



CORPORATIVO LA PALOMA S.A. DE C.V.
CALLE MARIANO ESCOBEDO No.6, COL. CENTRO
CONCORDIA, SINALOA.

R.F.C.
CPA-061117-QJ8

I.M.S.S.
L51-11189-10-0



MUNICIPIO DE ESCUINAPA, SINALOA
DIRECCION DE OBRAS, SERVICIOS PUBLICOS
Y ECOLOGIA

ESCUINAPA, SINALOA

HOJA: 1 de 1



CONCEPTOS DE ESTIMACION

CONTRATO: **ESC-FAISMUN-2025-019** ESTIMACION: **01 (Finiquito)**
PERIODO: **13-ago-25** AL **11-oct-25** LOCALIDAD: **CELAYA** MUNICIPIO: **ESCUINAPA**
DESCRIPCION: **CONSTRUCCION DE TECHO FIRME DE 4X4 M2, EN LA COMUNIDAD DE CELAYA, ESCUINAPA, SINALOA.**

IMPORTE DE OBRA: **\$541,380.36**
IMPORTE DE ANTICIPO DE OBRA: **\$189,483.14**
IMPORTE TOTAL DE CONTRATO: **\$541,380.36**

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	SEGUN PROYECTO			HASTA ESTA ESTIMACION	HASTA ESTIMACION ANTERIOR	EXCEDENTE	DE ESTA ESTIMACION	IMPORTE
			VOL.	PJ	\$					
TECHOS DE CONCRETO EN LA COMUNIDAD DE CELAYA.										
TRA	Trazo de terreno, el precio incluye: material, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución.	M2	192.00	\$ 6.8600	\$ 1,317.12	192.00	0.00	0.00	192.00	1,317.12
CIM-LS	Cimbra y descimbra en losas con tarimas de triplay 1.22 x 2.44 Incluye: Materiales, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución.	M2	192.00	\$ 780.66	\$ 149,886.72	192.00	0.00	0.00	192.00	149,886.72
ACRVR	Acero de refuerzo del núm. 3, (3/8") fyp = 4200 kg/ml, en losa de techo, incluye: habilitado y armado, materiales, mano de obra, equipo, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.	TON	1.20	\$ 38,439.57	\$ 46,127.48	1.20	0.00	0.00	1.20	46,127.49
SM-CO	Suministro y colocación de concreto simple de 10 cm de espesor, acabado común, concreto hecho en obra de f'c= 200 kg/cm2, incluye: material, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución.	M2	192.00	\$ 701.85	\$ 134,757.12	192.00	0.00	0.00	192.00	134,757.12
SE-AL	Salida de electricidad para alumbrado a base de tubo conduit pared delgada de 13 mm., con un desarrollo de 4 mts, con cable thw cal. 12, con dos cajas conduit T-9, T-29 serie 9; El precio incluye: conectores pared delgada de 13 mm, coples de 13 mm, abrazaderas de uña, apagador y placa sencilla marca quinzifo, caja de registro de 1/2" y soque de sobreponer, incluye: material, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución.	SAL	12.00	\$ 1,613.35	\$ 19,360.20	12.00	0.00	0.00	12.00	19,360.20
SE-AB	Salida de electricidad para abanico a base de tubo conduit pared delgada de 13 mm. con un desarrollo de 10 mts, con cable thw cal. 12, con dos cajas conduit T-9, T-29 serie 9, y una FS-1 de 13 mm; El precio incluye: conectores pared delgada de 13 mm, coples de 13 mm, abrazaderas de uña, apagador y placa sencilla marca quinzifo, caja de registro de 1/2" y soque de sobreponer, incluye: material, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución.	SAL	12.00	\$ 1,613.36	\$ 19,360.32	12.00	0.00	0.00	12.00	19,360.32
PRET	Pretil block de concreto 9x14x28 con mortero cemento 1:5 14cm. de espesor acabado común, incluye: acarreo 1a. estacion a 20.00m, incluye: material, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ML	192.00	\$ 193.56	\$ 37,163.52	192.00	0.00	0.00	192.00	37,163.52
CHAF	Chaffan de 10 x 10 asentado con mezcla cemento arena de proporción 1:5, incluye: material, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ML	192.00	\$ 253.77	\$ 48,723.84	192.00	0.00	0.00	192.00	48,723.84
LIMP-F	Limpieza final de la obra, incluye: material, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución.	M2	192.00	\$ 52.14	\$ 10,010.88	192.00	0.00	0.00	192.00	10,010.88
TOTAL TECHOS DE CONCRETO EN LA SINDICATURA DE OJO DE ISLA DEL BOSQUE.:										\$ 466,707.21
TOTAL DE ESTIMACION:										\$ 466,707.21

ELABORÓ

ARQ. ARNULFO LIZARRAGA VALENZUELA
REPRESENTANTE LEGAL

REVISÓ

ARQ. SILVIA ZAYDEE PADILLA CRESPO
SUPERVISOR DE OBRAS PUBLICAS

AUTORIZÓ

M. en ARQ. GRACIELA ELIZALDE SANTOS
DIRECTORA DE OBRAS, SERVICIOS
PUBLICOS Y ECOLOGIA



CORPORATIVO LA PALOMA S.A. DE C.V.
CALLE MARIANO ESCOBEDO No.6, COL. CENTRO
CONCORDIA, SINALOA.

R.F.C.
CPA-061117-QJ8

I.M.S.S.
L51-11189-10-0



MUNICIPIO DE ESCUINAPA, SINALOA
DIRECCION DE OBRAS, SERVICIOS PUBLICOS
Y ECOLOGIA

ESCUINAPA, SINALOA

HOJA: 1 de 1



RESUMEN DE ESTIMACION

CONTRATO: **ESC-FAISMUN-2025-019**
PERIODO: **13-ago-25** AL **11-oct-25** LOCALIDAD: **CELAYA** ESTIMACION: **01 (Finiquito)**
MUNICIPIO: **ESCUINAPA**
DESCRIPCION: **CONSTRUCCION DE TECHO FIRME DE 4X4 M2, EN LA COMUNIDAD DE CELAYA, ESCUINAPA, SINALOA.**
IMPORTE DE OBRA: **\$541,380.36** CONVENIO ADICIONAL:
IMPORTE DE ANTICIPO DE OBRA: **\$189,483.14** PERIODO CONVENIO ADICIONAL: DEL AL
IMPORTE TOTAL DE CONTRATO: **\$541,380.36**

TECHOS DE CONCRETO EN LA COMUNIDAD DE CELAYA.

OBRA	IMPORTE
TECHOS DE CONCRETO EN LA COMUNIDAD DE CELAYA.	\$ 466,707.21

SUB TOTAL= \$ 466,707.21
I.V.A \$ 74,673.15
TOTAL = \$ 541,380.36

Elaboró

ARQ. ARNULFO LIZARRAGA VALENZUELA
CORPORATIVO LA PALOMA, S.A. DE C.V.
REPRESENTANTE LEGAL

Revisó

ARQ. SILVIA ZAYDEE PADILLA CRESPO
SUPERVISOR DE OBRAS PUBLICAS

Autorizó

M. en ARQ. GRACIELA ELIZALDE SANTOS
DIRECTORA DE OBRAS, SERVICIOS
PUBLICOS Y ECOLOGIA




R.F.C.
CPA-061117-QJ8

CORPORATIVO LA PALOMA S.A. DE C.V.
CALLE MARIANO ESCOBEDO No.6, COL. CENTRO
CONCORDIA, SINALOA.

I.M.S.S.
L51-11189-10-0



MUNICIPIO DE ESCUINAPA, SINALOA
DIRECCION DE OBRAS, SERVICIOS PUBLICOS
ESCUINAPA, SINALOA

HOJA: 1 de 1



ESTADO DE CUENTA

LOCALIDAD: CELAYA
ESTIMACION: 01 (Finiquito)
MUNICIPIO: ESCUINAPA
DESCRIPCION: CONSTRUCCION DE TECHO FIRME DE 4X4 M2, EN LA COMUNIDAD DE CELAYA, ESCUINAPA, SINALOA.
FECHA INICIO CONTRATO: 13-ago-25
FECHA TERMINACION CONTRATO: 11-oct-25
CONTRATO: ESC-FAISMUN-2025-019
FECHA CONTRATO: 12-ago-25

IMPORTE DE OBRA: \$541,380.36 CLAVE DE CONVENIO ADICIONAL:
IMPORTE DE ANTICIPO DE OBRA: \$189,483.14 PERIODO CONVENIO ADICIONAL:
IMPORTE TOTAL DE CONTRATO: \$541,380.36 IMPORTE CONVENIO ADICIONAL:

DEL AL

No. DE ESTIMACION	PERIODO	IMPORTE ESTIMACION \$	IMPORTE IVA \$	SN	3% ORGANISMO INTERNO DE CONTROL MPAL Y CONGRESO DEL EDO.	35% AMORTIZACION ANTICIPO \$	TOTAL DEDUCCIONES \$	LIQUIDO A PAGAR \$
01 (Finiquito)	13-ago-25 11-oct-25	\$ 541,380.36	\$ 466,707.21	\$	14,001.22	\$ 189,483.13	\$ 203,484.35	\$ 337,896.01
TOTALES:		\$ 541,380.36	\$ 466,707.21	\$	14,001.22	\$ 189,483.13	\$ 203,484.35	\$ 337,896.01
SALDO DEL CONTRATO:		\$0.00		SALDO POR AMORTIZAR:		\$0.00		

REALIZO
ARQ. ARNULFO LIZARRAGA VALENZUELA
CORPORATIVO LA PALOMA, S.A. DE C.V.
REPRESENTANTE LEGAL

REVISO
ARQ. SILVIA ZAYDEE PADILLA CRESPO
SUPERVISOR DE OBRAS PUBLICAS

AUTORIZO
M. en ARQ. GRACIELA ELIZALDE SANTOS
DIRECTORA DE OBRAS, SERVICIOS
PUBLICOS Y ECOLOGIA

AUTORIZO
L.C.P. JOSE TRINIDAD IBARRA MARTINEZ
TESORERO MUNICIPAL

CARATULA DE RECIBO

Hoja: 1 de 1

RECIBO MUNICIPAL No. 01 (Finiquito)



CORPORATIVO LA PALOMA S.A. DE C.V.
CALLE MARIANO ESCOBEDO No.6, COL. CENTRO
CONCORDIA, SINALOA.

TELÉFONO:

CEL:

669-127-9484

UBICACION:

CONCORDIA, SIN.

R.F.C.

CPA-061117-QJ8

I.M.S.S.

L51-11189-10-0

FECHA:

11-oct-25

ESTIMACION No:

01 (Finiquito)

PERIODO:

DEL

13-ago-25

AL

11-oct-25

DESCRIPCION:

CONSTRUCCION DE TECHO FIRME DE 4X4 M2, EN LA COMUNIDAD DE CELAYA, ESCUINAPA, SINALOA.

FECHA DE CONTRATO:

12-ago-25

PERIODO DE EJECUCION DEL CONTRATO:

INICIO:

13-ago-25

TERMINACION:

11-oct-25

PRORROGA:

DEL

AL

CONTRATO NO:

ESC-FAISMUN-2025-019

IMPORTE SIN IVA

\$466,707.21

IMPORTE CON IVA

\$541,380.36

35% ANTICIPO

\$189,483.14

IMPORTE TOTAL DE CONTRATO:

\$541,380.36

BUENO POR:

\$337,896.01

RECIBE DE LA TESORERIA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE ESCUINAPA, SINALOA, LA CANTIDAD DE:

\$337,896.01 SON: (TRESCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS 01/100 M.N.

EN PAGO DE ESTIMACION 01 (Finiquito)

DEDUCCIONES:

AMORTIZACION ANTICIPO 35% (*)

\$ 163,347.53

MAS I.V.A.

\$ 26,135.60

TOTAL AMORTIZACION DE ANTICIPO

\$ 189,483.13

CALCULO DE ESTIMACION

IMPORTE DE LA OBRA EJECUTADA SIN IVA

\$ 466,707.21

DEDUCCION ANTICIPO (35%):

-\$ 163,347.53

SUMA:

\$ 303,359.68

MAS I.V.A 16 %

\$ 48,537.55

TOTAL:

\$ 351,897.23

DEDUCCION SVIFC (3%):

-\$ 14,001.22

LIQUIDO A PAGAR:

\$ 337,896.01

3% ORGANISMO INTERNO DE CONTROL

MUNICIPAL Y CONGRESO DEL ESTADO: (*)

\$ 14,001.22

TOTAL DE DEDUCCIONES:

\$ 203,484.35

(*) DEL IMPORTE EJECUTADO SIN IVA

SALDO A PAGAR:

\$ 337,896.01

REALIZÓ

ARQ. ARNULFO LIZARRAGA VALENZUELA
CORPORATIVO LA PALOMA, S.A. DE C.V.
REPRESENTANTE LEGAL

AUTORIZÓ

M. en ARQ. GRACIELA ELIZALDE SANTOS
DIRECTORA DE OBRAS, SERVICIOS
PUBLICOS Y ECOLOGIA

REVISÓ

ARQ. SILVIA ZAYDEE PADILLA CRESPO
SUPERVISOR DE OBRAS PUBLICAS

AUTORIZÓ

L.C.P. JOSE TRINIDAD IBARRA MARTINEZ
TESORERO MUNICIPAL



Corporativo

La Paloma

Arq. Arnulfo Lizarraga Valenzuela
Representante Legal

R.F.C. CPA-061117-QJ8

C. MARIANO ESCOBEDO No. 6 CENTRO ESQ. CON ISIDORO PERAZA
CONCORDIA, SINALOA. C.P. 82600

TEL/FAX 01(694) 968-22-17, 968-13-82 CEL 044(6691)
27-94-84

Recibo No. 1 (Uno)
Bueno por: **\$337,896.01**

RECIBI DE TESORERIA DEL MUNICIPIO DE ESCUINAPA LA CANTIDAD DE: -----
----- **\$337,896.01** (TRESCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y SEIS
PESOS 01/100 M.N.).
POR CONCEPTO DE:
PAGO CORRESPONDIENTE A LA **ESTIMACION No.1 (FINIQUITO)** DEL CONTRATO No.
ESC-FAISMUN-2025-019 DE LA OBRA DE DESIGNACION:
**- CONSTRUCCION DE TECHO FIRME DE 4X4 M2, EN LA COMUNIDAD DE CELAYA,
ESCUINAPA, SINALOA.**

Monto total Contratado =	\$541,380.36	(Son Quinientos Cuarenta y Un Mil Trescientos Ochenta Pesos 36/100 M.N.)
IMPORTE DE ESTIMACION:		\$466,707.21
SUBTOTAL:		\$466,707.21
16% IVA:		\$74,673.15
TOTAL:		\$541,380.36
DEDUCCIONES:		
AMORTIZACION ANTICIPO 35%:		\$189,483.13
CONGRESO DEL ESTADO 3%:		\$14,001.22
TOTAL NETO A COBRAR:		\$337,896.01

RECIBI:
ESCUINAPA, SINALOA A 11 DE OCTUBRE DE 2025
CORPORATIVO LA PALOMA, S.A. DE C.V.

Atentamente:

Arq. Arnulfo Lizarraga Valenzuela
Representante Legal



c.c.p. Archivo

CONSTRUCCIÓN Y DISEÑO DE OBRA CIVIL EN GENERAL

NUMEROS GENERADORES

LOCALIDAD: CELAYA	ESTIMACION: 01 (Finiquito)
MUNICIPIO: ESCUINAPA	
DESCRIPCION: CONSTRUCCION DE TECHO FIRME DE 4X4 M2, EN LA COMUNIDAD DE CELAYA, ESCUINAPA, SINALOA.	

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	LOCALIZACIÓN			LARGO	ANCHO	ALTO	RESULTADO	OBSERVACIONES
			EJE	TRAMO	PZAS					
TECHOS DE CONCRETO EN LA COMUNIDAD DE CELAYA.										
TRA	Trazo de terreno, el precio incluye: material, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución.	M2			12.00	4.00	4.00		192.00	
CIM-LS	Cimbra y descimbra en losas con tarimas de triplay 1.22 x 2.44 Incluye: Materiales, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución.	M2			12.00	4.00	4.00		192.00	
ACRVR	Acero de refuerzo del núm. 3, (3/8") fyp = 4200 kg/ml, en losa de techo , incluye: habilitado y armado, materiales, mano de obra, equipo, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.	TON		12.00	4.00/0.20= 21 pzas(4.00)=84 ml		0.00056	0.56448		
				12.00	4.00/0.20= 21 pzas(4.00)= 84 ml		0.00056	0.56448		
				12.00	4.00/0.20= 11 pzas(1.00)= 11 ml		0.00056	0.07392		1.20
SM-CO	Suministro y colocación de concreto simple de 10 cm de espesor, acabado común, concreto hecho en obra de f'c= 200 kg/cm2,incluye: material, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución.	M2			12.00	4.00	4.00		192.00	
SE-AL	Salida de electricidad para alumbrado a base de tubo conduit pared delgada de 13 mm., con un desarrollo de 4 mts, con cable thw cal. 12 , con dos cajas conduit T-9, T-29 serie 9, El precio incluye: conectores pared delgada de 13 mm, coples de 13 mm, abrazaderas de uña, apagador y placa sencilla marca quinzifio, caja de registro de 1/2" y soque de sobreponer, incluye: material, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución.	SAL			12.00				12.00	
SE-AB	Salida de electricidad para abanico a base de tubo conduit pared delgada de 13 mm., con un desarrollo de 10 mts, con cable thw cal. 12 , con dos cajas conduit T-9, T-29 serie 9, y una FS-1 de 13 mm; El precio incluye: conectores pared delgada de 13 mm, coples de 13 mm, abrazaderas de uña, apagador y placa sencilla marca quinzifio, caja de registro de 1/2" y soque de sobreponer, incluye: material, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución.	SAL			12.00				12.00	
PRET	Pretil block de concreto 9x14x28 con mortero cem-are 1:5 14cm. de espesor acabado comun, incluye: acarreo 1a. estacion a 20.00m. incluye: material, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ML			12.00	16.00			192.00	
CHAF	Chaffan de 10 x 10 asentado con mezcla cemento arena de proporción 1:5, incluye: material, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ML			12.00	16.00			192.00	
LIMP-F	Limpieza final de la obra, incluye: material, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución.	M2			12.00	4.00	4.00		192.00	

ELABORÓ

ARQ. ARNULFO LIZARRAGA VALENZUELA
 SUPERINTENDENTE DE OBRA

AUTORIZO

ARQ. SILVIA ZAYDEE PADILLA CRESPO
 SUPERVISOR DE OBRAS PUBLICAS


CROQUIS

LOCALIDAD: CELAYA

ESTIMACION: 01 (Finiquito)
MUNICIPIO: ESCUINAPA

DESCRIPCION: CONSTRUCCION DE TECHO FIRME DE 4X4 M2, EN LA COMUNIDAD DE CELAYA, ESCUINAPA, SINALOA.

ALZADO PRINCIPAL TECHO FIRME TIPO

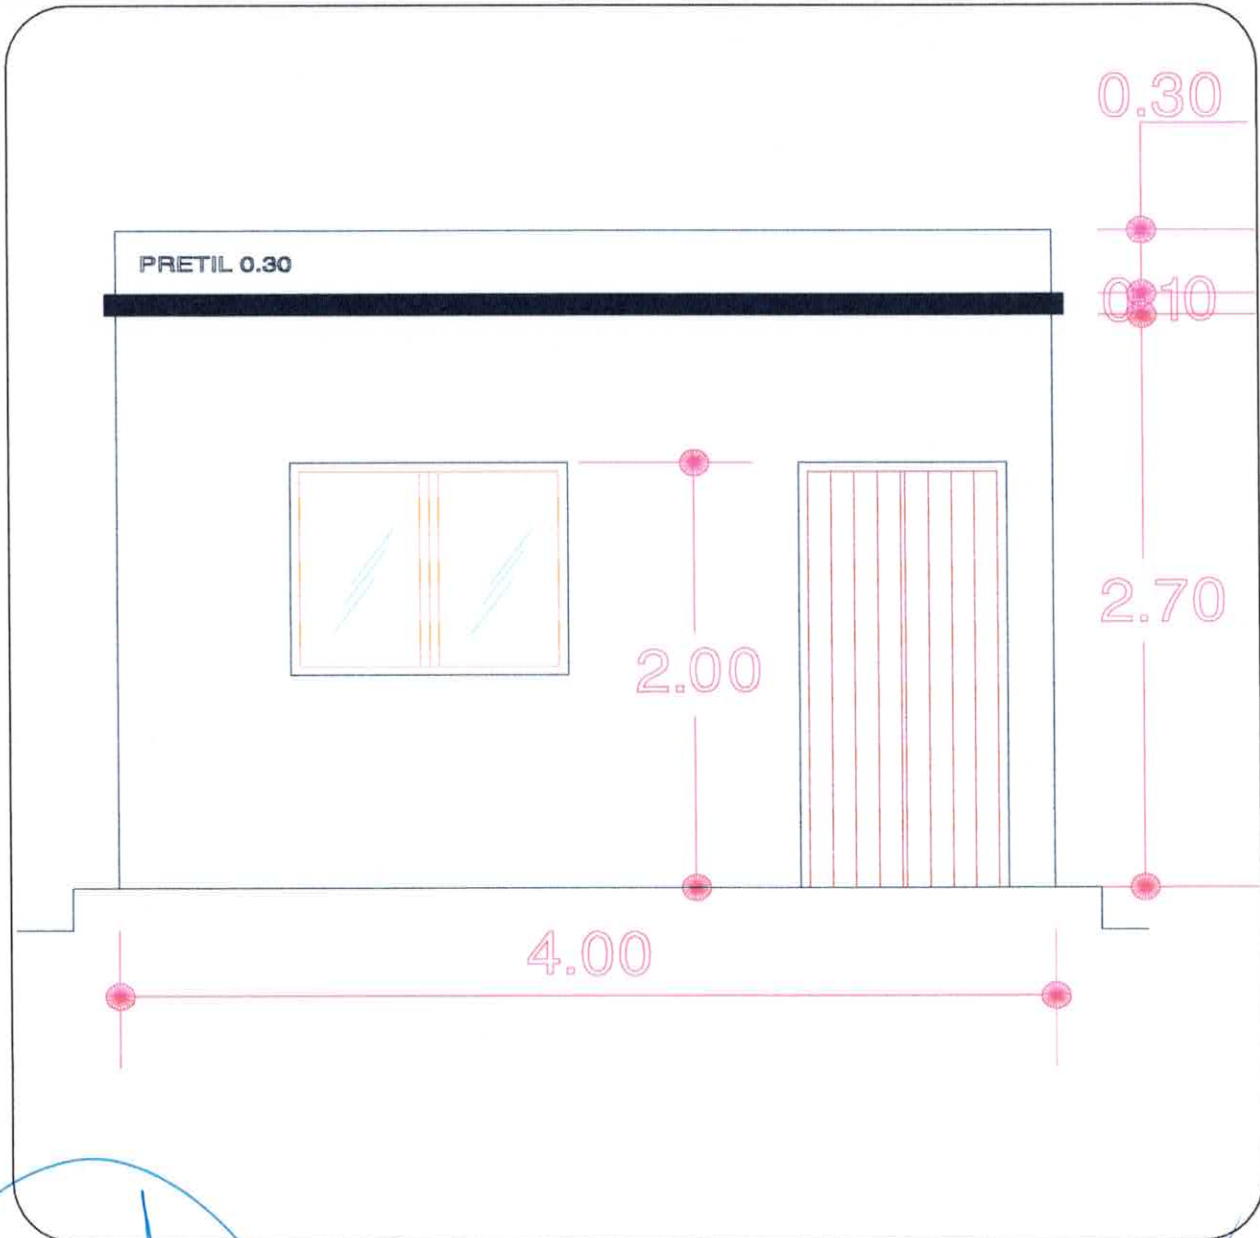

ELABORÓ

ARQ. ARNULFO LIZARRAGA VALENZUELA
SUPERINTENDENTE DE OBRA

AUTORIZÓ

ARQ. SILVIA ZAYDEE PADILLA CRESPO
SUPERVISOR DE OBRAS PUBLICAS



CROQUIS


LOCALIDAD: CELAYA

ESTIMACION: 01 (Finiquito)
MUNICIPIO: ESCUINAPA

DESCRIPCION: CONSTRUCCION DE TECHO FIRME DE 4X4 M2, EN LA COMUNIDAD DE CELAYA, ESCUINAPA, SINALOA.

DETALLE DE LOSA DE TECHO FIRME TIPO

Losa plana en estructura de 0.10
varilla $\frac{3}{8}$ " @ 20 cm ambos sentidos

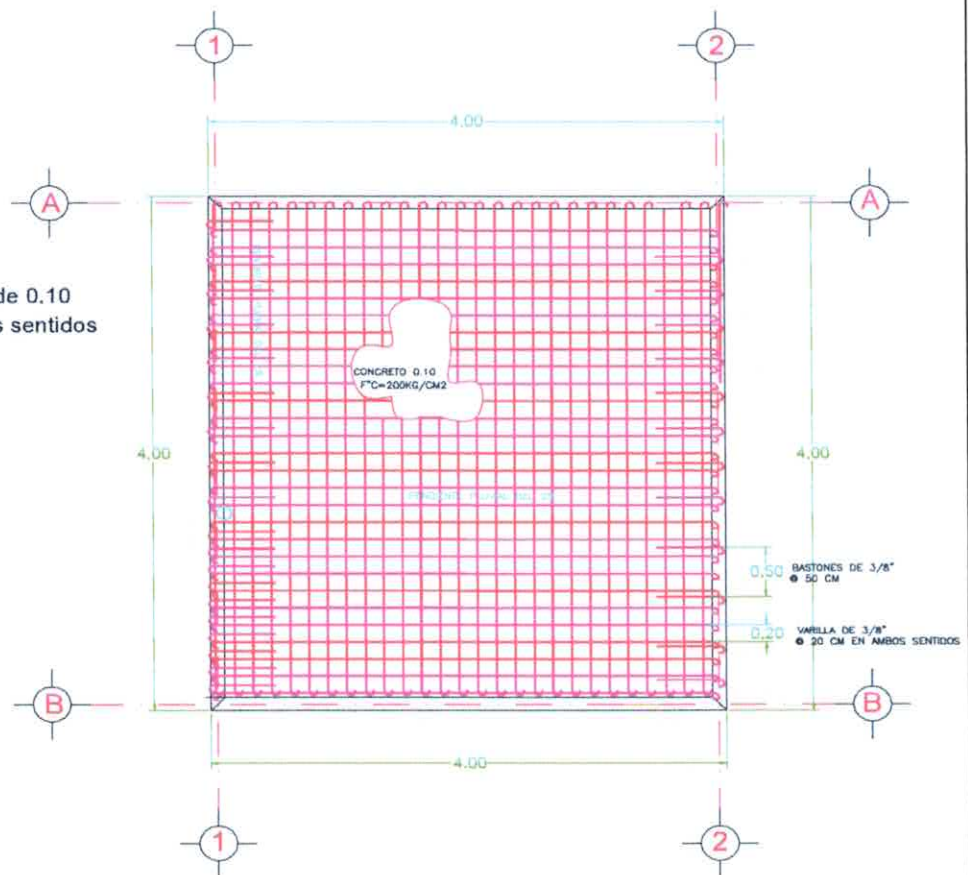

ELABORÓ

ARQ. ARNULFO LIZARRAGA VALENZUELA
SUPERINTENDENTE DE OBRA


AUTORIZÓ

ARQ. SILVIA ZAYDEE PADILLA CRESPO
SUPERVISOR DE OBRAS PUBLICAS

CROQUIS

LOCALIDAD: **CELAYA** ESTIMACION: **01 (Finiquito)**
 MUNICIPIO: **ESCUINAPA**
 DESCRIPCION: **CONSTRUCCION DE TECHO FIRME DE 4X4 M2, EN LA COMUNIDAD DE CELAYA, ESCUINAPA, SINALOA.**

CLAVE	(Descripcion del Concepto)
	PLANTA DE LOAS DE AZOTEA

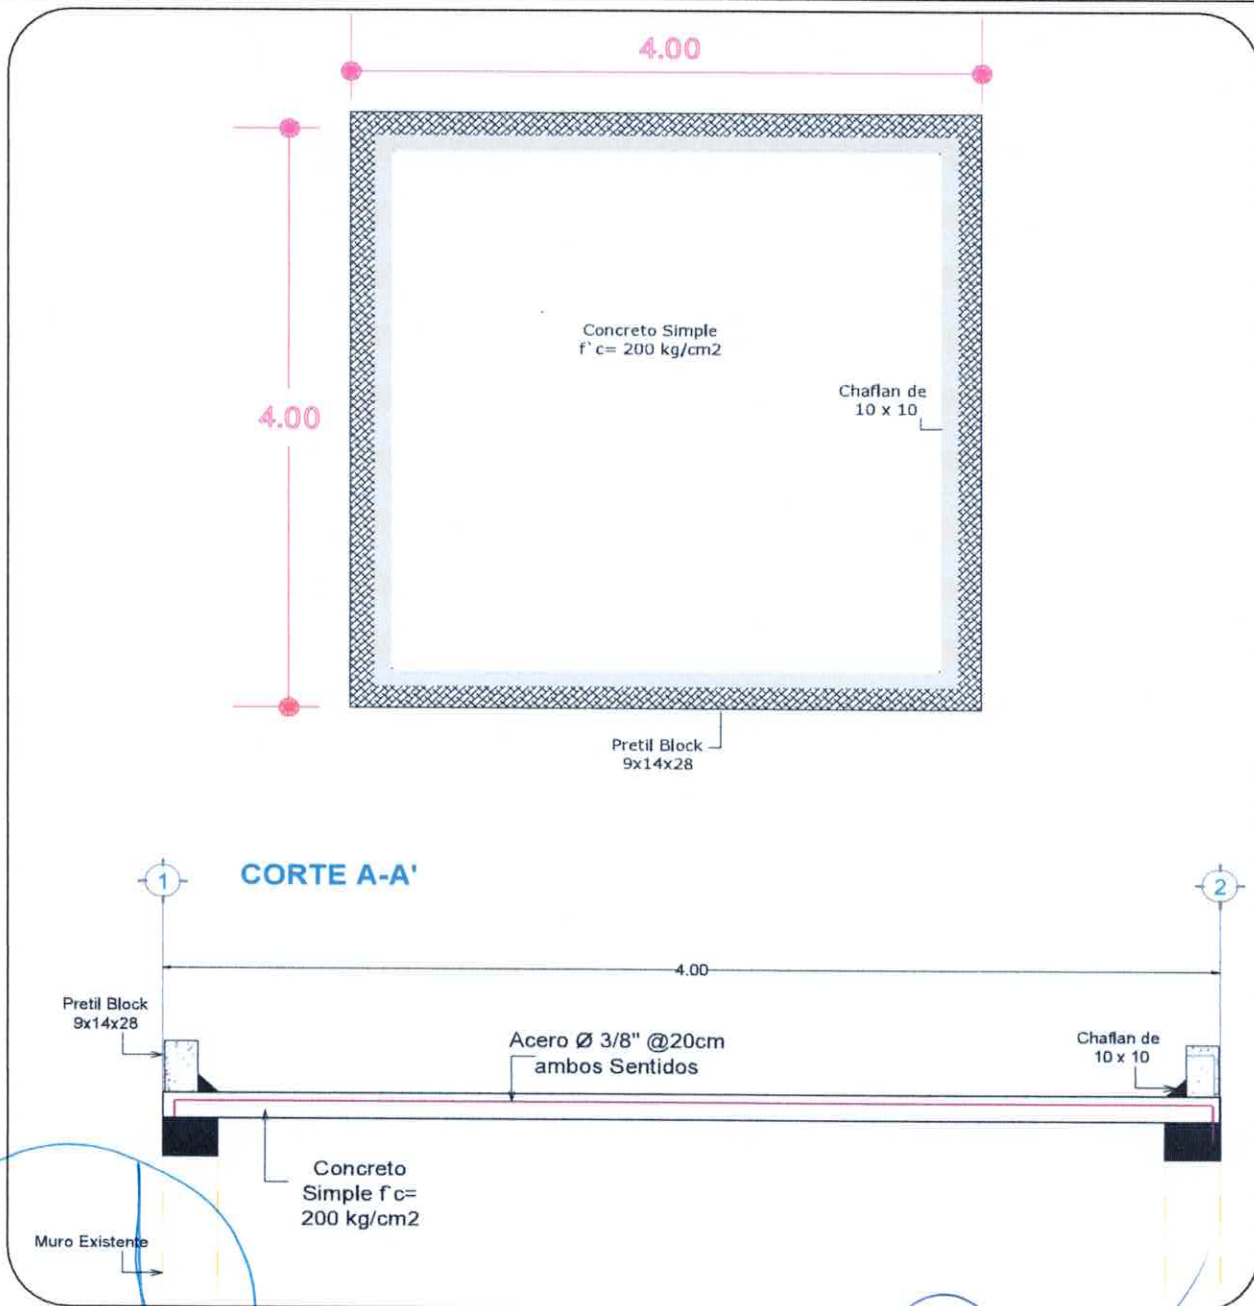

ELABORÓ
ARQ. ARNULFO LIZARRAGA VALENZUELA
 SUPERINTENDENTE DE OBRA

AUTORIZÓ
ARQ. SILVIA ZAYDEE PADILLA CRESPO
 SUPERVISOR DE OBRAS PUBLICAS



CORPORATIVO LA PALOMA S.A. DE C.V.
CALLE MARIANO ESCOBEDO No.6, COL. CENTRO
CONCORDIA, SINALOA.

I.M.S.S.
L51-11189-10-0



MUNICIPIO DE ESCUINAPA, SINALOA
DIRECCION DE OBRAS, SERVICIOS PUBLICOS
Y ECOLOGIA

ESCUINAPA, SINALOA

HOJA: 1 de 3



FOTOGRAFIAS

LOCALIDAD: CELAYA

ESTIMACION: 01 (Finiquito)

MUNICIPIO: ESCUINAPA

DESCRIPCION: CONSTRUCCION DE TECHO FIRME DE 4X4 M2, EN LA COMUNIDAD DE CELAYA, ESCUINAPA, SINALOA.

CLAVE	(Descripcion del Concepto)
CIM-LS	Cimbra y descimbra en losas con tarimas de triplay 1.22 x 2.44 Incluye: Materiales, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución.



CLAVE	(Descripcion del Concepto)
ACRVR	Acero de refuerzo del núm. 3, (3/8") fyp = 4200 kg/ml, en losa de techo , incluye: habilitado y armado, materiales, mano de obra, equipo, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.



ELABORO

ARQ. ARNULFO LIZARRAGA VALENZUELA
SUPERINTENDENTE DE OBRA

AUTORIZO

ARQ. SILVIA ZAYDEE PADILLA CRESPO
SUPERVISOR DE OBRAS PUBLICAS

FOTOGRAFIAS

ESTIMACION: **01 (Finiquito)**
 MUNICIPIO: **ESCUINAPA**

LOCALIDAD: **CELAYA**

DESCRIPCION: **CONSTRUCCION DE TECHO FIRME DE 4X4 M2, EN LA COMUNIDAD DE CELAYA, ESCUINAPA, SINALOA.**

CLAVE	(Descripcion del Concepto)
SE-AL	Salida de electricidad para alumbrado a base de tubo conduit pared delgada de 13 mm., con un desarrollo de 4 mts, con cable thw cal. 12 , con dos cajas conduit T-9, T-29 serie 9; El precio incluye: conectores pared delgada de 13 mm, coples de 13 mm, abrazaderas de uña, apagador y placa sencilla marca quinzio, caja de registro de 1/2" y soque de sobreponer. incluye: material, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución.



CLAVE	(Descripcion del Concepto)
SE-AB	Salida de electricidad para abanico a base de tubo conduit pared delgada de 13 mm., con un desarrollo de 10 mts, con cable thw cal. 12 , con dos cajas conduit T-9, T-29 serie 9, y una FS-1 de 13 mm; El precio incluye: conectores pared delgada de 13 mm, coples de 13 mm, abrazaderas de uña, apagador y placa sencilla marca quinzio, caja de registro de 1/2" y soque de sobreponer. incluye: material, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución.



ELABORÓ

ARQ. ARNULFO LIZARRAGA VALENZUELA
 SUPERINTENDENTE DE OBRA

AUTORIZO

ARQ. SILVIA ZAYDEE PADILLA CRESPO
 SUPERVISOR DE OBRAS PUBLICAS

FOTOGRAFIAS

LOCALIDAD: CELAYA

ESTIMACION: 01 (Finiquito)
 MUNICIPIO: ESCUINAPA

DESCRIPCION: CONSTRUCCION DE TECHO FIRME DE 4X4 M2, EN LA COMUNIDAD DE CELAYA, ESCUINAPA, SINALOA.

CLAVE	(Descripcion del Concepto)
SM-CO	Suministro y colocación de concreto simple de 10 cm de espesor, acabado común, concreto hecho en obra de $f'c = 200 \text{ kg/cm}^2$, incluye: material, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución.



CLAVE	(Descripcion del Concepto)
SM-CO	Suministro y colocación de concreto simple de 10 cm de espesor, acabado común, concreto hecho en obra de $f'c = 200 \text{ kg/cm}^2$, incluye: material, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución.



ELABORÓ

ARQ. ARNULFO LIZARRAGA VALENZUELA
 SUPERINTENDENTE DE OBRA

AUTORIZO

ARQ. SILVIA ZAYDEE PADILLA CRESPO
 SUPERVISOR DE OBRAS PUBLICAS
