



Badiraguato

GENERANDO BUENOS RESULTADOS



OFICIO No. OPDUyE/599/2025
ASUNTO: SOLICITUD PAGO DE
ESTIMACIÓN 01 NORMAL

Badiraguato, Sin., a 05 de Noviembre de 2025


MTRO. GONZALO IRINEO CABALLERO TERRAZAS
TESORERO MUNICIPAL
P R E S E N T E.-

POR MEDIO DE LA PRESENTE, LE SOLICITO EL PAGO POR: CONCEPTO DE PAGO DE ANTICIPO, DEL IMPORTE DEL CONTRATO, A FAVOR DE LA EMPRESA: SERGIO JOEL PADILLA SOTO, LA CUAL REALIZA LOS TRABAJOS APROBADOS POR EL SUBCOMITE DE BIENESTAR MUNICIPAL, A CONTINUACIÓN, SE DETALLA:

- NOMBRE DE LA OBRA: CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE METÁLICA EN LA COMUNIDAD DE LA APOMA, SINDICATURA DE HIGUERAS DE ÁLVAREZ BORBOA, MUNICIPIO DE BADIRAGUATO, SINALOA.
- No. DE CONTRATO: MBGBR-LP-FAISMUN-006/2025
- IMPORTE DEL CONTRATO: \$2,931,818.64 (DOS MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y UN MIL OCHOCIENTOS DIECIOCHO PESOS 64/100 M.N)
- CONCEPTO DEL PAGO: PAGO DE ESTIMACIÓN 01 NORMAL
- IMPORTE A PAGAR: \$1,431,353.15 (UN MILLON CUATROCIENTOS TREINTA Y UN MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS 15/100 M.N)
- RECURSOS: FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FAISMUN) EJERCICIO 2025.
- EMPRESA: SERGIO JOEL PADILLA SOTO
- R.F.C. PASS971118IR0
- DOMICILIO FISCAL: CALLE ENRIQUE COLUNGA 1962, GUSTAVO DIAZ ORDAZ, CULIACÁN, SINALOA C.P. 80180
- No. DE FACTURA: # 87, DE FECHA 03 DE NOVIEMBRE DE 2025.

SE ANEXA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DE SOPORTE, COMO AMPARO DE DICHO PAGO.

AGRADECIENDO DE ANTEMANO LA ATENCIÓN QUE SE SIRVA DAR A LA PRESENTE, ME DESPIDO QUEDANDO A SUS ÓRDENES.



DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS,
DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA,
BADIRAGUATO, SINALOA.

ATENTAMENTE

C. ING. RUBIEL RINCÓN RAMOS
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS,
DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA



MUNICIPIO DE
BADIRAGUATO
TESORERÍA

11:16 AM
05 NOV 2025

RECIBIDO

C.C.P. ARCHIVO.



Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Serie:

Folio: 87

Fecha: 03/Nov/2025 17:40:57

Lugar de expedición (C.P.) 80180

Emisor

SERGIO JOEL PADILLA SOTO

RFC: PASS971118IR0

Régimen Fiscal: 612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y

Domicilio: Profesionales

ENRIQUE COLUNGA 1962 Gustavo Díaz Ordaz Culiacán Sinaloa México

80180

Receptor
Cliente: MUNICIPIO DE BADIRAGUATO

RFC: MBA850101214

Uso CFDI: I01 - Construcciones

Exportación: 01 - No aplica

Domicilio Fiscal: 80500

Régimen Fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

Domicilio: GABRIEL LEYVA SOLANO S/N Col Centro Badiraguato Sinaloa México 80500

Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición

Forma de Pago: 03 - Transferencia electrónica de

Tipo de cambio: 1.000000

Moneda: MXN - Peso Mexicano

Información de cancelación

Motivo de cancelación:

Folio relacionado:

Cantidad	Clave Unidad SAT	Clave Prod/Servicio	Descripción	Valor unitario	Impuestos	Importe
1.00	E48 - Unidad de servicio	72152601 - Servicio de techado	<p>PAGO DE ESTIMACION 01 NORMAL</p> <p>DE LA OBRA: CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE METALICA EN LA COMUNIDAD DE LA APOMA, SINDICATURA DE HIGUERAS DE ALVAREZ BORBOA, MUNICIPIO DE BADIRAGUATO, SINALOA.</p> <p>CONTRATO NO.: MBGBR-LP-FAISMUN-006/2025</p> <p>MONTO DEL CONTRATO: \$ 2,931,818.64</p> <p>IMPORTE DE LA OBRA EJECUTADA SIN IVA \$ 1,977,007.10</p> <p>MAS I.V.A 16 % \$ 316,321.14</p> <p>TOTAL DE LA OBRA EJECUTADA CON IVA \$ 2,293,328.24</p> <p>AMORTIZACIÓN ANTICIPO 35% \$ 691,952.48</p> <p>MAS I.V.A.: \$ 110,712.40</p> <p>TOTAL AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO: \$ 802,664.88</p> <p>Importe TOTAL A FACTURAR \$ 1,285,054.62</p> <p>MAS I.V.A \$ 205,608.74</p> <p>MONTO NETO A FACTURAR \$ 1,490,663.36</p> <p>RETENCION 3% (S.V.I.F.Y C.): \$ 59,310.21</p> <p>TOTAL DEDUCCIONES: \$ 861,975.09</p> <p>MONTO LIQUIDO A RECIBIR: \$ 1,431,353.15</p>	\$1,285,054.62	IVA, - Importe: 205608.74	\$1,285,054.62

CFDI RELACIONADOS

Tipo de relación:

Lista de CFDI's relacionados:

Total con letra:

un millón cuatrocientos noventa mil seiscientos sesenta y tres Pesos 36/100 M.N.

Subtotal: \$1,285,054.62**I.V.A.:** \$205,608.74**Total:** \$1,490,663.36**Este documento es una representación impresa de un CFDI****Serie del Certificado del emisor:** 00001000000711829771**Folio Fiscal:** 05531DAD-A52E-49BD-A5D9-EF5927A422CD**No. de serie del Certificado del SAT:** 00001000000709182898**Fecha y hora de certificación:** 2025-11-03T18:41:04**Sello digital del CFDI**

RxFW85L8NbQyINwQEITZqTXPUcjrcPIx+1/gpuWP9AyFrgp5O/DteyXJ6INbZH4Z8vRQz6IL2vtpriTfgOedrJPz/SFk8RT5PupVe054Eoiv8ergJxyx/RxkZfz8XWsiQMPym+uBBj8cl
clep7Ei39oyrDAHx9GJNd83BF695aZxZo9cB+GorftHP+YS1K+PrguhzDhX8XZ27EK9z75X+VWFeDKmhbfOarXO30hhDQeqUOdSZbpxGa9iW+189sWIHQBuCLgy574dNAWdWwWrd8Lj44pm
QdixAC3i98660rQ+6y4sv3o9E2Bve09koQb583FQB5+j8oHKJPWCPUYVOA==

Sello del SAT

MGgsW9+roHEbLApePjmd260wG/cYWiZQ4CH7sLr/FaTEmyXzowjs2z2kPXIZjgs18VhSUardWcZW520u2Mg8/fF6+MSarIAPzZeM7Q+uewl.9fX3uc4VwcNC8K+9OE/w+p7lg0yg
z5QPd/11EOqRq7mTMT5xYtuab98kNan8AgHUj64f/K5wmBFXCdq+2FlwSviUBhaJd2SMLPwY3k1N3NFPF8cWSSIVRISAdi3F+NURi9mmpeSL0XshdXVDVwwoN41ih+m1Ax/v9kkGM
Bollf+wFOHISseJnCmOyVC4uKaDkQbkJEEDsmKcR77Tyss+3uowqjkUg==

Cadena original del complemento del certificación digital del SAT

[[1.1]05531DAD-A52E-49BD-A5D9-EF5927A422CD|2025-11-03T18:41:04|MAS0810247C0|RxFW85L8NbQyINwQEITZqTXPUcjrcPIx+1/gpuWP9AyFrgp5O/DteyXJ6INbZH4Z8vR
Qzr6IL2vtpriTfgOedrJPz/SFk8RT5PupVe054Eoiv8ergJxyx/RxkZfz8XWsiQMPym+uBBj8clclep7Ei39oyrDAHx9GJNd83BF695aZxZo9cB+GorftHP+YS1K+PrguhzDhX8XZ27EK9z7
5X+VWFeDKmhbfOarXO30hhDQeqUOdSZbpxGa9iW+189sWIHQBuCLgy574dNAWdWwWrd8Lj44pmQdixAC3i98660rQ+6y4sv3o9E2Bve09koQb583FQB5+j8oHKJPWCPUYVOA==|0000100
000709182898]]

Versión del comprobante: 4.0

Hoja 2

```
<cfdi:Comprobante xmlns:cfdi="http://www.sat.gob.mx/cfd/4" xmlns:wsdl="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/cfd/4 http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/4/cfdv40.xsd"
Certificados="MIG6BCCAyggAwIBAgIUMDAwMDAwMDA3MTE4Mjk3NzEwDQYKOZiHvcNAQELBQAwGGMVMTUwMwYDQDQDQxgQyBERUwGU0VSvk1DSUsgrEUGQRNRSUSJU1RSQUNJT04gVFJJQ1VU
Exportacion="01" Fecha="2025-11-03T17:40:57" Folio="87" FormaPago="03" LugarExpedicion="80100" MetodoPago="PUE" Moneda="MXN"
NoCertificados="00001000000711829771"
Sello="RxFW85L8NbQyINwQELTZqTXPUcjRPIX+1/qpuWP9AYFrpg50/DteVXJ6tNhZ4Z8vRQzf6IL2vtprITfgOedrJPZ/SFKBRT5PupVe054EoiV8erqJxyx/RxkZfZ8XwslQMPym+uBBj8cicIep.
SubTotal="1285054.62" TipoDeComprobante="I" Total="1490663.36" Version="4.0">
  <cfdi:Emisor Nombre="SERGIO JOEL PADILLA SOTO" RegimenFiscal="612" Rfc="PASS971181R0"/>
  <cfdi:Receptor DomicilioFiscalReceptor="80500" Nombre="MUNICIPIO DE BADIRAGUATO" RegimenFiscalReceptor="603" Rfc="MBA80101214" UsoCFDI="I01"/>
  <cfdi:Conceptos>
    <cfdi:Concepto Cantidad="1.00" ClaveProdServ="72152601" ClaveUnidad="E48" Descripcion="SERVICIO DE TECHADO PAGO DE ESTIMACION 01 NORMAL DE LA OBRA:
CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE METALICA EN LA COMUNIDAD DE LA APOMA, SINDICATURA DE HIGUERAS DE ALVAREZ BORBOA, MUNICIPIO DE BADIRAGUATO, SINALOA.
CONTRATO NO.: MBGBR-LP-FAISMUN-006/2025 MONTO DEL CONTRATO: $ 2,931,818.64 IMPORTE DE LA OBRA EJECUTADA SIN IVA $ 1,977,007.10 MAS I.V.A 16 % $
316,321.14 TOTAL DE LA OBRA EJECUTADA CON IVA $ 2,293,328.24 AMORTIZACIÓN ANTICIPO 35% $ 691,952.48 MAS I.V.A.: $ 110,712.40 TOTAL AMORTIZACIÓN DE
ANTICIPO: $ 802,664.88 Importe TOTAL A FACTURAR $ 1,285,054.62 MAS I.V.A $ 205,608.74 MONTO NETO A FACTURAR $ 1,490,663.36 RETENCION 3% ( S.V.I.F.Y
C. ) : $ 59,310.21 TOTAL DEDUCCIONES: $ 861,975.09 MONTO LIQUIDO A RECIBIR: $ 1,431,353.15 Importe="1285054.62" NoIdentificacion="SER11"
ObjetoImp="02" ValorUnitario="1285054.62">
    <cfdi:Impuestos>
      <cfdi:Traslados>
        <cfdi:Traslado Base="1285054.62" Importe="205608.74" Impuesto="002" TasaOCuota="0.160000" TipoFactor="Tasa"/>
      </cfdi:Traslados>
    </cfdi:Impuestos>
  </cfdi:Concepto>
</cfdi:Conceptos>
<cfdi:Impuestos TotalImpuestosTrasladados="205608.74">
  <cfdi:Traslados>
    <cfdi:Traslado Base="1285054.62" Importe="205608.74" Impuesto="002" TasaOCuota="0.160000" TipoFactor="Tasa"/>
  </cfdi:Traslados>
</cfdi:Impuestos>
<cfdi:Complemento>
  <cfdi:TimbreFiscalDigital xmlns:tfd="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital" xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital
http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/TimbreFiscalDigital/TimbreFiscalDigitalv11.xsd" Version="1.1" UUID="055331DAD-A52E-49BD-A5D9-EF5927A422CD"
FechaTimbrado="2025-11-03T18:41:04" RfcProvCertif="MAS0010247C0">
    SelloCFD="RxFW85L8NbQyINwQELTZqTXPUcjRPIX+1/qpuWP9AYFrpg50/DteVXJ6tNhZ4Z8vRQzf6IL2vtprITfgOedrJPZ/SFKBRT5PupVe054EoiV8erqJxyx/RxkZfZ8XwslQMPym+uBBj
NoCertificadosSAT="00001000000709182898"
    SelloSAT="MGsW0+roHEBLApePJmd2601fG/cYwlfZQ4CH7sLr/FaTEmiyXzowjs22z1zPXiZjqls18VhSwardWc2W520u2Mg0/kF6+M5ar1APAZeM7Q+uawL9fx3uc4VvcNC8K+90E/w+p7Ig
  </cfdi:Complemento>
</cfdi:Comprobante>
```



Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
PASS971118IR0	SERGIO JOEL PADILLA SOTO	MBA850101214	MUNICIPIO DE BADIRAGUATO
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
05531DAD-A52E-49BD-A5D9-EF5927A422CD	2025-11-03T17:40:57	2025-11-03T18:41:04	MAS0810247C0
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$1,490,663.36	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

[Imprimir](#)



Fecha: 26 de agosto de 2025

CARATULA DE ESTIMACIÓN

CONTRATISTA: SERGIO JOEL PADILLA SOTO		ESTIMACIÓN No: 01 NORMAL	
DOMICILIO: CALLE ENRIQUE COLUNGA 1962, GUSTAVO DIAZ ORDAZ, CULIACÁN, SINALOA. C.P. 80180		PERIODO DE ESTIMACION:	
TELÉFONO: 667-5818434	CEL: 667-5818434	DEL	25-jul-25
R.F.C.		AL	24-ago-25
PASS971118IR0.		FECHA DE CONTRATO:	
DEPENDENCIA.-		21-jul-25	
AYUNTAMIENTO DE BADIRAGUATO			
LOCALIDAD: LA APOMA		MUNICIPIO: BADIRAGUATO	PERIODO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO:
		INICIO:	25-jul-25
		TERMINACIÓN:	22-sep-25
DESCRIPCIÓN:			
CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE METALICA EN LA COMUNIDAD DE LA APOMA, SINDICATURA DE HIGUERAS DE ALVAREZ BORBOA, MUNICIPIO DE BADIRAGUATO, SINALOA			
CONTRATO No:			
MBGBR-LP-FAISMUN-006/2025			
IMPORTE SIN IVA DE LA OBRA	IMPORTE CON IVA DE LA OBRA	35% ANTICIPO DE LA OBRA	IMPORTE TOTAL DE CONTRATO:
\$2,527,429.86	\$2,931,818.64	\$1,026,136.52	\$2,931,818.64
RECIBI :			BUENO POR: \$ 1,431,353.15
\$ 1,431,353.15 (SON UN MILLÓN CUATROCIENTOS TREINTA Y UN MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS 15/100 M.N.)			
EN PAGO DE ESTIMACIÓN: 01 NORMAL			
DEDUCCIONES:		CALCULO DE ESTIMACIÓN	
AMORTIZACIÓN ANTICIPO 35%	\$ 691,952.48	IMPORTE DE LA OBRA EJECUTADA SIN IVA	\$ 1,977,007.10
MAS I.V.A.:	\$ 110,712.40	MAS I.V.A 16 %	\$ 316,321.14
TOTAL AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO:	\$ 802,664.88	TOTAL DE LA OBRA EJECUTADA CON IVA	\$ 2,293,328.24
3 % SVIFYC:	\$ 59,310.21	MENOS TOTAL DEDUCCIONES:	\$ 861,975.09
TOTAL DEDUCCIONES:	\$ 861,975.09	MONTO A FACTURAR MAS IVA	\$ 1,490,663.36
		SALDO A PAGAR:	\$ 1,431,353.15

ELABORO.-

Sergio J. Padilla Soto
C. SERGIO JOEL PADILLA SOTO
REPRESENTANTE LEGAL

REVISÓ.-

ING. JOSE RODOLFO CONTRERAS LOPEZ
COSTOS Y PRESUPUESTOS.

AUTORIZO

C. ING. RUBIEL RINCON RAMOS
DIRECTOR DE O.P.D.U. Y I



SERGIO JOEL PADILLA SOTO

Dependencia :

AYUNTAMIENTO DE BADIRAGUATO

Control de Estimaciones

CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE METALICA EN LA COMUNIDAD DE LA APOMA, SINDICATURA DE HIGUERAS DE ALVAREZ BORBOA, MUNICIPIO DE BADIRAGUATO, SINALOA				Fecha:	Estimacion:
				26 de agosto de 2025	01 NORMAL
Periodo de la estimacion:	25/07/2025	24/08/2025	Localidad:	No. De contrato:	
Periodo de Ejecución:	25/07/2025	22/09/2025	LA APOMA	MBGBR-LP-FAISMUN-006/2025	
Importe del contrato con I.V.A:	Imp. Contratado sin I.V.A	Anticipo	Importe Anticipo sin I.V.A	% de Avance	
\$ 2,931,818.64	\$ 2,527,429.86	\$ 1,026,136.52	\$ 884,600.45	78%	
				% Avance Total	78%

Control Del Anticipo	Liquidacion de Estimacion	Control de Estimacion
AMORTIZA ESTA ESTIMACION	Importe de la Estimacion (+) \$ 1,977,007.10	ESTA ESTIMACION
\$ 802,664.88	16 % I.V.A (+) \$ 316,321.14	
	Sub- Total A (=) \$ 2,293,328.24	\$ 2,293,328.24
	Amortizacion Anticipo 35% \$ 691,952.48	
AMORTIZACION ANTERIOR	16 % I.V.A (+) \$ 110,712.40	ACUMULADO ANTERIOR
\$ -	Total (=) \$ 802,664.88	\$ -
	Importe TOTAL A FACTURAR \$ 1,285,054.62	
TOTAL AMORTIZADO	16 % I.V.A (+) \$ 205,608.74	TOTAL ACUMULADO.
\$ 802,664.88	Total (=) \$ 1,490,663.36	\$ 2,293,328.24
	3 % SMFYC: \$ 59,310.21	
ANTICIPO OTORGADO	Total Deducciones (=) \$ 861,975.09	CONTRATADO
\$ 1,026,136.52	Importe T O T A L \$ 1,431,353.15	\$ 2,931,818.64
SALDO DEL ANTICIPO	NETO A PAGAR \$ 1,431,353.15	SALDO
\$223,471.64	Son:	\$ 638,490.40
	(SON UN MILLÓN CUATROCIENTOS TREINTA Y UN MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS 15/100 M.N.)	

ELABORO.-

Sergio J. Padilla Soto
C. SERGIO JOEL PADILLA SOTO
REPRESENTANTE LEGAL

REVISO

ING. JOSE RODOLFO CONTRERAS LOPEZ
COSTOS Y PRESUPUESTOS.

AUTORIZO

C. ING. RUBIEL RINCON RAMOS.
DIRECTOR O.P.D.U. Y E.

ELABORO:-

Sergio J. Padilla Soto
C. SERGIO JOEL PADILLA SOTO
REPRESENTANTE LEGAL

AUTORIZO.-
C. ING. RUBIEL RINCON RAMOS
DIRECTOR DE O.P.D.U. Y E.



CONTRATISTA:		FECHA:	
SERGIO JOEL PADILLA SOTO		26 de agosto de 2025	
DOMICILIO:		DEPENDENCIA:	
CALLE ENRIQUE COLUNGA 1962, GUSTAVO DIAZ ORDAZ, CULIACÁN, SINALOA. C.P. 80180		AYUNTAMIENTO DE BADIRAGUATO	
R.F.C.			
PASS971118IR0.			

RESÚMEN DE ESTIMACIÓN

	LOCALIDAD:	LA APOMA	ESTIMACIÓN:	01 NORMAL
DESCRIPCIÓN:	CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE METALICA EN LA COMUNIDAD DE LA APOMA, SINDICATURA DE HIGUERAS DE ALVAREZ BORBOA, MUNICIPIO DE BADIRAGUATO, SINALOA			
IMPORTE DE OBRA SIN IVA:	\$ 2,527,429.86			
IMPORTE DE ANTICIPO DE OBRA:	\$ 1,026,136.52			
IMPORTE TOTAL DE CONTRATO:	\$ 2,931,818.64			

DESTAJOS		IMPORTE
1	PRELIMINARES	\$ 125,099.19
2	CIMENTACON	\$ 289,937.00
3	ESTRUCTURA	\$ 1,561,970.91
4	ALBAÑILERIA	\$ -
5	INSTALACIONES ESPECIALES	\$ -
6	TRABAJOS FINALES	\$ -
SUBTOTAL ESTIMACIÓN:		\$ 1,977,007.10

SUB TOTAL=	\$ 1,977,007.10
I.V.A AL 16 %	\$ 316,321.14
TOTAL =	\$ 2,293,328.24

ELABORO.-

Sergio J. Padilla Soto
C. SERGIO JOEL PADILLA SOTO
REPRESENTANTE LEGAL

REVISOR

ING. JOSE RODOLFO CONTRERAS LOPEZ
COSTOS Y PRESUPUESTOS.

AUTORIZO.-

[Firma]
C. ING. RUBIEL RINCON RAMOS,
DIRECTOR DE O.P.D.U. Y E.



DESGLASE

CONTRATISTA: SERGIO JOEL PADILLA SOTO		DEPENDENCIA:		AYUNTAMIENTO DE BADIRAGUATO		1 de 4	
DOMICILIO: CALLE ENRIQUE COLUNGA 1962, GUSTAVO DIAZ ORDAZ, CULIACÁN, SINALOA. C.P. 80180		R.F.C.		PASS9711181RO.		martes, 26 de agosto de 2025	

DESGLASE DE CONCEPTOS DE ESTIMACIÓN

DESCRIPCIÓN: CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE METALICA EN LA COMUNIDAD DE LA APOMA, SINDICATURA DE HIGUERAS DE ALVAREZ BORBOA, MUNICIPIO DE BADIRAGUATO, SINALOA										01 NORMAL			
IMPORTE DE OBRA SIN IVA: \$2,527,429.86										\$2,931,818.64			
IMPORTE DE ANTICIPO DE OBRA: \$1,026,136.52										IMPORTE TOTAL DE CONTRATO:			
LOCALIDAD: LA APOMA										ESTIMACIÓN:			
CONCEPTO										HASTA ESTIM. ANTERIOR	EXCEDENTE	DE ESTA ESTIMACIÓN	IMPORTE
CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANT.	P.U.	TOTAL	HASTA ESTIM. ANTERIOR	EXCEDENTE	DE ESTA ESTIMACIÓN	IMPORTE				
1	PRELIMINARES												
GP01	TRAZO Y NIVELACIÓN DEL TERRENO ESTABLECIENDO EJES Y NIVELLETAS DE REFERENCIA, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M2	624.00	\$ 18.58	\$ 11,593.92	624.00	0.00	624.00	\$ 11,593.92				
GP153	CORTE CON DISCO DE DIAMANTE EN BANQUETA Y/O LOSA DE PAVIMENTO. INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	ML	90.00	\$ 83.99	\$ 7,559.10	90.00	0.00	90.00	\$ 7,559.10				
GP157	DEMOLICIÓN DE PISO DE CONCRETO DE 10 CMS DE ESPESOR, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	M2	50.63	\$ 146.18	\$ 7,401.09	62.50	0.00	62.50	\$ 9,136.25				
GP17	EXCAVACIÓN POR MEDIOS MECÁNICOS EN MATERIAL TIPO "B" DE 0.00 A 2.00 MTS.	M3	116.44	\$ 73.39	\$ 8,545.53	140.63	0.00	140.63	\$ 10,320.84				
GP58	RELLENO COMPACTADO CON BAILARINA EN CAPAS DE 20 CMS DE ESPESOR CON MATERIAL DE BANCO. INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIAL EN LA OBRA, AGUA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU TERMINACIÓN.	M3	91.59	\$ 570.59	\$ 52,260.34	140.63	0.00	140.63	\$ 80,242.07				
GP03	CARGA Y ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN Y/O DEMOLICIONES MEDIDO COMPACTO, 1ER KILOMETRO.	M3	116.44	\$ 53.65	\$ 6,247.01	116.44	0.00	116.44	\$ 6,247.01				
2	CIMENTACION												
GP207	ZAPATA AISLADA DE 2.00X2.00X0.25 MTS DE ESPESOR ARMADA CON VARILLA DE 1/2" @ 20 EN AMBAS DIRECCIONES A DOS LECHOS, COLADA CON CONCRETO HECHO EN OBRA CON F'C=250 KG/CM. INCLUYE: MANO DE OBRA, MATERIALES, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	10.00	\$ 9,827.60	\$ 98,276.00	10.00	0.00	10.00	\$ 98,276.00				
GP238	DADO DE 60X60 DE 2.00 MTS DE ALTURA ARMADO CON 15 VARILLAS DE 1/2" Y ESTRIBOS DE VARILLA DE 3/8" @ 20 CMS ACABADO APARENTE, CONCRETO HECHO EN OBRA CON UN F'C=200 KG/CM2. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTAS.	PZA	10.00	\$ 10,699.55	\$ 106,995.50	10.00	0.00	10.00	\$ 106,995.50				

ELABORÓ:

Sergio J. Padilla Soto

C. SERGIO JOEL PADILLA SOTO
REPRESENTANTE LEGAL

REVISÓ

ING. JOSE RODOLFO CONTRERAS LOPEZ
COSTOS Y PRESUPUESTOS

AUTORIZO

C. ING. RUBIEL RINCON RAMOS
DIRECTOR DE O.P.D.U. Y E.

DESNGLOSE



CONTRATISTA: SERGIO JOEL PADILLA SOTO		DEPENDENCIA:	FECHA: martes, 26 de agosto de 2025
DOMICILIO:	CALLE ENRIQUE COLUNGA 1982, GUSTAVO DIAZ ORDAZ, CULIACÁN, SINALOA. C.P. 80180	R.F.C.:	AVUNTAMIENTO DE BADIRAGUATO 2 de 4 PASS971118IR0.

DESNGLOSE DE CONCEPTOS DE ESTIMACIÓN

DESCRIPCIÓN: CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE METALICA EN LA COMUNIDAD DE LA APOMA, SINDICATURA DE HIGUERAS DE ALVAREZ BORBOA, MUNICIPIO DE BADIRAGUATO, SINALOA	LOCALIDAD: LA APOMA	ESTIMACIÓN: 01 NORMAL
IMPORTE DE OBRA SIN IVA: \$2,527,429.86	IMPORTE DE ANTICIPO DE OBRA: \$1,026,136.52	IMPORTE TOTAL DE CONTRATO: \$2,931,818.64

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	SEGUN PROYECTO			HASTA ESTA ESTIM	HASTA ESTIM ANTERIOR	EXCEDENTE	DE ESTA ESTIMACIÓN	IMPORTE
			CANT	P.U.	TOTAL					
GP160	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PLACA DE ACERO DE 60 X 60 CMS. DE 1" DE ESPESOR CON CUATRO BARRENOS DE 1 1/8" DE DIÁMETRO Y CUATRO BARRENOS DE 7/8" DE DIÁMETRO, ANCLADA EN DADO CON CUATRO ANCLAS DE 1" Y CUATRO ANCLAS DE 3/4" DE 1.80 MTS. CON 20 CM DE DOBLES Y 10 CMS. DE ROSCA. INCLUYE: PRIMARIO DE FONDO ANTICORROSIVO, MORTERO GROUT EN UN ESPESOR DE 5 CMS. PARA ESTABILIZAR PLACA, MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	PZA	10.00	\$ 8,466.55	\$ 84,665.50	10.00	0.00	0.00	10.00	\$ 84,665.50
GP161	ESTRUCTURA COLUMNA DE TUBO CIRCULAR DE 8" DE 1/2" DE ESPESOR CON TUBO DE FIERRO NEGRO DE 6.00 M DE LONGITUD. INCLUYE: 4 CARTABONES DE FORMA TRAPEZOIDAL A BASE DE PLACA DE ACERO DE 15 X 25 CM Y DE 1/2" DE ESPESOR, INCLUYE: CORTES, COLOCACIÓN, SOLDADURA, PLOMEADO, NIVELACIÓN, MANIOBRAS, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	10.00	\$ 29,789.15	\$ 297,891.50	10.00	0.00	0.00	10.00	\$ 297,891.50
GP162	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PLACA DE ACERO PARA ASIENTO DE ARMADURA ARMADA CON DOS PLACAS (MENSULAS) VERTICALES DE 0.15X0.15 MTS. X1/2" DE ESPESOR Y BASE DE 0.20X0.25 MTS. X1/2" DE ESPESOR. INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	10.00	\$ 1,621.99	\$ 16,219.90	10.00	0.00	0.00	10.00	\$ 16,219.90
GP163	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PLACA DE ACERO DE 15 X 20 CM X1/2" DE ESPESOR PARA UNIR COLUMNAS CON VIGAS Y VIGAS CON VIGAS. INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	80.00	\$ 658.18	\$ 52,654.40	80.00	0.00	0.00	80.00	\$ 52,654.40
GP164	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PLACA DE ACERO PARA ASIENTO DE VIGA IPR 6" X 4" (12.70 KG/ML) CON DOS PLACAS DE 15 X 10 CM. X 1/2" DE ESPESOR (MENSULAS) SEGÚN DETALLE. INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	16.00	\$ 743.97	\$ 11,903.52	16.00	0.00	0.00	16.00	\$ 11,903.52
GP165	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PLACA DE ACERO CIRCULAR DE 14" DE DIÁMETRO Y 1/4" DE ESPESOR. INCLUYE: SOLDADURA, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	10.00	\$ 906.46	\$ 9,064.60	10.00	0.00	0.00	10.00	\$ 9,064.60

ELABORO:-

Sergio J. Padilla Soto
C. SERGIO JOEL PADILLA SOTO
PROFESIONISTA EN P.A.S.

REVISÓ
ING. JOSE RODOLFO CONTRERAS LOPEZ
AUTORIZA LA OBRERA EN OBRA

AUTORIZO
C. ING. RUBIEL RINCON RAMOS

DESGLASE



CONTRATISTA: SERGIO JOEL PADILLA SOTO		DEPENDENCIA:		FECHA: martes, 26 de agosto de 2025	
DOMICILIO: CALLE ENRIQUE COLUNGA 1962, GUSTAVO DIAZ ORDAZ, CULIACÁN, SINALOA, C.P. 80180		R.F.C. PASS971118IR0.		AYUNTAMIENTO DE BADIRAGUATO 3 de 4	

DESGLASE DE CONCEPTOS DE ESTIMACIÓN

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	SEGUN PROYECTO		TOTAL	HASTA ESTA ESTIM	HASTA ESTIM ANTERIOR	EXCEDENTE	DE ESTA ESTIMACIÓN	IMPORTE
			CANT	P.U.						
DESCRIPCIÓN: CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE METALICA EN LA COMUNIDAD DE LA APOMA, SINDICATURA DE HIGUERAS DE ALVAREZ BORBOA, MUNICIPIO DE BADIRAGUATO, SINALOA										
IMPORTE DE OBRA SIN IVA: \$2,527,429.86										
IMPORTE DE ANTICIPO DE OBRA: \$1,026,136.52										
IMPORTE TOTAL DE CONTRATO: \$2,931,818.64										
GP166	SUMINISTRO, FABRICACIÓN Y COLOCACION DE ARMADURA DE 1.20 MTS. DE PERALTE Y 17.70 MTS DE LONGITUD COMBADA, A BASE DE PTR DE 3" X 3" COLOR BLANCO EN (CUERDA SUPERIOR E INFERIOR), DOS MONTANTES DE 3" X 3" CALIBRE VERDE EN CADA EXTREMO INTERIOR DE LA ARMADURA SOLDADOS A PLACAS DE COLUMNA, DOS DIAGONALES Y DOS MONTANTES EN CADA EXTREMO DE PTR DE 2 1/2" X 2 1/2" CALIBRE VERDE, MONTANTES Y DIAGONALES DE 2 1/2" X 2 1/2" COLOR BLANCO EN PARTE EXTERNA, (VER CROQUIS). INCLUYE: SOLDADURA 7018, APLICACIÓN DE PRIMARIO, COLOCACIÓN, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	5.00	\$ 66,064.21	\$ 330,321.05	5.00	0.00	0.00	5.00	\$ 330,321.05
GP167	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PTR DE 3" X 3" (BLANCO), COMO REFUERZOS CENTRALES, INCLUYE: SOLDADURA Y PINTURA ANTICORROSIVA, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	ML	60.00	\$ 753.96	\$ 45,237.60	60.00	0.00	0.00	60.00	\$ 45,237.60
GP168	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE VIGA "1" 6" X 4". COMO REFUERZO LATERAL, INCLUYE: SOLDADURA, PINTURA ESMALTE, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. (VER DETALLE).	ML	53.76	\$ 1,541.51	\$ 82,871.58	53.76	0.00	0.00	53.76	\$ 82,871.58
GP169	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CLIPS DE 20 CMS. DE LARGO PARA SUECIÓN DE POLIN A BASE DE ANGULAR DE 5" X 1/4" DE ESPESOR, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	100.00	\$ 321.68	\$ 32,168.00	100.00	0.00	0.00	100.00	\$ 32,168.00
GP170	SUMINISTRO Y COLOCACION DE POLIN 8" CAL. 14 Y SOLDADA A VIGA CARGADORA INCLUYE: PINTURA ANTICORROSIVA, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	ML	600.00	\$ 462.12	\$ 277,272.00	600.00	0.00	0.00	600.00	\$ 277,272.00
GP171	SUMINISTRO Y COLOCACION DE VARILLA REDONDA LISA DE 5/8" CON EXTREMOS ROSCADOS PARA CONTRAVENTE, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	ML	92.80	\$ 227.08	\$ 21,073.02	92.80	0.00	0.00	92.80	\$ 21,073.02
GP172	SEPARADOR DE ANGULAR DE 1 1/2" X 1/4" DE ESPESOR DE 1.10 MTS. DE LONGITUD CON PLACA DE 2" X 4" X 1/4" EN LOS EXTREMOS, INCLUYE: SOLDADURA, PINTURA ANTICORROSIVA, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	64.00	\$ 513.44	\$ 32,860.16	64.00	0.00	0.00	64.00	\$ 32,860.15
GP173	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CUBIERTA CONVADA DE LAMINA TERNIUM TO-100 GALVANIZADA CAL. 24 INCLUYE:PIPA AUTOROSCABLE, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	M2	680.40	\$ 517.98	\$ 352,433.59	680.40	0.00	0.00	680.40	\$ 352,433.59

ELABORO.-

Sergio J. Padilla Soto
C. SERGIO JOEL PADILLA SOTO

REVISÓ

ING. JOSE RODOLFO CONTRERAS LOPEZ

REVISÓ

C. ING. RUBIEL RINCON RAMOS

FECHA martes, 26 de agosto de 2025

CONTRATISTA: SERGIO JOEL PADILLA SOTO

CONTRATISTA:	SERGIO JOEL PADILLA SOTO	DEPE:
DOMICILIO:	CALLE ENRIQUE COLUNGA 1962, GUSTAVO DIAZ ORDAZ, CULIACÁN, SINALOA. C.P. 801800	

DOMICILIO:	CALLE ENRIQUE COLUNGA 1962, GUSTAVO DIAZ ORDAZ, CULIACÁN, SINALOA. C.P. 801800
------------	--

R.F.C.	PASS971118IR0.
--------	----------------

4 de 4

		LOCALIDAD:	LA APOMA	ESTIMACIÓN:	01 NORMAL
DESCRIPCIÓN: CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE METALICA EN LA COMUNIDAD DE LA APOMA, SINDICATURA DE HIGUERAS DE ALVAREZ BORBOA, MUNICIPIO DE BADIRAGUATO, SINALOA					
IMPORTE DE OBRA SIN IVA:	\$2,527,429.86	IMPORTE DE ANTICIPO DE OBRA:	\$1,026,136.52	IMPORTE TOTAL DE CONTRATO:	\$2,931,818.64

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	SEGUN PROYECTO			HASTA ESTIM.	HASTA ESTIM. ANTERIOR	EXCEDENTE	DE ESTA ESTIMACION	IMPORTE
			CANT.	P.U.	TOTAL					
4	ALBANILERIA									
5	INSTALACIONES ESPECIALES									
6	TRABAJOS FINALES						0.00	0.00		
									SUB-TOTAL \$	1,977,007.10
									IVA \$	316,321.14
									MONTO TOTAL \$	2,293,328.24

Sergio J. Padilla Soto

REVISADO

ING. JOSE RODOLFO CONTRERAS LOPEZ

AUTORIZO

C. ING. RUBIEL RINCON RAMOS



CONTRATISTA:			DEPENDENCIA:						
SERGIO JOEL PADILLA SOTO			AYUNTAMIENTO DE BADIRAGUATO						
CONTRATISTA:			SERGIO JOEL PADILLA SOTO						
R.F.C.			PAS9971118RD.						
OBRA:			CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE METALICA EN LA COMUNIDAD DE LA APOMA, SINDICATURA DE HIGUERAS DE ALVAREZ BORBOA, MUNICIPIO DE BADIRAGUATO, SINALOA						
ESTIMACION			01 NORMAL						
GENERADORES DE ESTIMACION									
CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANT	LARGO	ANCHO	ESPESOR	ACUMULADO		OBSERVACIONES
							PARCIAL	TOTAL	
1	PRELIMINARES								
GP01	TRAZO Y NIVELACIÓN DEL TERRENO ESTABLECIENDO EJES Y NIVELETAS DE REFERENCIA, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M2							VER CROQUIS
				30.00	26.00		780.00		
							TOTAL EJECUTADO	780.00	
							ESTA ESTIMACION	624.00	
GP153	CORTE CON DISCO DE DIAMANTE EN BANQUETA Y/O LOSA DE PAVIMENTO, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	ML							VER CROQUIS
			10.00	9.00			90.00		
							TOTAL EJECUTADO	90.00	
GP157	DEMOLICIÓN DE PISO DE CONCRETO DE 10 CMS DE ESPESOR, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	M2							VER CROQUIS
			10.00	2.50	2.50		62.50		
							TOTAL EJECUTADO	62.50	
							ESTA ESTIMACION	50.63	
GP17	EXCAVACIÓN POR MEDIOS MECANICOS EN MATERIAL TIPO "B" DE 0.00 A 2.00 MTS.	M3							VER CROQUIS
			10.00	2.50	2.50	2.25	140.63		
							TOTAL EJECUTADO	140.63	
							ESTA ESTIMACION	116.44	
GP58	RELLENO COMPACTADO CON BAILARINA EN CAPAS DE 20 CMS DE ESPESOR CON MATERIAL DE BANCO, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIAL EN LA OBRA, AGUA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	M3							VER CROQUIS
			10.00	2.50	2.50	2.25	140.63		
							TOTAL EJECUTADO	140.63	
							ESTA ESTIMACION	91.59	
GP03	CARGA Y ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN Y/O DEMOLICIONES MEDIDO COMPACTO, 1ER KILOMETRO.	M3							VER CROQUIS
			10.00	2.50	2.50	2.25	140.63		
							TOTAL EJECUTADO	140.63	
							ESTA ESTIMACION	116.44	
2	CIMENTACION								
GP207	ZAPATA AISLADA DE 2.00x2.00x0.25 MTS DE ESPESOR ARMADA CON VARILLA DE 1/2" @ 20 EN AMBAS DIRECCIONES A DOS LECHOS, COLADA CON CONCRETO HECHO EN OBRA CON F'C=250	PZA							VER CROQUIS
			10.00						
							TOTAL EJECUTADO	10.00	
GP238	DADO DE 60x60 DE 2.00 MTS DE ALTURA ARMADO CON 15 VARILLAS DE 1/2" Y ESTRIBOS DE VARILLA DE 3/8" @ 20 CMS ACABADO APARENTE, CONCRETO HECHO EN OBRA CON UN	PZA							VER CROQUIS
			10.00						
							TOTAL EJECUTADO	10.00	
GP160	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PLACA DE ACERO DE 60 X 60 CMS. DE 1" DE ESPESOR CON CUATRO BARRENOS DE 1 1/8" DE DIÁMETRO Y CUATRO BARRENOS DE 7/8" DE DIÁMETRO.	PZA							VER CROQUIS
			10.00						
							TOTAL EJECUTADO	10.00	
3	ESTRUCTURA								
GP161	COLUMNA DE TUBO CIRCULAR DE 8" DE 1/2" DE ESPESOR CON TUBO DE FIERRO NEGRO DE 6.00 M DE LONGITUD, INCLUYE: 4 CARTABONES DE FORMA TRAPEZOIDAL A BASE DE PLACA DE	PZA							VER CROQUIS
			10.00						
							TOTAL EJECUTADO	10.00	
GP162	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PLACA DE ACERO PARA ASIENTO DE ARMADURA ARMADA CON DOS PLACAS (MENSULAS) VERTICALES DE 0.15x0.15 MTS. X 1/2" DE ESPESOR Y BASE DE	PZA							VER CROQUIS
							TOTAL EJECUTADO	10.00	

ELABORO:-

Sergio J. Padilla Soto
C. SERGIO JOEL PADILLA SOTO
REPRESENTANTE LEGAL

REVISO:

ARQ. BRICIDA GPE NIEBLAS MARTINEZ
SUPERVISOR DE OBRA

AUTORIZO:-

ING. RUBIEL RINCON RAMOS
DIRECTOR DE O.P.D.U. Y E.



CONTRATISTA:		DEPENDENCIA:	
SERGIO JOEL PADILLA SOTO		AYUNTAMIENTO DE BADIRAGUATO	
CONTRATISTA:		SERGIO JOEL PADILLA SOTO	
R.F.C.		PASS971118R0.	
OBRA:		CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE METALICA EN LA COMUNIDAD DE LA APOMA, SINDICATURA DE HIGUERAS DE ALVAREZ BORBOA, MUNICIPIO DE BADIRAGUATO, SINALOA	
ESTIMACION		01 NORMAL	
GENERADORES DE ESTIMACION			
GP163	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PLACA DE ACERO DE 15 x 20 CM X 1/2" DE ESPESOR PARA UNIR COLUMNAS CON VIGAS Y VIGAS CON VIGAS. INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA.	PZA	VER CROQUIS
		8.00	10.00
			80.00
			TOTAL EJECUTADO 80.00
GP164	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PLACA DE ACERO PARA ASIENTO DE VIGA IPR 6" X 4" (12.70 KG/ML) CON DOS PLACAS DE 15 X 10 CM. X 1/2" DE ESPESOR (MENSULAS) SEGÚN DETALLE. INCLUYE:	PZA	VER CROQUIS
		16.00	
			TOTAL EJECUTADO 16.00
GP165	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PLACA DE ACERO CIRCULAR DE 14" DE DIÁMETRO Y 1/4" DE ESPESOR. INCLUYE: SOLDADURA, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	VER CROQUIS
		TAPAS 10.00	
			TOTAL EJECUTADO 10.00
GP166	SUMINISTRO, FABRICACIÓN Y COLOCACIÓN DE ARMADURA DE 1.20 MTS. DE PERALTE Y 17.70 MTS DE LONGITUD COMBADA, A BASE DE PTR DE 3" X 3" COLOR BLANCO EN (CUERDA SUPERIOR E	PZA	VER CROQUIS
		5.00	
			TOTAL EJECUTADO 5.00
GP167	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PTR DE 3" X 3" (BLANCO), COMO REFUERZOS CENTRALES. INCLUYE: SOLDADURA Y PINTURA ANTICORROSIVA, MATERIAL, MANO DE OBRA.	ML	VER CROQUIS
		2.00	30.00
			60.00
			TOTAL EJECUTADO 60.00
GP168	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE VIGA "1" 6" X 4", COMO REFUERZO LATERAL. INCLUYE: SOLDADURA, PINTURA ESMALTE, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. (VER	ML	VER CROQUIS
			53.76
			TOTAL EJECUTADO 53.76
GP169	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CLIPS DE 20 CMS. DE LARGO PARA SUJECIÓN DE POLIN A BASE DE ANGULAR DE 5" X 1/4" DE ESPESOR, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y	PZA	VER CROQUIS
		5.00	20.00
			100.00
			TOTAL EJECUTADO 100.00
GP170	SUMINISTRO Y COLOCACION DE POLIN 8" CAL. 14 Y SOLDADA A VIGA CARGADORA INCLUYE: PINTURA ANTICORROSIVA, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	ML	VER CROQUIS
		20.00	30.00
			600.00
			TOTAL EJECUTADO 600.00
GP171	SUMINISTRO Y COLOCACION DE VARILLA REDONDA LISA DE 5/8" CON EXTREMOS ROSCADOS PARA CONTRAVENTEO, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y	ML	VER CROQUIS
		8.00	11.60
			92.80
			TOTAL EJECUTADO 92.80
GP172	SEPARADOR DE ANGULAR DE 1 1/2" X 1/4" DE ESPESOR DE 1.10 MTS. DE LONGITUD CON PLACA DE 2" X 4" X 1/4" EN LOS EXTREMOS, INCLUYE: SOLDADURA, PINTURA ANTICORROSIVA,	PZA	VER CROQUIS
		4.00	16.00
			64.00
			TOTAL EJECUTADO 64.00
GP173	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CUBIERTA CONVADA DE LAMINA TERNIUM TO-100 GALVANIZADA CAL. 24 INCLUYE:PLIA, AUTOROSCABLE, MATERIAL, MANO DE OBRA,	M2	VER CROQUIS
		30.00	22.08
			680.40
			TOTAL EJECUTADO 680.40

ELABORO:
Sergio J Padilla Soto
C. SERGIO JOEL PADILLA SOTO
REPRESENTANTE LEGAL

REVISO:
ARQ. BRIGIDA GPE NIEBLAS MARTINEZ
SUPERVISOR DE OBRA

AUTORIZO:
ING. RUBIEL RINCÓN RAMOS
DIRECTOR DE O.P.D.U. Y E.

CONTRATISTA:
SERGIO JOEL PADILLA SOTO

DEPENDENCIA:
AYUNTAMIENTO DE BADIRAGUATO

DOMICILIO: CALLE ENRIQUE COLUNGA 1962, GUSTAVO DIAZ ORDAZ, CULIACÁN, SINALOA. C.P. 80180


R.F.C. PASS971110IR0.

OBRA: CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE METALICA EN LA COMUNIDAD DE LA APOMA, SINDICATURA DE HIGUERAS DE ALVAREZ BORBOA, MUNICIPIO DE BADIRAGUATO, SINALOA

CROQUIS ESTIMACION:

CROQUIS ESTIMACION:

CLAVE	CONCEPTO
1	PRELIMINARES
GP01	TRAZO Y NIVELACION DEL TERRENO ESTABLECIENDO EJES Y NIVELETAS DE REFERENCIA, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.
GP153	CORTE CON DISCO DE DIAMANTE EN BANQUETA Y/O LOSA DE PAVIMENTO, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.
GP157	DEMOLICIÓN DE PISO DE CONCRETO DE 10 CMS DE ESPESOR, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.
GP17	EXCAVACIÓN POR MEDIOS MECÁNICOS EN MATERIAL TIPO "B" DE 0.00 A 2.00 MTS.
GP56	RELLENO COMPACTADO CON BAILARINA EN CAPAS DE 20 CMS DE ESPESOR CON MATERIAL DE BANCO, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIAL EN LA
GP03	CARGA Y ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN Y/O DEMOLICIONES MEDIDO COMPACTO, 1ER KILOMETRO.

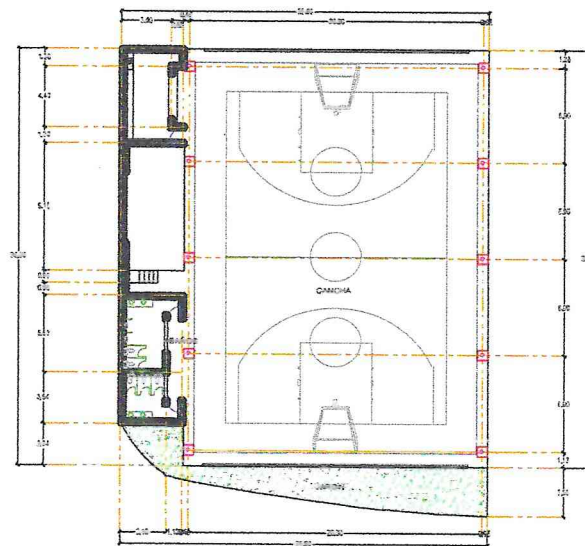

ELABORO.-

Sergio J. Padilla Soto
CC. SERGIO JOEL PADILLA SOTO
REPRESENTANTE LEGAL

REVISO.-

ARQ. BRICEIDA GPE NIEBLAS MARTINEZ
SUPERVISOR DE OBRA

AUTORIZO.-

C. ING. RUBIEL RINCON RAMOS.
DIRECTOR DE O.P.D.U. Y E.

CONTRATISTA:
SERGIO JOEL PADILLA SOTO

DEPENDENCIA:
AYUNTAMIENTO DE BADIRAGUATO


DOMICILIO: CALLE ENRIQUE COLUNGA 1962, GUSTAVO DIAZ ORDAZ, CULIACÁN, SINALOA. C.P. 86180

R.F.C. PASS971118IR0.

OBRA: CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE METALICA EN LA COMUNIDAD DE LA APOMA, SINDICATURA DE HIGUERAS DE ALVAREZ BORBOA, MUNICIPIO DE BADIRAGUATO, SINALOA

CROQUIS ESTIMACION:

2	CIMENTACION
GP207	ZAPATA AISLADA DE 2.00X2.00X0.25 MTS DE ESPESOR ARMADA CON VARILLA DE 1/2" @ 20 EN AMBAS DIRECCIONES A DOS LECHOS, COLADA CON
GP238	DADO DE 60X60 DE 2.00 MTS DE ALTURA ARMADO CON 15 VARILLAS DE 1/2" Y ESTRIBOS DE VARILLA DE 3/8" @ 20 CMS ACABADO APARENTE.
GP160	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PLACA DE ACERO DE 60 X 60 CMS. DE 1" DE ESPESOR CON CUATRO BARRENOS DE 1 1/8" DE DIAMETRO Y CUATRO

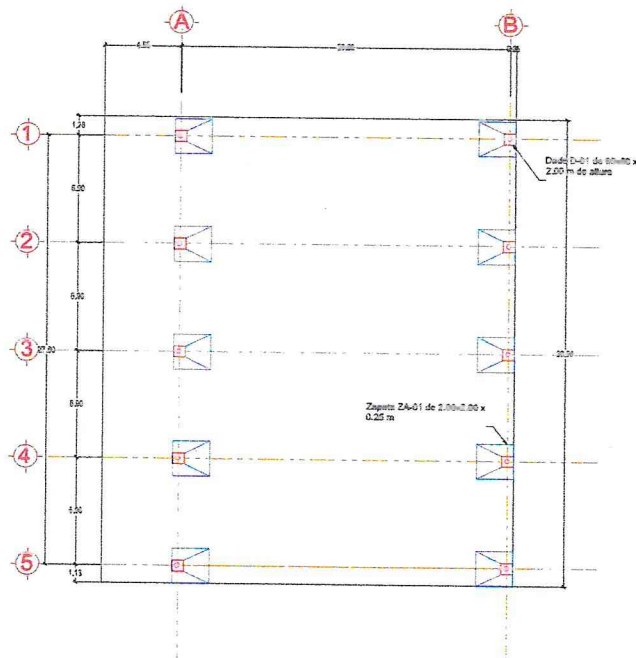

ELABORO.-

Sergio J. Padilla Soto
CC. SERGIO JOEL PADILLA SOTO
REPRESENTANTE LEGAL

REVISO.-

Arq. Briceida Speneblas Martinez
ARQ. BRICEIDA SPENEBLAS MARTINEZ
SUPERVISOR DE OBRA

AUTORIZO.-

C. Ing. Rubiel Rincon Ramos
C. ING. RUBIEL RINCON RAMOS.
DIRECTOR DE O.P.D.U. Y E.

CONTRATISTA:
SERGIO JOEL PADILLA SOTO

DEPENDENCIA:
AYUNTAMIENTO DE BADIRAGUATO


DOMICILIO: CALLE ENRIQUE COLUNGA 1962, GUSTAVO DIAZ ORDAZ, CULIACÁN, SINALOA. C.P. 80180

R.F.C. PASS971116IR0.

OBRA: CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE METALICA EN LA COMUNIDAD DE LA APOMA, SINDICATURA DE HIGUERAS DE ALVAREZ BORBOA, MUNICIPIO DE BADIRAGUATO, SINALOA

CROQUIS ESTIMACION:

3	ESTRUCTURA
GP161	COLUMNA DE TUBO CIRCULAR DE 8" DE 1/2" DE ESPESOR CON TUBO DE FIERRO NEGRO DE 6.00 M DE LONGITUD, INCLUYE: 4 CARTABONES DE
GP162	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PLACA DE ACERO PARA ASIENTO DE ARMADURA ARMADA CON DOS PLACAS (MENSULAS) VERTICALES DE
GP163	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PLACA DE ACERO DE 15 x 20 CM X 1/2" DE ESPESOR PARA UNIR COLUMNAS CON VIGAS Y VIGAS CON VIGAS.
GP164	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PLACA DE ACERO PARA ASIENTO DE VIGA IPR 6" X 4" (12.70 KG/ML) CON DOS PLACAS DE 15 X 10 CM. X 1/2" DE
GP165	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PLACA DE ACERO CIRCULAR DE 14" DE DIAMETRO Y 1/4" DE ESPESOR. INCLUYE: SOLDADURA, MATERIAL, MANO
GP166	SUMINISTRO, FABRICACIÓN Y COLOCACION DE ARMADURA DE 1.20 MTS. DE PERALTE Y 17.70 MTS DE LONGITUD COMBADA, A BASE DE PTR DE 3" X
GP167	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PTR DE 3" X 3" (BLANCO), COMO REFUERZOS CENTRALES, INCLUYE: SOLDADURA Y PINTURA ANTICORROSIVA,
GP168	SUMINISTRO Y COLOCACION DE VIGA "I" 6" X 4", COMO REFUERZO LATERAL, INCLUYE: SOLDADURA, PINTURA ESMALTE, MATERIAL, MANO DE OBRA,
GP169	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CLIPS DE 20 CMS. DE LARGO PARA SUJECION DE POLIN A BASE DE ANGULAR DE 6" X 1/4" DE ESPESOR, INCLUYE:
GP170	SUMINISTRO Y COLOCACION DE POLIN 8" CAL. 14 Y SOLDADA A VIGA CARGADORA INCLUYE: PINTURA ANTICORROSIVA, MATERIAL, MANO DE OBRA,
GP171	SUMINISTRO Y COLOCACION DE VARILLA REDONDA LISA DE 5/8" CON EXTREMOS ROSCADOS PARA CONTRAVENTE, INCLUYE: MATERIAL, MANO
GP172	SEPARADOR DE ANGULAR DE 1 1/2" X 1/4" DE ESPESOR DE 1.10 MTS. DE LONGITUD CON PLACA DE 2" X 4" X 1/4" EN LOS EXTREMOS, INCLUYE:
GP173	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CUBIERTA CONVADA DE LAMINA TERNIUM TO-100 GALVANIZADA CAL. 24 INCLUYE:PIJA AUTOROSCABLE, MATERIAL,

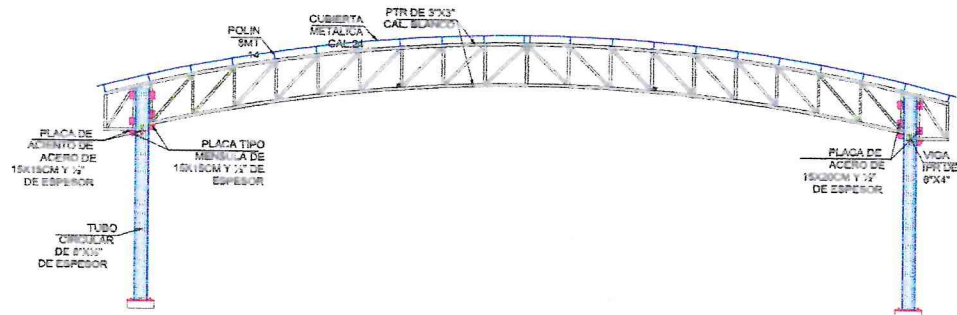

ELABORO.-

Sergio J. Padilla Soto
CC. SERGIO JOEL PADILLA SOTO
REPRESENTANTE LEGAL

REVISO.-

ARQ. BRICEIDA GPE NIEBLAS MARTINEZ
SUPERVISOR DE OBRA

AUTORIZO.-

C. ING. RUBIEL RINCON RAMOS.
DIRECTOR DE O.P.D.U. Y E.



CONTRATISTA:

SERGIO JOEL PADILLA SOTO

DEPENDENCIA:

AYUNTAMIENTO DE BADIRAGUATO

DOMICILIO:

CALLE ENRIQUE COLUNGA 1962, GUSTAVO DIAZ ORDAZ, CULIACÁN, SINALOA. C.P. 80180

R.F.C.

PASS971118IR0.

OBRA:

CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE METALICA EN LA COMUNIDAD DE LA APOMA, SINDICATURA DE HIGUERAS DE ALVAREZ BORBOA, MUNICIPIO DE BADIRAGUATO, SINALOA

FOTOS DE ESTIMACION:

FOTOS DE ESTIMACION:

CVE	CONCEPTO
1	PRELIMINARES
GP01	TRAZO Y NIVELACIÓN DEL TERRENO ESTABLECIENDO EJES Y NIVELETAS DE REFERENCIA, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.
GP15	CORTE CON DISCO DE DIAMANTE EN BANQUETA Y/O LOSA DE PAVIMENTO, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.
GP15	DEMOLICIÓN DE PISO DE CONCRETO DE 10 CMS DE ESPESOR, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.
GP17	EXCAVACIÓN POR MEDIOS MECÁNICOS EN MATERIAL TIPO "B" DE 0.00 A 2.00 MTS.
GP58	RELLENO COMPACTADO CON BAILARINA EN CAPAS DE 20 CMS DE ESPESOR CON MATERIAL DE BANCO, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIAL EN LA
GP03	CARGA Y ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN Y/O DEMOLICIONES MEDIDO COMPACTO, 1ER KILOMETRO.



ELABORO.-

Sergio J. Padilla Soto
C. SERGIO JOEL PADILLA SOTO
DEPENDIENTE I.E.C.A.I

REVISO.-

ARQ. BRICEIDA GPE NIEBLAS MARTINEZ
SUPERVISOR DE OBRA

AUTORIZO.-

C.ING. RUBIEL RINCON RAMOS
DIRECTOR DE O.P.D.U. Y E.



CONTRATISTA:

SERGIO JOEL PADILLA SOTO

DEPENDENCIA:

AYUNTAMIENTO DE BADIRAGUATO

DOMICILIO:

CALLE ENRIQUE COLUNGA 1962, GUSTAVO DIAZ ORDAZ, CULIACÁN, SINALOA. C.P. 80180

R.F.C.

PASS971118IR0.

OBRA:

CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE METALICA EN LA COMUNIDAD DE LA APOMA, SINDICATURA DE HIGUERAS DE ALVAREZ BORBOA, MUNICIPIO DE BADIRAGUATO, SINALOA

FOTOS DE ESTIMACION:

FOTOS DE ESTIMACION:

CVE

3

CONCEPTO

CIMENTACION

GP20

ZAPATA AISLADA DE 2.00X2.00X0.25 MTS DE ESPESOR ARMADA CON VARILLA DE 1/2" @ 20 EN AMBAS DIRECCIONES A DOS LECHOS, COLADA CON

GP23

DADO DE 60X60 DE 2.00 MTS DE ALTURA ARMADO CON 15 VARILLAS DE 1/2" Y ESTRIBOS DE VARILLA DE 3/8" @ 20 CMS ACABADO APARENTE,

GP16

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PLACA DE ACERO DE 60 X 60 CMS. DE 1" DE ESPESOR CON CUATRO BARRENOS DE 1 1/8" DE DIÁMETRO Y CUATRO



ELABORO.-

Sergio J. Padilla Soto

C. SERGIO JOEL PADILLA SOTO

REPRESENTANTE I FCAI

REVISO.-

ARQ. BRICEIDA GPE NIEBLAS MARTINEZ

SUPERVISOR DE OBRA

AUTORIZO.-

C. ING. RUBIEL RINCON RAMOS

DIRECTOR DE O P D I I Y F



CONTRATISTA:

SERGIO JOEL PADILLA SOTO

DEPENDENCIA:

AYUNTAMIENTO DE BADIRAGUATO

DOMICILIO:

CALLE ENRIQUE COLUNGA 1962, GUSTAVO DIAZ ORDAZ, CULIACÁN, SINALOA. C.P. 80180

R.F.C.:

PASS971118IR0.

OBRA:

CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE METALICA EN LA COMUNIDAD DE LA APOMA, SINDICATURA DE HIGUERAS DE ALVAREZ BORBOA, MUNICIPIO DE BADIRAGUATO, SINALOA

FOTOS DE ESTIMACION



ELABORO.-

Sergio J. Padilla Soto
C. SERGIO JOEL PADILLA SOTO
REPRESENTANTE LEGAL

REVISO.-

Arq. Briceida GPE Nieblas Martinez
ARQ. BRICEIDA GPE NIEBLAS MARTINEZ
SUPERVISOR DE OBRA

AUTORIZO.-

C. Ing. Rubiel Rincon Ramos
C. ING. RUBIEL RINCON RAMOS
DIRECTOR DE OBRAS



Fecha y hora de consulta

14/11/2025 2:23:31 PM

Contrato

00798320

BBVA Net Cash - Pagos Interbancarios

Nombre del Cliente

MUNICIPIO DE BADIRAGUATO

Operación autorizada

Transferencia en proceso de validación y aplicación.

Datos del firmante

Usuario: ADMIN1

Poder: 100%

Datos de la operación

Tipo de operación: Pago Interbancario

Descripción: EST 01 NORM LP006

Importe de la operación: 1,431,353.15 MXP

Cuenta de retiro: 0124174836

Cuenta de depósito: 072730012837223485

Divisa de la cuenta: MXP

Divisa de la cuenta: MXP

Titular de la cuenta: MUNICIPIO DE BADIRAG
UATO

Titular de la cuenta: SERGIO JOEL PADILLA SOTO

Nombre banco destino: BANORTE

Fecha de creación: 14/11/2025

Fecha de aplicación: 14/11/2025

Concepto de pago: EST 01 NORM LP006

Referencia numérica:

Instrumento de seguridad: ASD 6551749382

Hora de captura en el canal: 14:23:28

Datos de confirmación de la transferencia

Folio interbancario: 0000996128

Clave de rastreo: 002601002511140000996128

Folio de firma: 0094679020

Folio único: I401202511141423280094679026

Estado operación

Porcentaje Firmado: 100%

Estado: Operado

Detalle de firmas

Acción	Usuario	Porcentaje aportado	Fecha
CREO	ADMIN1	— %	14/11/2025
FIRMO	ADMIN1	100 %	14/11/2025

BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México

www.bbvanetcash.mx
