

OFICIO No. OPDUyE/688/2025
ASUNTO: SOLICITUD PAGO DE
ESTIMACIÓN 02 NORMAL FINIQUITO
Badiraguato, Sin., a 27 de Noviembre de 2025

MTRO. GONZALO IRINEO CABALLERO TERRAZAS
TESORERO MUNICIPAL
P R E S E N T E.-

POR MEDIO DE LA PRESENTE, LE SOLICITO EL PAGO POR: CONCEPTO DE PAGO DE ESTIMACION 02 NORMAL FINIQUITO, DEL IMPORTE DEL CONTRATO, A FAVOR DE LA EMPRESA: SERGIO JOEL PADILLA SOTO, LA CUAL REALIZA LOS TRABAJOS APROBADOS POR EL SUBCOMITE DE BIENESTAR MUNICIPAL, A CONTINUACIÓN, SE DETALLA:

- NOMBRE DE LA OBRA: CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE METÁLICA EN LA COMUNIDAD DE LA APOMA, SINDICATURA DE HIGUERAS DE ÁLVAREZ BORBOA, MUNICIPIO DE BADIRAGUATO, SINALOA.
- No. DE CONTRATO: MBGBR-LP-FAISMUN-006/2025
- IMPORTE DEL CONTRATO: \$2,931,818.64 (DOS MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y UN MIL OCHOCIENTOS DIECIOCHO PESOS 64/100 M.N)
- CONCEPTO DEL PAGO: PAGO DE ESTIMACIÓN 02 NORMAL FINIQUITO
- IMPORTE A PAGAR: \$398,506.07 (TRESCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS SEIS PESOS 07/100 M.N)
- RECURSOS: FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FAISMUN) EJERCICIO 2025.
- EMPRESA: SERGIO JOEL PADILLA SOTO
- R.F.C. PASS971118IR0
- DOMICILIO FISCAL: CALLE ENRIQUE COLUNGA 1962, GUSTAVO DIAZ ORDAZ, CULIACÁN, SINALOA C.P. 80180
- No. DE FACTURA: # 3DE9, DE FECHA 27 DE NOVIEMBRE DE 2025.

SE ANEXA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DE SOPORTE, COMO AMPARO DE DICHO PAGO.

AGRADECIENDO DE ANTEMANO LA ATENCIÓN QUE SE SIRVA DAR A LA PRESENTE, ME DESPIDO QUEDANDO A SUS ÓRDENES.


ATENTAMENTE
C. ING. RUBIEL RINCÓN RAMOS
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS,
DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS,
DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA,
BADIRAGUATO, SINALOA.

C.C.P. ARCHIVO.

 MUNICIPIO DE
BADIRAGUATO
TESORERÍA

27 NOV 2025
Adrián G
RECIBIDO
6:33 PM



Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Serie:

Folio: 104

Fecha: 27/Nov/2025 12:24:37

Lugar de expedición (C.P.) 80180

Emisor
SERGIO JOEL PADILLA SOTO

RFC: PASS971118IR0

Régimen Fiscal: 612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

Domicilio: ENRIQUE COLUNGA 1962 Gustavo Díaz Ordaz Culiacán Sinaloa México 80180

Receptor
Cliente: MUNICIPIO DE BADIRAGUATO

RFC: MBA850101214

Uso CFDI: I01 - Construcciones

Exportación: 01 - No aplica

Domicilio Fiscal: 80500

Régimen Fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

Domicilio: GABRIEL LEYVA SOLANO S/N Col Centro Badiraguato Sinaloa México 80500

Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición

Forma de Pago: 03 - Transferencia electrónica de

Tipo de cambio: 1.000000

Moneda: MXN - Peso Mexicano

Información de cancelación

Motivo de cancelación:

Folio relacionado:

Cantidad	Clave Unidad SAT	Clave Prod/Servicio	Descripción	Valor unitario	Impuestos	Importe
1.00	E48 - Unidad de servicio	72152601 - Servicio de techado	<p>PAGO DE ESTIMACION 02 NORMAL FINIQUITO</p> <p>DE LA OBRA: CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE METALICA EN LA COMUNIDAD DE LA APOMA, SINDICATURA DE HIGUERAS DE ALVAREZ BORBOA, MUNICIPIO DE BADIRAGUATO, SINALOA</p> <p>CONTRATO NO.: MBGBR-LP-FAISMUN-006/2025 MONTO DEL CONTRATO: \$ 2,931,818.64</p> <p>IMPORTE DE LA OBRA EJECUTADA SIN IVA \$ 550,422.76 MAS I.V.A 16 % \$ 88,067.64 TOTAL DE LA OBRA EJECUTADA CON IVA \$ 638,490.40</p> <p>AMORTIZACIÓN ANTICIPO 35% \$ 192,647.97 MAS I.V.A.: \$ 30,823.68 TOTAL AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO: \$ 223,471.65</p> <p>Importe TOTAL A FACTURAR \$ 357,774.79 MAS I.V.A \$ 57,243.97 MONTO NETO A FACTURAR \$ 415,018.76</p> <p>RETENCION 3% (S.V.I.F.Y C.): \$ 16,512.68 TOTAL DEDUCCIONES: \$ 239,984.33</p> <p>MONTO LIQUIDO A RECIBIR: \$ 398,506.07</p>	\$357,774.79	IVA, - Importe: 57243.97	\$357,774.79

CFDI RELACIONADOS

Tipo de relación:

Lista de CFDI's relacionados:

Total con letra:

cuatrocientos quince mil dieciocho Pesos 76/100 M.N.

Subtotal: \$357,774.79

I.V.A.: \$57,243.97

Total: \$415,018.76



Este documento es una representación impresa de un CFDI

Serie del Certificado del emisor: 00001000000711829771

Folio Fiscal: C0FCAFFA-C8D9-4EFF-9E80-D159A9A33DE9

No. de serie del Certificado del SAT: 00001000000709182898

Fecha y hora de certificación: 2025-11-27T13:24:41

Sello digital del CFDI

Y3NhgUx7wNCRQ1HJfObwJmep3wvZiGp1NSYnd2fjU3qf5MXk4DerwTiG0cMY9c4JeWrOMMuFAhJe6gU75FhVAZJlkGIF4wCd0ZevgGoMWG4psppuomIUdG+p2kUsSdA8/pulhw1PYcMMuw
d7v2eIXWZSYkyRf8AJcNwmgKlaDOI56ZQdr/5goeDMJTMhRkmyUI6/r0aVg8yIN4D8idRyy7leSQ5ZA7w6vb8kpxbJGxUTvVbYkGRL2UdEjlcSLgnl8OyIM8MhHSLdwbtkmki+8h9UEw
SXGOmfoufSXZKqCcSc/HoFddFfoayrU+IARKAL2HU1rQvLwni5vPi+rw==

Sello del SAT

XeIAgibLZJ1dYR+YKCKKHU1zKuR0Wb6D6p+TYJ+SX9bZEurBmjS6d7Ym+MPhiumZJEYg+Klb6D9dJ45pundleG0DzSOdYnKJ4dvzNGuN7pnss7eSwUaEk/Rm/X2DXi2aTYRzXpkb
qfBX5ktz9lCU7MfmBnxUih0mahMRofP+OBiWBQ/4izu3+5cZ3LPfT066Zij60XKLmzkzFvzVqBBYKGI/OEL5cUQKivV0dAxBINijy7OJD3wXDwYnS+exq3ceR96saIA+H6/VQisQ0Q
LIJoVW8MazDj5xDE2IL1zIRb2Xluvh8eN1ZVna8H/UoFSe+J9F/HsA==

Cadena original del complemento del certificación digital del SAT

||1.1|C0FCAFFA-C8D9-4EFF-9E80-D159A9A33DE9|2025-11-27T13:24:41|MAS0810247C0Y3NhgUx7wNCRQ1HJfObwJmep3wvZiGp1NSYnd2fjU3qf5MXk4DerwTiG0cMY9c4JeWr
OMMuFAhJe6gU75FhVAZJlkGIF4wCd0ZevgGoMWG4psppuomIUdG+p2kUsSdA8/pulhw1PYcMMuw d7v2eIXWZSYkyRf8AJcNwmgKlaDOI56ZQdr/5goeDMJTMhRkmyUI6/r0aVg8yIN4D8i
dRyy7leSQ5ZA7w6vb8kpxbJGxUTvVbYkGRL2UdEjlcSLgnl8OyIM8MhHSLdwbtkmki+8h9UEwSXGOmfoufSXZKqCcSc/HoFddFfoayrU+IARKAL2HU1rQvLwni5vPi+rw==|00001000
000709182898||

Versión del comprobante: 4.0

Hoja 2

This XML file does not appear to have any style information associated with it. The document tree is shown below.

```
<cfdi:Comprobante xmlns:cfdi="http://www.sat.gob.mx/cfd/4" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/cfd/4 http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/4/cfdv40.xsd"
Certificado="MIIGBDCCA+ygAwIBAgIUMDAwMDEwMDAwMDA3MTE4Mjk3NzEwDQYJKoZIhvcNAQELBQAwggGVMTUwMwYDVQ0DCx8Qy8BERUwU0VSVk1DSU8gREUgQUJNSU5JUR5QUJNT04gVFJJQ1VU
Exportacion="01" Fecha="2025-11-27T12:24:37" Folio="104" FormaPago="03" LugarExpedicion="80100" MetodoPago="PUE" Moneda="MXN"
NoCertificado="00001000000711829771"
Sello="Y3NhGUX7wNCRQ1HJf0bwjMep3wvZiGp1NSYnd2fsjU3qf5M0K4DsrwTiG0cMY9c4jsW0MMuFAH7e6gU75FhVAZJikG1F4wCd0ZevgG0MWG4psppuomlUdG+p2kUsSdA8/puhw1PYcMMuwd7v2
SubTotal="357774.79" TipoDeComprobante="I" Total="415018.76" Version="4.0">
  <cfdi:Emisor Nombre="SERGIO JOEL PADILLA SOTO" RegimenFiscal="612" Rfc="PASS971118TR0"/>
  <cfdi:Receptor DomicilioFiscalReceptor="80500" Nombre="MUNICIPIO DE BADIRAGUATO" RegimenFiscalReceptor="603" Rfc="MBA850101214" UsoCFDI="I01"/>
  <cfdi:Conceptos>
    <cfdi:Concepto Cantidad="1.00" ClaveProdServ="72152601" ClaveUnidad="E48" Descripcion="SERVICIO DE TECHADO PAGO DE ESTIMACION 02 NORMAL FINIQUITO DE
LA OBRA: CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE METALICA EN LA COMUNIDAD DE LA APOMA, SINDICATURA DE HIGUERAS DE ALVAREZ BORBOA, MUNICIPIO DE BADIRAGUATO, SINALOA
CONTRATO NO.: M0GBR-LP-FAISMUN-006/2025 MONTO DEL CONTRATO: $ 2,931,818.64 IMPORTE DE LA OBRA EJECUTADA SIN IVA $ 550,422.76 MAS I.V.A 16 % $
88,067.64 TOTAL DE LA OBRA EJECUTADA CON IVA $ 638,490.40 AMORTIZACIÓN ANTICIPO 35% $ 192,647.97 MAS I.V.A.: $ 30,823.68 TOTAL AMORTIZACIÓN DE
ANTICIPO: $ 223,471.65 Importe TOTAL A FACTURAR $ 357,774.79 MAS I.V.A $ 57,243.97 MONTO NETO A FACTURAR $ 415,018.76 RETENCION 3% ( S.V.I.F.Y C.) :
$ 16,512.68 TOTAL DEDUCCIONES: $ 239,984.33 MONTO LIQUIDO A RECIBIR: $ 398,506.07" Importe="357774.79" NoIdentificacion="SER06" ObjetoImp="02"
ValorUnitario="357774.79">
      <cfdi:Impuestos>
        <cfdi:Traslados>
          <cfdi:Traslado Base="357774.79" Importe="57243.97" Impuesto="002" TasaOCuota="0.160000" TipoFactor="Tasa"/>
        </cfdi:Traslados>
      </cfdi:Impuestos>
    </cfdi:Concepto>
  </cfdi:Conceptos>
  <cfdi:Impuestos TotalImpuestosTrasladados="57243.97">
    <cfdi:Traslados>
      <cfdi:Traslado Base="357774.79" Importe="57243.97" Impuesto="002" TasaOCuota="0.160000" TipoFactor="Tasa"/>
    </cfdi:Traslados>
  </cfdi:Impuestos>
  <cfdi:Complemento>
    <tfd:TimbreFiscalDigital xmlns:tfd="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital" xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital
http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/TimbreFiscalDigital/TimbreFiscalDigitalv11.xsd" Version="1.1" UUID="C0FCAFFA-C8D9-4EFF-9E80-D159A9A33DE9"
FechaTimbrado="2025-11-27T13:24:41" RfcProvCertif="MBA85010247C0"
SelloCFD="Y3NhGUX7wNCRQ1HJf0bwjMep3wvZiGp1NSYnd2fsjU3qf5M0K4DsrwTiG0cMY9c4jsW0MMuFAH7e6gU75FhVAZJikG1F4wCd0ZevgG0MWG4psppuomlUdG+p2kUsSdA8/puhw1PYcM
NoCertificadoSAT="00001000000709182898"
SelloSAT="XetAtGtblZJ1dY/R+VVKCKhU1zKuR0Mb5D6p+TYJ+SX9bZEurBmjS6d7YMrMPhiumZJEYg+Kblb6D9dJ45purx1IeG0DzS0dYnKJ4dvzNGuN7pnss7eSwU/aEk/Rm/X2fXfI2aTYRz
  </tfd:TimbreFiscalDigital>
  </cfdi:Complemento>
</cfdi:Comprobante>
```

Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
PASS971118IR0	SERGIO JOEL PADILLA SOTO	MBA850101214	MUNICIPIO DE BADIRAGUATO
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
C0FCAFFA-C8D9-4EFF-9E80-D159A9A33DE9	2025-11-27T12:24:37	2025-11-27T13:24:41	MAS0810247C0
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$415,018.76	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir



SERGIO JOEL PADILLA SOTO

Dependencia:
AYUNTAMIENTO DE BADIRAGUATO
Control de Estimaciones

CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE METALICA EN LA COMUNIDAD DE LA APOMA, SINDICATURA DE HIGUERAS DE ALVAREZ BORBOA, MUNICIPIO DE BADIRAGUATO, SINALOA			Fecha:	Estimacion:
			22 de octubre de 2025	02 NORMAL FINIQUITO
Periodo de la estimacion:	25/08/2025	22/09/2025	Localidad:	No. De contrato:
Periodo de Ejecución:	25/08/2025	22/09/2025	LA APOMA	MBGBR-LP-FAISMUN-006/2025
Importe del contrato con I.V.A:	Imp. Contratado sin I.V.A	Anticipo	Importe Anticipo sin I.V.A	% de Avance
\$ 2,931,818.64	\$ 2,527,429.86	\$ 1,026,136.52	\$ 884,600.45	22%
				% Avance Total
				100%

Control Del Anticipo	Liquidacion de Estimacion	Control de Estimacion
AMORTIZA ESTA ESTIMACION	Importe de la Estimacion (+) \$ 550,422.76	ESTA ESTIMACION
\$ 223,471.64	16 % I.V.A (+) \$ 88,067.64	\$ 638,490.40
	Sub- Total A (=) \$ 638,490.40	
	Amortizacion Anticipo 35% \$ 192,647.97	
AMORTIZACION ANTERIOR	16 % I.V.A (+) \$ 30,823.68	ACUMULADO ANTERIOR
\$ 802,664.88	Total (=) \$ 223,471.65	\$ 2,293,328.24
	Importe TOTAL A FACTURAR \$ 357,774.79	
TOTAL AMORTIZADO	16 % I.V.A (+) \$ 57,243.97	TOTAL ACUMULADO.
\$ 1,026,136.52	Total (=) \$ 415,018.76	\$ 2,931,818.64
	3 % SVIFYC: \$ 16,512.68	
ANTICIPO OTORGADO	Total Deducciones (=) \$ 239,984.33	CONTRATADO
\$ 1,026,136.52	Importe T O T A L \$ 398,506.07	\$ 2,931,818.64
	NETO A PAGAR	
SALDO DEL ANTICIPO	\$ 398,506.07	SALDO
\$ -	Son:	\$ -
	(SON TRESCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS SEIS PESOS 07/100 M.N.)	

ELABORO.-

Sergio J. Padilla
C. SERGIO JOEL PADILLA SOTO
REPRESENTANTE LEGAL

REVISO

ING. JOSE RODOLFO CONTRERAS LOPEZ
COSTOS Y PRESUPUESTOS.

AUTORIZO

C. ING. RUBIEL RINCON RAMOS.
DIRECTOR O.P.D.U. Y E.



Fecha: 22 de octubre de 2025

CARATULA DE ESTIMACIÓN

CONTRATISTA: SERGIO JOEL PADILLA SOTO		ESTIMACIÓN No: 02 NORMAL FINIQUITO	
DOMICILIO: CALLE ENRIQUE COLUNGA 1962, GUSTAVO DIAZ ORDAZ, CULIACÁN, SINALOA. C.P. 80180		PERIODO DE ESTIMACION:	
TELÉFONO: 667-5818434	CEL: 667-5818434	DEL 25-ago-25	AL 22-sep-25
R.F.C. PASS971118IR0.		FECHA DE CONTRATO: 21-jul-25	
DEPENDENCIA: AYUNTAMIENTO DE BADIRAGUATO			
LOCALIDAD: LA APOMA		MUNICIPIO: BADIRAGUATO	PERIODO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO:
		INICIO: 25-jul-25	TERMINACIÓN: 22-sep-25
DESCRIPCIÓN:			
CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE METALICA EN LA COMUNIDAD DE LA APOMA, SINDICATURA DE HIGUERAS DE ALVAREZ BORBOA, MUNICIPIO DE BADIRAGUATO, SINALOA			
CONTRATO No: MBGBR-LP-FAISMUN-006/2025			
IMPORTE SIN IVA DE LA OBRA	IMPORTE CON IVA DE LA OBRA	35% ANTICIPO DE LA OBRA	IMPORTE TOTAL DE CONTRATO:
\$2,527,429.86	\$2,931,818.64	\$1,026,136.52	\$2,931,818.64
RECIBI:			BUENO POR: \$ 398,506.07
\$ 398,506.07 (SON TRESCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS SEIS PESOS 07/100 M.N.)			
EN PAGO DE ESTIMACIÓN: 02 NORMAL FINIQUITO			
DEDUCCIONES:		CALCULO DE ESTIMACIÓN	
AMORTIZACIÓN ANTICIPO 35%	\$ 192,647.97	IMPORTE DE LA OBRA EJECUTADA SIN IVA	\$ 550,422.76
MAS I.V.A.:	\$ 30,823.68	MAS I.V.A 16 %	\$ 88,067.64
TOTAL AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO:	\$ 223,471.65	TOTAL DE LA OBRA EJECUTADA CON IVA	\$ 638,490.40
3 % SVIFYC:	\$ 16,512.68	MENOS TOTAL DEDUCCIONES:	\$ 239,984.33
TOTAL DEDUCCIONES:	\$ 239,984.33	MONTO A FACTURAR MAS IVA	\$ 415,018.75
SALDO A PAGAR:			\$ 398,506.07

ELABORO.-

Sergio J. Padilla
C. SERGIO JOEL PADILLA SOTO
REPRESENTANTE LEGAL

REVISÓ.-

ING. JOSE RODOLFO CONTRERAS LOPEZ
COSTOS Y PRESUPUESTOS.

AUTORIZO.

C. ING. RUBIEL RINCON RAMOS
DIRECTOR DE O.P.D.U. Y E

 		CONTRATISTA: SERGIO JOEL PADILLA SOTO		DEPENDENCIA: AYUNTAMIENTO DE BADIRAGUATO		FECHA: 22 de octubre de 2025	
DOMICILIO: CALLE ENRIQUE COLUNGA 1962, GUSTAVO DIAZ ORDAZ, CULIACÁN, SINALOA. C.P. 80180							
R.F.C.: PASS971118IR0.							
ESTADO DE CUENTA							
		LOCALIDAD:		LA APOMA		ESTIMACIÓN:	
						02 NORMAL FINIQUITO	
DESCRIPCIÓN: CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE METALICA EN LA COMUNIDAD DE LA APOMA, SINDICATURA DE HIGUERAS DE ALVAREZ BORBOA, MUNICIPIO DE BADIRAGUATO, SINALOA							
FECHA INICIO CONTRATO:	25-jul-25	FECHA TERMINACION CONTRATO:	22-sep-25	CONTRATO:	MBGBR-LP-FAISMUN-006/2025	FECHA CONTRATO:	21-jul-25
IMPORTE DE OBRA SIN IVA:		\$2,527,429.86		CLAVE DE CONVENIO ADICIONAL:			
IMPORTE DE ANTICIPO DE OBRA:		\$1,026,136.52		PERIODO CONVENIO ADICIONAL:			
IMPORTE TOTAL DE CONTRATO:		\$2,931,818.64		IMPORTE CONVENIO ADICIONAL:			
No. DE ESTIMACIÓN	PERIODO	IMPORTE C/IVA ESTIMACIÓN	IMPORTE SIN IVA	3 % SVIFYC:	AMORTIZACIÓN ANTICIPO 35%	IMPORTE TOTAL CONTRATADO:	LIQUIDO A PAGAR
01 NORMAL	25-jul-25	\$ 2,293,328.24	\$ 1,977,007.10	\$ 59,310.21	\$ 802,664.88	\$ 861,975.09	\$ 1,431,353.15
02 NORMAL FINIQUITO	25-ago-25	\$ 638,490.40	\$ 550,422.76	\$ 16,512.68	\$ 223,471.64	\$ 239,984.32	\$ 398,506.08
TOTALES:		\$ 2,931,818.64	\$ 2,527,429.86	\$ 75,822.89	\$ 1,026,136.52	\$ 1,101,959.41	\$ 1,829,859.23
		\$	\$	\$	\$	\$	\$
		SALDO POR AMORTIZAR:					
		\$	\$	\$	\$	\$	\$
		SALDO DEL CONTRATO:					
		\$	\$	\$	\$	\$	\$

ELABORO.-

REVISÓ.-

Sergio J. Padilla
 C. SERGIO JOEL PADILLA SOTO
 REPRESENTANTE LEGAL

ING. JOSE RODOLFO CONTRERAS LOPEZ
 COSTO Y PRESUPUESTOS.

[Firma]
 C. ING. RUBIEL RINCON RAMOS
 DIRECTOR DE O.P.D.U. Y E.



CONTRATISTA:		DEPENDENCIA:	
SERGIO JOEL PADILLA SOTO		AYUNTAMIENTO DE BADIRAGUATO	
DOMICILIO:		FECHA:	
CALLE ENRIQUE COLUNGA 1962, GUSTAVO DIAZ ORDAZ, CULIACÁN, SINALOA. C.P. 80180		22 de octubre de 2025	
R.F.C.			
PASS971118IR0.			

RESÚMEN DE ESTIMACIÓN

		LOCALIDAD:	LA APOMA	ESTIMACIÓN:	02 NORMAL FINIQUITO
DESCRIPCIÓN:	CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE METALICA EN LA COMUNIDAD DE LA APOMA, SINDICATURA DE HIGUERAS DE ALVAREZ BORBOA, MUNICIPIO DE BADIRAGUATO, SINALOA				
IMPORTE DE OBRA SIN IVA:		\$ 2,527,429.86			
IMPORTE DE ANTICIPO DE OBRA:		\$ 1,026,136.52			
IMPORTE TOTAL DE CONTRATO:		\$ 2,931,818.64			

DESTAJO		IMPORTE
1	PRELIMINARES	\$ -
2	CIMENTACON	\$ -
3	ESTRUCTURA	\$ 80,752.18
4	ALBAÑILERIA	\$ 462,596.77
5	INSTALACIONES ESPECIALES	\$ 45,076.09
6	TRABAJOS FINALES	\$ 12,999.28
SUBTOTAL ESTIMACIÓN:		\$ 601,424.32
POR CIERRE DE ESTIMACIÓN:		\$ 550,422.76

SUB TOTAL=	\$ 550,422.76
I.V.A AL 16 %	\$ 88,067.64
TOTAL =	\$ 638,490.40

ELABORO.-

Sergio J. Padilla
C. SERGIO JOEL PADILLA SOTO
REPRESENTANTE LEGAL

REVISO.-

ING. JOSE RODOLFO CONTRERAS LOPEZ
COSTOS Y PRESUPUESTOS.

AUTORIZO.-

Rubiel Rincon Ramos
C. ING. RUBIEL RINCON RAMOS.
DIRECTOR DE O.P.D.U. Y E.



CONTRATISTA: SERGIO JOEL PADILLA SOTO		DEPENDENCIA:		AYUNTAMIENTO DE BADIRAGUATO		1 de 2	
DOMICILIO: CALLE ENRIQUE COLUNGA 1962, GUSTAVO DIAZ ORDAZ, CULIACÁN, SINALOA. C.P. 80180		R.F.C.:		PASS971118IRO.		FECHA: miércoles, 22 de octubre de 2025	

DESGLOSE DE CONCEPTOS DE ESTIMACIÓN

DESCRIPCIÓN: CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE METALICA EN LA COMUNIDAD DE LA APOMA, SINDICATURA DE HIGUERAS DE ALVAREZ BORBOA, MUNICIPIO DE BADIRAGUATO, SINALOA										02 NORMAL FINQUITO	
IMPORTE DE OBRA SIN IVA: \$2,527,429.86										IMPORTE TOTAL DE CONTRATO: \$2,931,818.64	
IMPORTE DE ANTICIPO DE OBRA: \$1,026,136.52											
LOCALIDAD: LA APOMA										ESTIMACIÓN:	
CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	SEGUN PROYECTO		HASTA ESTA ESTIM	HASTA ESTIM ANTERIOR	EXCEDENTE	DE ESTA ESTIMACIÓN	IMPORTE		
			CANT	P.U.	TOTAL						
1	PRELIMINARES										
2	CIMENTACION										
3	ESTRUCTURA										
GP174	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CANALETA PARA BAJANTE DE AGUAS PLUVIALES A BASE DE LAMINA LISA PINTRO CAL. 22. INCLUYE: MANO DE OBRA, SOPORTES PARA SUJECIÓN, HERRAMIENTA, MATERIALES Y EQUIPO.	ML	60.00	\$ 1,213.63	\$ 72,817.80	60.00	0.00	60.00	\$	72,817.80	
GP175	BAJANTE DE AGUA PLUVIALES CON TUBO DE 6". INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, COLOCACIÓN, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	4.00	\$ 3,987.19	\$ 15,868.76	2.00	0.00	2.00	\$	7,934.38	
4	ALBAÑILERIA										
GP177	PISO DE 10 CMS DE ESPESOR ACABADO PULIDO, CONCRETO HECHO EN OBRA CON F'C=200 KG/CM2 AGREGADO DE 3/4". INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	M2	624.00	\$ 686.04	\$ 428,088.96	674.30	0.00	674.30	\$	462,596.77	
5	INSTALACIONES ESPECIALES										
GP179	SALIDA DE ALUMBRADO CON TUBERIA GALVANIZADA DE 3/4". INCLUYE: TUBERIA GALVANIZADA, ACCESORIOS, CABLE CAL. 12, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	6.00	\$ 2,988.82	\$ 17,932.92	6.00	0.00	6.00	\$	17,932.92	
GP180	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE INTERRUPTOR DE 1X20 SQUARD, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	3.00	\$ 459.91	\$ 1,379.73	1.00	0.00	1.00	\$	459.91	
GP181	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LAMPARA HIGH BAY LED DE 150 W, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	6.00	\$ 4,447.21	\$ 26,683.26	6.00	0.00	6.00	\$	26,683.26	

ELABORÓ:

Sergio J. Padilla
C. SERGIO JOEL PADILLA SOTO

REVISÓ

ING. JOSE ROBERTO CONTRERAS LOPEZ
NOTARIO PUBLICO

AUTORIZO

C. ING. RUBIEL RINCON RAMOS
NOTARIO PUBLICO



CONTRATISTA: SERGIO JOEL PADILLA SOTO		DEPENDENCIA:		FECHA: miércoles, 22 de octubre de 2025	
DOMICILIO: CALLE ENRIQUE COLINGA 1982, GUSTAVO DIAZ ORDAZ, CULIACÁN, SINALOA. C.P. 80180		R.F.C.: PASS971118IR0.		AYUNTAMIENTO DE BADIRAGUATO 2 de 2	

DESGLOSE DE CONCEPTOS DE ESTIMACIÓN

DESCRIPCIÓN: CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE METALICA EN LA COMUNIDAD DE LA APOMA, SINDICATURA DE HIGUERAS DE ALVAREZ BORBOA, MUNICIPIO DE BADIRAGUATO, SINALOA				LOCALIDAD:		ESTIMACIÓN:		02 NORMAL FINIQUITO	
IMPORTE DE OBRA SIN IVA: \$2,527,429.86				IMPORTE DE ANTICIPO DE OBRA: \$1,026,136.52		IMPORTE TOTAL DE CONTRATO:		\$2,931,818.64	
CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANT	SEGUN PROYECTO P.U.	TOTAL	HASTA ESTA ESTIM	EXCEDENTE	DE ESTA ESTIMACIÓN	IMPORTE
6	TRABAJOS FINALES								
GP67	LETRERO INFORMATIVO ALUSIVO A LA OBRA FABRICADO CON PTR DE 1 1/2" CON MEDIDAS DE 1.20X1.80 MTS DE ALTO, INCLUYE: LONA IMPRESA CON INFORMACIÓN DE LA OBRA, CONCRETO HECHO EN OBRA CON UN F/C=150 KG/CM2 EN PATAS DE ANUNCIO DE 0.40X0.40X0.40, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	1.00	\$ 6,445.08	\$ 6,445.08	1.00	0.00	1.00	\$ 6,445.08
GP101	LIMPIEZA AL FINAL DE LA OBRA, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	M2	624.00	\$ 9.72	\$ 6,065.28	674.30	0.00	674.30	\$ 6,554.20
								SUB-TOTAL	\$ 601,424.32
								IVA	\$ 96,227.89
								MONTO TOTAL	\$ 697,652.21
								POR CIERRE DE OBRA	\$ 638,490.40

ELABORO.-

Sergio J. Padilla
C. SERGIO JOEL PADILLA SOTO
REPRESENTANTE LEGAL

REVISÓ

ING. JOSE RODOLFO CONTRERAS LOPEZ
COSTOS Y PRESUPUESTOS

[Firma]
AUTORIZO
C. ING. RUBIEL RINCON RAMOS
PRESIDENTE DE A.C. P. U. V. F.



CONTRATISTA:				DEPENDENCIA:				
SERGIO JOEL PADILLA SOTO				AYUNTAMIENTO DE BADIRAGUATO				
CONTRATISTA:		SERGIO JOEL PADILLA SOTO						
R.F.C.		PAS9871118RD.						
OBRA:		CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE METALICA EN LA COMUNIDAD DE LA APOMA, SINDICATURA DE HIGUERAS DE ALVAREZ BORBOA, MUNICIPIO DE BADIRAGUATO, SINALOA						
ESTIMACION		02 NORMAL FINIQUITO						
GENERADORES DE ESTIMACION								
CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANT	LARGO	ANCHO	ESPEJOR	ACUMULADO	OBSERVACIONES
							PARCIAL	TOTAL
3	ESTRUCTURA							
GP174	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CANALETA PARA BAJANTE DE AGUAS PLUVIALES A BASE DE LAMINA LISA PINTRO CAL. 22, INCLUYE: MANO DE OBRA, SOPORTES PARA SUJECCIÓN.	ML						
			2.00	30.00			60.00	
							TOTAL EJECUTADO	60.00
GP175	BAJANTE DE AGUA PLUVIALES CON TUBO DE 6", INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, COLOCACIÓN, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA						
			2.00				2.00	
							TOTAL EJECUTADO	2.00
4	ALBANILERIAS							
GP177	PISO DE 10 CMS DE ESPESOR ACABADO PULIDO, CONCRETO HECHO EN OBRA CON	M2						
		AREA DE CANCHA					563.86	
		AREA IZQUIERDA					46.03	
		AREA DERECHA					64.41	
							TOTAL EJECUTADO	674.30
							ESTA ESTIMACION	624.00
							DIFERENCIA	50.30
5	INSTALACIONES ESPECIALES							
GP179	SALIDA DE ALUMBRADO CON TUBERIA GALVANIZADA DE 3/4", INCLUYE: TUBERIA GALVANIZADA, ACCESORIOS, CABLE CAL 12, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	SAL						
			6.00				6.00	
							TOTAL EJECUTADO	6.00
GP180	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE INTERRUPTOR DE 1X20 SQUARD, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA						
			1.00				1.00	
							TOTAL EJECUTADO	1.00
GP181	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LAMPARA HIGH BAY LED DE 150 W, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA						
			6.00				6.00	
							TOTAL EJECUTADO	6.00
6	TRABAJOS FINALES							
GP07	LETRERO INFORMATIVO ALUSIVO A LA OBRA, FABRICADO CON PTR DE 1 1/2" CON MEDIDAS DE 1.20X1.80 MTS DE ALTO, INCLUYE: LONA IMPRESA, CON INFORMACIÓN DE LA OBRA, CONCRETO	PZA						
			1.00				1.00	
							TOTAL EJECUTADO	1.00
GP101	LIMPIEZA AL FINAL DE LA OBRA, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	M2						
		AREA DE CANCHA					563.86	
		AREA IZQUIERDA					46.03	
		AREA DERECHA					64.41	
							TOTAL EJECUTADO	674.30
							ESTA ESTIMACION	624.00
							DIFERENCIA	50.30

ELABORO.-

Sergio J. Padilla
C. SERGIO JOEL PADILLA SOTO
REPRESENTANTE LEGAL

REVISÓ

ARQ. BRICEIDA GPE NIEBLAS MARTINEZ
SUPERVISOR DE OBRA

ING. RUBIEL RINCON RAMOS
DIRECTOR DE O.P.D.U. Y E.



CONTRATISTA:
SERGIO JOEL PADILLA SOTO

DEPENDENCIA:
AYUNTAMIENTO DE BADIRAGUATO

DOMICILIO: CALLE ENRIQUE COLUNGA 1962, GUSTAVO DIAZ ORDAZ, CULIACÁN, SINALOA, C.P. 80180


R.F.C. PASS971118IR0.

OBRA: CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE METALICA EN LA COMUNIDAD DE LA APOMA, SINDICATURA DE HIGUERAS DE ALVAREZ BORBOA, MUNICIPIO DE BADIRAGUATO, SINALOA

CROQUIS ESTIMACION:

CROQUIS ESTIMACION:

CLAVE	CONCEPTO
3	ESTRUCTURA
GP174	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CANALETA PARA BAJANTE DE AGUAS PLUVIALES A BASE DE LAMINA LISA PINTRO CAL. 22, INCLUYE: MANO DE
GP175	BAJANTE DE AGUA PLUVIALES CON TUBO DE 6", INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, COLOCACIÓN, HERRAMIENTA Y EQUIPO.
4	ALBAÑILERIA
GP177	PISO DE 10 CMS DE ESPESOR ACABADO PULIDO, CONCRETO HECHO EN OBRA CON F'C=200 KG/CM2 AGREGADO DE 3/4", INCLUYE: MATERIALES,

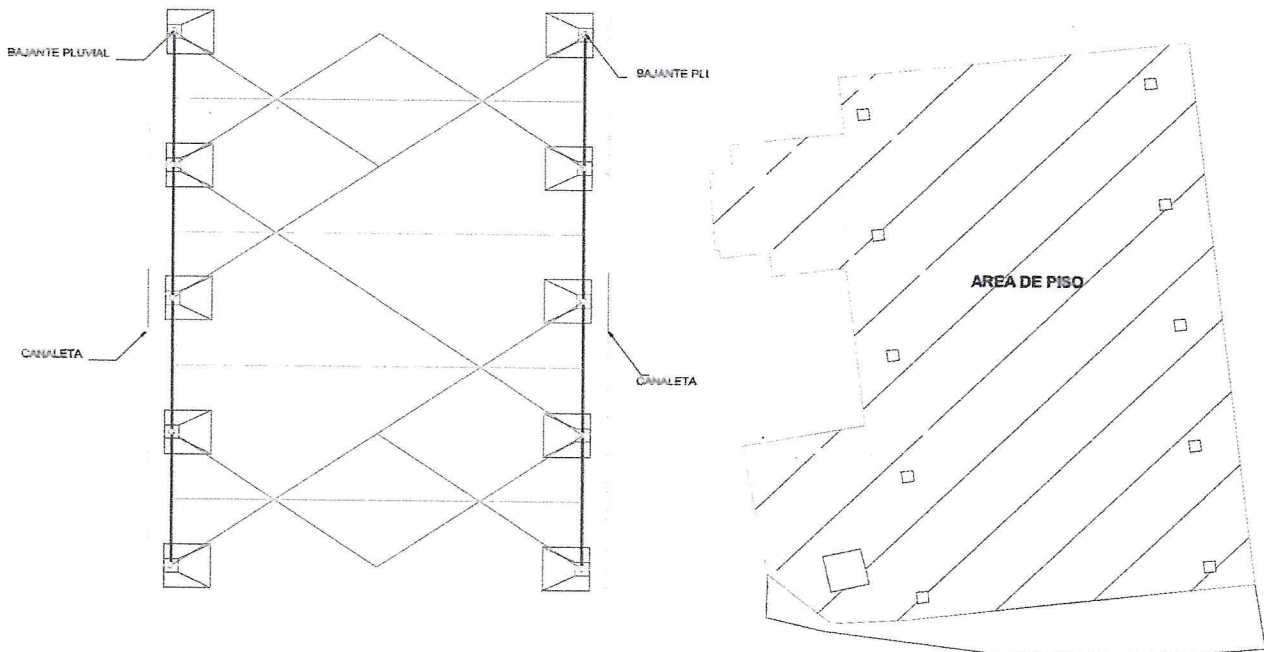

ELABORO.-

Sergio J. Padilla
CC. SERGIO JOEL PADILLA SOTO
REPRESENTANTE LEGAL

REVISO.-

ARQ. BRICEIDA GPE NIEBLAS MARTINEZ
SUPERVISOR DE OBRA

AUTORIZO.-

[Signature]
C. ING. RUBIEL RINCON RAMOS.
DIRECTOR DE O.P.D.U. Y E.



CONTRATISTA:
SERGIO JOEL PADILLA SOTO

DEPENDENCIA:
AYUNTAMIENTO DE BADIRAGUATO


DOMICILIO: CALLE ENRIQUE COLUNGA 1962, GUSTAVO DIAZ ORDAZ, CULIACÁN, SINALOA. C.P. 80180

R.F.C. PASS971118IR0.

OBRA: CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE METALICA EN LA COMUNIDAD DE LA APOMA, SINDICATURA DE HIGUERAS DE ALVAREZ BORBOA, MUNICIPIO DE BADIRAGUATO, SINALOA

CROQUIS ESTIMACION:

4	INSTALACIONES ESPECIALES
GP179	SALIDA DE ALUMBRADO CON TUBERIA GALVANIZADA DE 3/4", INCLUYE: TUBERIA GALVANIZADA, ACCESORIOS, CABLE CAL 12, MANO DE OBRA,
GP180	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE INTERRUPTOR DE 1X20 SQUARD, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.
GP30	REGISTRO PREFABRICADO DE CONCRETO DE 40X40X40 CM CON TAPA DE CONCRETO DE 6 CM DE ESPESOR, CON MARCO DE FIERRO
6	TRABAJOS FINALES
GP67	LETRERO INFORMATIVO ALUSIVO A LA OBRA FABRICADO CON PTR DE 1 1/2" CON MEDIDAS DE 1.20X1.80 MTS DE ALTO, INCLUYE: LONA IMPRESA
GP101	LIMPIEZA AL FINAL DE LA OBRA. INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.

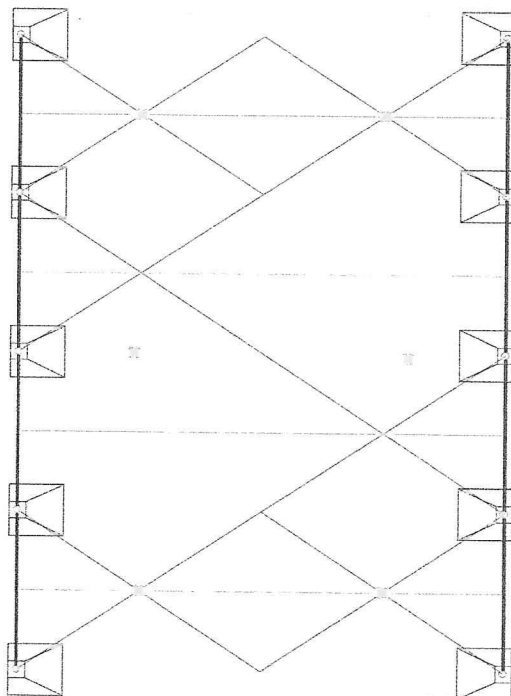

ELABORO.-

Sergio J. Padilla
CC. SERGIO JOEL PADILLA SOTO
REPRESENTANTE LEGAL

REVISO.-

ARQ. BRICEIDA GPE NIEBLAS MARTINEZ
SUPERVISOR DE OBRA

AUTORIZO.-

C. ING. RUBIEL RINCON RAMOS.
DIRECTOR DE O.P.D.U. Y E.



CONTRATISTA:

SERGIO JOEL PADILLA SOTO

DEPENDENCIA:

AYUNTAMIENTO DE BADIRAGUATO

DOMICILIO:

CALLE ENRIQUE COLUNGA 1962, GUSTAVO DIAZ ORDAZ, CULIACÁN, SINALOA. C.P. 80180

R.F.C.

PASS971118IR0.

OBRA:

CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE METALICA EN LA COMUNIDAD DE LA APOMA, SINDICATURA DE HIGUERAS DE ALVAREZ BORBOA, MUNICIPIO DE BADIRAGUATO, SINALOA

FOTOS DE ESTIMACION:

FOTOS DE ESTIMACION:

CVE	CONCEPTO
3	ESTRUCTURA
GP17	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CANALETA PARA BAJANTE DE AGUAS PLUVIALES A BASE DE LAMINA LISA PINTRO CAL. 22, INCLUYE: MANO DE OBRA,
GP17	BAJANTE DE AGUA PLUVIALES CON TUBO DE 6", INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, COLOCACIÓN, HERRAMIENTA Y EQUIPO.
4	ALBANTILERIA
GP17	PISO DE 10 CMS DE ESPESOR ACABADO PULIDO, CONCRETO HECHO EN OBRA CON F'C=200 KG/CM2 AGREGADO DE 3/4", INCLUYE: MATERIALES, MANO



ELABORO.-

Sergio J. Padilla
C. SERGIO JOEL PADILLA SOTO
CONSTRUCCIONES

REVISO.-

ARQ. BRICEIDA GPE NIEBLAS MARTINEZ
ARQ. BRICEIDA GPE NIEBLAS MARTINEZ
CONSTRUCCIONES DE OBRA

AUTORIZO.-

C.ING. RUBIEL RINCON RAMOS
C.ING. RUBIEL RINCON RAMOS
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS



CONTRATISTA:

SERGIO JOEL PADILLA SOTO

DEPENDENCIA:

AYUNTAMIENTO DE BADIRAGUATO

DOMICILIO:

CALLE ENRIQUE COLUNGA 1962, GUSTAVO DIAZ ORDAZ, CULIACÁN, SINALOA. C.P. 80180

R.F.C.:

PASS971118IR0.


OBRA:

CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE METALICA EN LA COMUNIDAD DE LA APOMA, SINDICATURA DE HIGUERAS DE ALVAREZ BORBOA, MUNICIPIO DE BADIRAGUATO, SINALOA

FOTOS DE ESTIMACION:

FOTOS DE ESTIMACION:

CVE	CONCEPTO
5	INSTALACIONES ESPECIALES
GP17	SALIDA DE ALUMBRADO CON TUBERÍA GALVANIZADA DE 3/4", INCLUYE: TUBERÍA GALVANIZADA, ACCESORIOS, CABLE CAL 12, MANO DE OBRA,
GP18	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE INTERRUPTOR DE 1X20 SQUARD, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.
GP30	REGISTRO PREFABRICADO DE CONCRETO DE 40X40X40 CM CON TAPA DE CONCRETO DE 6 CM DE ESPESOR, CON MARCO DE FIERRO GALVANIZADO DE
6	TRABAJOS FINALES
GP67	LETRERO INFORMATIVO ALUSIVO A LA OBRA FABRICADO CON PTR DE 1 1/2" CON MEDIDAS DE 1.20X1.80 MTS DE ALTO, INCLUYE: LONA IMPRESA CON
GP10	LIMPIEZA AL FINAL DE LA OBRA. INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.

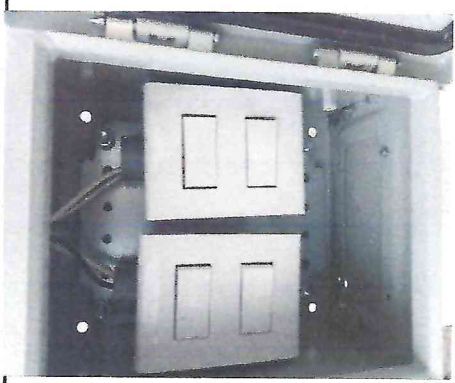

ELABORO.-

Sergio J. Padilla
C. SERGIO JOEL PADILLA SOTO
REPRESENTANTE LEGAL

REVISO.-

Arq. Briceida GPE Nieblas Martinez
ARQ. BRICEIDA GPE NIEBLAS MARTINEZ
SUPERVISOR DE OBRA

AUTORIZO.-

C. Ing. Rubiel Rincon Ramos
C. ING. RUBIEL RINCON RAMOS
DIRECTOR DE OBRA



Fecha y hora de consulta

02/12/2025 4:28:54 PM

Contrato

00798320

BBVA Net Cash - Pagos Interbancarios

Nombre del Cliente

MUNICIPIO DE BADIRAGUATO

Operación autorizada

Transferencia en proceso de validación y aplicación.

Datos del firmante

Usuario: ADMIN1

Poder: 100%

Datos de la operación

Tipo de operación: Pago Interbancario

Descripción: EST 02 NOR FIN LP006

Importe de la operación: 398,506.07 MXP

Cuenta de retiro: 0124174836

Cuenta de depósito: 072730012837223485

Divisa de la cuenta: MXP

Divisa de la cuenta: MXP

Titular de la cuenta: MUNICIPIO DE BADIRAGUATO

Titular de la cuenta: SERGIO JOEL PADILLA SOTO

Nombre banco destino: BANORTE

Fecha de creación: 02/12/2025

Fecha de aplicación: 02/12/2025

Concepto de pago: EST 02 NOR FIN LP006

Referencia numérica:

Instrumento de seguridad: ASD 6551749382

Hora de captura en el canal: 16:28:52

Datos de confirmación de la transferencia

Folio interbancario: 0000474333

Clave de rastreo: 002601002512020000474333

Folio de firma: 0043518264

Folio único: I401202512021628520043518270

Estado operación

Porcentaje Firmado: 100%

Estado: Operado

Detalle de firmas

Acción	Usuario	Porcentaje aportado	Fecha
CREO	ADMIN1	-- %	02/12/2025
FIRMO	ADMIN1	100 %	02/12/2025

BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México

www.bbvanetcash.mx
