



Badiraguato

GANERANDO BUENOS RESULTADOS

OFICIO No. OPDUyE/813/2025

ASUNTO: SOLICITUD PAGO ESTIMACIÓN 01 NORMAL

Badiraguato, Sin., a 26 de Diciembre de 2025

MTRO. GONZALO IRINEO CABALLERO TERRAZAS
TESORERO MUNICIPAL
P R E S E N T E.-

POR MEDIO DE LA PRESENTE, LE SOLICITO EL PAGO POR: **CONCEPTO DE PAGO ESTIMACIÓN 01 NORMAL**, DEL IMPORTE DEL CONTRATO, A FAVOR DE LA EMPRESA: **JOSE CARLOS JUSAVIRO MONTOYA**, LA CUAL REALIZA LOS TRABAJOS APROBADOS POR EL SUBCOMITE DE BIENESTAR MUNICIPAL, A CONTINUACIÓN, SE DETALLA:

- **NOMBRE DE LA OBRA:** CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO Y ALUMBRADO PÚBLICO, ENTRE CALLE LOS PINOS Y CALLE SIN NOMBRE, COLONIA BUENA VISTA, DE LA CABECERA MUNICIPAL DE BADIRAGUATO, SINALOA.
- **No. DE CONTRATO:** MBGBR-AD-FAISMUN-025/2025
- **IMPORTE DEL CONTRATO:** \$772,196.86 (SETECIENTOS SETENTA Y DOS MIL CIENTO NOVENTA Y SEIS PESOS 86/100 M.N)
- **CONCEPTO DEL PAGO:** PAGO DE ESTIMACIÓN 01 NORMAL
- **IMPORTE A PAGAR:** \$477,970.51 (CUATROCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS SETENTA PESOS 51/100 M.N)
- **RECURSOS:** FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FAISMUN), EJERCICIO 2025
- **EMPRESA:** JOSE CARLOS JUSAVIRO MONTOYA
- **R.F.C.** TRI-170712-K25
- **DOMICILIO FISCAL:** CALLE DEGOLLADO S/N, INTERIOR 1C, ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE COLON, COLONIA CENTRO, GUASAVE, SINALOA, C.P. 8100.
- **No. DE FACTURA:** # 6159, DE FECHA 24 DE DICIMEBRE DE 2025.

SE ANEXA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DE SOPORTE, COMO AMPARO DE DICHO PAGO.

AGRADECIENDO DE ANTEMANO LA ATENCIÓN QUE SE SIRVA DAR A LA PRESENTE, ME DESPIDO QUEDANDO A SUS ÓRDENES.



DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS,
DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA.
BADIRAGUATO, SINALOA.

C.C.P. ARCHIVO.

ATENTAMENTE


C. ING. RUBIEL RINCÓN RAMOS
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS,
DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA



**MUNICIPIO DE
BADIRAGUATO**
TESORERÍA

Monten Az.
26 DIC 2025
10:09 PM
RECIBIDO

**TRIDICUT**

TRI170712K25

RÉGIMEN FISCAL: 601 - General de Ley Personas Morales
DEGOLLADO, S/N/1 C, Centro, 81000, Guasave, Guasave, Sinaloa, México
Tel. 6671209727

CLIENTE

MUNICIPIO DE BADIRAGUATO

MBA850101214

USO CFDI: G03 - Gastos en general.

DOMICILIO FISCAL: 80500

RÉGIMEN FISCAL: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
GABRIEL LEYVA SOLANO SN, 80500, BADIRAGUATO, Badiraguato, Sinaloa, México

Factura 540

FOLIO FISCAL (UUID)

2438155A-84AB-4140-A58A-B0B0D14A6159

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

00001000000711762511

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000719444611

FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN

2025-12-24T11:43:31

RFC PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN

STA0903206B9

FECHA Y HORA DE EMISIÓN DE CFDI

2025-12-24T10:23:31

LUGAR DE EXPEDICIÓN

81000

CONCEPTOS					
Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Objeto Imp.	Importe
1.00	E48	PAGO DE ESTIMACION 01 NORMAL DE LA OBRA: CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRAULICO Y ALUMBRADO PUBLICO, ENTRE CALLE LOS PINOS Y CALLE SIN NOMBRE, COLONIA BUENA VISTA, DE LA CABECERA MUNICIPAL DE BADIRAGUATO, SINALOA.	\$ 429,117.17	02 - Sí objeto de impuesto.	\$ 429,117.17

CONTRATO No.: MBGBR-AD-FAISMUN-025/2025.

MONTO DEL CONTRATO: \$772,196.86

IMPORTE DE LA OBRA EJECUTADA SIN IVA: \$660,180.26

MAS I.V.A. 16%: \$105,628.84

TOTAL DE LA OBRA EJECUTADA CON IVA: \$765,809.10

AMORTIZACION ANTICIPO 35%: \$231,063.09

MAS I.V.A.: \$38,970.09

TOTAL AMORTIZACION DE ANTICIPO: \$268,033.18

IMPORTE BRUTO A FACTURAR: \$429,117.17

MAS I.V.A. A FACTURAR 16%: \$68,658.75

MONTO NETO A FACTURAR: \$497,775.92

RETENCION 3% (S.V.I.F. Y C.): \$19,805.41

TOTAL DEDUCCIONES: \$287,838.59

MONTO LIQUIDO A RECIBIR: \$477,970.51

Clave Prod. Serv. - 72101500 Servicios de apoyo para la construcción

Impuestos:

Trasladados:

002 IVA Base - 429117.17 Tasa - 0.160000 Importe - \$ 68,658.75

IMPORTE CON LETRA

CUATROCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS
SETENTA Y CINCO PESOS, 92/100 MXN

SUBTOTAL

\$ 429,117.17

TRASLADO IVA TASA 0.160000

\$ 68,658.75

TOTAL

\$ 497,775.92

TIPO DE COMPROBANTE

I - Ingreso

FORMA DE PAGO

99 - Por definir

MÉTODO DE PAGO

PPD - Pago en parcialidades o diferido

MONEDA

MXN - Peso Mexicano

VERSION

4.0

EXPORTACION

01 - No aplica

**SELLO DIGITAL DEL CFDI**

YLZa0RqwuTAo6nztibPZZthOaJVOBX3e1giAKMPCCO00EGB34eE0EZZmrvV5Rilw7ymhUBDTon6UTetQv6w9la/ijsv8T/U2i6DcE7ygC+6IT0ZztFyhpQ1Lhio8VEFID/
Fa+hlmVbV5u9mpI6fmi38BYaCn5QX3NZiCvgmWruTwWIR2JXey6K6ViqSMJIDAb0q2XSMNTbInojr+N7xYwNy0hEvCzuuP6Jm2K+Yc+3ewDW/59a3pbd9HnX4qa
IACDN6ZvEu++Jh0NZYqV2f4b/9MKbHhPMK5p8M7W90H4XonimoT9+dM+mgu0cMA/ANsgLaXB97VQ==

SELLO DIGITAL DEL SAT

dK8VP/QzHVuBa6hgvUvDzqaZms98OoPBrDQE1oQ0mmS5a7l/mf/qqhY48FwaAuzJyYimQqN+XT6LBN5e/Z+EBX0ym4JhE+D9uF7dNo6RAfjm179i3P+G+Cy2x+
c+BthcKG8SiG1L5ouPQ2EJCnsaXXIDpbyQ0VdmM/Tim9+y3pqQaHUGPNKJSvwnyPyvJKsgaHJb/BvhaP2LOEHEHZfIUKISM2R93e4Z+UWmwELv3Zv4tLZ+U
QbXb02qGs1X0V7Z1kQIIVVqsMU2yq6HVxHokfUhbWqVKCYm6F8WBDU8cQx9PuiNINJKALawIdryi1vFiGHA==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

[1.1]2438155A-84AB-4140-A58A-B0B0D14A6159[2025-12-

24T11:43:31]STA0903206B9[YLZa0RqwuTAo6nztibPZZthOaJVOBX3e1giAKMPCCO00EGB34eE0EZZmrvV5Rilw7ymhUBDTon6UTetQv6w9la/ijsv8T/U2i6DcE7ygC
+6IT0ZztFyhpQ1Lhio8VEFID/Fa+hlmVbV5u9mpI6fmi38BYaCn5QX3NZiCvgmWruTwWIR2JXey6K6ViqSMJIDAb0q2XSMNTbInojr+N7xYwNy0hEvCzuuP6Jm2K+Yc
+3ewDW/59a3pbd9HnX4qaIACDN6ZvEu++Jh0NZYqV2f4b/9MKbHhPMK5p8M7W90H4XonimoT9+dM+mgu0cMA/ANsgLaXB97VQ==][00001000000711762511]

Facturar en línea premium® CFDI

Descargue gratis este comprobante

en formato digital .XML ingresando a: fel.blikon.com/xmlPara Facturar en Línea ingresa a: fel.blikon.com

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Página 1 de 1

```
<cfdi:Comprobante xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:cfdi="http://www.sat.gob.mx/cfd/4"
xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/cfd/4 http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/4/cfdv40.xsd" Version="4.0" Folio="540" Fecha="2025-12-
24T10:23:31"
Sello="YLZs08quwTAo8nzhbRZZtHh0e3VOBX3e1giiaKMPCC000EGB34eE0EZZmvr/V5Rilw7ymhURDton6UTetQv6w9Ie/1j9v8T/J2I6DcE7ygC6tT0ZztFyhpQ1Lht08VEFD/Fa+/hlmVb
FormaPago="99" NoCertificado="00001000000719444611"
Certificado="MIIF7zCCA9egAwIBAgIUMDAwMDEwMDAwMDA3MTk0NDQ2MTEwDQYJKoZIhvcNAQELBQAwggVMTUwMwYDVQ0DCyBCyBERUMgU0UgVSVK1DSU8gREUgQUJRN5SU1R5QUJN3T04gVFJ
SubTotal="429117.17" Moneda="MXN" Total="497775.92" TipoDeComprobante="I" Exportacion="01" MetodoPago="PPD" LugarExpedicion="81000">
<cfdi:Emisor Rfc="TRI170712K25" Nombre="TRIDICUT" RegimenFiscal="601"/>
<cfdi:Receptor Rfc="MBA550101214" Nombre="MUNICIPIO DE BADIRAGUATO" DomicilioFiscalReceptor="80500" RegimenFiscalReceptor="603" UsoCFDI="G03"/>
<cfdi:Conceptos>
<cfdi:Concepto ClaveProdServ="72101500" Cantidad="1" ClaveUnidad="E48" Descripcion="PAGO DE ESTIMACION 01 NORMAL DE LA OBRA: CONSTRUCCIÓN DE
PAVIMENTO HIDRAULICO Y ALUMBRADO PUBLICO, ENTRE CALLE LOS PINOS Y CALLE SIN NOMBRE, COLONIA BUENA VISTA, DE LA CABECERA MUNICIPAL DE
BADIRAGUATO, SINALOA. CONTRATO No.: MBGBR-AD-FAISMLN-025/2025. MONTO DEL CONTRATO: $772,196.86 IMPORTE DE LA OBRA EJECUTADA SIN IVA: $660,180.26
MAS I.V.A. 16%: $105,628.84 TOTAL DE LA OBRA EJECUTADA CON IVA: $765,809.10 AMORTIZACION ANTICIPO 35%: $231,063.09 MAS I.V.A.: $36,970.09 TOTAL
AMORTIZACION DE ANTICIPO: $268,033.18 IMPORTE BRUTO A FACTURAR: $429,117.17 MAS I.V.A. A FACTURAR 16%: $68,658.75 MONTO NETO A FACTURAR:
$497,775.92 RETENCION 3% (S.V.I.F. Y C.): $19,805.41 TOTAL DEDUCCIONES: $287,838.59 MONTO LIQUIDO A RECIBIR: $477,970.51"
ValorUnitario="429117.17" Importe="429117.17" ObjetoImp="02">
<cfdi:Impuestos>
<cfdi:Traslados>
<cfdi:Traslado Base="429117.17" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOcuota="0.160000" Importe="68658.75"/>
</cfdi:Traslados>
</cfdi:Impuestos>
</cfdi:Concepto>
</cfdi:Conceptos>
<cfdi:Impuestos TotalImpuestosTrasladados="68658.75">
<cfdi:Traslados>
<cfdi:Traslado Base="429117.17" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOcuota="0.160000" Importe="68658.75"/>
</cfdi:Traslados>
</cfdi:Impuestos>
</cfdi:Comprobante>
<cfdi:TimbreFiscalDigital xmlns:tfd="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital" Version="1.1" RfcProvCertif="STA090320689" UUID="2438155A-84AB-
4140-A52A-B080D14A6159" FechaTimbrado="2025-12-24T11:43:31"
SelloCFD="YLZs08quwTAo8nzhbRZZtHh0e3VOBX3e1giiaKMPCC000EGB34eE0EZZmvr/V5Rilw7ymhURDton6UTetQv6w9Ie/1j9v8T/J2I6DcE7ygC6tT0ZztFyhpQ1Lht08VEFD/Fa-
NoCertificadoSAT="00001000000711762511"
SelloSAT="dtXvVF/GzHvUuBa6hgVvDzqZms9R0s0PB8DQEl0Q0mm5Sa7/lm/+qqhY48FweAuzJ5YyimQqN+XT5LBNSE/Z+EBX9lym4Jhe+D9oF7dNoGRAfJm179t3P+C+Cy2Xn+c+B1hcKl
xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital
http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/TimbreFiscalDigital/TimbreFiscalDigitalv11.xsd"/>
</cfdi:Comprobante>
</cfdi:Comprobante>
```



Fecha: 3 de diciembre de 2025

CARATULA DE ESTIMACIÓN

CONTRATISTA:	TRIDICUT, S.A. DE C.V.	ESTIMACIÓN No:	01 NORMAL
DOMICILIO:	Calle, Degollado S/N Interior 1 C, Entre Calle Hidalgo y Calle Colon Colonia: Centro, Guasave, Sinaloa, C.P. 8100	PERIODO DE ESTIMACION:	
TELÉFONO:	CEL:	DEL	18-nov-25
6871209727	6871250834	AL	02-dic-25
R.F.C.		FECHA DE CONTRATO:	
TRI-170712-K25			17-nov-25
DEPENDENCIA:-			

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA.

LOCALIDAD:	MUNICIPIO:	PERIODO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO:
CABECERA MUNICIPAL	BADIRAGUATO	INICIO: 18-nov-25
		TERMINACIÓN: 02-dic-25

DESCRIPCIÓN:

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO Y ALUMBRADO PÚBLICO, ENTRE CALLE LOS PINOS Y CALLE SIN NOMBRE, COLONIA BUENA VISTA, DE LA CABECERA MUNICIPAL DE BADIRAGUATO, SINALOA.

CONTRATO No:

MBGBR-AD-FAISMUN-025/2025

IMPORTE SIN IVA DE LA OBRA	IMPORTE CON IVA DE LA OBRA	35% ANTICIPO DE LA OBRA	IMPORTE TOTAL DE CONTRATO:
\$665,686.95	\$772,196.86	\$270,268.90	\$772,196.86

RECIBI DEL H. AYUNTAMIENTO DE BADIRAGUATO: BUENO POR: \$ 477,970.51


\$ 477,970.51 (SON CUATROCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS SETENTA PESOS 51/100 M.N.)

EN PAGO DE ESTIMACIÓN: 01 NORMAL

DEDUCCIONES:		CALCULO DE ESTIMACIÓN	
AMORTIZACIÓN ANTICIPO 35%	\$ 231,063.09	IMPORTE DE LA OBRA EJECUTADA SIN IVA	\$ 660,180.26
MAS I.V.A..	\$ 36,970.09	MAS I.V.A 16 %	\$ 105,628.84
TOTAL AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO:	\$ 268,033.18	TOTAL DE LA OBRA EJECUTADA CON IVA	\$ 765,809.10
3 % SVIFYC:	\$ 19,805.41	MENOS TOTAL DEDUCCIONES:	\$ 287,838.59
TOTAL DEDUCCIONES:	\$ 287,838.59	MONTO A FACTURAR CON IVA	\$ 497,775.92

SALDO A PAGAR: \$ 477,970.51

ELABORO


 JOSE CARLOS JUSAVIRO MONTOYA CASTRO
 REPRESENTANTE LEGAL

REVISOR


 ING. JOSÉ R. CONTRERAS LÓPEZ
 COORDINADOR DE PRESUPUESTOS Y COSTOS

AUTORIZO.


 ING. RUBIEL RINCÓN RAMOS
 DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS
 DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA



DEPENDENCIA

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS,
DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA.

Control de Estimaciones

TRIDICUT, S.A. DE C.V.


CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO Y ALUMBRADO PÚBLICO, ENTRE CALLE LOS PINOS Y CALLE SIN NOMBRE, COLONIA BUENA VISTA, DE LA CABECERA MUNICIPAL DE BADIAGUATO, SINALOA.			Fecha:		Estimacion:		
			3 de diciembre de 2025		01 NORMAL		
Periodo de la estimacion:	18/11/2025	02/12/2025	Localidad:		No. De contrato:		
Periodo de Ejecución:	18/11/2025	02/12/2025	CABECERA MUNICIPAL		MBGBR-AD-FAISMUN-025/2025		
Importe del contrato con I.V.A:		Imp. Contratado sin I.V.A		Anticipo		Importe Anticipo sin I.V.A	% de Avance
\$ 772,196.86		\$ 665,686.95		\$ 270,268.90		\$ 232,990.43	99%
							% Avance Total
							99%

Control Del Anticipo	Liquidacion de Estimacion		Control de Estimacion
AMORTIZA ESTA ESTIMACION	Importe de la Estimacion (+)	\$ 660,180.26	ESTA ESTIMACION
	16 % I.V.A (+)	\$ 105,628.84	
\$ 268,033.19	Sub- Total A (=)	\$ 765,809.10	\$ 765,809.10
	Amortizacion Anticipo	\$ 231,063.09	
AMORTIZACION ANTERIOR	16 % I.V.A (+)	\$ 36,970.09	ACUMULADO ANTERIOR
\$ -	Total (=)	\$ 268,033.18	\$ -
	Importe TOTAL	\$ 429,117.17	
TOTAL AMORTIZADO	16 % I.V.A (+)	\$ 68,658.75	TOTAL ACUMULADO.
\$ 268,033.19	Total (=)	\$ 497,775.92	\$ 765,809.10
	3 % SVIFYC:	\$ 19,805.41	
ANTICIPO OTORGADO	Total Deducciones (=)	\$ 287,838.59	CONTRATADO
\$ 270,268.90	Importe T O T A L	\$ 477,970.51	\$ 772,196.86
	NETO A PAGAR		
SALDO DEL ANTICIPO	\$ 477,970.51		SALDO
\$2,235.71	Son:		\$ 6,387.76
	(SON CUATROCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS SETENTA PESOS 51/100 M.N.)		

ELABORADO
JOSE CARLOS J MONTOYA C
REPRESENTANTE LEGAL

REVISADO
ING JOSÉ R CONTRERAS LÓPEZ
COORDINADOR DE PRESUPUESTOS Y COSTOS

AUTORIZADO
ING RUBIEL RINCÓN RAMOS
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS
DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA



100

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA.

R.F.C. TRI-170712-K25

	LOCALIDAD:	CABECERA MUNICIPAL	ESTIMACIÓN:	01 NORMAL
DESCRIPCIÓN:	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO Y ALUMBRADO PÚBLICO, ENTRE CALLE LOS PINOS Y CALLE SIN NOMBRE, COLONIA BUENA VISTA, DE LA CABECERA MUNICIPAL DE BADIRAGUATO, SINALOA.			

FECHA INICIO	18-nov-25	FECHA TERMINACION	02-dic-25	CONTRATO:	MBGBR-AD-FAISMUN-025/2025	FECHA CONTRATO:	17-nov-25
--------------	-----------	-------------------	-----------	-----------	---------------------------	-----------------	-----------

No. DE ESTIMACIÓN		PERIODO	IMPORTE C/IVA ESTIMACIÓN	IMPORTE SIN IVA	3 % SVIFYC:	AMORTIZACIÓN ANTICIPO	TOTAL DEDUCCIONES	LIQUIDO A PAGAR
IMPORTE DE OBRA SIN IVA:		\$665,686.95	CLAVE DE CONVENIO ADICIONAL:					
IMPORTE DE ANTICIPO DE OBRA:		\$270,268.90	PERIODO CONVENIO ADICIONAL:					
IMPORTE TOTAL DE CONTRATO:		\$772,196.86	IMPORTE CONVENIO ADICIONAL:					
01 NORMAL		18-nov-25	02-dic-25	\$ 765,809.10	\$ 660,180.26	\$ 19,805.41	\$ 268,033.19	\$ 477,970.50
TOTALES:				\$ 765,809.10	\$ 660,180.26	\$ 19,805.41	\$ 268,033.19	\$ 477,970.50
		SALDO DEL CONTRATO:		\$ 6,387.76	SALDO POR AMORTIZAR:		\$ 2,235.71	

REVISOR

AUTORIZO.-

ING. JOSÉ R. CONTRERAS LÓPEZ
COORDINADOR DE PRESUPUESTOS Y COSTOS

ING. RUBIEL RINCÓN RAMOS
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS
DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA.



FECHA 3 de diciembre de 2025

CONTRATISTA:

TRIDICUT, S.A. DE C.V.

DEPENDENCIA:

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA.

DOMICILIO: Calle, Degollado S/N interior 1 C, Entre Calle Hidalgo y Calle Colon

R.F.C. TRI-170712-K25

RESÚMEN DE ESTIMACIÓN

	LOCALIDAD: CABECERA MUNICIPAL	ESTIMACIÓN: 01 NORMAL
DESCRIPCIÓN:	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO Y ALUMBRADO PÚBLICO, ENTRE CALLE LOS PINOS Y CALLE SIN NOMBRE, COLONIA BUENA VISTA, DE LA CABECERA MUNICIPAL DE BADIRAGUATO, SINALOA.	

IMPORTE DE OBRA SIN IVA:	\$ 665,686.95
IMPORTE DE ANTICIPO DE OBRA:	\$ 270,268.90
IMPORTE TOTAL DE CONTRATO:	\$ 772,196.86

DESTAJO		IMPORTE
1	PRELIMINARES	\$ 236,164.45
2	ESTRUCTURA	\$ 353,176.72
3	INSTALACIONES ESPECIALES	\$ 62,005.33
4	TRABAJOS FINALES	\$ 8,833.76
SUBTOTAL ESTIMACIÓN:		\$ 660,180.26

SUB TOTAL=	\$ 660,180.26
I.V.A AL 16 %	\$ 105,628.84
TOTAL =	\$ 765,809.10

ELABORO


 JOSE CARLOS JUSAVIRO MONTOYA CASTRO
 REPRESENTANTE LEGAL

REVISO


 ING. JOSE R. CONTRERAS LÓPEZ
 COORDINADOR DE PRESUPUESTOS Y COSTOS

AUTORIZO.-


 ING. RUBIEL RINCÓN RAMOS
 DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS
 DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA.

CONTRATISTA:		TRIDICUT, S.A. DE C.V.			DEPENDENCIA:		DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA.			FECHA		03/12/2025	
DOMICILIO:		Calle, Degollado S/N Interior 1 C, Entre Calle Hidalgo y Calle Colon Colonía: Centro, Guasave, Sinaloa. C.P. 8100					R.F.C.		TRI-170712-K25		1 de 4		
DESGLÓSE DE CONCEPTOS DE ESTIMACIÓN													
DESCRIPCIÓN:		LOCALIDAD:		CABECERA MUNICIPAL		ESTIMACIÓN:		01 NORMAL					
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO Y ALUMBRADO PÚBLICO, ENTRE CALLE LOS PINOS Y CALLE SIN NOMBRE, COLONIA BUENA VISTA, DE LA CABECERA MUNICIPAL DE BADIRAGUATO, SINALOA.		IMPORTE DE ANTICIPO DE OBRA:		\$270,268.90		IMPORTE TOTAL DE CONTRATO:		\$772,196.86					
IMPORTE DE OBRA SIN IVA:		\$665,686.95											
CLAVE		CONCEPTO		UNIDAD		CANT		P.U.		VOLUMEN TOTAL		HASTA ESTIM ANTERIOR	
EXCEDENTE										DE ESTA ESTIMACIÓN		IMPORTE	
1 PRELIMINARES													
GP01		TRAZO Y NIVELACIÓN DEL TERRENO ESTABLECIENDO EJES Y NIVELETAS DE REFERENCIA, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.		M2		434.00		\$ 15.58		\$ 6,761.72		434.00 \$ 6,761.72	
GP02		EXCAVACIONES EN CORTES Y ADICIONALES BAJO LA SUB RASANTE EN CUALQUIER TIPO DE MATERIAL EXISTENTE, EXCEPTO ROCA FLUA, CON EQUIPO MECÁNICO, INCLUYE: CARGA CON MÁQUINA DEL MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN Y ACARREOS FUERA DE LA OBRA, MEDIDO COMPACTO.		M3		174.25		\$ 133.09		\$ 23,190.93		174.25 \$ 23,190.93	
GP05		COMPACTACIÓN DE TERRENO NATURAL EN AREA DE DESPLANTE, INCLUYE: ESCARIFICADO E INCORPORACIÓN DE HUMEDAD AL 90%, INCLUYE MANO DE OBRA Y MATERIAL.		M2		316.82		\$ 37.61		\$ 11,915.60		316.82 \$ 11,915.60	
GBR500		MEJORAMIENTO DE TERRENO CON CAPA DE 20 CM DE MATERIAL BALASTRE, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIAL BALASTRE CON CARGA Y ACARREO AL 1ER KM. MEDIDO COMPACTO, PRUEBAS DE LABORATORIO DE CALIDAD DE MATERIALES.		M2		316.82		\$ 176.17		\$ 55,814.18		316.82 \$ 55,814.18	
GP255		SUB-BASE COMPACTO INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIAL DE SUB-BASE CON CARGA Y ACARREO AL 1ER KM. MEDIDO COMPACTO, COMPACTACIÓN AL 100 % PRUEBA AASTHO MOD., PRUEBAS DE LABORATORIO DE CALIDAD DE MATERIALES.		M2		316.82		\$ 185.71		\$ 58,836.64		316.82 \$ 58,836.64	
GP25		MATERIAL BASE COMPACTADA AL 100 % DE SU PESO VOLUMÉTRICO, INCLUYE: SUMINISTRO DEL AGREGADO, ACARREO, COMPACTACIÓN, PRUEBA DE LABORATORIO Y TODO LO NECESARIO PARA SU TERMINACIÓN.		M2		316.82		\$ 212.07		\$ 67,188.02		316.82 \$ 67,188.02	
GP06		RIEGO DE IMPREGNACIÓN CON EMULSIÓN CATIONICA ECH 60, A RAZÓN DE 1.50 A 1.8 L7M2 O POLIETILENO NEGRO CALIBRE 14, INCLUYE: ARENEO, APLICACIÓN, ALMACENAMIENTO, CALENTAMIENTO, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.		M2		316.82		\$ 39.32		\$ 12,457.36		316.82 \$ 12,457.36	

ELABORÓ
[Firma]
JOSE CARLOS J. MONTTOYA C
REPRESENTANTE LEGAL

REVISÓ
[Firma]
ING JOSÉ R. CONTRERAS LÓPEZ
COORDINADOR DE PRESUPUESTOS Y COSTOS

AUTORIZÓ
[Firma]
ING RUBIEL RINCON RAMOS
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS,
DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA

DESGLÓSE



CONTRATISTA:	TRIDICUT, S.A. DE C.V.	DEPENDENCIA:	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA.	FECHA:	03/12/2025
DOMICILIO:	Calle. Degollado S/N Interior 1 C, Entre Calle Hidalgo y Calle Colon Colonia: Centro, Guasave, Sinaloa. C.P. 8100	R.F.C.	TRI-170712-K25	2 de 4	

DESGLÓSE DE CONCEPTOS DE ESTIMACIÓN

DESCRIPCIÓN:	CONCEPTO	UNIDAD	SEGUN PROYECTO			VOLUMEN TOTAL	HASTA ESTIM ANTERIOR	EXCEDENTE	DE ESTA ESTIMACIÓN	IMPORTE
			CANT	P.U.	TOTAL					
IMPORTE DE OBRA SIN IVA:	\$665,686.95									\$772,198.86
IMPORTE DE ANTICIPO DE OBRA:	\$270,268.90									
CLAVE	2	ESTRUCTURA								
GP08	GUARNICIÓN TIPO "L" DE 15X30X60 DE CONCRETO PREMEZCLADO DE F'C= 250 KG/CM2, INCLUYE: CIMBRA Y DESIMBRA, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, MANIOBRAS LOCALES Y TODO LO NECESARIO PARA SU TERMINACIÓN.	ML	80.80	\$	719.19 \$	58,110.55	0.00	0.00	79.99 \$	57,528.01
GP088	PATIN DE 15X60 DE CONCRETO PREMEZCLADO DE F'C= 250 KG/CM2, INCLUYE: CIMBRA Y DESIMBRA, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, MANIOBRAS LOCALES Y TODO LO NECESARIO PARA SU TERMINACIÓN.	ML	6.00	\$	624.05 \$	3,744.30	0.00	0.00	6.00 \$	3,744.30
GP109	LOSA DE CONCRETO DE 15 CMS DE ESPESOR CON CONCRETO PREMEZCLADO F'C=300 KG/CM". INCLUYE: MANO DE OBRA, MATERIALES, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	M2	264.74	\$	839.01 \$	222,119.51	0.00	0.00	263.47 \$	221,053.96
GP133	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONTRA JUNTA DE PVC TIPO C-3 PARA LOSAS DE 15 CM. EN PAVIMENTOS, INCLUYE: TRAZO, ALINEACIÓN, HINGADO Y REMOCIÓN DE TAPA.	ML	136.40	\$	32.67 \$	4,456.19	0.00	0.00	119.46 \$	3,902.76
GP13	CALAFATEO EN LOSAS DE CONCRETO HIDRÁULICO CON ASFALTEX 505, INCLUYE: UN RIEGO CON EMULTEX T.P. (PRIMER), UN RIEGO DE ASFALTEX 505 Y BARRIDO DE LA SUPERFICIE.	ML	130.20	\$	33.75 \$	4,394.25	0.00	0.00	128.87 \$	4,349.36
GP15	SUMINISTRO, HABILITADO Y COLOCACIÓN DE ACERO DE REFUERZO LISO EN PASAJUNTAS DE 5/8" DE DIÁMETRO, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	ML	43.40	\$	77.12 \$	3,347.01	0.00	0.00	43.40 \$	3,347.01
GP11	PINTURA EN GUARNICIÓN DE 20 X 15 CM. CON PINTURA TIPO TRAFICO SCT COLOR AMARILLO O BLANCO, CON USO DE MAQUINA PINTARRAYAS. INCLUYE: PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, MATERIAL, MANO DE OBRA CALIFICADA Y EQUIPO ADECUADO.	ML	80.80	\$	81.89 \$	6,616.71	0.00	0.00	79.99 \$	6,550.38

ELABORÓ
JOSE CARLOS J. MONTTOYA C
REPRESENTANTE LEGAL

REVISÓ
ING. JOSÉ R. CONTRERAS LÓPEZ
COORDINADOR DE PRESUPUESTOS Y COSTOS

AUTORIZO
ING. RUBIEL RINCON RAMOS
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS,
DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA



DESGLOSE

CONTRATISTA:		TRIDICUT, S.A. DE C.V.		DEPENDENCIA:		DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA.				FECHA		03/12/2020			
DOMICILIO:		Calle, Degollado S/N Interior 1 C, Entre Calle Hidalgo y Calle Colon Coloniza: Centro, Guasave, Sinaloa. C.P. 8100				R.F.C.		TRL-170712-K25		3 de 4					
DESGLOSE DE CONCEPTOS DE ESTIMACIÓN															
DESCRIPCIÓN:		CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO Y ALUMBRADO PÚBLICO, ENTRE CALLE LOS PINOS Y CALLE SIN NOMBRE, COLONIA BUENA VISTA, DE LA CABECERA MUNICIPAL DE BADIRAGUATO, SINALOA.				LOCALIDAD:		CABECERA MUNICIPAL		ESTIMACIÓN:		01 NORMAL			
IMPORTE DE OBRA SIN IVA:		\$665,686.95		IMPORTE DE ANTICIPO DE OBRA:		\$270,268.90		IMPORTE TOTAL DE CONTRATO:						\$772,196.86	
CLAVE		CONCEPTO		UNIDAD	CANT	SEGUN PROYECTO		VOLUMEN TOTAL	HASTA ESTIM ANTERIOR	EXCEDENTE	DE ESTA ESTIMACIÓN	IMPORTE			
						P.U.		TOTAL							
GP26		RELLENO EN BANQUETAS CON MATERIAL INERTE COMPACTADO PARA EL 95% CON PLACA VIBRATORIA EN CAPAS NO MAYORES DE 20 CMS, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIAL, AGUA PARA OBTENER LA HUMEDAD OPTIMA DE COMPACTACIÓN, TENDIDO EN CAPAS, ACARREOS, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.		M3	23.44	\$	160.09	\$	3,752.51	23.44	0.00	23.44	\$	3,752.51	
GP10		BANQUETA DE 10 CMS DE ESPESOR CONCRETO PREMEZCLADO CON F'C=150 KG/CM2 T.M.A. 3/4", ACABADO ESCOBILLADO, INCLUYE: TRAZO Y NIVELACIÓN, CIMBRA, COLADO DE CONCRETO, CURADO, VOLTEADOR PERIMETRAL Y LIMPIEZA DE FORMAS.		M2	117.18	\$	417.72	\$	48,948.43	117.18	0.00	117.18	\$	48,948.43	
3		INSTALACIONES ESPECIALES													
GP20		POLIDUCTO NARANJA REFORZADO DE 1-1/4" DE DIÁMETRO, INCLUYE: EXCAVACIÓN EN ZANJA EN TERRENO TIPO B, RELLENO CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.		ML	39.40	\$	160.42	\$	6,320.55	30.46	0.00	30.46	\$	4,886.39	
GP21		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE XLP DS AL 3 CAL, 6 AWG, 600 VOLTS, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.		ML	48.40	\$	117.79	\$	5,701.04	33.46	0.00	33.46	\$	3,941.25	
GP22		SISTEMA DE TIERRA PARA FINAL DE CIRCUITO, INCLUYE: VARILLA PARA TIERRA 5/8" x 1.50 m. CONECTOR PARA VARILLA DE TIERRA MECANICO, SOLDADURA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.		PZA	1.00	\$	1,194.74	\$	1,194.74	1.00	0.00	1.00	\$	1,194.74	

ELABORÓ:
JOSE CARLOS J MONTTOYA C
REPRESENTANTE LEGAL

REVISÓ:
ING JOSÉ R CONTRERAS LÓPEZ
COORDINADOR DE PRESUPUESTOS Y COSTOS

AUTORIZO:
ING RUBÉN RINCON RAMOS
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS,
DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA

CONTRATISTA:		TRIDICUT, S.A. DE C.V.		DEPENDENCIA:		DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA.				FECHA		03/12/2025	
DOMICILIO:		Calle, Degollado S/N Interior 1 C, Entre Calle Hidalgo y Calle Colon Colonia: Centro, Guasave, Sinaloa, C.P. 8100				R.F.C.		TRI-170712-K25		4 de 4			
DESGLOSE DE CONCEPTOS DE ESTIMACIÓN													
DESCRIPCIÓN:		LOCALIDAD:		CABECERA MUNICIPAL		ESTIMACIÓN:		01 NORMAL					
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO Y ALUMBRADO PÚBLICO, ENTRE CALLE LOS PINOS Y CALLE SIN NOMBRE, COLONIA BUENA VISTA, DE LA CABECERA MUNICIPAL DE BADIRAGUATO, SINALOA.		IMPORTE DE ANTICIPO DE OBRA:		\$270,268.90		IMPORTE TOTAL DE CONTRATO:		\$772,196.86					
IMPORTE DE OBRA SIN IVA:		\$665,686.95											
CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANT	SEGUN PROYECTO		VOLUMEN TOTAL	HASTA ESTIM ANTERIOR	EXCEDENTE	DE ESTA ESTIMACIÓN	IMPORTE			
					P.U.	TOTAL							
GP23	LUMINARIA VIAL LED TECNOLOGÍA FLR MODELO FORLEXA 3, FABRICADA EN ALUMINIO PURO INYECTADO MEDIDAS 720X308X93 MM, PROTECCIÓN IP66/IK08, CON TRES MÓDULOS (48 LEDS) POTENCIA DE 106 - 150 WATTS, EFICIENCIA LUMINOSA DE 110 LM/W, CON DRIVER PROGRAMABLE PHILIPS DE 120-277 V., INCLUYE: BASE DE CONCRETO PIRAMIDAL DE 0.30X0.70X0.90 M., POSTE CONICO DE FIERRO DE 8.00 M. DE ALTURA, BRAZO DE 2.40 M. DE FIERRO, LAMPARA COMPLETA, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	2.00	\$	23,511.81	\$ 47,023.62	0.00	0.00	2.00	\$ 47,023.62			
GP24	REGISTRO PREFABRICADO DE CONCRETO DE 40X40X40 CM CON TAPA DE CONCRETO DE 6 CM DE ESPESOR, CON MARCO DE FIERRO GALVANIZADO DE 1 1/2"x1 1/2"x1/8" CONTRAMARCO DE ANGULO DE 1 1/4"x 1 1/4"x1/8". INCLUYE: SUMINISTRO, COLOCACIÓN, EXCAVACIÓN, RELLENO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	PZA	3.00	\$	1,219.83	\$ 3,659.49	0.00	0.00	3.00	\$ 3,659.49			
GP30	INTERCONEXION A RED ELECTRICA INCLUYE MATERIAL MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	1.00	\$	1,299.84	\$ 1,299.84	0.00	0.00	1.00	\$ 1,299.84			
4	TRABAJOS FINALES												
GBR671	LETRERO INFORMATIVO ALUSIVO A LA OBRA FABRICADO CON PTR VER PLANO, INCLUYE: INFORMACIÓN DE LA OBRA, PATAS DE METAL COLADA CON CONCRETO HECHO EN OBRA DE F'C=150 KG/CM2, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	1.00	\$	4,771.52	\$ 4,771.52	0.00	0.00	1.00	\$ 4,771.52			
GP101	LIMPIEZA DE OBRA. INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	M2	434.00	\$	9.36	\$ 4,062.24	0.00	0.00	434.00	\$ 4,062.24			



VOLUMENES GENERADORES

CONTRATISTA:

TRIDICUT, S.A. DE C.V.

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO Y ALUMBRADO PÚBLICO, ENTRE CALLE LOS PINOS Y CALLE SIN NOMBRE, COLONIA BUENA VISTA, DE LA CABECERA MUNICIPAL DE BADIRAGUATO, SINALOA.

ESTIMACION

01 NORMAL

R.F.C. TRI-170712-K25

CLAVE	CONCEPTO	LOCALIZACIÓN		UNIDAD	LARGO	ANCHO	ALTO	PZA	TOTAL	OBSERVACIONES
		EJE	TRAMO							
1	PRELIMINARES									
GP01	TRAZO Y NIVELACIÓN DEL TERRENO ESTABLECIENDO EJES Y NIVELETAS DE REFERENCIA, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.			M2	39.91	10.18		1.00	406.28	
					11.13	2.86		1.00	32.07	AREA IRREGULAR
								TOTAL	438.35	
								A COBRAR	434.00	
								RESTANTES	4.35	
GP02	EXCAVACIONES EN CORTES Y ADICIONALES BAJO LA SUB-RASANTE EN CUALQUIER TIPO DE MATERIAL EXISTENTE, EXCEPTO ROCA FIJA, CON EQUIPO MECÁNICO, INCLUYE: CARGA CON MÁQUINA DEL MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN Y ACARREOS FUERA DE LA OBRA, MEDIDO COMPACTO.			M3	39.91	7.30	0.65	1.00	189.37	
					9.13	2.86	0.65	1.00	16.56	AREA IRREGULAR
								TOTAL	205.93	
								A COBRAR	174.25	
								RESTANTES	31.68	
GP05	COMPACTACIÓN DE TERRENO NATURAL EN AREA DE DESPLANTE, INCLUYE: ESCARIFICADO E INCORPORACIÓN DE HUMEDAD AL 90%, INCLUYE MANO DE OBRA Y MATERIAL.			M2	39.91	7.30		1.00	291.34	
					9.13	2.86		1.00	25.48	AREA IRREGULAR
								TOTAL	316.82	
GBR500	MEJORAMIENTO DE TERRENO CON CAPA DE 20 CM DE MATERIAL BALASTRE, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIAL BALASTRE CON CARGA Y ACARREO AL 1ER KM. MEDIDO COMPACTO, PRUEBAS DE LABORATORIO DE CALIDAD DE MATERIALES.			M2	39.91	7.30		1.00	291.34	
					9.13	2.86		1.00	25.48	
								TOTAL	316.82	
GP255	SUB-BASE COMPACTO INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIAL DE SUB-BASE CON CARGA Y ACARREO AL 1ER KM. MEDIDO COMPACTO, COMPACTACIÓN AL 100 % PRUEBA AASTHO MOD., PRUEBAS DE LABORATORIO DE CALIDAD DE MATERIALES.			M2	39.91	7.30		1.00	291.34	
					9.13	2.86		1.00	25.48	
								TOTAL	316.82	
GP25	MATERIAL BASE COMPACTADA AL 100 % DE SU PESO VOLUMÉTRICO, INCLUYE: SUMINISTRO DEL AGREGADO, ACARREO, COMPACTACIÓN, PRUEBA DE LABORATORIO Y TODO LO NECESARIO PARA SU TERMINACIÓN.			M2	39.91	7.30		1.00	291.34	
					9.13	2.86		1.00	25.48	
								TOTAL	316.82	
GP06	RIEGO DE IMPREGNACIÓN CON EMULSIÓN CATIONICA ECI-60, A RAZÓN DE 1.50 A 1.8 LT/M2 O POLIETILENO NEGRO CALIBRE 14, INCLUYE: ARENEO, APLICACIÓN, ALMACENAMIENTO, CALENTAMIENTO, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.			M2	39.91	7.30		1.00	291.34	
					9.13	2.86		1.00	25.48	
								TOTAL	316.82	

ELABORO-

JOSE CARLOS JUSAVIRO MONTOYA CASTRO
REPRESENTANTE LEGAL

REVISO-

SUPERVISOR DE OBRA

ING. RUBIEL RINCÓN RAMOS
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS
DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA.



VOLUMENES GENERADORES

CONTRATISTA:

TRIDICUT, S.A. DE C.V.

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO Y ALUMBRADO PÚBLICO, ENTRE CALLE LOS PINOS Y CALLE SIN NOMBRE, COLONIA BUENA VISTA, DE LA CABECERA MUNICIPAL DE BADIRAGUATO, SINALOA.

ESTIMACION

01 NORMAL

R.E.C. TRI-170712-K25

CLAVE	CONCEPTO	LOCALIZACION		UNIDAD	LARGO	ANCHO	ALTO	PZA	TOTAL	OBSERVACIONES
		EJE	TRAMO							
2	ESTRUCTURA									
GP08	GUARNICIÓN TIPO "L" DE 15X30X60 DE CONCRETO PREMEZCLADO DE F'C= 250 KG/CM2, INCLUYE: CIMBRA Y DESIMBRA, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, MANIOBRAS LOCALES Y TODO LO NECESARIO PARA SU TERMINACIÓN.			ML	14.50			1.00	14.50	
					20.00			1.00	20.00	
					3.02			1.00	3.02	
					39.30			1.00	39.30	
					3.17			1.00	3.17	
								TOTAL	79.99	
GP088	PATIN DE 15X60 DE CONCRETO PREMEZCLADO DE F'C= 250 KG/CM2, INCLUYE: CIMBRA Y DESIMBRA, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, MANIOBRAS LOCALES Y TODO LO NECESARIO PARA SU TERMINACIÓN.			ML	4.50			1.00	4.50	
					1.00			1.00	1.00	
					0.70			1.00	0.70	
								TOTAL	6.20	
								A COBRAR	6.00	
								RESTANTE	0.20	
GP109	LOSA DE CONCRETO DE 15 CMS DE ESPESOR CON CONCRETO PREMEZCLADO F'C=300 KG/CM", INCLUYE: MANO DE OBRA, MATERIALES, HERRAMIENTA Y EQUIPO.			M2	39.91	6.10		1.00	243.45	
					7.88	2.86		1.00	20.02	
								TOTAL	263.47	
GP133	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONTRA JUNTA DE PVC TIPO C-3 PARA LOSAS DE 15 CM. EN PAVIMENTOS, INCLUYE: TRAZO, ALINEACIÓN, HINCADO Y REMOCIÓN DE TAPA.			ML	39.91	6.10		17.00	103.70	
					2.86	7.88		2.00	15.76	
								TOTAL	119.46	
GP13	CALAFATEO EN LOSAS DE CONCRETO HIDRÁULICO CON ASFALTEX 505, INCLUYE: UN RIEGO CON EMULTEX T.P. (PRIMER), UN RIEGO DE ASFALTEX 505 Y BARRIDO DE LA SUPERFICIE.			ML	42.92			1.00	42.92	LADO IZQUIERDO
					42.87			1.00	42.87	CENTRAL
					43.08			1.00	43.08	LADO DERECHO
								TOTAL	128.87	
GP15	SUMINISTRO, HABILITADO Y COLOCACIÓN DE ACERO DE REFUERZO LISO EN PASAJUNTAS DE 5/8" DE DIAMETRO, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.			ML	43.40			1.00	43.40	
								TOTAL	43.40	
GP11	PINTURA EN GUARNICIÓN DE 20 X 15 CM. CON PINTURA TIPO TRÁFICO SCT COLOR AMARILLO O BLANCO, CON USO DE MAQUINA PINTARRAYAS, INCLUYE: PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, MATERIAL, MANO DE OBRA CALIFICADA Y EQUIPO ADECUADO.			ML	14.50			1.00	14.50	
					20.00			1.00	20.00	
					3.02			1.00	3.02	
					39.30			1.00	39.30	
					3.17			1.00	3.17	
								TOTAL	79.99	

ELABORO.-


JOSE CARLOS JUSAVIRIO MONTOYA CASTRO
REPRESENTANTE LEGAL

REVISO.-


SUPERVISOR DE OBRA

AUTORIZO.-


ING. RUBIEL RINCÓN RAMOS
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS
DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA.



VOLUMENES GENERADORES

CONTRATISTA:				CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO Y ALUMBRADO PÚBLICO, ENTRE CALLE LOS PINOS Y CALLE SIN NOMBRE, COLONIA BUENA VISTA, DE LA CABECERA MUNICIPAL DE BADIRAGUATO, SINALOA.						ESTIMACION
TRIDICUT, S.A. DE C.V.										01 NORMAL
R.F.C. TRI-170712-K25										
CLAVE	CONCEPTO	LOCALIZACIÓN		UNIDAD	LARGO	ANCHO	ALTO	PZA	TOTAL	OBSERVACIONES
		EJE	TRAMO							
GP26	RELLENO EN BANQUETAS CON MATERIAL INERTE COMPACTADO PARA EL 95% CON PLACA VIBRATORIA EN CAPAS NO MAYORES DE 20 CMS, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIAL, AGUA PARA OBTENER LA HUMEDAD ÓPTIMA DE COMPACTACIÓN, TENDIDO EN CAPAS, ACARREOS, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.			M3	39.91	1.45	0.20	1.00	11.50	
					3.02	1.45	0.20	1.00	0.80	
					40.00	1.45	0.20	1.00	11.20	
					3.17	1.45	0.20	1.00	0.78	
								TOTAL	24.28	
								A COBRAR	23.44	
								RESTANTE	0.84	
GP10	BANQUETA DE 10 CMS DE ESPESOR CONCRETO PREMEZCLADO CON F'C=150 KG/CM2 T.M.A. 3/4", ACABADO ESCOBILLADO, INCLUYE: TRAZO Y NIVELACIÓN, CIMBRA, COLADO DE CONCRETO, CURADO, VOLTEADOR PERIMETRAL Y LIMPIEZA DE FORMAS.			M2	39.91	1.45		1.00	57.51	
					3.02	1.45		1.00	4.38	
					0.80	0.80		-3.00	-1.92	
					40.00	1.45		1.00	58.00	
					3.17	1.45		1.00	3.91	
								TOTAL	119.88	
								A COBRAR	117.16	
								RESTANTE	2.70	
3	INSTALACIONES ESPECIALES									
GP20	POLIDUCTO NARANJA REFORZADO DE 1-1/4" DE DIÁMETRO, INCLUYE: EXCAVACIÓN EN ZANJA EN TERRENO TIPO B, RELLENO CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.			ML	30.46			1.00	30.46	
								TOTAL	30.46	
GP21	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE XLP DS AL 3 CAL. 6 AWG, 600 VOLTS, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.			ML	30.46			1.00	30.46	
					1.00			3.00	3.00	REGISTROS
								TOTAL	33.46	
GP22	SISTEMA DE TIERRA PARA FINAL DE CIRCUITO, INCLUYE: VARILLA PARA TIERRA 5/8" x 1.50 m, CONECTOR PARA VARILLA DE TIERRA MECANICO, SOLDADURA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.			PZA				1.00	1.00	
								TOTAL	1.00	
GP23	LUMINARIA VIAL LED TECNOLOGÍA FLR MODELO FORLEXA 3, FABRICADA EN ALUMINIO PURO INYECTADO MEDIDAS 720X308X93 MM, PROTECCIÓN IP66/IK08, CON TRES MÓDULOS (48 LEDS) POTENCIA DE 106 - 150 WATTS, EFICIENCIA LUMINOSA DE 110 LMW, CON DRIVER PROGRAMABLE PHILIPS DE 120-277 V., INCLUYE: BASE DE CONCRETO PIRAMIDAL DE 0.30X0.70X0.90 M., POSTE CÓNICO DE FIERRO DE 8.00 M. DE ALTURA, BRAZO DE 2.40 M. DE FIERRO, LAMPARA COMPLETA, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.			PZA				2.00	2.00	
								TOTAL	2.00	

ELABORO.-

JOSE CARLOS JUSAVIRO MONTOYA CASTRO
REPRESENTANTE LEGAL

REVISO.-

SUPERVISOR DE OBRA

AUTORIZO.-

ING. RUBIEL RINCÓN RAMOS
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS
DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA.



VOLUMENES GENERADORES

CONTRATISTA:		CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO Y ALUMBRADO PÚBLICO, ENTRE CALLE LOS PINOS Y CALLE SIN NOMBRE, COLONIA BUENA VISTA, DE LA CABECERA MUNICIPAL DE BADIRAGUATO, SINALOA.								ESTIMACION
TRIDICUT, S.A. DE C.V.										01 NORMAL
R.F.C. TRI-170712-K25										
CLAVE	CONCEPTO	LOCALIZACION		UNIDAD	LARGO	ANCHO	ALTO	PZA	TOTAL	OBSERVACIONES
		EJE	TRAMO							
GP24	REGISTRO PREFABRICADO DE CONCRETO DE 40X40X40 CM CON TAPA DE CONCRETO DE 6 CM DE ESPESOR, CON MARCO DE FIERRO GALVANIZADO DE 1 1/2"X1 1/2"X1/8" CONTRAMARCO DE ÁNGULO DE 1 1/4"X 1 1/4"X1/8", INCLUYE: SUMINISTRO, COLOCACIÓN, EXCAVACIÓN, RELLENO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.			PZA				3.00	3.00	
								TOTAL	3.00	
GP30	INTERCONEXION A RED ELECTRICA INCLUYE MATERIAL MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.			PZA				1.00	1.00	
								TOTAL	1.00	
4	TRABAJOS FINALES									
GBR671	LETRERO INFORMATIVO ALUSIVO A LA OBRA FABRICADO CON PTR VER PLANO, INCLUYE: INFORMACIÓN DE LA OBRA, PATAS DE METAL COLADA CON CONCRETO HECHO EN OBRA DE F' C=150 KG/CM2, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.			PZA				1.00	1.00	
								TOTAL	1.00	
GP101	LIMPIEZA DE OBRA, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.			M2	39.91	10.18		1.00	406.28	
					11.13	2.86		1.00	32.07	
								TOTAL	438.35	
								A COBRAR	434.00	
								RESTANTE	4.35	

ELABORO.-


JOSE CARLOS JUSAVIRO MONTOYA CASTRO
REPRESENTANTE LEGAL

REVISO.-


SUPERVISOR DE OBRA

AUTORIZO.-


ING. RUBIEL RINCÓN RAMOS
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS
DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA.



CONTRATISTA:

DEPENDENCIA:

TRIDICUT, S.A. DE C.V.

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA.

DOMICILIO:

Calle. Degollado S/N interior 1 C, Entre Calle Hidalgo y Calle Colon

Colonia: Centro, Guasave, Sinaloa. C.P. 8100

R.F.C.:


TRI-170712-K25

OBRA:

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO Y ALUMBRADO PÚBLICO, ENTRE CALLE LOS PINOS Y CALLE SIN NOMBRE, COLONIA BUENA VISTA, DE LA CABECERA MUNICIPAL DE BADIRAGUATO, SINALOA.

CROQUIS ESTIMACION:

CLAVE	CONCEPTO
1	PRELIMINARES
GP01	TRAZO Y NIVELACIÓN DEL TERRENO ESTABLECIENDO EJES Y NIVELETAS DE REFERENCIA, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.
GP02	EXCAVACIONES EN CORTES Y ADICIONALES BAJO LA SUB-RASANTE EN CUALQUIER TIPO DE MATERIAL EXISTENTE, EXCEPTO ROCA FIJA, CON EQUIPO MECANICO, INCLUYE: CARGA CON MÁQUINA DEL MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN Y ACARREOS FUERA DE LA OBRA, MEDIDO COMPACTO.
GP05	COMPACTACIÓN DE TERRENO NATURAL EN AREA DE DESPLANTE, INCLUYE: ESCARIFICADO E INCORPORACIÓN DE HUMEDAD AL 90%, INCLUYE MANO DE OBRA Y MATERIAL.
GBR500	MEJORAMIENTO DE TERRENO CON CAPA DE 20 CM DE MATERIAL BALASTRE, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIAL BALASTRE CON CARGA Y ACARREO AL 1ER KM. MEDIDO COMPACTO, PRUEBAS DE LABORATORIO DE CALIDAD DE MATERIALES.
GP255	SUB-BASE COMPACTO INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIAL DE SUB-BASE CON CARGA Y ACARREO AL 1ER KM. MEDIDO COMPACTO, COMPACTACIÓN AL 100 % PRUEBA AASTHO MOD., PRUEBAS DE LABORATORIO DE CALIDAD DE MATERIALES.
GP25	MATERIAL BASE COMPACTADA AL 100 % DE SU PESO VOLUMÉTRICO, INCLUYE: SUMINISTRO DEL AGREGADO, ACARREO, COMPACTACIÓN, PRUEBA DE LABORATORIO Y TODO LO NECESARIO PARA SU TERMINACIÓN.
GP06	REGO DE IMPREGNACIÓN CON EMULSIÓN CATIÓNICA ECR-90, A RAZÓN DE 1.50 A 1.8 LT/M2 O POLIETILENO NEGRO CALIBRE 14, INCLUYE: ARENEO, APLICACIÓN, ALMACENAMIENTO, CALENTAMIENTO, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.

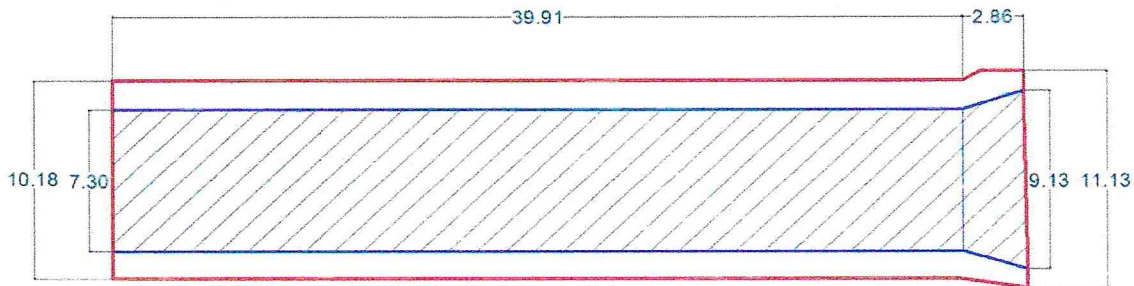

- ☐ AREA DE TRABAJOS
☒ AREA DE EXCAVACIÓN Y MEJORAMIENTO

ELABORO:

JOSE CARLOS JUSAVIRO MONTOYA CASTRO
REPRESENTANTE LEGAL


REVISÓ:-

SUPERVISOR DE OBRA

AUTORIZO:-

ING. RUBIEL RINCÓN RAMOS
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS
DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA.

 	
CONTRATISTA: TRIDICUT, S.A. DE C.V.	
DEPENDENCIA: DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA.	
DOMICILIO: Calle. Degollado S/N interior 1 C, Entre Calle Hidalgo y Calle Colon Colonia: Centro, Guasave, Sinaloa. C.P. 8100	
R.F.C. TRI-170712-K25	OBRA: CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO Y ALUMBRADO PÚBLICO, ENTRE CALLE LOS PINOS Y CALLE SIN NOMBRE, COLONIA BUENA VISTA, DE LA CABECERA MUNICIPAL DE BADIRAGUATO, SINALOA.
CROQUIS ESTIMACION:	
2	ESTRUCTURA
GP06	GUARNICIÓN TIPO "L" DE 15X30X60 DE CONCRETO PREMEZCLADO DE FC=250 KG/CM2, INCLUYE: CIMBRA Y DESIMBRA, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, MANIOBRAS LOCALES Y TODO LO NECESARIO PARA SU TERMINACIÓN.
GP08	PATIN DE 15X60 DE CONCRETO PREMEZCLADO DE FC= 250 KG/CM2. INCLUYE: CIMBRA Y DESIMBRA, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, MANIOBRAS LOCALES Y TODO LO NECESARIO PARA SU TERMINACIÓN.
GP109	LOSA DE CONCRETO DE 15 CMS DE ESPESOR CON CONCRETO PREMEZCLADO FC=300 KG/CM2, INCLUYE: MANO DE OBRA, MATERIALES, HERRAMIENTA Y EQUIPO.
GP133	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONTRA JUNTA DE PVC TIPO C-3 PARA LOSAS DE 15 CM. EN PAVIMENTOS. INCLUYE: TRAZO, ALINEACIÓN, HINCADO Y REMOCIÓN DE TAPA.
GP13	CALAFATEO EN LOSAS DE CONCRETO HIDRÁULICO CON ASFALTEX 505. INCLUYE: UN RIEGO CON EMULTEX T.P. (PRIMER), UN RIEGO DE ASFALTEX 505 Y BARRIDO DE LA SUPERFICIE.
GP15	SUMINISTRO, HABILITADO Y COLOCACIÓN DE ACERO DE REFUERZO LISO EN PASAJUNTAS DE 5/8" DE DIAMETRO, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.
GP11	PINTURA EN GUARNICIÓN DE 20 X 15 CM. CON PINTURA TIPO TRAFICO SCT COLOR AMARILLO O BLANCO. CON USO DE MAQUINA PINTARRAYAS, INCLUYE: PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, MATERIAL, MANO DE OBRA CALIFICADA Y EQUIPO ADECUADO.
GP26	RELLENO EN BANQUETAS CON MATERIAL INERTE COMPACTADO PARA EL 95% CON PLACA VIBRATORIA EN CAPAS NO MAYORES DE 20 CMS. INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIAL, AGUA PARA OBTENER LA HUMEDAD ÓPTIMA DE COMPACTACIÓN, TENDIDO EN CAPAS, ACARREOS, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.
GP10	BANQUETA DE 10 CMS DE ESPESOR CONCRETO PREMEZCLADO CON F'C=150 KG/CM2 T.M.A. 3/4". ACABADO ESCOBILLADO. INCLUYE: TRAZO Y NIVELACIÓN, CIMBRA, COLADO DE CONCRETO, CURADO, VOLTEADOR PERIMETRAL Y LIMPIEZA DE FORMAS.

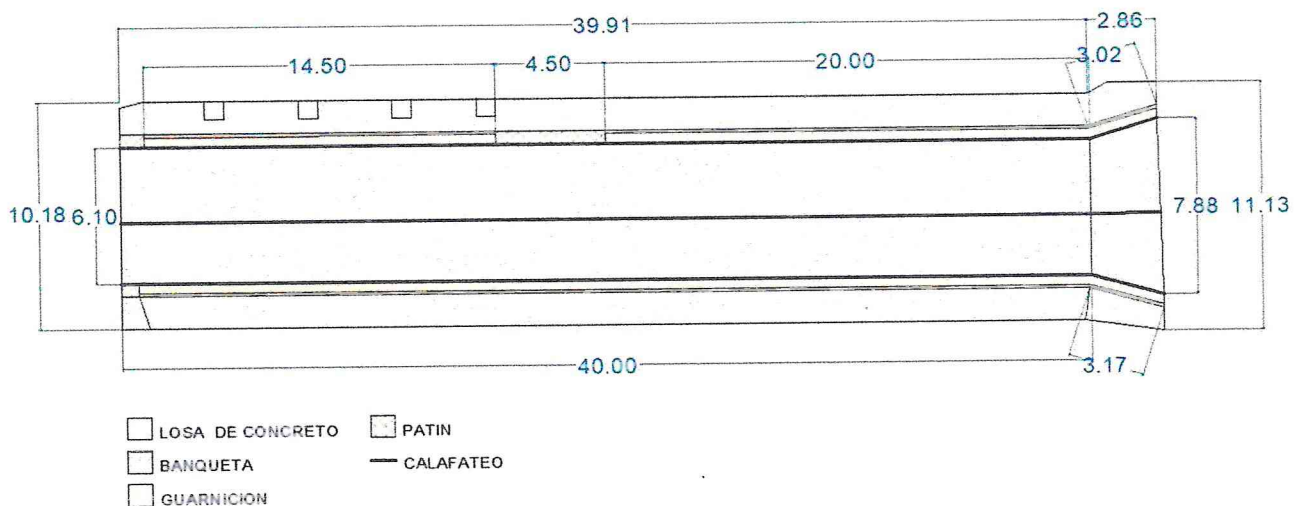

ELABORO.-

 JOSE CARLOS JUSAVIRO MONTOYA CASTRO
 REPRESENTANTE LEGAL

REVISÓ.-

SUPERVISOR DE OBRA

AUTORIZO.-

 ING. RUBIEL RINCÓN RAMOS
 DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS
 DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA.



Fecha y hora de consulta30/12/2025 5:19:55 PM

Contrato00798320

Nombre del ClienteMUNICIPIO DE BADIRAGUATO

BBVA Net Cash - Pagos Interbancarios

Operación autorizada

Transferencia en proceso de validación y aplicación.

Datos del firmante

Usuario:ADMIN1

Poder:100%

Datos de la operación

Tipo de operación:Pago Interbancario

Descripción:EST 01 NORM AD 025Importe de la operación:477,970.51 MXP

Cuenta de retiro:0124174836Cuenta de depósito:036730500515535778

Divisa de la cuenta:MXPDivisa de la cuenta:MXP

Titular de la cuenta:MUNICIPIO DE BADIRAGUATOTitular de la cuenta:TRIDICUT SA DE CV

Nombre banco destino:INBURSA

Fecha de creación:30/12/2025Fecha de aplicación:30/12/2025

Concepto de pago:EST 01 NORM AD 025Referencia numérica:

Instrumento de seguridad:ASD 6551749382Hora de captura en el canal:17:19:53

Datos de confirmación de la transferencia

Folio interbancario:0000757323Clave de rastreo:002601002512300000757323

Folio de firma:0016152075Folio único:I401202512301719530016152081

Estado operación

Porcentaje Firmado:100%

Estado:Operado

Detalle de firmas

Acción	Usuario	Porcentaje aportado	Fecha
CREO	ADMIN1	-- %	30/12/2025
FIRMO	ADMIN1	100 %	30/12/2025
