

OFICIO No. OPDUyE/453/2025
ASUNTO: SOLICITUD PAGO ESTIMACION
01 NORMAL
Badiraguato, Sin., a 08 de Agosto de 2025

MTRO. GONZALO IRINEO CABALLERO TERRAZAS
TESORERO MUNICIPAL
P R E S E N T E.-

POR MEDIO DE LA PRESENTE, LE SOLICITO EL PAGO POR CONCEPTO DE ESTIMACIÓN 01 NORMAL, DEL IMPORTE DEL CONTRATO, A FAVOR DE LA EMPRESA: JESÚS AMADO CAMACHO OSUNA, LA CUAL REALIZA LOS TRABAJOS APROBADOS POR EL SUBCOMITÉ DE BIENESTAR MUNICIPAL, A CONTINUACIÓN, SE DETALLA:

- **NOMBRE DE LA OBRA:** CONSTRUCCIÓN DE RECUBRIMIENTO DE UN SUELO CON CONCRETO HIDRÁULICO, EN LA CALLE MOCORITO (ARROYO DE ARENA) ENTRE BOULEVARD JUAN S MILLÁN Y CALLE ELIGIO ABITIA, COLONIA CENTRO, MUNICIPIO DE BADIRAGUATO, SINALOA.
- **No. DE CONTRATO:** MBGBR-LP-FAISMUN-004/2025.
- **IMPORTE DEL CONTRATO:** \$7,499,560.31 (SIETE MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS SESENTA PESOS 31/100 M.N.)
- **CONCEPTO DEL PAGO:** PAGO DE ESTIMACION 01 NORMAL.
- **IMPORTE A PAGAR:** \$1,528,038.64 (UN MILLÓN QUINIENTOS VEINTIOCHO MIL TREINTA Y OCHO PESOS 64/100 M.N)
- **RECURSOS:** FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FAISMUN) EJERCICIO 2025.
- **EMPRESA:** JESÚS AMADO CAMACHO OSUNA
- **R.F.C.:** CAOJ810630ST4
- **DOMICILIO FISCAL:** CALLE SIN NOMBRE S/N. COLONIA: LOC. LOS NARANJOS, C.P. 80080, CULIACÁN, SINALOA.
- **No. DE FACTURA:** # 47, DE FECHA 07 DE AGOSTO DE 2025.

SE ANEXA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DE SOPORTE, COMO AMPARO DE DICHO PAGO.

AGRADECIENDO DE ANTEMANO LA ATENCIÓN QUE SE SIRVA DAR A LA PRESENTE, ME DESPIDO QUEDANDO A SUS ÓRDENES.



ATENTAMENTE



C. ING. RUBIEL RINCÓN RAMOS
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS,


DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA
C.C.P. ARCHIVO
DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA,
BADIRAGUATO, SINALOA.



**MUNICIPIO DE
BADIRAGUATO**
TESORERÍA

Alexis
08 AGO 2025
2:53 PM

RECIBIDO



JESUS AMADO CAMACHO OSUNA

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Serie:

Folio: 47

Fecha: 07/Ago/2025 15:50:50

Lugar de expedición (C.P.) 80080

Emisor

JESUS AMADO CAMACHO OSUNA

RFC: CAOJ810630ST4

Régimen Fiscal: 612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y

Domicilio: Profesionales

LOS NARANJOS Culiacán Sinaloa México 80080

Receptor

Cliente: MUNICIPIO DE BADIRAGUATO

RFC: MBA850101214

Uso CFDI: I01 - Construcciones

Exportación: 01 - No aplica

Domicilio Fiscal: 80500

Régimen Fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

Domicilio: GABRIEL LEYVA SOLANO S/N Badiraguato Badiraguato Sinaloa México 80500

Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición

Forma de Pago: 03 - Transferencia electrónica de

Tipo de cambio: 1.00000

Moneda: MXN - Peso Mexicano

Cantidad	Clave Unid ad SAT	Clave Prod/Servi cio	Descripción	Valor unitario	Impuestos	Importe
1.00	E48 - Unidad de servicio	72141103 - Servicio de pavimentación de calles y carreteras	<p>PAGO DE ESTIMACION 01 NORMAL</p> <p>DE LA OBRA: CONSTRUCCIÓN DE RECUBRIMIENTO DE UN SUELO CON CONCRETO HIDRÁULICO, EN LA CALLE MOCORITO (ARROYO DE ARENA) ENTRE BOULEVARD JUAN S MILLÁN Y CALLE ELIGIO ABITIA, COLONIA CENTRO, MUNICIPIO DE BADIRAGUATO, SINALOA.</p> <p>CONTRATO NO.: MBGBR-LP-FAJSMUN-004/2025</p> <p>MONTO DEL CONTRATO: \$ 7,499,560.31</p> <p>IMPORTE DE LA OBRA EJECUTADA SIN IVA \$ 2,110,550.62</p> <p>MAS I.V.A 16 % \$ 337,688.10</p> <p>TOTAL DE LA OBRA EJECUTADA CON IVA \$ 2,448,238.72</p> <p>AMORTIZACIÓN ANTICIPO 35% \$ 738,692.72</p> <p>MAS I.V.A.: \$ 118,190.84</p> <p>TOTAL AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO: \$ 856,883.56</p> <p>Importe TOTAL A FACTURAR \$ 1,371,857.90</p> <p>MAS I.V.A \$ 219,497.26</p> <p>MONTO NETO A FACTURAR \$ 1,591,355.16</p> <p>RETENCION 3% (S.V.I.F.Y.C.) : \$ 63,316.52</p> <p>TOTAL DEDUCCIONES: \$ 920,200.08</p> <p>MONTO LIQUIDO A RECIBIR: \$ 1,528,038.64</p>	\$1,371,857.90	IVA, - Importe: 219497.26	\$1,371,857.90

Información de cancelación

Motivo de cancelación:

Folio relacionado:

CFDI RELACIONADOS

Tipo de relación:

Lista de CFDI's relacionados:

Total con letra:
un millón quinientos noventa y un mil trescientos cincuenta y cinco Pesos 16/100 M.N.

Subtotal: \$1,371,857.90

IVA 16 %: \$219,497.26

Total: \$1,591,355.16



Este documento es una representación impresa de un CFDI

Serie del Certificado del emisor: 00001000000711830284
Folio Fiscal: D1337B05-621F-4BE0-98A2-8F40966C3B9D
No. de serie del Certificado del SAT: 00001000000709182898
Fecha y hora de certificación: 2025-08-07T16:50:56

Sello digital del CFDI

yPltj8HTPq43ybcGMi4COiuiDUiNErty1GkXILdseeb4AHjFkD3eeXkREgEgxfaiOWEjH5nV0T6u2xbjWok3O0k4+iwixCuBUpTJSZvXzPMOjb1W24ga/gcVmqRCvAR3jEVAnG
ikFgIVKnnSPA8ISAv4TFs9v0g2fcpTh6cJwHcp2LYX0282AB6OUO472RIMyRBSTF4uzDyM8mNXQdmzqWCFcLmj4Gw8Uj+12SFSQW5gsh5YHSdymn+LEsOHZEAspYrq4r+qcp7P1hwR/V
mL0yTgJ07ZQoEs8nyQ2byA8M24ANzsqAKuE3i+/D7U//8ocCMMiOZK1bA==

Sello del SAT

AfD9/dEXX2a4IJgUu9kGpb7EI25iCYm7DxQEQGsa32C44GuHgn0Y5zUu0CDoxr0UP35ys+eNLwFIdrh3JqCDOB3qNlzp0RYspqFWB3i8P6zXDhUlu+W2VGvzhn8u5yZ2Ry6QD
nT1IvBpYpaM4+zbk/RK3hkp/z3Joc6NNb5/cquD9wHTJ3/APpzsOy+C6ABzoWXXig3Yx8fumdELJyQ3Zg9AG8likTPKv4M1Hvxp3+HgPPRrBocx+ivH3YdKvalOWG6gz13x6r+ICUmP
6hGS40uv1zYw/Pm8VTB55hTYMJLW0Kdhn2QdRwInukryaPwrcqbKkQ==

Cadena original del complemento del certificación digital del SAT

||1.1|D1337B05-621F-4BE0-98A2-8F40966C3B9D|2025-08-07T16:50:56|MAS0810247C0|yPltj8HTPq43ybcGMi4COiuiDUiNErty1GkXILdseeb4AHjFkD3eeXkREgEgxfaiO
WEjH5nV0T6u2xbjWok3O0k4+iwixCuBUpTJSZvXzPMOjb1W24ga/gcVmqRCvAR3jEVAnGikFgIVKnnSPA8ISAv4TFs9v0g2fcpTh6cJwHcp2LYX0282AB6OUO472RIMyRBSTF4uzDy
M8mNXQdmzqWCFcLmj4Gw8Uj+12SFSQW5gsh5YHSdymn+LEsOHZEAspYrq4r+qcp7P1hwR/VmL0yTgJ07ZQoEs8nyQ2byA8M24ANzsqAKuE3i+/D7U//8ocCMMiOZK1bA==|00001000000709182898||

```
<cdfi:Comprobante xmlns:cfdi="http://www.sat.gob.mx/cfd/4" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/cfd/4 http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/4/cfdv40.xsd"
Certificacdo="MIIGCCCA/CgAwIBAgIUMDAwMDEwMDAwMDA3MTE4MzAyODQwDQY3K0ZlIHNcNAQELBQAwggCVMTUwMwYDVQQDDCvBQyBERUwgcUQVSVk1ODU0SgRlUgQUJRN3U3U1R5SUNJT04vVjFJ
Exportacion="01" Fecha="2025-08-07T15:50:50" Folio="47" FormaPago="03" LugarExpedicion="80000" MetodoPago="PUE" Moneda="MXN"
NoCertificado="00001000000711830284"
Sello="yPtqj8HTPq43ybcGMi4C0iuiDUFNER/ty1GkXfLdsebt4AhjrFkD3eeXkBEgEgXifaIOWeli+H5N/r0T6u2xbjWok300k4+1wIXCuBu0TJSZvX/zPM0jbiW24ga/gcVmQKRcVAr3jEVAN
SubTotal="1371857.90" TipoDeComprobante="I" Total="1591355.16" Version="4.0">
  <cfdi:Emisor Nombre="JESUS AMADO CAMACHO OSUNA" RegimenFiscal="612" Rfc="CA07810630ST4"/>
  <cfdi:Receptor DomicilioFiscalReceptor="80500" Nombre="MUNICIPIO DE BADIRAGUATO" RegimenFiscalReceptor="603" Rfc="MDAB50101214" UsoCFDI="I01"/>
  <cfdi:Conceptos>
    <cfdi:Concepto Cantidad="1.00" ClaveProdServ="72141103" ClaveUnidad="E48" Descripcion="SERVICIO DE PAVIMENTACIÓN DE CALLES Y CARRETERASPAGO DE
ESTIMACION 01 NORMALDE LA OBRA: CONSTRUCCIÓN DE RECUBRIMIENTO DE UN SUELO CON CONCRETO HIDRÁULICO, EN LA CALLE MOCORITO (ARROYO DE ARENA) ENTRE
BOULEVARD JUAN S MILLÁN Y CALLE ELIGIO ABITIA, COLONIA CENTRO, MUNICIPIO DE BADIRAGUATO, SINALOA.CONTRATO NO.: MBGBR-LP-FAISMUN-004/2025MUNTO
DEL CONTRATO: $ 7,499,500.31IMPORTE DE LA OBRA EJECUTADA SIN IVA $ 2,110,550.62MAS I.V.A 16 % $ 337,688.10TOTAL DE LA OBRA EJECUTADA CON IVA $
2,448,238.72AMORTIZACIÓN ANTICIPO 35% $ 738,692.72MAS I.V.A.: $ 118,190.84TOTAL AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO: $ 856,883.56Importe TOTAL A FACTURAR $
1,371,857.90MAS I.V.A $ 219,497.26MUNTO NETO A FACTURAR $ 1,591,355.16RETENCION 3% ( S.V.I.F.Y C.) : $ 63,316.52TOTAL DEDUCCIONES: $
920,200.00MUNTO LIQUIDO A RECIBIR: $ 1,528,638.64" Importe="1371857.90" NoIdentificacion="SER05" ObjetoImp="02" ValorUnitario="1371857.90">
      <cfdi:Impuestos>
        <cfdi:Traslados>
          <cfdi:Traslado Base="1371857.90" Importe="219497.26" Impuesto="002" TasaOCuota="0.160000" TipoFactor="Tasa"/>
        </cfdi:Traslados>
      </cfdi:Impuestos>
    </cfdi:Concepto>
  </cfdi:Conceptos>
  <cfdi:Impuestos TotalImpuestosTrasladados="219497.26">
    <cfdi:Traslados>
      <cfdi:Traslado Base="1371857.90" Importe="219497.26" Impuesto="002" TasaOCuota="0.160000" TipoFactor="Tasa"/>
    </cfdi:Traslados>
  </cfdi:Impuestos>
  <cfdi:Complemento>
    <tfd:TimbreFiscalDigital xmlns:tfd="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital" xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital
http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/TimbreFiscalDigital/TimbreFiscalDigitalv11.xsd" Version="1.1" UUID="D1337B05-621F-4BE0-9BA2-
8F409066C3B9D" FechaTimbrado="2025-08-07T16:50:56" RfcProvCertif="MAS0810247C0"
SelloCFD="yPtqj8HTPq43ybcGMi4C0iuiDUFNER/ty1GkXfLdsebt4AhjrFkD3eeXkBEgEgXifaIOWeli+H5N/r0T6u2xbjWok300k4+1wIXCuBu0TJSZvX/zPM0jbiW24ga/gcVmQKRcVAr
NoCertificadoSAT="00001000000709182898"
SelloSAT="AFD9/dEXx2a411JgUuKSpb7E1Z5iCYm7DxQEQGsa32C44UgNgn0jY5ZUu0CdCxsri0UP35ys+eNLWfFdrh3JqCDBa3qNiZlpn0RYspqfw1B3L9P6zX0hUiu+W2VGvzhn8u
  </cfdi:Complemento>
</cfdi:Comprobante>
```



Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
CAOJ810630ST4	JESUS AMADO CAMACHO OSUNA	MBA850101214	MUNICIPIO DE BADIRAGUATO
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
D1337B05-621F-4BE0-98A2-8F40966C3B9D	2025-08-07T15:50:50	2025-08-07T16:50:56	MAS0810247C0
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$1,591,355.16	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir



JESUS AMADO CAMACHO OSUNA

Dependencia :
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA
Control de Estimaciones

CONSTRUCCIÓN DE RECUBRIMIENTO DE UN SUELO CON CONCRETO HIDRÁULICO, EN LA CALLE MOCORITO (ARROYO DE ARENA) ENTRE BOULEVARD JUAN S MILLÁN Y CALLE ELIGIO ABITIA, COLONIA CENTRO, MUNICIPIO DE BADIRAGUATO, SINALOA				Fecha:	Estimación:
				6 de agosto de 2025	01 NORMAL
Periodo de la estimación:	23/07/2025	05/08/2025	Localidad:	No. De contrato:	
Periodo de Ejecución:	23/07/2025	19/11/2025	BADIRAGUATO	MBGBR-LP-FAISMUN-004/2025	
Importe del contrato con I.V.A:	Imp. Contratado sin I.V.A	Anticipo	Importe Anticipo sin I.V.A	% de Avance	
\$ 7,499,560.31	\$ 6,465,138.20	\$ 2,624,846.11	\$ 2,262,798.37	33%	
				% Avance Total	
				33%	

Control Del Anticipo	Liquidacion de Estimacion	Control de Estimacion
AMORTIZA ESTA ESTIMACION	Importe de la Estimacion (+) \$ 2,110,550.62	ESTA ESTIMACION
\$ 856,883.55	16 % I.V.A (+) \$ 337,688.10	\$ 2,448,238.72
	Sub- Total A (=) \$ 2,448,238.72	
	Amortizacion Anticipo 35% \$ 738,692.72	
AMORTIZACION ANTERIOR	16 % I.V.A (+) \$ 118,190.84	ACUMULADO ANTERIOR
\$ -	Total (=) \$ 856,883.56	\$ -
	Importe TOTAL A FACTURAR \$ 1,371,857.90	
TOTAL AMORTIZADO	16 % I.V.A (+) \$ 219,497.26	TOTAL ACUMULADO
\$ 856,883.55	Total (=) \$ 1,591,355.16	\$ 2,448,238.72
	3 % SVIFYC: \$ 63,316.52	
ANTICIPO OTORGADO	Total Deducciones (=) \$ 920,200.08	CONTRATADO
\$ 2,624,846.11	Importe TOTAL \$ 1,528,038.64	\$ 7,499,560.31
SALDO DEL ANTICIPO	NETO A PAGAR \$ 1,528,038.64	SALDO
\$1,767,962.56	Son:	\$ 5,051,321.59
	(SON UN MILLÓN QUINIENTOS VEINTIOCHO MIL TREINTA Y OCHO PESOS 64/100 M.N.)	

ELABORO:-

JESUS AMADO CAMACHO OSUNA
REPRESENTANTE LEGAL

REVISO

ING. JOSE RODOLFO CONTRERAS LOPEZ
COSTOS Y PRESUPUESTOS.

AUTORIZO

C. ING. RUBIEL RINCON RAMOS.
DIRECTOR O.P.D.U. Y E.



Fecha: 6 de agosto de 2025

CARATULA DE ESTIMACIÓN

CONTRATISTA: JESUS AMADO CAMACHO OSUNA		ESTIMACIÓN No: 01 NORMAL	
DOMICILIO: Calle sin nombre s/n. Colonia: Loc. Los Naranjos, C.P. 80080, Culiacán, Sinaloa		PERIODO DE ESTIMACIÓN:	
TELÉFONO:	CEL:	DEL	23-jul-25
		AL	05-ago-25
R.F.C.		FECHA DE CONTRATO:	
CAOJ810630ST4.		19-jul-25	
DEPENDENCIA:-			
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA			
LOCALIDAD:		MUNICIPIO:	PERIODO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO:
BADIRAGUATO		BADIRAGUATO	INICIO: 23-jul-25
			TERMINACIÓN: 19-nov-25
DESCRIPCIÓN:			
CONSTRUCCIÓN DE RECUBRIMIENTO DE UN SUELO CON CONCRETO HIDRAULICO, EN LA CALLE MOCORITO (ARROYO DE ARENA) ENTRE BOULEVARD JUAN S MILLÁN Y CALLE ELIGIO ABITIA, COLONIA CENTRO, MUNICIPIO DE BADIRAGUATO, SINALOA			
CONTRATO No.			
MBGBR-LP-FAISMUN-004/2025			
IMPORTE SIN IVA DE LA OBRA	IMPORTE CON IVA DE LA OBRA	35% ANTICIPO DE LA OBRA	IMPORTE TOTAL DE CONTRATO:
\$6,465,138.20	\$7,499,560.31	\$2,624,846.11	\$7,499,560.31
			BUENO POR: \$ 1,528,038.64
RECIBI:			
\$ 1,528,038.64 (SON UN MILLÓN QUINIENTOS VEINTIOCHO MIL TREINTA Y OCHO PESOS 64/100 M.N.)			
EN PAGO DE ESTIMACIÓN:		01 NORMAL	
DEDUCCIONES:		CALCULO DE ESTIMACIÓN	
AMORTIZACIÓN ANTICIPO 35%	\$ 738,692.72	IMPORTE DE LA OBRA EJECUTADA SIN IVA	\$ 2,110,550.62
MAS I.V.A.:	\$ 118,190.84	MAS I.V.A. 16 %	\$ 337,688.10
TOTAL AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO:	\$ 856,883.56	TOTAL DE LA OBRA EJECUTADA CON IVA	\$ 2,448,238.72
3 % SVIFYC:	\$ 63,316.52	MENOS TOTAL DEDUCCIONES:	\$ 920,200.08
TOTAL DEDUCCIONES:	\$ 920,200.08	MONTO A FACTURAR MAS IVA	\$ 1,591,355.16
		SALDO A PAGAR: \$ 1,528,038.64	

ELABORO.-

JESUS Amado
C. JESUS AMADO CAMACHO OSUNA
REPRESENTANTE LEGAL

REVISÓ.-

ING. JOSE RODOLFO CONTRERAS LOPEZ
COSTOS Y PRESUPUESTOS.

AUTORIZO

C. ING. RUBIEL RINCON RAMOS
DIRECTOR DE O.P.D.U. Y E

ELABORO.-

Jesus Amado
C. JESUS AMADO CAMACHO OSUNA
REPRESENTANTE LEGAL

REVISOR: 
ING. JOSE RODOLFO CONTRERAS LOPEZ
COSTO Y PRESUPUESTOS.

AUTORIZO:-

C. ING. RUBIEL RINCON RAMOS
DIRECTOR DE O.P.D.U. Y E.



CONTRATISTA:		FECHA:																
JESUS AMADO CAMACHO OSUNA		6 de agosto de 2025																
DOMICILIO:		DEPENDENCIA:																
Calle sin nombre s/n. Colonia: Loc. Los Naranjos, C.P. 80080, Culiacán, Sinaloa		DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA																
R.F.C.:																		
CAOJ810630ST4																		
RESÚMEN DE ESTIMACIÓN																		
		LOCALIDAD:	ESTIMACIÓN:															
		BADIRAGUATO	01 NORMAL															
DESCRIPCIÓN:																		
CONSTRUCCIÓN DE RECUBRIMIENTO DE UN SUELO CON CONCRETO HIDRÁULICO, EN LA CALLE MOCORITO (ARROYO DE ARENA) ENTRE BOULEVARD JUAN S MILLÁN Y CALLE ELIGIO ABITIA, COLONIA CENTRO, MUNICIPIO DE BADIRAGUATO, SINALOA																		
IMPORTE DE OBRA SIN IVA:		\$ 6,465,138.20																
IMPORTE DE ANTICIPO DE OBRA:		\$ 2,624,846.11																
IMPORTE TOTAL DE CONTRATO:		\$ 7,499,560.31																
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">DESTAJO</th> <th>IMPORTE</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>PRELIMINARES</td> <td>\$ 2,110,550.62</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>ESTRUCTURA</td> <td>\$ -</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>OTROS</td> <td>\$ -</td> </tr> <tr> <td colspan="2">SUBTOTAL ESTIMACIÓN:</td> <td>\$ 2,110,550.62</td> </tr> </tbody> </table>				DESTAJO		IMPORTE	1	PRELIMINARES	\$ 2,110,550.62	2	ESTRUCTURA	\$ -	3	OTROS	\$ -	SUBTOTAL ESTIMACIÓN:		\$ 2,110,550.62
DESTAJO		IMPORTE																
1	PRELIMINARES	\$ 2,110,550.62																
2	ESTRUCTURA	\$ -																
3	OTROS	\$ -																
SUBTOTAL ESTIMACIÓN:		\$ 2,110,550.62																
SUB TOTAL=		\$ 2,110,550.62																
I.V.A AL 16 %		\$ 337,688.10																
TOTAL =		\$ 2,448,238.72																

ELABORO.-

JESUS Amado
C. JESUS AMADO CAMACHO OSUNA
REPRESENTANTE LEGAL

REVISÓ

ING. JOSE RODOLFO CONTRERAS LOPEZ
COSTOS Y PRESUPUESTOS.

AUTORIZO.-

[Firma]
C. ING. RUBIEL RINCON RAMOS,
DIRECTOR DE O.P.D.U. Y E.

miércoles, 6 de agosto de 2025

miércoles, 6 de agosto de 2025

**DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS,
DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA**

CONTRATISTA:	JESUS AMADO CAMACHO OSUNA
--------------	---------------------------

DEPENDENCIA:

JESUS AMADO CAMACHO OSUNA

1 de 1

CAQJ810630ST4.

--	--

Call the number on the label for more information.

DESGLÓSE DE CONCEPTOS DE ESTIMACIÓN

OS DE ESTIMACIÓN

Abstract

LOCALIDAD:	BADIRAGUATO	ESTIMACION:
		01 NORWIA
		JUAN S MILLAN Y CALLE E LGIO
		RODRIGUEZ DE ARRIAGA ENRIQUE ROQUE EVARD

CONSTRUCCION DE RECUBRIMIENTO DE UN SUELO CON CONCRETO HIDRAULICO, EN LA CALLE MCCORITO (ARROYO DE ARENA) ENTRE BOULEVARD JOAN S MILLAN Y CALLE ELIZABETH

DESCRIPCION:	IMPORTE DE ANTICIPO DE OBRA:	IMPORTE TOTAL DE CONTRATO:
ABITIA, COLONIA CENTIN, MUNICIPIO DE BADIKRAVAGUAY, SINALOA	\$2,624,846.11	\$7,499,560.31

[illegible]

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	SEGUN PROYECTO			HASTA ESTIM	HASTA ESTIM	E CECEDENTE	ESTIMACIÓN	IMPORTE
			GANT	P.U.	TOTAL					
GP01	1 TRAZO Y NIVELACIÓN DEL TERRENO ESTABLECIENDO EJES Y NIVELITAS DE REFERENCIA. INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M2	4,063.99	\$ 15.58	\$ 63,316.96	4,063.99		0.00	4,063.99	\$ 63,316.96
GP02	EXCAVACIONES EN CORTES Y ADICIONALES BAJO LA SUB-RASANTE EN CUALQUIER TIPO DE MATERIAL EXISTENTE, EXCEPTO ROCA FUA, CON EQUIPO MECANICO, INCLUYE: CARGA CON MAQUINA DEL MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN Y ACARREOS FUERA DE LA OBRA, MEDIDO COMPACTO.	M3	2,235.20	\$ 133.09	\$ 297,482.77	2,235.20		0.00	2,235.20	\$ 297,482.77
GP03	COMPACTACIÓN DE TERRENO NATURAL EN AREA DE DESPLANTE, INCLUYE: ESCARIFICADO E INCORPORACIÓN DE HUMEDAD AL 90%, INCLUYE MANO DE OBRA Y MATERIAL.	M2	4,063.99	\$ 37.61	\$ 152,846.66	4,063.99		0.00	4,063.99	\$ 152,846.66
GP255	SUB-BASE COMPACTO INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIAL DE SUB-BASE CON CARGA Y ACARREO AL 1ER KM. MEDIDO COMPACTO, COMPACTACIÓN AL 100 % PRUEBA AASTHO MOD., PRUEBAS DE LABORATORIO DE CALIDAD DE MATERIALES.	M2	4,063.99	\$ 157.55	\$ 640,231.62	4,063.99		0.00	4,063.99	\$ 640,231.62
GP25	MATERIAL BASE DE COMPACTADA AL 100 % DE SU PESO VOLUMETRICO, INCLUYE: SUMINISTRO DEL AGREGADO, ACARREO, COMPACTACIÓN, PRUEBA DE LABORATORIO Y TODO LO NECESARIO PARA SU TERMINACIÓN.	M2	4,063.99	\$ 196.07	\$ 796,826.52	4,063.99		0.00	4,063.99	\$ 796,826.52
GP03	RIEGO DE IMPREGNACIÓN CON EMULSION CATIONICA EC-50, A RAZÓN DE 1.50 A 1.8 LT/M2, INCLUYE: ARENEO, APICACIÓN, ALMACENAMIENTO, CALENTAMIENTO, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (DE SER NECESARIO SE PUEDE UTILIZAR HULE NEGRO)	M2	4,063.99	\$ 39.32	\$ 159,796.09	4,063.99		0.00	4,063.99	\$ 159,796.09
									SUB-TOTAL	\$ 2,110,550.62
									IVA	\$ 337,688.10
									MONTO TOTAL	\$ 2,448,238.72

ELABORÓ:-
JESUS AMADO
C. JESUS AMADO CAMACHO OSUNA
REPRESENTANTE LEGAL

ING. JOSE RODOLFO CONTRERAS LOPEZ
COSTOS Y PRESUPUESTOS.

AUTORIZO



C. ING. RUBIEL RINCON RAMOS
DIRECTOR DE O.P.D.U. Y E.



VOLUMENES GENERADORES

CONTRATISTA			CONSTRUCCIÓN DE RECUBRIMIENTO DE UN SUELO CON CONCRETO HIDRÁULICO, EN LA CALLE MOCOFITO (ARROYO DE ARENA) ENTRE BOULEVARD JUAN S MILLÁN Y CALLE ELUGIO ABITIA, COLONIA CENTRO, MUNICIPIO DE BADIRAGUATO, SINALOA							ESTIMACION
JESUS AMADO CAMACHO OSUNA										01 NORMAL
RFC:	CAOJ810630ST4.									
CLAVE	CONCEPTO		LOCALIZACION	UNIDAD	LARGO	ANCHO	ALTO	PZA	TOTAL	OBSERVACIONES
1	PRELIMINARES		EJE	TRAMO	EN METROS					
GP01	TRAZO Y NIVELACIÓN DEL TERRENO ESTABLECIENDO EJES Y NIVELETAS DE REFERENCIA, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.			M2						
			CADENAMIENTO							
			0+000.00	0+005.00	5.0000	33.81			169.05	
			0+005.00	0+010.00	5.0000	26.76			133.80	
			0+010.00	0+015.00	5.0000	22.75			113.75	
			0+015.00	0+020.00	5.0000	18.61			93.05	
			0+020.00	0+025.00	5.0000	15.79			78.95	
			0+025.00	0+030.00	5.0000	13.82			69.10	
			0+030.00	0+032.53	2.5300	13.50			34.16	
			0+032.53	0+035.00	2.4700	13.50			33.35	
			0+035.00	0+040.00	5.0000	13.50			67.50	
			0+040.00	0+045.00	5.0000	13.50			67.50	
			0+045.00	0+050.00	5.0000	13.50			67.50	
			0+050.00	0+055.00	5.0000	13.50			67.50	
			0+055.00	0+060.00	5.0000	13.50			67.50	
			0+060.00	0+065.00	5.0000	13.50			67.50	
			0+065.00	0+070.00	5.0000	13.50			67.50	
			0+070.00	0+075.00	5.0000	13.50			67.50	
			0+075.00	0+080.00	5.0000	13.50			67.50	
			0+080.00	0+085.00	5.0000	13.50			67.50	
			0+085.00	0+090.00	5.0000	13.50			67.50	
			0+090.00	0+095.00	5.0000	13.50			67.50	
			0+095.00	0+100.00	5.0000	13.50			67.50	
			0+100.00	0+105.00	5.0000	13.50			67.50	
			0+105.00	0+110.00	5.0000	13.50			67.50	
			0+110.00	0+115.00	5.0000	13.50			67.50	
			0+115.00	0+120.00	5.0000	13.50			67.50	
			0+120.00	0+125.00	5.0000	13.50			67.50	
			0+125.00	0+130.00	5.0000	13.50			67.50	

ELABORADO POR:
Jesús Amado
C. JESUS AMADO CAMACHO OSUNA
REPRESENTANTE LEGAL

REVISADO POR:
Briceida
ARQ. BRICEIDA GPE NIEBLAS MARTINEZ
SUPERVISOR

AUTORIZADO POR:
Rubiel
ING. RUBIEL RINCON RAMOS
DIRECTOR DE O.P.D.U.Y.E.



VOLUMENES GENERADORES

CONTRATISTA		CONSTRUCCIÓN DE RECUBRIMIENTO DE UN SUELO CON CONCRETO HIDRÁULICO, EN LA CALLE MOCOFITO (ARROYO DE ARENA) ENTRE BOULEVARD JUAN S MILLÁN Y CALLE ELUGIO ABITIA, COLONIA CENTRO, MUNICIPIO DE BADIRAGUATO, SINALOA						ESTIMACION	
JESUS AMADO CAMACHO OSUNA								01 NORMAL	
RFC:	CAOJ810630ST4.								
CLAVE	C O N C E P T O	LOCALIZACION	UNIDAD	LARGO	ANCHO	ALTO	PZA	TOTAL	OBSERVACIONES
		EJE	TRAMO	EN METROS					
		0+130.00	0+135.00	5,0000	13.50			67.50	
		0+135.00	0+140.00	5,0000	13.50			67.50	
		0+140.00	0+145.00	5,0000	13.50			67.50	
		0+145.00	0+150.00	5,0000	13.50			67.50	
		0+150.00	0+155.00	5,0000	13.50			67.50	
		0+155.00	0+160.00	5,0000	13.50			67.50	
		0+160.00	0+165.00	5,0000	13.50			67.50	
		0+165.00	0+170.00	5,0000	13.50			67.50	
		0+170.00	0+175.00	5,0000	13.50			67.50	
		0+175.00	0+180.00	5,0000	13.50			67.50	
		0+180.00	0+185.00	5,0000	13.50			67.50	
		0+185.00	0+190.00	5,0000	13.50			67.50	
		0+190.00	0+195.00	5,0000	13.50			67.50	
		0+195.00	0+200.00	5,0000	13.50			67.50	
		0+200.00	0+205.00	5,0000	13.50			67.50	
		0+205.00	0+210.00	5,0000	13.50			67.50	
		0+210.00	0+215.00	5,0000	13.50			67.50	
		0+215.00	0+220.00	5,0000	13.50			67.50	
		0+220.00	0+225.00	5,0000	13.50			67.50	
		0+225.00	0+230.00	5,0000	13.50			67.50	
		0+230.00	0+235.00	5,0000	13.50			67.50	
		0+235.00	0+240.00	5,0000	13.50			67.50	
		0+240.00	0+245.00	5,0000	13.50			67.50	
		0+245.00	0+250.00	5,0000	13.50			67.50	
		0+250.00	0+255.00	5,0000	13.50			67.50	
		0+255.00	0+260.00	5,0000	13.50			67.50	
		0+260.00	0+265.00	5,0000	13.50			67.50	
		0+265.00	0+270.00	5,0000	13.50			67.50	
		0+270.00	0+275.00	5,0000	13.50			67.50	
		0+275.00	0+280.00	5,0000	13.50			67.50	
		0+280.00	0+282.32	2.3200	13.50			31.32	
							TOTAL	4,064.03	
							TOTAL CONTRATADO	4,063.99	

ELABORO: 
C. JESUS AMADO CAMACHO OSUNA
REPRESENTANTE LEGAL

REVISO: 
ARQ. BRICEIDA GFE NIEBLAS MARTINEZ
SUPERVISOR

AUTORIZO: 
ING. RUBIEL RINCON RAMOS
DIRECTOR DE O.P.D.U.Y.E.



VOLUMENES GENERADORES

CONTRATISTA

JESUS AMADO CAMACHO OSUNA

RFC: CAOJ810630ST4.

CONCEPTO

EXCAVACIONES EN CORTES Y ADICIONALES BAJO LA SUB-
RASANTE EN CUALQUIER TIPO DE MATERIAL EXISTENTE.
EXCEPTO ROCA FUA, CON EQUIPO MECANICO, INCLUYE:
CARGA CON MAQUINA DEL MATERIAL PRODUCTO DE
EXCAVACION Y ACARREOS FUERA DE LA OBRA, MEDIDO
COMPACTO.

VER CROQUIS

ESTIMACION
01 NORMAL

CONSTRUCCIÓN DE RECUBRIMIENTO DE UN SUELO CON CONCRETO HIDRÁULICO, EN LA CALLE
MOCORITO (ARROYO DE ARENA) ENTRE BOULEVARD JUAN S MILLÁN Y CALLE ELIGIO ABITIA,
COLONIA CENTRO, MUNICIPIO DE BADIRAGUATO, SINALOA

RFC:	CLAVE	CONCEPTO	LOCALIZACION		UNIDAD	EN METROS			PZA	TOTAL	OBSERVACIONES
			EJE	TRAMO		LARGO	ANCHO	ALTO			
GP02			CADENAMIENTO		M3	LONG	AREA				
			0+000.00	0+005.00		5.0000	14.97				
			0+005.00	0+010.00		5.0000	16.75				
			0+010.00	0+015.00		5.0000	20.79				
			0+015.00	0+020.00		5.0000	33.86				
			0+020.00	0+025.00		5.0000	27.78				
			0+025.00	0+030.00		5.0000	8.45				
			0+030.00	0+032.53		2.5300	0.12				
			0+032.53	0+035.00		2.4700	0.12				
			0+035.00	0+040.00		5.0000	0.12				
			0+040.00	0+045.00		5.0000	0.12				
			0+045.00	0+050.00		5.0000	0.17				
			0+050.00	0+055.00		5.0000	1.14				
			0+055.00	0+060.00		5.0000	6.48				
			0+060.00	0+065.00		5.0000	7.21				
			0+065.00	0+070.00		5.0000	12.03				
			0+070.00	0+075.00		5.0000	12.26				
			0+075.00	0+080.00		5.0000	12.96				
			0+080.00	0+085.00		5.0000	12.09				
			0+085.00	0+090.00		5.0000	11.37				
			0+090.00	0+095.00		5.0000	8.52				
			0+095.00	0+100.00		5.0000	4.82				
			0+100.00	0+105.00		5.0000	5.31				
			0+105.00	0+110.00		5.0000	5.47				
			0+110.00	0+115.00		5.0000	5.69				
			0+115.00	0+120.00		5.0000	7.16				
			0+120.00	0+125.00		5.0000	7.39				
			0+125.00	0+130.00		5.0000	7.64				
			0+130.00	0+135.00		5.0000	7.99				
			0+135.00	0+140.00		5.0000	9.42				
			0+140.00	0+145.00		5.0000	9.55				
			0+145.00	0+150.00		5.0000	8.94				
			0+150.00	0+155.00		5.0000	9.30				
CAOJ810630ST4.	GP02	EXCAVACIONES EN CORTES Y ADICIONALES BAJO LA SUB- RASANTE EN CUALQUIER TIPO DE MATERIAL EXISTENTE. EXCEPTO ROCA FUA, CON EQUIPO MECANICO, INCLUYE: CARGA CON MAQUINA DEL MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION Y ACARREOS FUERA DE LA OBRA, MEDIDO COMPACTO.	0+000.00	0+005.00	M3	5.0000	14.97			74.85	
			0+005.00	0+010.00		5.0000	16.75			83.75	
			0+010.00	0+015.00		5.0000	20.79			103.95	
			0+015.00	0+020.00		5.0000	33.86			169.30	
			0+020.00	0+025.00		5.0000	27.78			138.90	
			0+025.00	0+030.00		5.0000	8.45			42.25	
			0+030.00	0+032.53		2.5300	0.12			0.30	
			0+032.53	0+035.00		2.4700	0.12			0.30	
			0+035.00	0+040.00		5.0000	0.12			0.60	
			0+040.00	0+045.00		5.0000	0.12			0.60	
			0+045.00	0+050.00		5.0000	0.17			0.85	
			0+050.00	0+055.00		5.0000	1.14			5.70	
			0+055.00	0+060.00		5.0000	6.48			32.40	
			0+060.00	0+065.00		5.0000	7.21			36.05	
			0+065.00	0+070.00		5.0000	12.03			60.15	
			0+070.00	0+075.00		5.0000	12.26			61.30	
			0+075.00	0+080.00		5.0000	12.96			64.80	
			0+080.00	0+085.00		5.0000	12.09			60.45	
			0+085.00	0+090.00		5.0000	11.37			56.85	
			0+090.00	0+095.00		5.0000	8.52			42.60	
			0+095.00	0+100.00		5.0000	4.82			24.10	
			0+100.00	0+105.00		5.0000	5.31			26.55	
			0+105.00	0+110.00		5.0000	5.47			27.35	
			0+110.00	0+115.00		5.0000	5.69			28.45	
			0+115.00	0+120.00		5.0000	7.16			35.80	
			0+120.00	0+125.00		5.0000	7.39			36.95	
			0+125.00	0+130.00		5.0000	7.64			38.20	
			0+130.00	0+135.00		5.0000	7.99			39.95	
			0+135.00	0+140.00		5.0000	9.42			47.10	
			0+140.00	0+145.00		5.0000	9.55			47.75	
			0+145.00	0+150.00		5.0000	8.94			44.70	
			0+150.00	0+155.00		5.0000	9.30			46.50	

AUTORIZO.-
ING. RUBIEL PINOCH RAMOS
DIRECTOR DE O.P.D.U.Y.E.

REVISO.-
ARQ. BRIGIDA GONZALEZ MARTINEZ
SUPERVISOR

REPRESENTANTE LEGAL
JESUS AMADO CAMACHO OSUNA



VOLUMENES GENERADORES

CONTRATISTA		CONSTRUCCIÓN DE RECUBRIMIENTO DE UN SUELO CON CONCRETO HIDRÁULICO, EN LA CALLE MOCORITO (ARROYO DE ARENA) ENTRE BOULEVARD JUAN S MILLÁN Y CALLE ELUGIO ABITIA, COLONIA CENTRO, MUNICIPIO DE BADIRAGUATO, SINALOA							ESTIMACION	
JESUS AMADO CAMACHO OSUNA									01 NORMAL	
RFC:	CAOJ810630ST4.									
CLAVE	C O N C E P T O	LOCALIZACION	UNIDAD	LARGO	ANCHO	ALTO	PZA	TOTAL	OBSERVACIONES	
		EJE	TRAMO		EN METROS					
		0+155.00	0+160.00		5.0000	8.88		44.40		
		0+160.00	0+165.00		5.0000	9.45		47.25		
		0+165.00	0+170.00		5.0000	9.98		49.90		
		0+170.00	0+175.00		5.0000	9.30		46.50		
		0+175.00	0+180.00		5.0000	8.88		44.40		
		0+180.00	0+185.00		5.0000	8.53		42.65		
		0+185.00	0+190.00		5.0000	8.64		43.20		
		0+190.00	0+195.00		5.0000	9.91		49.55		
		0+195.00	0+200.00		5.0000	13.19		65.95		
		0+200.00	0+205.00		5.0000	8.52		42.60		
		0+205.00	0+210.00		5.0000	8.05		40.25		
		0+210.00	0+215.00		5.0000	7.89		39.45		
		0+215.00	0+220.00		5.0000	6.57		32.85		
		0+220.00	0+225.00		5.0000	6.21		31.05		
		0+225.00	0+230.00		5.0000	6.50		32.50		
		0+230.00	0+235.00		5.0000	6.58		32.90		
		0+235.00	0+240.00		5.0000	6.57		32.85		
		0+240.00	0+245.00		5.0000	6.86		34.30		
		0+245.00	0+250.00		5.0000	6.89		34.45		
		0+250.00	0+255.00		5.0000	7.19		35.95		
		0+255.00	0+260.00		5.0000	6.15		30.75		
		0+260.00	0+265.00		5.0000	6.96		34.80		
		0+265.00	0+270.00		5.0000	6.84		34.20		
		0+270.00	0+275.00		5.0000	6.47		32.35		
		0+275.00	0+280.00		5.0000	6.33		31.65		
		0+280.00	0+282.32		2.3200	6.23		14.45		
		0+110.00	0+110.00		0.5500	82.98		45.64		
		0+205.00	0+205.00		0.5500	150.91		83.00		
		0+275.00	0+275.00		0.2200	72.33		15.91		
							TOTAL	2,025.05		
							TOTAL CONTRATADO	2,235.20		

ELABORO:-
C. JESUS AMADO CAMACHO OSUNA
REPRESENTANTE LEGAL

REVISO:-
ARQ. BRICEIDA GFE NIEBLAS MARTINEZ
SUPERVISOR

AUTORIZO:-
ING. RUBIEL RINCON RAMOS
DIRECTOR DE O.P.D.U.Y.E.



JESUS AMADO CAMACHO OSUNA

CONCEPT O

CLAVE	CONCEPTO	LOCALIZACION		UNIDAD	EN METROS			PZA	TOTAL	OBSERVACIONES
		EJE	TRAMO		LARGO	ANCHO	ALTO			
		0+165.00	0+170.00		5.0000	12.50			62.50	
		0+170.00	0+175.00		5.0000	12.50			62.50	
		0+175.00	0+180.00		5.0000	12.50			62.50	
		0+180.00	0+185.00		5.0000	12.50			62.50	
		0+185.00	0+190.00		5.0000	12.50			62.50	
		0+190.00	0+195.00		5.0000	12.50			62.50	
		0+195.00	0+200.00		5.0000	12.50			62.50	
		0+200.00	0+205.00		5.0000	12.50			62.50	
		0+205.00	0+210.00		5.0000	12.50			62.50	
		0+210.00	0+215.00		5.0000	12.50			62.50	
		0+215.00	0+220.00		5.0000	12.53			62.65	
		0+220.00	0+225.00		5.0000	12.50			62.50	
		0+225.00	0+230.00		5.0000	12.50			62.50	
		0+230.00	0+235.00		5.0000	12.50			62.50	
		0+235.00	0+240.00		5.0000	12.50			62.50	
		0+240.00	0+245.00		5.0000	12.50			62.50	
		0+245.00	0+250.00		5.0000	12.50			62.50	
		0+250.00	0+255.00		5.0000	12.50			62.50	
		0+255.00	0+260.00		5.0000	12.50			62.50	
		0+260.00	0+265.00		5.0000	12.50			62.50	
		0+265.00	0+270.00		5.0000	12.50			62.50	
		0+270.00	0+275.00		5.0000	12.50			62.50	
		0+275.00	0+280.00		5.0000	12.50			62.50	
		0+280.00	0+282.32		2.3200	12.50			29.00	
		0+110.00	0+110.00			82.98			82.98	
		0+205.00	0+205.00			150.91			150.91	
		0+275.00	0+275.00			72.33			72.33	
							TOTAL		41'5.87	
							TOTAL CONTRATADO		4,063.99	

REVISOR: *Brso*
ARQ.BRICEIDA GPE NIEBLAS MARTINEZ
SUPERVISOR

AUTORIZO.-

ING. RUBIEL RINCON RAMOS
DIRECTOR DE O.P.D.U. Y E.



VOLUMENES GENERADORES

CONTRATISTA

JESUS AMADO CAMACHO OSUNA

RFC: CAOJ810630ST4.

CONCEPTO

SUB-BASE COMPACTO INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIAL DE SUB-BASE CON CARGA Y ACARREO AL 1ER KM. MEDIDO COMPACTO, COMPACTACIÓN AL 100 % PRUEBA AASTHO MOD., PRUEBAS DE LABORATORIO DE CALIDAD DE MATERIALES.

ESTIMACION
01 NORMAL

CONSTRUCCIÓN DE RECUBRIMIENTO DE UN SUELO CON CONCRETO HIDRÁULICO, EN LA CALLE MOCORITO (ARROYO DE ARENA) ENTRE BOULEVARD JUAN S MILLÁN Y CALLE ELUGIO ABITA, COLONIA CENTRO, MUNICIPIO DE BADIRAGUATO, SINALOA

LOCALIZACION
EJE

TRAMO

UNIDAD

LARGO

ANCHO

ALTO

PZA

TOTAL

OBSERVACIONES

VER CROQUIS

LONG

ANCHO

ALTO

PZA

TOTAL

OBSERVACIONES

VER CROQUIS

LONG

ANCHO

ALTO

PZA

TOTAL

OBSERVACIONES

VER CROQUIS

LONG

ANCHO

ALTO

PZA

TOTAL

OBSERVACIONES

VER CROQUIS

LONG

ANCHO

ALTO

PZA

TOTAL

OBSERVACIONES

VER CROQUIS

LONG

ANCHO

ALTO

PZA

TOTAL

OBSERVACIONES

VER CROQUIS

LONG

ANCHO

ALTO

PZA

TOTAL

OBSERVACIONES

VER CROQUIS

LONG

ANCHO

ALTO

PZA

TOTAL

OBSERVACIONES

VER CROQUIS

LONG

ANCHO

ALTO

PZA

TOTAL

OBSERVACIONES

VER CROQUIS

LONG

ANCHO

ALTO

PZA

TOTAL

OBSERVACIONES

VER CROQUIS

LONG

ANCHO

ALTO

PZA

TOTAL

OBSERVACIONES

VER CROQUIS

LONG

ANCHO

ALTO

PZA

TOTAL

OBSERVACIONES

VER CROQUIS

LONG

ANCHO

ALTO

PZA

TOTAL

OBSERVACIONES

VER CROQUIS

LONG

ANCHO

ALTO

PZA

TOTAL

OBSERVACIONES

VER CROQUIS

LONG

ANCHO

ALTO

PZA

TOTAL

OBSERVACIONES

VER CROQUIS

LONG

ANCHO

ALTO

PZA

TOTAL

OBSERVACIONES

VER CROQUIS

LONG

ANCHO

ALTO

PZA

TOTAL

OBSERVACIONES

VER CROQUIS

LONG

ANCHO

ALTO

PZA

TOTAL

OBSERVACIONES

VER CROQUIS

LONG

ANCHO

ALTO

PZA

TOTAL

OBSERVACIONES

VER CROQUIS

LONG

ANCHO

ALTO

PZA

TOTAL

OBSERVACIONES

VER CROQUIS

LONG

ANCHO

ALTO

PZA

TOTAL

OBSERVACIONES

VER CROQUIS

LONG

ANCHO

ALTO

PZA

TOTAL

OBSERVACIONES

VER CROQUIS

LONG

ANCHO

ALTO

PZA

TOTAL

OBSERVACIONES

VER CROQUIS

LONG

ANCHO

ALTO

PZA

TOTAL

OBSERVACIONES

VER CROQUIS

LONG

ANCHO

ALTO

PZA

TOTAL

OBSERVACIONES

VER CROQUIS

LONG

ANCHO

ALTO

PZA

TOTAL

OBSERVACIONES

VER CROQUIS

LONG

ANCHO

ALTO

PZA

TOTAL

OBSERVACIONES

VER CROQUIS

LONG

ANCHO

ALTO

PZA

TOTAL

OBSERVACIONES

VER CROQUIS

LONG

ANCHO

ALTO

PZA

TOTAL

OBSERVACIONES

VER CROQUIS

LONG

ANCHO

ALTO

PZA

TOTAL

OBSERVACIONES

VER CROQUIS

LONG

ANCHO

ALTO

PZA

TOTAL

OBSERVACIONES

VER CROQUIS

LONG

ANCHO

ALTO

PZA

TOTAL

OBSERVACIONES

VER CROQUIS

LONG

ANCHO

ALTO

PZA

TOTAL

OBSERVACIONES

VER CROQUIS

LONG

ANCHO

ALTO

PZA

TOTAL

OBSERVACIONES

VER CROQUIS

LONG

ANCHO

ALTO

PZA

TOTAL

OBSERVACIONES

VER CROQUIS

LONG

ANCHO

ALTO

PZA

TOTAL

OBSERVACIONES

VER CROQUIS

LONG

ANCHO

ALTO

PZA

TOTAL

OBSERVACIONES

VER CROQUIS

LONG

ANCHO

ALTO

PZA

TOTAL

OBSERVACIONES

VER CROQUIS

LONG

ANCHO

ALTO

PZA

TOTAL

OBSERVACIONES

VER CROQUIS

LONG

ANCHO

ALTO

PZA

TOTAL

OBSERVACIONES

VER CROQUIS

LONG

ANCHO

ALTO

PZA

TOTAL

OBSERVACIONES

VER CROQUIS

LONG

ANCHO

ALTO

PZA

TOTAL

OBSERVACIONES

VER CROQUIS

LONG

ANCHO

ALTO

PZA

TOTAL

OBSERVACIONES

VER CROQUIS

LONG

ANCHO

ALTO

PZA

TOTAL

OBSERVACIONES

VER CROQUIS

LONG

ANCHO

ALTO

PZA

TOTAL

OBSERVACIONES

VER CROQUIS

LONG

ANCHO

ALTO

PZA

TOTAL

OBSERVACIONES

VER CROQUIS

LONG

ANCHO

ALTO

PZA

TOTAL

OBSERVACIONES

VER CROQUIS

LONG

ANCHO

ALTO

PZA

TOTAL



ELABORÓ:
C. JESÚS AMADO CAMACHO OSUNA
REPRESENTANTE LEGAL

AUTORIZO.-
ING. RUBIEL RINCON RAMOS
DIRECTOR DE O.P.D.U.Y.E.



VOLUMENES GENERADORES

CONTRATISTA

JESUS AMADO CAMACHO OSUNA

RFC: CAOJ810630ST4.

C O N C E P T O

MATERIAL BASE DE COMPACTADA AL 100 % DE SU PESO VOLUMETRICO, INCLUYE: SUMINISTRO DEL AGREGADO, ACARREO, COMPACTACIÓN, PRUEBA DE LABORATORIO Y TODO LO NECESARIO PARA SU TERMINACIÓN.

LOCALIZACION

EJE

TRAMO

UNIDAD

LARGO

ANCHO

ALTO

PZA

TOTAL

OBSERVACIONES

ESTIMACION

01 NORMAL

VER CROQUIS

AUTORIZO.-

ING. RUBIEL BINCEN RAMOS

DIRECTOR DE O.P.D.U.Y.E.

SUPERVISOR

REVISOR

ARQ. BRIGIDA GONZALEZ MARTINEZ

REPRESENTANTE LEGAL

C. JESUS AMADO CAMACHO OSUNA

REVISOR

ARQ. BRIGIDA GONZALEZ MARTINEZ

REPRESENTANTE LEGAL

C. JESUS AMADO CAMACHO OSUNA

REVISOR

ARQ. BRIGIDA GONZALEZ MARTINEZ

REPRESENTANTE LEGAL

C. JESUS AMADO CAMACHO OSUNA

REVISOR

ARQ. BRIGIDA GONZALEZ MARTINEZ

REPRESENTANTE LEGAL

C. JESUS AMADO CAMACHO OSUNA

REVISOR

ARQ. BRIGIDA GONZALEZ MARTINEZ

REPRESENTANTE LEGAL

C. JESUS AMADO CAMACHO OSUNA

REVISOR

ARQ. BRIGIDA GONZALEZ MARTINEZ

REPRESENTANTE LEGAL

CLAVE

GP25

0+000.00

0+005.00

0+010.00

0+015.00

0+020.00

0+025.00

0+030.00

0+032.53

0+035.00

0+040.00

0+045.00

0+050.00

0+055.00

0+060.00

0+065.00

0+070.00

0+075.00

0+080.00

0+085.00

0+090.00

0+095.00

0+100.00

0+105.00

0+110.00

0+115.00

0+120.00

0+125.00

0+130.00

0+135.00

0+140.00

0+145.00

0+150.00

0+155.00

0+160.00

0+165.00

0+170.00

0+175.00

0+180.00

0+185.00

0+190.00

0+195.00

CONSTRUCCIÓN DE RECUBRIMIENTO DE UN SUELO CON CONCRETO HIDRÁULICO, EN LA CALLE MOCORITO (ARROYO DE ARENA) ENTRE BOULEVARD JUAN S MILLÁN Y CALLE ELIGIO ARITIA, COLONIA CENTRO, MUNICIPIO DE BADRAGUATO, SINALOA

VER CROQUIS

169.05

133.25

111.30

93.05

78.95

69.10

32.23

30.97

62.50

62.50

62.50

62.50

62.50

62.50

62.50

62.50

62.50

62.50

62.50

62.50

62.50

62.50

62.50

62.50

62.50

62.50

62.50

62.50

62.50

62.50

62.50

62.50

62.50

62.50

62.50

62.50

62.50

62.50

62.50

62.50

62.50



JESUS AMADO CAMACHO OSUNA

CONCEPTO

ELABORO: *Jesús Amado*
C. JESUS AMADO CAMACHO OSUNA
REPRESENTANTE LEGAL

REVISOR: *Bried*
ARQ. BRICEIDA GPE NIEBLAS MARTINEZ
SUPERVISOR

AUTORIZO.-
ING. RUBIEL RINCON RAMOS
DIRECTOR DE O.P.D.U.Y.E.




ELABORÓ: 
C. JESUS AMADO CAMACHO OSUNA
REPRESENTANTE LEGAL

REVISO.- *Brsd*
ARQ.BRICEIDA GPE NIEBLAS MARTINEZ
SUPERVISOR

AUTORIZO.-
ING. RUBIEL RINCON RAMOS
DIRECTOR DE O.P.D.U.Y.E.

CONTRATISTA: JESUS AMADO CAMACHO OSUNA		DEPENDENCIA: DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS. DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA	
DOMICILIO: Calle sin nombre s/n. Colonia: Loc. Los Naranjos, C.P. 80080, Culiacán, Sinaloa			
R.F.C.: CAQJ810630ST4.			
OBRA: CONSTRUCCIÓN DE RECUBRIMIENTO DE UN SUELO CON CONCRETO HIDRÁULICO, EN LA CALLE MOCORITO (ARROYO DE ARENA) ENTRE BOULEVARD JUAN S MILLÁN Y CALLE ELIGIO ABITIA, COLONIA CENTRO, MUNICIPIO DE BADIRAGUATO, SINALOA			

CROQUIS ESTIMACION:	
CLAVE	CONCEPTO
1	PRELIMINARES
GP01	TRAZO Y NIVELACIÓN DEL TERRENO ESTABLECIENDO EJES Y NIVELETAS DE REFERENCIA, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.
GP02	EXCAVACIONES EN CORTES Y ADICIONALES BAJO LA SUB RASANTE EN CUALQUIER TIPO DE MATERIAL EXISTENTE, EXCEPTO ROCA FIJA, CON
GP05	COMPACTACION DE TERRENO NATURAL EN AREA DE DESPLANTE, INCLUYE: ESCARIFICADO E INCORPORACION DE HUMEDAD AL 80%, INCLUYE
GP255	SUB-BASE COMPACTO INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIAL DE SUB-BASE CON CARGA Y ACARREO AL 1ER KM. MEDIDO COMPACTO,
GP26	MATERIAL BASE DE COMPACTADA AL 100 % DE SU PESO VOLUMETRICO, INCLUYE: SUMINISTRO DEL AGREGADO, ACARREO, COMPACTACION,
GP06	RIEGO DE IMPREGNACIÓN CON EMULSIÓN CATIONICA ECI-80, A RAZÓN DE 1.50 A 1.8 LT/M2, INCLUYE: ARENEO, APLICACIÓN, ALMACENAMIENTO,

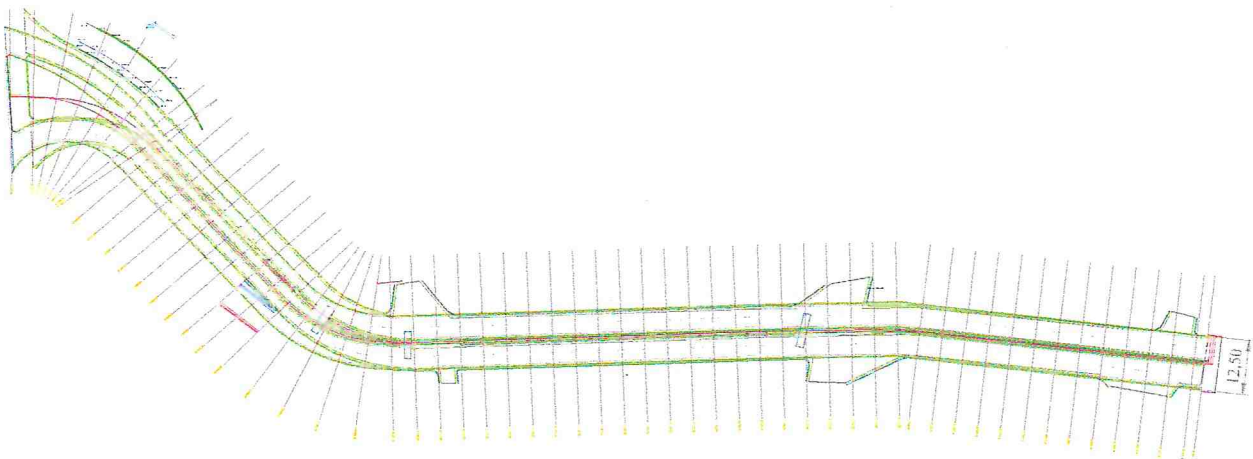

ELABORO
Jesús Amado Camacho Osuna
 C. JESUS AMADO CAMACHO OSUNA
 REPRESENTANTE LEGAL

REVISO.-
Briseida
 ARQ. BRICEIDA GPE NIEBLAS MARTINEZ
 SUPERVISOR DE OBRA

AUTORIZO.-
Rubiel Rincon Ramos
 C. ING. RUBIEL RINCON RAMOS.
 DIRECTOR DE O.P.D.U. Y E.

FOTOS



CONTRATISTA:

JESUS AMADO CAMACHO OSUNA

DEPENDENCIA:

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS,
DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA

DOMICILIO:

Calle sin nombre s/n. Colonia: Loc. Los Naranjos, C.P. 80080, Culiacán, Sinaloa

R.F.C.

CAOJ810630ST4.

OBRA:

CONSTRUCCION DE RECUBRIMIENTO DE UN SUELO CON CONCRETO HIDRÁULICO, EN LA CALLE MOCORITO (ARROYO DE ARENA) ENTRE BOULEVARD JUAN S MILLÁN Y CALLE ELIGIO ABITIA, COLONIA CENTRO, MUNICIPIO DE BADIRAGUATO, SINALOA

FOTOS DE ESTIMACION:

FOTOS DE ESTIMACION:

CVE

1

CONCEPTO

PRELIMINARES

GP01	TRAZO Y NIVELACIÓN DEL TERRENO ESTABLECIENDO EJES Y NIVELETAS DE REFERENCIA, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.
GP02	EXCAVACIONES EN CORTES Y ADICIONALES BAJO LA SUB-RASANTE EN CUALQUIER TIPO DE MATERIAL EXISTENTE, EXCEPTO ROCA FIJA, CON EQUIPO
GP05	COMPACTACIÓN DE TERRENO NATURAL EN AREA DE DESPLANTE, INCLUYE: ESCARIFICADO E INCORPORACIÓN DE HUMEDAD AL 90%, INCLUYE MANO
GP25	SUB-BASE COMPACTO INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIAL DE SUB-BASE CON CARGA Y ACARREO AL 1ER KM. MEDIDO COMPACTO, COMPACTACIÓN AL
GP25	MATERIAL BASE DE COMPACTADA AL 100 % DE SU PESO VOLUMÉTRICO, INCLUYE: SUMINISTRO DEL AGREGADO, ACARREO, COMPACTACIÓN, PRUEBA
GP06	RIEGO DE IMPREGNACIÓN CON EMULSIÓN CATIONICA ECI-60, A RAZÓN DE 1.50 A 1.8 LT/M2, INCLUYE: ARENEO, APLICACIÓN, ALMACENAMIENTO,



ELABORO.-

Jesús Amado

C. JESUS AMADO CAMACHO OSUNA
REPRESENTANTE LEGAL

REVISO.-

Bras

ARQ. BRICEIDA GPE NIEBLAS MARTINEZ
SUPERVISOR DE OBRA

AUTORIZO.-

Rubiel Rincon Ramos

C.ING. RUBIEL RINCON RAMOS
DIRECTOR DE O.P.D.U. Y E.



Fecha y hora de consulta11/08/2025 6:31:39 PM

Contrato00798320

Nombre del ClienteMUNICIPIO DE BADIRAGUATO

BBVA Net Cash - Pagos Interbancarios

Operación autorizada

Transferencia en proceso de validación y aplicación.

Datos del firmante

Usuario:ADMIN1

Poder:100%

Datos de la operación

Tipo de operación: Pago Interbancario	
Descripción: EST 01 NORM LP004	Importe de la operación: 1,528,038.64 MXP
Cuenta de retiro: 0124174836	Cuenta de depósito: 072730012781361749
Divisa de la cuenta: MXP	Divisa de la cuenta: MXP
Titular de la cuenta: MUNICIPIO DE BADIRAG UATO	Titular de la cuenta: JESUS AMADO CAMACHO OSUNA
Nombre banco destino: BANORTE	Fecha valor: 12/08/2025
Fecha de creación: 11/08/2025	Fecha de aplicación: 11/08/2025
Concepto de pago: EST 01 NORM LP004	Referencia numérica:
Instrumento de seguridad: ASD 6551749382	Hora de captura en el canal: 18:31:37

Datos de confirmación de la transferencia

Folio interbancario: 0000945464	Clave de rastreo: 002601002508120000945464
Folio de firma: 0069129054	Folio único: I401202508111831370069129060

Estado operación

Porcentaje Firmado: 100%

Estado: Operado

Detalle de firmas

Acción	Usuario	Porcentaje aportado	Fecha
CREO	ADMIN1	--- %	11/08/2025
FIRMO	ADMIN1	100 %	11/08/2025
