



Badiraguato

GENERANDO BUENOS RESULTADOS



OFICIO No. OPDUyE/722/2025
ASUNTO: SOLICITUD PAGO ESTIMACIÓN
01 ADICIONAL

Badiraguato, Sin., a 04 de Diciembre de 2025


MTRO. GONZALO IRINEO CABALLERO TERRAZAS
TESORERO MUNICIPAL
P R E S E N T E.-

POR MEDIO DE LA PRESENTE, LE SOLICITO EL PAGO POR: CONCEPTO DE PAGO DE ESTIMACIÓN 01 ADICIONAL, DEL IMPORTE DEL CONTRATO, A FAVOR DE LA EMPRESA: JESUS AMADO CAMACHO OSUNA, LA CUAL REALIZA LOS TRABAJOS APROBADOS POR EL SUBCOMITE DE BIENESTAR MUNICIPAL, A CONTINUACIÓN, SE DETALLA:

- NOMBRE DE LA OBRA: CONSTRUCCIÓN DE RECUBRIMIENTO DE UN SUELO CON CONCRETO HIDRÁULICO, EN LA CALLE MOCORITO (ARROYO DE ARENA) ENTRE BOULEVARD JUAN S. MILLAN Y CALLE ELIGIO ABITIA, COLONIA CENTRO, MUNICIPIO DE BADIRAGUATO, SINALOA.
- No. DE CONTRATO: MBGBR-LP-FAISMUN-004/2025
- IMPORTE DEL CONTRATO: \$7,499,560.31 (SIETE MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS SESENTA PESOS 31/100 MN.)
- CONCEPTO DEL PAGO: PAGO DE ESTIMACIÓN 01 ADICIONAL
- IMPORTE A PAGAR: \$85,967.19 (OCHENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS 19/100 M.N)
- RECURSOS: FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FAISMUN) EJERCICIO 2025.
- EMPRESA: JESÚS AMADO CAMACHO OSUNA
- R.F.C. CAOJ810630ST4
- DOMICILIO FISCAL: CALLE SIN NOMBRE, S/N, COLONIA: LOC. LOS NARANJOS, C.P. 80080, CULIACÁN, SINALOA.
- No. DE FACTURA: # DAEB, DE FECHA 04 DE DICIEMBRE DE 2025.

SE ANEXA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DE SOPORTE, COMO AMPARO DE DICHO PAGO.

AGRADECIENDO DE ANTEMANO LA ATENCIÓN QUE SE SIRVA DAR A LA PRESENTE, ME DESPIDO QUEDANDO A SUS ÓRDENES.



DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS,
DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA,
C.C.P. ARCHIVO

ATENTAMENTE

C. ING. RUBIEL RINCÓN RAMOS
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS,
DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA

MUNICIPIO DE
BADIRAGUATO
TESORERÍA

RECIBIDO
04 DIC 2025
06:43 PM



JESUS AMADO CAMACHO OSUNA

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Serie:

Folio: 87

Fecha: 04/Dic/2025 16:46:04

Lugar de expedición (C.P.) 80080

Emisor

JESUS AMADO CAMACHO OSUNA

RFC: CAOJ810630ST4

Régimen Fiscal: 612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

Domicilio: LOS NARANJOS Culiacán Sinaloa México 80080

Receptor

Cliente: MUNICIPIO DE BADIRAGUATO

RFC: MBA850101214

Uso CFDI: I01 - Construcciones

Exportación: 01 - No aplica

Domicilio Fiscal: 80500

Régimen Fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

Domicilio: GABRIEL LEYVA SOLANO S/N Badiraguato Badiraguato Sinaloa México 80500

Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición

Forma de Pago: 03 - Transferencia electrónica de

Tipo de cambio: 1.000000

Moneda: MXN - Peso Mexicano

Cantidad	Clave Unid ad SAT	Clave Prod/Servi cio	Descripción	Valor unitario	Impuestos	Importe
1.00	E48 - Unidad de servicio	72141103 - Servicio de pavimentación de calles y carreteras	<p>PAGO DE ESTIMACION 01 ADICIONAL</p> <p>DE LA OBRA: CONSTRUCCIÓN DE RECUBRIMIENTO DE UN SUELO CON CONCRETO HIDRÁULICO, EN LA CALLE MOCORITO (ARROYO DE ARENA) ENTRE BOULEVARD JUAN S MILLÁN Y CALLE ELIGIO ABITIA, COLONIA CENTRO, MUNICIPIO DE BADIRAGUATO, SINALOA.</p> <p>CONTRATO NO.: MBGBR-LP-FAISMUN-004/2025 MONTO DEL CONTRATO: \$ 7,499,560.31</p> <p>IMPORTE DE LA OBRA EJECUTADA SIN IVA \$ 18,739.22 MAS I.V.A 16 % \$ 1 8,998.28 TOTAL DE LA OBRA EJECUTADA CON IVA \$ 1 37,737.50</p> <p>AMORTIZACIÓN ANTICIPO 35% \$ 4 1,558.73 MAS I.V.A.: \$ 6,649.40 TOTAL AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO: \$ 4 8,208.13</p> <p>Importe TOTAL A FACTURAR \$ 7 7,180.49 MAS I.V.A \$ 1 2,348.88 MONTO NETO A FACTURAR \$ 8 9,529.37</p> <p>RETENCION 3% (S.V.I.F.Y C.) : \$ 3,562.18 TOTAL DEDUCCIONES: \$ 5 1,770.31</p> <p>MONTO LIQUIDO A RECIBIR: \$ 8 5,967.19</p>	\$77,180.49	IVA, - Importe: 12348.88	\$77,180.49

Información de cancelación

Motivo de cancelación:

Folio relacionado:

CFDI RELACIONADOS

Tipo de relación:

Lista de CFDI's relacionados:

Total con letra:
ochenta y nueve mil quinientos veintinueve Pesos 37/100 M.N.

Subtotal: \$77,180.49
I.E.S.P.S \$0.00
IVA 16 %: \$12,348.88

Total: \$89,529.37



Este documento es una representación impresa de un CFDI

Serie del Certificado del emisor: 00001000000711830284
Folio Fiscal: 9DD74F5B-7941-4AE0-99F4-2101DDC0DAEB
No. de serie del Certificado del SAT: 00001000000709182898
Fecha y hora de certificación: 2025-12-04T17:46:10

Sello digital del CFDI

N01G/HQx0eH+DaSby+8ZlloCXT9wq1IJR5qYMOUwUwSdITIPYXrV+FnI+986/05k76b03Te66VfVodpcMNIUqgu7mpBTwlvNT7A1YckqGB2f0shuOipxpSocRlo4uQTc6ky0ZcZF9
CFLkKHEF+eMozJN5vVd2HUpIXZ0pXcF3i51xTqJHgHcP3n0x/kqFE/UbeyLSLLi002Zu2e4eNuHgx1vG1JBjI/dRIalHqeC6gb43PBwkGICSw0xCvWinFjuMOuCPFGGdbpVih1ipOsk
N2KE9kfinuWTFW37QYwCmWdHvS6fWuAgA05p0wgQG/Zqny2mOenywEA==

Sello del SAT

IwBGeJu8KTpbMWgqJ63Z3pZsyMLdinN98dj1bpIKTmZpzdKwpNN0B51qHxWY+W1YNeM73S4gJBc9PO6RmbLLU0XW5VvmZmwZcFKCeQoeBd+3QqAoY2/dkMHgHfrcI8+WUH14MVEH7
ig7gzr/Q6jGZyx/VUuCjzwer6joWCmEQPPJT+5dNtA7c2lp73bprNGpgf9WfioyIR6pi+fwqfWwppju7Qn4TCXyofT4S76311c79i0u3/IjYSel5+b+IYZ7f43HCyZDXiqZPL
MNZp/J5CS9T3eSzzb6xzaIZ3icJhBAh0QaJr90OCFBy09RbwuO/HDDXJpg==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|9DD74F5B-7941-4AE0-99F4-2101DDC0DAEB|2025-12-04T17:46:10|MAS0810247C0|N01G/HQx0eH+DaSby+8ZlloCXT9wq1IJR5qYMOUwUwSdITIPYXrV+FnI+986/05k7
6b03Te66VfVodpcMNIUqgu7mpBTwlvNT7A1YckqGB2f0shuOipxpSocRlo4uQTc6ky0ZcZF9CFLkKHEF+eMozJN5vVd2HUpIXZ0pXcF3i51xTqJHgHcP3n0x/kqFE/UbeyLSLLi002Zu2e4
eNuHgx1vG1JBjI/dRIalHqeC6gb43PBwkGICSw0xCvWinFjuMOuCPFGGdbpVih1ipOskN2KE9kfinuWTFW37QYwCmWdHvS6fWuAgA05p0wgQG/Zqny2mOenywEA==|00001000000709
182898||

This XML file does not appear to have any style information associated with it. The document tree is shown below.

[illegible]



Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
CAOJ810630ST4	JESUS AMADO CAMACHO OSUNA	MBA850101214	MUNICIPIO DE BADIRAGUATO
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
9DD74F5B-7941-4AE0-99F4-2101DDC0DAEB	2025-12-04T16:46:04	2025-12-04T17:46:10	MAS0810247C0
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$89,529.37	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir



Fecha: 28 de noviembre de 2025

CARATULA DE ESTIMACIÓN

CONTRATISTA:		JESUS AMADO CAMACHO OSUNA		ESTIMACIÓN No:		01 ADICIONAL	
DOMICILIO:		Calle sin nombre s/n. Colonia: Loc. Los Naranjos, C.P. 80080, Culiacán, Sinaloa					
TELÉFONO:		CEL:		PERIODO DE ESTIMACION:			
				DEL		03-oct-25	
				AL		19-nov-25	
R.F.C.				FECHA DE CONTRATO:			
CAOJ810630ST4.						19-jul-25	
DEPENDENCIA:-		DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA					
		LOCALIDAD:		MUNICIPIO:		PERIODO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO:	
		BADIRAGUATO		BADIRAGUATO		INICIO: 23-jul-25	
						TERMINACIÓN: 19-nov-25	
DESCRIPCIÓN:							
CONSTRUCCIÓN DE RECUBRIMIENTO DE UN SUELO CON CONCRETO HIDRAULICO, EN LA CALLE MOCORITO (ARROYO DE ARENA) ENTRE BOULEVARD JUAN S MILLÁN Y CALLE ELIGIO ABITIA, COLONIA CENTRO, MUNICIPIO DE BADIRAGUATO, SINALOA.							
CONTRATO No:							
MBGBR-IP-FAISMUN-004/2025							
IMPORTE SIN IVA DE LA OBRA		IMPORTE CON IVA DE LA OBRA		35% ANTICIPO DE LA OBRA		IMPORTE TOTAL DE CONTRATO:	
\$6,465,138.20		\$7,499,560.31		\$2,624,846.11		\$7,499,560.31	
RECIBI:						BUENO POR: \$ 85,967.19	
\$ 85,967.19		(SON OCHENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS 19/100 M.N.)					
EN PAGO DE ESTIMACIÓN:		01 ADICIONAL					
DEDUCCIONES:							
AMORTIZACIÓN ANTICIPO 35%		\$ 41,558.73		CALCULO DE ESTIMACIÓN			
MAS I.V.A.:		\$ 6,649.40		IMPORTE DE LA OBRA EJECUTADA SIN IVA		\$ 118,739.22	
TOTAL AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO:		\$ 48,208.13		MAS I.V.A 16 %		\$ 18,998.28	
3 % SVIFYC:		\$ 3,562.18		TOTAL DE LA OBRA EJECUTADA CON IVA		\$ 137,737.50	
TOTAL DEDUCCIONES:		\$ 51,770.31		MENOS TOTAL DEDUCCIONES:		\$ 51,770.31	
				MONTO A FACTURAR MAS IVA		\$ 89,529.37	
						SALDO A PAGAR: \$ 85,967.19	

ELABORO.-

Jesús Amado Camacho Osuna
C. JESUS AMADO CAMACHO OSUNA
REPRESENTANTE LEGAL

REVISOR

Ing. Jose Rodolfo Contreras Lopez
ING. JOSE RODOLFO CONTRERAS LOPEZ
COSTOS Y PRESUPUESTOS.

AUTORIZO.

C. Ing. Rubiel Rincon Ramos
C. ING. RUBIEL RINCON RAMOS
DIRECTOR DE O.P.D.U. Y E



JESUS AMADO CAMACHO OSUNA

Dependencia :
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA
Control de Estimaciones

CONSTRUCCIÓN DE RECUBRIMIENTO DE UN SUELO CON CONCRETO HIDRÁULICO, EN LA CALLE MOCORITO (ARROYO DE ARENA) ENTRE BOULEVARD JUAN S MILLÁN Y CALLE ELIGIO ABITIA, COLONIA CENTRO, MUNICIPIO DE BADIRAGUATO, SINALOA.				Fecha:		Estimacion:					
				28 de noviembre de 2025		01 ADICIONAL					
Periodo de la estimación:		03/10/2025		19/11/2025		Localidad:		No. De contrato:			
Periodo de Ejecución:		03/10/2025		19/11/2025		BADIRAGUATO		MBGBR-LP-FAISMUN-004/2025			
Importe del contrato con I.V.A:			Imp. Contratado sin I.V.A			Anticipo		Importe Anticipo sin I.V.A		% de Avance	
\$ 7,499,560.31			\$ 6,465,138.20			\$ 2,624,846.11		\$ 2,262,798.37		2%	
										% Avance Total	
										97%	

Control Del Anticipo	Liquidacion de Estimacion	Control de Estimacion
AMORTIZA ESTA ESTIMACION:	Importe de la Estimacion (+) \$ 118,739.22	ESTA ESTIMACION
\$ 48,208.13	16 % I.V.A (+) \$ 18,998.28	
	Sub- Total A (=) \$ 137,737.50	\$ 137,737.50
	Amortizacion Anticipo 35% \$ 41,558.73	
AMORTIZACION ANTERIOR	16 % I.V.A (+) \$ 6,649.40	ACUMULADO ANTERIOR
\$ 2,505,623.10	Total (=) \$ 48,208.13	\$ 7,158,923.17
	Importe TOTAL A FACTURAR \$ 77,180.49	
TOTAL AMORTIZADO	16 % I.V.A (+) \$ 12,348.88	TOTAL ACUMULADO.
\$ 2,553,831.23	Total (=) \$ 89,529.37	\$ 7,296,660.67
	3 % SVIFYC: \$ 3,562.18	
ANTICIPO OTORGADO	Total Deducciones (=) \$ 51,770.31	CONTRATADO
\$ 2,624,846.11	Importe TOTAL \$ 85,967.19	\$ 7,499,560.31
SALDO DEL ANTICIPO	NETO A PAGAR \$ 85,967.19	SALDO
\$71,014.88	Son:	\$ 202,899.64
	(SON OCHENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS 19/100 M.N.)	

ELABORO:


Jesús Amado
C. JESUS AMADO CAMACHO OSUNA
REPRESENTANTE LEGAL

REVISÓ

ING. JOSE RODOLFO CONTRERAS LOPEZ
COSTOS Y PRESUPUESTOS.

AUTORIZO

Rubiel Rincon Ramos
C. ING. RUBIEL RINCON RAMOS.
DIRECTOR O.P.D.U. Y E.



CONTRATISTA:	JESUS AMADO CAMACHO OSUNA
--------------	---------------------------

DOMICILIO: Calle sin nombre s/n. Colonia: Loc. Los Naranjos, C.P. 80080, Culiacán, Sinaloa

R.F.C.	CAOJ810630ST4.
--------	----------------

LOCALIDAD:	BADIRAGUATO
------------	-------------

DESCRIPCIÓN:	CONSTRUCCIÓN DE RECUBRIMIENTO DE UN SUELO CON CONCRETO HIDRÁULICO, EN LA CALLE MOCORITO (ARROYO DE ARENA) ENTRE BOULEVARD JUAN S MILLÁN Y CALLE ELIGIO ABITIA, COLONIA CENTRO, MUNICIPIO DE BADIRAGUATO, SINALOA.
--------------	---

FECHA INICIO CONTRATO:	23-jul-25	FECHA TERMINACION	19-nov-25	CONTRATO:	MBGBR-LP-FAISMUN-004/2025	FECHA CONTRATO:	19-jul-25
---------------------------	-----------	----------------------	-----------	-----------	---------------------------	-----------------	-----------

IMPORTE DE OBRA SIN IVA:	\$6,465,138.20	CLAVE DE CONVENIO ADICIONAL:
--------------------------	----------------	------------------------------

IMPORTE DE ANTICIPO DE OBRA:	\$2,624,846.11	PERIODO CONVENIO ADICIONAL:
------------------------------	----------------	-----------------------------

IMPORTE TOTAL DE CONTRATO:	\$7,499,560.31	IMPORTE CONVENIO ADICIONAL:
----------------------------	----------------	-----------------------------

No. DE ESTIMACIÓN	PERIODO		IMPORTE C/IVA ESTIMACIÓN	IMPORTE SIN IVA	3 % SVIFYC:	AMORTIZACIÓN ANTICIPO 35%	TOTAL DEDUCCIONES	LIQUIDO A PAGAR
	23-jul-25	05-ago-25						
01 NORMAL	23-jul-25	05-ago-25	\$ 2,448,238.72	\$ 2,110,550.62	\$ 63,316.52	\$ 856,883.55	\$ 920,200.07	\$ 1,528,038.65
02 NORMAL	06-ago-25	07-sep-25	\$ 1,457,063.34	\$ 1,256,089.09	\$ 37,682.67	\$ 509,972.17	\$ 547,654.84	\$ 909,408.50
03 NORMAL	08-sep-25	02-oct-25	\$ 1,457,380.64	\$ 1,256,362.62	\$ 37,690.88	\$ 510,083.22	\$ 547,774.10	\$ 909,606.54
04 NORMAL	03-oct-25	19-nov-25	\$ 1,796,240.47	\$ 1,548,483.16	\$ 46,454.49	\$ 628,684.16	\$ 675,138.65	\$ 1,121,101.82
01 ADICIONAL	03-oct-25	19-nov-25	\$ 137,737.50	\$ 118,739.22	\$ 3,562.18	\$ 48,208.13	\$ 51,770.31	\$ 85,967.19
TOTALES:			\$ 7,296,660.67	\$ 6,290,224.71	\$ 188,706.74	\$ 2,553,831.23	\$ 2,742,537.97	\$ 4,554,122.70
SALDO DEL CONTRATO:			\$ 202,899.64	SALDO POR AMORTIZAR:		\$ 71,014.88		

Teste Amado

C. JESUS AMADO CAMACHO OSUNA
REPRESENTANTE LEGAL

REVISO.-
ING. JOSE RODOLFO CONTRERAS LOPEZ
COSTO Y PRESUPUESTOS.

AUTORIZO.-
C. ING. RUBIEL RINCON RAMOS
DIRECTOR DE O.P.D.U. Y E.



CONTRATISTA:		FECHA:	
JESUS AMADO CAMACHO OSUNA		28 de noviembre de 2025	
DOMICILIO:		DEPENDENCIA:	
Calle sin nombre s/n. Colonia: Loc. Los Naranjos, C.P. 80080, Culiacán, Sinaloa		DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA	
R.F.C.	CAOJ810630ST4.		

RESÚMEN DE ESTIMACIÓN

LOCALIDAD:	BADIRAGUATO	ESTIMACIÓN:	01 ADICIONAL
DESCRIPCIÓN:	CONSTRUCCIÓN DE RECUBRIMIENTO DE UN SUELO CON CONCRETO HIDRÁULICO, EN LA CALLE MOCORITO (ARROYO DE ARENA) ENTRE BOULEVARD JUAN S MILLÁN Y CALLE ELIGIO ABITIA, COLONIA CENTRO, MUNICIPIO DE BADIRAGUATO, SINALOA.		

IMPORTE DE OBRA SIN IVA:	\$ 6,465,138.20
IMPORTE DE ANTICIPO DE OBRA:	\$ 2,624,846.11
IMPORTE TOTAL DE CONTRATO:	\$ 7,499,560.31

DESTAJO		IMPORTE
1	PRELIMINARES	\$ -
2	ESTRUCTURA	\$ 25,165.28
3	OTROS	\$ 93,573.94
SUBTOTAL ESTIMACIÓN:		\$ 118,739.22

SUB TOTAL=	\$ 118,739.22
I.V.A AL 16 %	\$ 18,998.28
TOTAL =	\$ 137,737.50

ELABORO.-

Jesús Amado
C. JESUS AMADO CAMACHO OSUNA
REPRESENTANTE LEGAL

REVISÓ.-

ING. JOSE RODOLFO CONTRERAS LOPEZ
COSTOS Y PRESUPUESTOS.

AUTORIZO.-

Rubiel Rincon Ramos
C. ING. RUBIEL RINCON RAMOS.
DIRECTOR DE O.P.D.U. Y E.



CONTRATISTA: JESUS AMADO CAMACHO OSUNA		DEPENDENCIA:		FECHA: viernes, 28 de noviembre de 2025	
DOMICILIO: Calle sin nombre s/n. Colonia: Loc. Los Naranjos, C.P. 80080, Culiacán, Sinaloa		R.F.C.: CAOJ810630ST4		1 de 1	
DESGLOSE DE CONCEPTOS DE ESTIMACIÓN					
DESCRIPCIÓN: CONSTRUCCIÓN DE RECUBRIMIENTO DE UN SUELO CON CONCRETO HIDRÁULICO, EN LA CALLE MOCORITO (ARROYO DE ARENA) ENTRE BOULEVARD JUAN S MILLÁN Y CALLE ELIGIO ABITIA, COLONIA CENTRO, MUNICIPIO DE BADIRAGUATO, SINALOA.		LOCALIDAD: BADIRAGUATO		ESTIMACIÓN: 01 ADICIONAL	
IMPORTE DE OBRA SIN IVA: \$6,465,138.20		IMPORTE DE ANTICIPO DE OBRA: \$2,624,846.11		IMPORTE TOTAL DE CONTRATO: \$7,499,560.31	

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	SEGUN PROYECTO		TOTAL	HASTA ESTIM	HASTA EST/IN	EXCEDENTE	DE ESTA ESTIMACIÓN	IMPORTE
			GANT	P.U.						
1	PRELIMINARES									
GP02	EXCAVACIONES EN CORTES Y ADICIONALES BAJO LA SUB-RASANTE EN CUALQUIER TIPO DE MATERIAL EXISTENTE, EXCEPTO ROCA FLIA, CON EQUIPO MECANICO, INCLUYE: CARGA CON MAQUINA DEL MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION Y ACARREOS FUERA DE LA OBRA, MEDIDO COMPACTO.	M3	2,235.20	\$ 133.08	\$ 297,482.77	2,625.05	2,235.20	389.85	389.85	\$ 51,885.14
2	ESTRUCTURA									
GP11	PINTURA EN GUARNICION DE 20 X 15 CM. CON PINTURA TIPO TRAFICO SCT COLOR AMARILLO O BLANCO, CON USO DE MAQUINA PINTARRAYAS, INCLUYE: PREPARACION DE LA SUPERFICIE, MATERIAL, MANO DE OBRA CALIFICADA Y EQUIPO ADECUADO.	ML	800.68	\$ 122.59	\$98,154.99	1,005.96	800.68	205.28	205.28	\$ 25,165.28
3	OTROS									
GP552	CANAL PLUVIAL DE 1.30 CON VARIACION A 2.10 X 1.30 MTS A BASE DE LOSA DE CIMENTACION Y MUROS DE CONCRETO REFORZADOS CON DOBLE PARRILLA DE ACERO DE 3/8" Y COLADOS CON CONCRETO FC=250 KG/CM2, INCLUYE: CONCRETO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.	PZA	14.25	\$ 24,953.05	\$ 355,580.96	18.00	14.25	3.75	3.75	\$ 93,573.94
									SUB-TOTAL	\$ 118,739.22
									IVA	\$ 18,998.28
									MONTO TOTAL	\$ 137,737.50

ELABORÓ: *Jesús Amado*
C. JESUS AMADO CAMACHO OSUNA
REPRESENTANTE LEGAL

REVISÓ: *Jesús Amado*
ING. JOSE RODOLFO CONTRERAS LOPEZ
COSTOS Y PRESUPUESTOS

AUTORIZO: *Jesús Amado*
C. ING. RUBIEL RINCON RAMOS
PRESUPUESTOS Y COSTOS



VOLUMENES GENERADORES

CONTRATISTA

JESUS AMADO CAMACHO OSUNA

RFC: CAOJ810630ST4.

CLAVE	CONCEPTO	LOCALIZACION		UNIDAD	LARGO	ANCHO EN METROS	ALTO	PZA	TOTAL	ESTIMACION 01 ADICIONAL
		EJE	TRAMO							
1	PRELIMINARES									
	EXCAVACIONES EN CORTES Y ADICIONALES BAJO LA SUB-RASANTE EN CUALQUIER TIPO DE MATERIAL EXISTENTE, EXCEPTO ROCA FIA, CON EQUIPO MECANICO, INCLUYE: CARGA CON MAQUINA DEL MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION Y ACARREOS FUERA DE LA OBRA, MEDIDO COMPACTO.			M3						VER CROQUIS
		CADENAMIENTO			LONG	AREA				
		0+000.00	0+005.00		5.0000	14.97			74.85	
		0+005.00	0+010.00		5.0000	16.75			83.75	
		0+010.00	0+015.00		5.0000	20.79			103.95	
		0+015.00	0+020.00		5.0000	33.86			169.30	
		0+020.00	0+025.00		5.0000	27.78			138.90	
		0+025.00	0+030.00		5.0000	8.45			42.25	
		0+030.00	0+032.53		2.5300	0.12			0.30	
		0+032.53	0+035.00		2.4700	0.12			0.30	
		0+035.00	0+040.00		5.0000	0.12			0.60	
		0+040.00	0+045.00		5.0000	0.12			0.60	
		0+045.00	0+050.00		5.0000	0.17			0.85	
		0+050.00	0+055.00		5.0000	1.14			5.70	
		0+055.00	0+060.00		5.0000	6.48			32.40	
		0+060.00	0+065.00		5.0000	7.21			36.05	
		0+065.00	0+070.00		5.0000	12.03			60.15	
		0+070.00	0+075.00		5.0000	12.26			61.30	
		0+075.00	0+080.00		5.0000	12.96			64.80	
		0+080.00	0+085.00		5.0000	12.09			60.45	
		0+085.00	0+090.00		5.0000	11.37			56.85	
		0+090.00	0+095.00		5.0000	8.52			42.60	
		0+095.00	0+100.00		5.0000	4.82			24.10	

ELABORO:
C. JESUS AMADO CAMACHO OSUNA
REPRESENTANTE LEGAL

REVISO:
SUPERVISOR DE OBRA

AUTORIZO:
ING. RUBIEL RINCON RAMOS
DIRECTOR DE O.P.D.U.Y.E.



VOLUMENES GENERADORES

CONTRATISTA

JESUS AMADO CAMACHO OSUNA

RFC: CAOJ810630ST4.

ESTIMACION
01 ADICIONAL

CONSTRUCCIÓN DE RECUBRIMIENTO DE UN SUELO CON CONCRETO HIDRÁULICO, EN LA CALLE
MOCORTO (ARROYO DE ARENA) ENTRE BOULEVARD JUAN S MILLÁN Y CALLE ELIGIO ABITIA,
COLONIA CENTRO, MUNICIPIO DE BADIRAGUATO, SINALOA

CLAVE	CONCEPTO	LOCALIZACION		UNIDAD	EN METROS			ALTO	PZA	TOTAL	OBSERVACIONES
		EJE	TRAMO		LARGO	ANCHO					
		0+100.00	0+105.00		5.0000	5.31				26.55	
		0+105.00	0+110.00		5.0000	5.47				27.35	
		0+110.00	0+115.00		5.0000	5.69				28.45	
		0+115.00	0+120.00		5.0000	7.16				35.80	
		0+120.00	0+125.00		5.0000	7.39				36.95	
		0+125.00	0+130.00		5.0000	7.64				38.20	
		0+130.00	0+135.00		5.0000	7.99				39.95	
		0+135.00	0+140.00		5.0000	9.42				47.10	
		0+140.00	0+145.00		5.0000	9.55				47.75	
		0+145.00	0+150.00		5.0000	8.94				44.70	
		0+150.00	0+155.00		5.0000	9.30				46.50	
		0+155.00	0+160.00		5.0000	8.88				44.40	
		0+160.00	0+165.00		5.0000	9.45				47.25	
		0+165.00	0+170.00		5.0000	9.98				49.90	
		0+170.00	0+175.00		5.0000	9.30				46.50	
		0+175.00	0+180.00		5.0000	8.88				44.40	
		0+180.00	0+185.00		5.0000	8.53				42.65	
		0+185.00	0+190.00		5.0000	8.64				43.20	
		0+190.00	0+195.00		5.0000	9.91				49.55	
		0+195.00	0+200.00		5.0000	13.19				65.95	
		0+200.00	0+205.00		5.0000	8.52				42.60	
		0+205.00	0+210.00		5.0000	8.05				40.25	
		0+210.00	0+215.00		5.0000	7.89				39.45	
		0+215.00	0+220.00		5.0000	6.57				32.85	
		0+220.00	0+225.00		5.0000	6.21				31.05	
		0+225.00	0+230.00		5.0000	6.50				32.50	
		0+230.00	0+235.00		5.0000	6.58				32.90	
		0+235.00	0+240.00		5.0000	6.57				32.85	
		0+240.00	0+245.00		5.0000	6.86				34.30	
		0+245.00	0+250.00		5.0000	6.89				34.45	
		0+250.00	0+255.00		5.0000	7.19				35.95	

ELABORO: 
C. JESUS AMADO CAMACHO OSUNA
REPRESENTANTE LEGAL

REVISO: 
SUPERVISOR DE OBRA

AUTORIZO: 
ING. RUBIEL RINCON RAMOS
DIRECTOR DE O.P.D.U.Y.E.



ELABORO: Jesus Amado Camacho Osuna
C. JESUS AMADO CAMACHO OSUNA
REPRESENTANTE LEGAL

REVISOR
SUPERVISOR DE OBRA

AUTORIZO:-
ING. RUBIEL RINCON RAMOS
DIRECTOR DE O.P.D.U.Y.E.

CONTRATISTA:
JESUS AMADO CAMACHO OSUNA

DEPENDENCIA:
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS,
DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA

DOMICILIO: Calle sin nombre s/n. Colonia: Loc. Los Naranjos, C.P. 80080, Culiacán, Sinaloa


R.F.C. CAOJS10630ST4.

OBRA: CONSTRUCCIÓN DE RECUBRIMIENTO DE UN SUELO CON CONCRETO HIDRÁULICO, EN LA CALLE MOCORITO (ARROYO DE ARENA) ENTRE BOULEVARD JUAN S MILLÁN Y CALLE ELIGIO ABITIA, COLONIA CENTRO, MUNICIPIO DE BADIRAGUATO, SINALOA.

CROQUIS ESTIMACION:

CROQUIS ESTIMACION:

CLAVE	CONCEPTO
1	PRELIMINARES
GP02	EXCAVACIONES EN CORTES Y ADICIONALES BAJO LA SUB-RASANTE EN CUALQUIER TIPO DE MATERIAL EXISTENTE, EXCEPTO ROCA FIJA, CON
2	ESTRUCTURA
GP11	PINTURA EN GUARNICIÓN DE 20 X 15 CM. CON PINTURA TIPO TRAFICO SCT COLOR AMARILLO O BLANCO, CON USO DE MAQUINA PINTARRAYAS,
3	OTROS
GP552	CANAL PLUVIAL DE 1.30 CON VARIACIÓN A 2.10 X 1.30 MTS A BASE DE LOSA DE CIMENTACIÓN Y MUROS DE CONCRETO REFORZADOS CON DOBLE

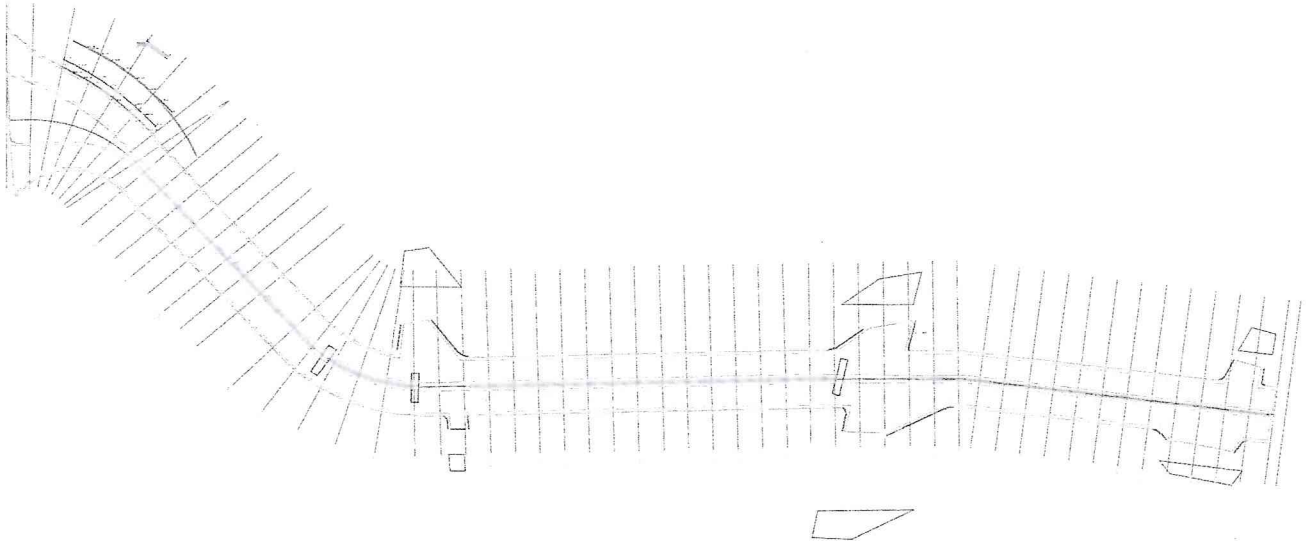

ELABORO
Jesús Amado Camacho Osuna
C. JESUS AMADO CAMACHO OSUNA
REPRESENTANTE LEGAL

REVISO.-
[Signature]
SUPERVISOR DE OBRA

AUTORIZO.-
[Signature]
C. ING. RUBIEL RINCON RAMOS.
DIRECTOR DE O.P.D.U. Y E.



CONTRATISTA:

JESUS AMADO CAMACHO OSUNA

DEPENDENCIA:

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS,
DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA

DOMICILIO:

Calle sin nombre s/n. Colonia: Loc. Los Naranjos, C.P. 80080, Culiacán, Sinaloa

R.F.C.

CAOJ810630ST4.


OBRA:

CONSTRUCCIÓN DE RECUBRIMIENTO DE UN SUELO CON CONCRETO HIDRÁULICO, EN LA CALLE MOCORITO (ARROYO DE ARENA) ENTRE BOULEVARD JUAN S MILLÁN Y CALLE ELIGIO ABITIA, COLONIA CENTRO, MUNICIPIO DE BADIRAGUATO, SINALOA.

FOTOS DE ESTIMACION:

FOTOS DE ESTIMACION:

CVE	CONCEPTO
1	PRELIMINARES
GP02	EXCAVACIONES EN CORTES Y ADICIONALES BAJO LA SUB-RASANTE EN CUALQUIER TIPO DE MATERIAL EXISTENTE, EXCEPTO ROCA FIJA, CON EQUIPO
2	ESTRUCTURA
GP11	PINTURA EN GUARNICIÓN DE 20 X 15 CM. CON PINTURA TIPO TRAFICO SCT COLOR AMARILLO O BLANCO, CON USO DE MAQUINA PINTARRAYAS,
3	OTROS
GP55	CANAL PLUVIAL DE 1.30 CON VARIACIÓN A 2.10 X 1.30 MTS A BASE DE LOSA DE CIMENTACION Y MUROS DE CONCRETO REFORZADOS CON DOBLE

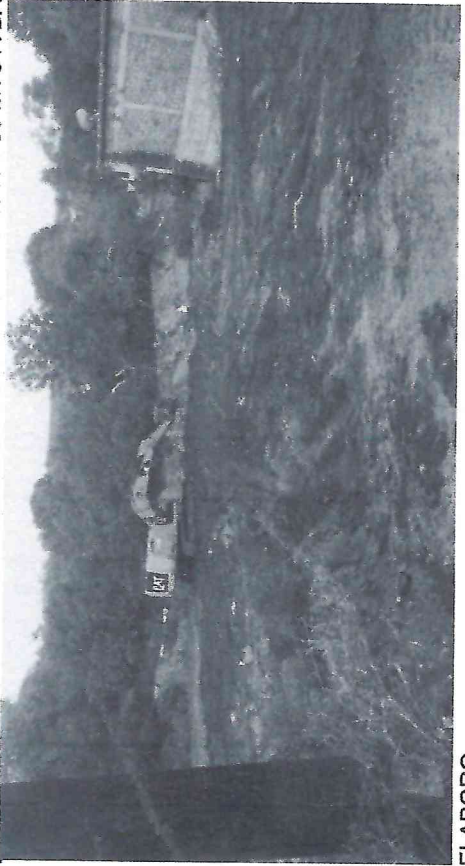

ELABORO.-

Jesus Amado
C. JESUS AMADO CAMACHO OSUNA
REPRESENTANTE LEGAL

REVISO.-

[Signature]
SUPERVISOR DE OBRA

AUTORIZO.-

[Signature]
C. ING. RUBIEL RINCON RAMOS
DIRECTOR DE OBRAS



Fecha y hora de consulta

10/12/2025 7:06:10 PM

Contrato

00798320

Nombre del Cliente

MUNICIPIO DE BADIRAGUATO

BBVA Net Cash - Pagos Interbancarios

Operación autorizada

Transferencia en proceso de validación y aplicación.

Datos del firmante

Usuario: ADMIN1

Poder: 100%

Datos de la operación

Tipo de operación: Pago Interbancario

Descripción: EST 01 AD LP 004

Importe de la operación: 85,967.19 MXP

Cuenta de retiro: 0124174836

Cuenta de depósito: 072730012781361749

Divisa de la cuenta: MXP

Divisa de la cuenta: MXP

Titular de la cuenta: MUNICIPIO DE BADIRAG
UATOTitular de la cuenta: JESUS AMADO CAMACHO
OSUNA

Nombre banco destino: BANORTE

Fecha valor: 11/12/2025

Fecha de creación: 10/12/2025

Fecha de aplicación: 10/12/2025

Concepto de pago: EST 01 AD LP 004

Referencia numérica:

Instrumento de seguridad: ASD 6551749382

Hora de captura en el canal: 19:06:08

Datos de confirmación de la transferencia

Folio interbancario: 0000220402

Clave de rastreo: 002601002512110000220402

Folio de firma: 0068150038

Folio único: I401202512101906080068150044

Estado operación

Porcentaje Firmado: 100%

Estado: Operado

Detalle de firmas

Acción	Usuario	Porcentaje aportado	Fecha
CREO	ADMIN1	— %	10/12/2025
FIRMO	ADMIN1	100 %	10/12/2025

BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México

www.bbvanetcash.mx
