



Badiraguato

GENERANDO BUENOS RESULTADOS



OFICIO No. OPDUyE/723/2025
ASUNTO: SOLICITUD PAGO ESTIMACIÓN
01 EXTRAORDINARIO FINIQUITO
Badiraguato, Sin., a 08 de Diciembre de 2025


MTRO. GONZALO IRINEO CABALLERO TERRAZAS
TESORERO MUNICIPAL
P R E S E N T E.-

POR MEDIO DE LA PRESENTE, LE SOLICITO EL PAGO POR: CONCEPTO DE PAGO DE ESTIMACIÓN 001 EXTRAORDINARIO FINIQUITO, DEL IMPORTE DEL CONTRATO, A FAVOR DE LA EMPRESA: JESUS AMADO CAMACHO OSUNA, LA CUAL REALIZA LOS TRABAJOS APROBADOS POR EL SUBCOMITE DE BIENESTAR MUNICIPAL, A CONTINUACIÓN, SE DETALLA:

- NOMBRE DE LA OBRA: CONSTRUCCIÓN DE RECUBRIMIENTO DE UN SUELO CON CONCRETO HIDRÁULICO, EN LA CALLE MOCORITO (ARROYO DE ARENA) ENTRE BOULEVARD JUAN S. MILLAN Y CALLE ELIGIO ABITIA, COLONIA CENTRO, MUNICIPIO DE BADIRAGUATO, SINALOA.
- No. DE CONTRATO: MBGBR-LP-FAISMUN-004/2025
- IMPORTE DEL CONTRATO: \$7,499,560.31 (SIETE MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS SESENTA PESOS 31/100 MN.)
- CONCEPTO DEL PAGO: PAGO DE ESTIMACIÓN 01 EXTRAORDINARIO FINIQUITO
- IMPORTE A PAGAR: \$126,637.36 (CIENTO VEINTISEIS MIL SEISCIENTOS TREITA Y SIETE PESOS 36/100 M.N)
- RECURSOS: FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FAISMUN) EJERCICIO 2025.
- EMPRESA: JESÚS AMADO CAMACHO OSUNA
- R.F.C. CAOJ810630ST4
- DOMICILIO FISCAL: CALLE SIN NOMBRE, S/N, COLONIA: LOC. LOS NARANJOS, C.P. 80080, CULIACÁN, SINALOA.
- No. DE FACTURA: # 738A, DE FECHA 08 DE DICIEMBRE DE 2025.

SE ANEXA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DE SOPORTE, COMO AMPARO DE DICHO PAGO.

AGRADECIENDO DE ANTEMANO LA ATENCIÓN QUE SE SIRVA DAR A LA PRESENTE, ME DESPIDO QUEDANDO A SUS ÓRDENES.



DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS,
DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA.
BADIRAGUATO, SINALOA.
C.C.P. ARCHIVO.


ATENTAMENTE

ING. RUBIEL RINCÓN RAMOS
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS,
DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA

MUNICIPIO DE
BADIRAGUATO
TESORERÍA

12:11 PM
08 DIC 2025

RECIBIDO



JESUS AMADO CAMACHO OSUNA

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Serie:

Folio: 90

Fecha: 08/Dic/2025 10:09:34

Lugar de expedición (C.P.) 80080

Emisor

JESUS AMADO CAMACHO OSUNA

RFC: CAOJ810630ST4

Régimen Fiscal: 612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y

Domicilio: Profesionales

LOS NARANJOS Culiacán Sinaloa México 80080

Receptor

Cliente: MUNICIPIO DE BADIRAGUATO

RFC: MBA850101214

Uso CFDI: I01 - Construcciones

Exportación: 01 - No aplica

Domicilio Fiscal: 80500

Régimen Fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

Domicilio: GABRIEL LEYVA SOLANO S/N Badiraguato Badiraguato Sinaloa México 80500

Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición

Forma de Pago: 03 - Transferencia electrónica de

Tipo de cambio: 1.000000

Moneda: MXN - Peso Mexicano

Cantidad	Clave Unid ad SAT	Clave Prod/Servi cio	Descripción	Valor unitario	Impuestos	Importe
1.00	E48 - Unidad de servicio	72141103 - Servicio de pavimentación de calles y carreteras	<p>PAGO DE ESTIMACION 01 EXTRAORDINARIO FINIQUITO DE LA OBRA: CONSTRUCCIÓN DE RECUBRIMIENTO DE UN SUELO CON CONCRETO HIDRÁULICO, EN LA CALLE MOCORITO (ARROYO DE ARENA) ENTRE BOULEVARD JUAN S MILLÁN Y CALLE ELIGIO ABITIA, COLONIA CENTRO, MUNICIPIO DE BADIRAGUATO, SINALOA.</p> <p>CONTRATO NO.: MBGBR-LP-FAISMUN-004/2025 MONTO DEL CONTRATO: \$ 7,499,560.31</p> <p>IMPORTE DE LA OBRA EJECUTADA SIN IVA \$ 174,913.48 MAS I.V.A 16 % \$ 27,986.16 TOTAL DE LA OBRA EJECUTADA CON IVA \$ 202,899.64</p> <p>AMORTIZACIÓN ANTICIPO 35% \$ 61,219.72 MAS I.V.A.: \$ 9,795.16 TOTAL AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO: \$ 71,014.88</p> <p>Importe TOTAL A FACTURAR \$ 113,693.76 MAS I.V.A \$ 18,191.01 MONTO NETO A FACTURAR \$ 131,884.77</p> <p>RETENCION 3% (S.V.I.F.Y C.): \$ 5,247.40</p> <p>TOTAL DEDUCCIONES: \$ 76,262.28 MONTO LIQUIDO A RECIBIR: \$ 126,637.36</p>	\$113,693.76	IVA, - Importe: 18191.01	\$113,693.76

Información de cancelación

Motivo de cancelación:

Folio relacionado:

CFDI RELACIONADOS

Tipo de relación:

Lista de CFDI's relacionados:

Total con letra:
ciento treinta y un mil ochocientos ochenta y cuatro Pesos 77/100 M.N.

Subtotal: \$113,693.76

IVA 16 %: \$18,191.01

Total: \$131,884.77



Este documento es una representación impresa de un CFDI

Serie del Certificado del emisor: 00001000000711830284
Folio Fiscal: 11070A8E-0C9A-4824-B950-1FE25A10738A
No. de serie del Certificado del SAT: 00001000000709182898
Fecha y hora de certificación: 2025-12-08T11:09:39

Sello digital del CFDI

xW5cSv7OTevm9YTxJEr+19KpWXBWwjcE/astfP4H7gCtbggyPulaa8bfv4K2E+pcBgotbxe3jHrT6aXjvQM0nXrG3vR3hXV8yNj9Lnniz29rX1hXGRM0cU3O3T+B/dOZUeBkEp4Cp
BZUSaz5rACq2+pcZNCfQScNbDqHuR62AnF3bMMuyiWx+2MD1xjXc22Y2ESpErETqQAjgFzCDDeWWp8fubABchH5WVcUhfYp5gT4H3gAbnOUBQqS10eyjTv7yNOQhcxFlxOw1WQX3IAq
NNoaDunP19fZm8XbSmeSvCksybqCv21fTZVbe9gSbdYmP7IHvLid31vuY3Q==

Sello del SAT

Q7GUYaSNga0Bf3HmwZ3R5DwuU5ixdvwJRzh6VPUNp4RvRk8B+TF7YIFmkKq+VtgU2SwQjomB27g6iKZYeaD10miRo5wcivjVfgtE/DHL5RFbChNoH6ZCSXZiGpi2EZjWJv0hpSixTeQ
Min1C4mL+gpXJ/UkC1dXfPegRka391K7iL3qfRkx51DTwRv/c+crRiOnx10fCgm+ifSXiQfArF+1BS0KU9IRyFASH7AxFwoqcZGeqgeDB5FJ0Nv8TbmeZvzSOCqykq/H757PODw2EDX
0IZxKLVAEF3tLFW1hgOuxGcFI+dhf3HKsfzapyKL6zq4hU7T7mT7ixAA==

Cadena original del complemento del certificación digital del SAT

||1.1|11070A8E-0C9A-4824-B950-1FE25A10738A|2025-12-08T11:09:39|MAS0810247C0|xW5cSv7OTevm9YTxJEr+19KpWXBWwjcE/astfP4H7gCtbggyPulaa8bfv4K2E+pcBgotbxe3jHrT6aXjvQM0nXrG3vR3hXV8yNj9Lnniz29rX1hXGRM0cU3O3T+B/dOZUeBkEp4CpBZUSaz5rACq2+pcZNCfQScNbDqHuR62AnF3bMMuyiWx+2MD1xjXc22Y2ESpErETqQAjgFzCDDeWWp8fubABchH5WVcUhfYp5gT4H3gAbnOUBQqS10eyjTv7yNOQhcxFlxOw1WQX3IAqNNoaDunP19fZm8XbSmeSvCksybqCv21fTZVbe9gSbdYmP7IHvLid31vuY3Q==|00001000000709182898||

This XML file does not appear to have any style information associated with it. The document tree is shown below.

```
<cfdi:Comprobante xmlns:cfdi="http://www.sat.gob.mx/cfd/4" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/cfd/4 http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/4/cfdv40.xsd"
Certificado="MIIGCDCCA/CgAwIBAgIUMDAwMDAwMDA3MTE4MzAyODQwDQYJKoZIhvcNAQELBQAwggGvMTUwMwYDVQQDDCxBQyBERUwguU0VSVK1DSU8gREUgQUJ1RSQUNJT04gVFJJQ1VU
Exportacion="01" Fecha="2025-12-08T10:09:34" Folio="90" FormaPago="03" LugarExpedicion="80080" MetodoPago="PUE" Moneda="MAN"
NoCertificado="00001000000711830284"
Sello="xW5cSv70Tevm9YTxJEr+19KpFWXBWwjcE/ksttP4H7gCtXggyPuIaa8bfv4K2E+pcBgoLbxe3jHrT6aXjxQM0nXxG3xvRkhXV6yNj9Lnniz29rX1hXGRM0cJJ303T+B/d0ZUeBkEp4Cp8ZUSa
SubTotal="113693.76" TipoDeComprobante="I" Total="131884.77" Version="4.0">
<cfdi:Emisor Nombre="JESUS AMADO CAMACHO OSUNA" RegimenFiscal="612" Rfc="CA0J810630ST4"/>
<cfdi:Receptor DomicilioFiscalReceptor="80500" Nombre="MUNICIPIO DE BADIRAGUATO" RegimenFiscalReceptor="603" Rfc="MBA850101214" UsoCFDI="I01"/>
<cfdi:Conceptos>
<cfdi:Concepto Cantidad="1.00" ClaveProdServ="72141103" ClaveUnidad="E48" Descripcion="SERVICIO DE PAVIMENTACION DE CALLES Y CARRETERAS PAGO DE
ESTIMACION 01 EXTRAORDINARIO FINIQUITO DE LA OBRA: CONSTRUCCIÓN DE RECUBRIMIENTO DE UN SUELO CON CONCRETO HIDRÁULICO, EN LA CALLE MOCORITO (ARROYO DE
ARENA) ENTRE BOULEVARD JUAN S MILLÁN Y CALLE ELIGIO ABITIA, COLONIA CENTRO, MUNICIPIO DE BADIRAGUATO, SINALOA. CONTRATO NO.: MBGBR-LP-FAISMUN-
004/2025 MONTO DEL CONTRATO: $ 7,499,500.31 IMPORTE DE LA OBRA EJECUTADA SIN IVA $ 174,913.48 MAS I.V.A 16 % $ 27,986.16 TOTAL DE LA OBRA EJECUTADA CON
IVA $ 202,899.64 AMORTIZACIÓN ANTICIPO 35% $ 61,219.72 MAS I.V.A.: $ 9,795.16 TOTAL AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO: $ 71,014.88 Importe TOTAL A FACTURAR $
113,693.76 MAS I.V.A $ 18,191.01 MONTO NETO A FACTURAR $ 131,884.77 RETENCIÓN 3% ( S.V.I.F.Y C. ) : $ 5,247.40 TOTAL DEDUCCIONES: $ 76,262.28 MONTO LIQUIDO
A RECIBIR: $ 126,637.36" Importe="113693.76" NoIdentificacion="SER05" ObjetoImp="02" ValorUnitario="113693.76">
<cfdi:Impuestos>
<cfdi:Traslados>
<cfdi:Traslado Base="113693.76" Importe="18191.01" Impuesto="002" TasaOCuota="0.160000" TipoFactor="Tasa"/>
</cfdi:Traslados>
</cfdi:Impuestos>
</cfdi:Concepto>
</cfdi:Conceptos>
<cfdi:Impuestos TotalImpuestosTrasladados="18191.01">
<cfdi:Traslados>
<cfdi:Traslado Base="113693.76" Importe="18191.01" Impuesto="002" TasaOCuota="0.160000" TipoFactor="Tasa"/>
</cfdi:Traslados>
</cfdi:Impuestos>
<cfdi:Complemento>
<tfd:TimbreFiscalDigital xmlns:tfd="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital" xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital
http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/TimbreFiscalDigital/TimbreFiscalDigitalv11.xsd" Version="1.1" UUID="11070A8E-0C9A-4824-B950-1FE25A10738A"
FechaTimbrado="2025-12-08T11:09:39" RfcProvCertif="MA50810247C0"
SelloCFD="xW5cSv70Tevm9YTxJEr+19KpFWXBWwjcE/ksttP4H7gCtXggyPuIaa8bfv4K2E+pcBgoLbxe3jHrT6aXjxQM0nXxG3xvRkhXV6yNj9Lnniz29rX1hXGRM0cJJ303T+B/d0ZUeBkEp4
NoCertificadoSAT="00001000000709182898"
SelloSAT="Q7GUYaSNga0Bf3HmwZ3R5DwuU51xlvwJ3Rzh6VPUNp4RvRk0B+TF7YiFmkKq+VtGU2SwQjom827q6IK2YeaD1t0miRo5wcivjVfqgtE/DHLSRFlbChN0h6ZCSXZfGpi2EZjWJv0hpSLX
</cfdi:Complemento>
</cfdi:Comprobante>
```



Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
CAOJ810630ST4	JESUS AMADO CAMACHO OSUNA	MBA850101214	MUNICIPIO DE BADIRAGUATO
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
11070A8E-0C9A-4824-B950-1FE25A10738A	2025-12-08T10:09:34	2025-12-08T11:09:39	MAS0810247C0
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$131,884.77	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir



Fecha: 28 de noviembre de 2025

CARATULA DE ESTIMACIÓN

CONTRATISTA:	JESUS AMADO CAMACHO OSUNA	ESTIMACIÓN No:	01 EXTRAORDINARIO FINIQUITO
DOMICILIO:	Calle sin nombre s/n. Colonia: Loc. Los Naranjos, C.P. 80080, Culiacán, Sinaloa	PERIODO DE ESTIMACION:	
TELÉFONO:	CEL: [REDACTED]	DEL	03-oct-25
	[REDACTED]	AL	19-nov-25
R.F.C.		FECHA DE CONTRATO:	
CAOJ810630ST4.			19-jul-25
DEPENDENCIA:-			

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA

LOCALIDAD:	MUNICIPIO:	PERIODO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO:
BADIRAGUATO	BADIRAGUATO	INICIO: 23-jul-25
		TERMINACIÓN: 19-nov-25

DESCRIPCIÓN:

CONSTRUCCIÓN DE RECUBRIMIENTO DE UN SUELO CON CONCRETO HIDRAULICO, EN LA CALLE MOCORITO (ARROYO DE ARENA) ENTRE BOULEVARD JUAN S MILLÁN Y CALLE ELIGIO ABITIA, COLONIA CENTRO, MUNICIPIO DE BADIRAGUATO, SINALOA.

CONTRATO No:

MBGBR-LP-FAISMUN-004/2025

IMPORTE SIN IVA DE LA OBRA	IMPORTE CON IVA DE LA OBRA	35% ANTICIPO DE LA OBRA	IMPORTE TOTAL DE CONTRATO:
\$6,465,138.20	\$7,499,560.31	\$2,624,846.11	\$7,499,560.31
			BUENO POR: \$ 126,637.36

RECIBI:

\$ 126,637.36 (SON CIENTO VEINTISEIS MIL SEISCIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS 36/100 M.N.)

EN PAGO DE ESTIMACIÓN:

01
EXTRAORDINARIO

DEDUCCIONES:		CALCULO DE ESTIMACIÓN	
AMORTIZACIÓN ANTICIPO 35%	\$ 61,219.72	IMPORTE DE LA OBRA EJECUTADA SIN IVA	\$ 174,913.48
MAS I.V.A.:	\$ 9,795.16	MAS I.V.A 16 %	\$ 27,986.16
TOTAL AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO:	\$ 71,014.88	TOTAL DE LA OBRA EJECUTADA CON IVA	\$ 202,899.64
3 % SVIFYC:	\$ 5,247.40	MENOS TOTAL DEDUCCIONES:	\$ 76,262.28
TOTAL DEDUCCIONES:	\$ 76,262.28	MONTO A FACTURAR MAS IVA	\$ 131,884.76

SALDO A PAGAR: \$ 126,637.36

ELABORO.-

C. JESUS AMADO CAMACHO OSUNA
REPRESENTANTE LEGAL

REVISOR.-

ING. JOSE RODOLFO CONTRERAS LOPEZ
COSTOS Y PRESUPUESTOS.

AUTOR

C. ING. RUBIEL RINCON RA
DIRECTOR DE O.P.D.L



JESUS AMADO CAMACHO OSUNA

Dependencia :
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA
Control de Estimaciones

CONSTRUCCIÓN DE RECUBRIMIENTO DE UN SUELO CON CONCRETO HIDRÁULICO, EN LA CALLE MOCORITO (ARROYO DE ARENA) ENTRE BOULEVARD JUAN S MILLÁN Y CALLE ELIGIO ABITIA, COLONIA CENTRO, MUNICIPIO DE BADIRAGUATO, SINALOA.			Fecha:		Estimacion:		
			28 de noviembre de 2025		01 EXTRAORDINARIO FINIQUITO		
Periodo de la estimación:		03/10/2025	19/11/2025	Localidad:		No. De contrato:	
Periodo de Ejecución		03/10/2025	19/11/2025	BADIRAGUATO		MBGBR-LP-FAJSMUN-004/2025	
Importe del contrato con I.V.A		Imp. Contratado sin I.V.A		Anticipo		Importe Anticipo sin I.V.A	% de Avance
\$ 7,499,560.31		\$ 6,465,138.20		\$ 2,624,846.11		\$ 2,262,798.37	3%
						% Avance Total	100%

Control Del Anticipo	Liquidacion de Estimacion		Control de Estimacion
AMORTIZA ESTA ESTIMACION	Importe de la Estimacion (+)	\$ 174,913.48	ESTA ESTIMACION
	16 % I.V.A (+)	\$ 27,986.16	
\$ 71,014.88	Sub- Total A (+)	\$ 202,899.64	\$ 202,899.64
	Amortizacion Anticipo 35%	\$ 61,219.72	
AMORTIZACION ANTERIOR	16 % I.V.A (+)	\$ 9,795.16	ACUMULADO ANTERIOR
\$ 2,553,831.23	Total (+)	\$ 71,014.88	\$ 7,296,660.67
	Importe TOTAL A FACTURAR	\$ 113,693.76	
TOTAL AMORTIZADO	16 % I.V.A (+)	\$ 18,191.00	TOTAL ACUMULADO.
\$ 2,624,846.11	Total (+)	\$ 131,884.76	\$ 7,499,560.31
	3 % SVIFYC:	\$ 5,247.40	
ANTICIPO OTORGADO	Total Deducciones (-)	\$ 76,262.28	CONTRATADO
\$ 2,624,846.11	Importe TOTAL	\$ 126,637.36	\$ 7,499,560.31
	NETO A PAGAR	\$ 126,637.36	
SALDO DEL ANTICIPO			SALDO
\$0.00	Sea:		\$ -
	(SON CIENTO VEINTISEIS MIL SEISCIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS 36/100 M.N.)		

ELABORO:-


C. JESUS AMADO CAMACHO OSUNA
REPRESENTANTE LEGAL

REVISO

ING. JOSE RODOLFO CONTRERAS LOPEZ
COSTOS Y PRESUPUESTOS.

AUTORIZO

C. ING. RUBIEL RINCON RAMOS.
DIRECTOR O.P.D.U. Y E.



DOMICILIO: Calle sin nombre s/n. Colonia: Loc. Los Naranjos, C.P. 80080, Culiacán, Sinaloa

ESTADO DE CUENTA

ESTADO DE CUENTA

				LOCALIDAD:	BADIRAGUATO	ESTIMACIÓN:	01 EXTRAORDINARIO FINIQUITO
DESCRIPCIÓN:	CONSTRUCCIÓN DE RECUBRIMIENTO DE UN SUELO CON CONCRETO HIDRÁULICO, EN LA CALLE MOCORITO (ARROYO DE ARENA) ENTRE BOULEVARD JUAN S MILLÁN Y CALLE ELIGIO ABITIA, COLONIA CENTRO, MUNICIPIO DE BADIRAGUATO, SINALOA.						
FECHA INICIO CONTRATO:	23-jul-25	FECHA TERMINACION CONTRATO:	19-nov-25	CONTRATO:	MBGBR-LP-FAISMUN-004/2025	FECHA CONTRATO:	19-jul-25
IMPORTE DE OBRA SIN IVA:	\$6,465,138.20	CLAVE DE CONVENIO ADICIONAL:					
IMPORTE DE ANTICIPO DE OBRA:	\$2,624,846.11	PERIODO CONVENIO ADICIONAL:					
IMPORTE TOTAL DE CONTRATO:	\$7,499,560.31	IMPORTE CONVENIO ADICIONAL:					
Nº. DE ESTIMACIÓN	PERIODO	IMPORTE C/IVA	IMPORTE SIN IVA	3 % SVIFYC:	AMORTIZACION ANTICIPO 35%	TOTAL DEDUCCIONES	LIQUIDO A PAGAR
01 NORMAL	23-jul-25	\$ 2,448,238.72	\$ 2,110,550.62	\$ 63,316.52	\$ 856,883.55	\$ 920,200.07	\$ 1,528,038.65
02 NORMAL	06-ago-25	\$ 1,457,063.34	\$ 1,256,089.09	\$ 37,682.67	\$ 509,972.17	\$ 547,654.84	\$ 909,408.50
03 NORMAL	08-sep-25	\$ 1,457,380.64	\$ 1,256,362.62	\$ 37,690.88	\$ 510,083.22	\$ 547,774.10	\$ 909,606.54
04 NORMAL	03-oct-25	\$ 1,796,240.47	\$ 1,548,483.16	\$ 46,454.49	\$ 628,684.16	\$ 675,138.65	\$ 1,121,101.82
01 ADICIONAL	03-oct-25	\$ 137,737.50	\$ 118,739.22	\$ 3,562.18	\$ 48,208.13	\$ 51,770.31	\$ 85,967.19
01 EXTRAORDINARIO FINIQUITO	03-oct-25	\$ 202,899.64	\$ 174,913.48	\$ 5,247.40	\$ 71,014.88	\$ 76,262.28	\$ 126,637.36
TOTALES:		\$ 7,499,560.31	\$ 6,465,138.19	\$ 193,954.14	\$ 2,624,846.11	\$ 2,818,800.25	\$ 4,680,760.06
SALDO DEL CONTRATO:		\$ -	SALDO POR AMORTIZAR:		\$ -		

Miss Arnold

C. JESUS AMADO CAMACHO OSUNA
REPRESENTANTE LEGAL

REVISÓ:-
ING. JOSE RODOLFO CONTRERAS LOPEZ
COSTO Y PRESUPUESTOS.

AUTORIZO:-
C. ING. RUBIEL RINCON RAMOS
DIRECTOR DE O.P.D.U. Y E.



CONTRATISTA:		FECHA: 28 de noviembre de 2025	
JESUS AMADO CAMACHO OSUNA		DEPENDENCIA:	
DOMICILIO: Calle sin nombre s/n. Colonia: Loc. Los Naranjos, C.P. 80080, Culiacán, Sinaloa		DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA	
R.F.C.	CAOJ810630ST4.		

RESÚMEN DE ESTIMACIÓN

	LOCALIDAD:	BADIRAGUATO	ESTIMACIÓN:	01 EXTRAORDINARIO FINIQUITO
DESCRIPCIÓN:	CONSTRUCCIÓN DE RECUBRIMIENTO DE UN SUELO CON CONCRETO HIDRÁULICO, EN LA CALLE MOCORITO (ARROYO DE ARENA) ENTRE BOULEVARD JUAN S MILLÁN Y CALLE ELIGIO ABITIA, COLONIA CENTRO, MUNICIPIO DE BADIRAGUATO, SINALOA.			
IMPORTE DE OBRA SIN IVA:	\$ 6,465,138.20			
IMPORTE DE ANTICIPO DE OBRA:	\$ 2,624,846.11			
IMPORTE TOTAL DE CONTRATO:	\$ 7,499,560.31			

DESTAJO		IMPORTE
1	PRELIMINARES	\$ -
2	ESTRUCTURA	\$ -
3	OTROS	\$ -
4	EXTRAORDINARIOS	\$ 246,362.06
SUBTOTAL ESTIMACIÓN:		\$ 246,362.06
POR CIERRE DE ESTIMACIÓN:		\$ 174,913.48

SUB TOTAL=	\$ 174,913.48
I.V.A AL 16 %	\$ 27,986.16
TOTAL =	\$ 202,899.64

ELABORO.-

Jesús Amado
C. JESUS AMADO CAMACHO OSUNA
REPRESENTANTE LEGAL

REVISÓ

Ing. José Rodolfo Contreras López
ING. JOSE RODOLFO CONTRERAS LOPEZ
COSTOS Y PRESUPUESTOS.

AUTORIZO.

C. Ing. Rubiel Rincón Ramos
C. ING. RUBIEL RINCON RAMOS
DIRECTOR DE O.P.D.U. Y E



CONTRATISTA:		JESUS AMADO CAMACHO OSUNA		DEPENDENCIA:		DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA		FECHA	
DOMICILIO:		Calle sin nombre s/n. Colonia: Loc. Los Naranjos, C.P. 80080, Culiacán, Sinaloa		R.F.C.		CAOJ810630ST4.		viernes, 28 de noviembre de 2025	
DESGLÓSE DE CONCEPTOS DE ESTIMACIÓN									
		LOCALIDAD:		BADIRAGUATO		ESTIMACIÓN:		01 EXTRAORDINARIO FINIQUITO	
DESCRIPCIÓN		CONSTRUCCIÓN DE RECUBRIMIENTO DE UN SUELO CON CONCRETO HIDRÁULICO, EN LA CALLE MOCORITO (ARROYO DE ARENA) ENTRE BOULEVARD JUAN S MILLÁN Y CALLE ELIGIO ABITIA, COLONIA CENTRO, MUNICIPIO DE BADIRAGUATO, SINALOA.							
IMPORTE DE OBRA SIN IVA:		\$6,465,138.20		IMPORTE DE ANTICIPO DE OBRA:		\$2,624,846.11		IMPORTE TOTAL DE CONTRATO:	
								\$7,499,560.31	
CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	SEGUN PROYECTO		HASTA ESTA ESTIM.	EXCEDENTE	HASTA ESTIM.	DE ESTA ESTIMACIÓN	IMPORTE
			CANT	P.U.	TOTAL				
1	PRELIMINARES								
2	ESTRUCTURA								
3	OTROS								
EXTRAORDINARIO									
EXT01	RELLENO EN BANQUETAS CON MATERIAL INERTE COMPACTADO PARA EL 95% CON PLACA VIBRATORIA EN CAPAS NO MAYORES DE 20 CMS. INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIAL, AGUA PARA OBTENER LA HUMEDAD ÓPTIMA DE COMPACTACIÓN, TENDIDO EN CAPAS, ACCARREOS, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M3	10.00	\$ 282.61	\$ 2,926.10	7.00	17.00	10.00	\$ 2,926.10
EXT02	BANQUETA DE 10 CMS DE ESPESOR CONCRETO PREMEZCLADO CON F'C=150 KG/CM2 T.M.A. 3/4", ACABADO ESCOBILLADO, INCLUYE: TRAZO Y NIVELACIÓN, CIMBRA, COLADO DE CONCRETO, CURADO, VOLTEADOR PERIMETRAL Y LIMPIEZA DE FORMAS.	M2	50.00	\$ 562.88	\$ 28,144.00	1.00	51.00	50.00	\$ 28,144.00
EXT03	ALCANTARILLA PLUVIAL DE 1.75X1.55, ARMADA CON ANGULAR DE 3"x3"x1/2" Y SOLERAS DE 3"x12" UNIDADES CON ANGULAR DE 3"x3"x1/2",REFORZADO CON IPR DE 6"x4". INCLUYE: MATERIAL, SOLDADURA, MANO DE OBRA, TRASLADO AL SITIO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	1.00	\$ 81,772.77	\$ 81,772.77	14.25	15.25	1.00	\$ 81,772.77
EXT04	ALCANTARILLA PLUVIAL DE 1.55X1.55, ARMADA CON ANGULAR DE 3"x3"x1/2" Y SOLERAS DE 3"x12" UNIDADES CON ANGULAR DE 3"x3"x1/2",REFORZADO CON IPR DE 6"x4". INCLUYE: MATERIAL, SOLDADURA, MANO DE OBRA, TRASLADO AL SITIO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	1.00	\$ 76,909.43	\$ 76,909.43	0.00	1.00	1.00	\$ 76,909.43
EXT05	REGISTRO DE ALBANAL DE 0.40X0.60 M. DE CLARO LIBRE DE 1.00 M. DE PROFUNDIDAD, FABRICADO CON TABIQUE DE BARRO ROJO RECOCIDO. 7X14X28 CM. PLANTILLA DE CONCRETO SIMPLE F'C=150 KG/CM2 T.M.A. 3/4" DE 8 CMS. DE ESPESOR, MARCO 1 1/2"x18", CONTRAMARCO DE 1 1/4"x18", TAPA DE CONCRETO ARMADO DE 8 CMS. VARILLAS DE 3/8" @ 15 CMS. INCLUYE: APLANADO INTERIOR ACABADO PULIDO CON MORTERO CEMENTO-ARENA PROPORCIÓN 1:3. EXCAVACIÓN, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA NECESARIA PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO.	PZA	6.00	\$ 4,179.77	\$ 25,078.62	8.00	14.00	6.00	\$ 25,078.62
EXT06	REPARACIONES DE DESCARGAS DOMICILIARIAS CON TUBERIAS DE PVC DE 8". INCLUYE: EXCAVACIONES, SILLETAS, MATERIAL NECESARIO, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA NECESARIA PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO.	PZA	6.00	\$ 5,255.19	\$ 31,531.14	6.00	12.00	6.00	\$ 31,531.14

ELABORA:
C. JESUS AMADO CAMACHO OSUNA
REPRESENTANTE LEGAL

REVISÓ:
ING. JOSE RODOLFO CONTRERAS LOPEZ
COSTOS Y PRESUPUESTOS.

AUTORIZO:
C. ING. RUBIEL RINCON RAMOS
DIRECTOR DE O.P.D.U. Y E.

CONTRATISTA: JESUS AMADO CAMACHO OSUNA

**DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS,
DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA**

DOMICILIO:	Calle sin nombre s/n. Colonia: Loc. Los Naranjos, C.P. 80080, Culiacán, Sinaloa
-------------------	---

CAOJ810630ST4.

R.F.C.

102

2 de 2

DESGLOSE DE CONCEPTOS DE ESTIMACIÓN

LOCALIDAD:

BADIRAGUATO	ESTIMACIÓN:	01 EXTRAORDINARIO FINIQUITO
-------------	-------------	-----------------------------

DESCRIPCIÓN	CONSTRUCCIÓN DE RECUBRIMIENTO DE UN SUELO CON CONCRETO HIDRÁULICO, EN LA CALLE MOCORITO (ARROYO DE ARENA) ENTRE BOULEVARD JUAN S MILLÁN Y CALLE ELIGIO ABITIA, COLONIA CENTRO, MUNICIPIO DE BADIRAGUATO, SINALOA.
-------------	---

IMPORTE DE OBRA SIN IVA:	\$6,465,138.20				
IMPORTE DE ANTICIPO DE OBRA:					
IMPORTE TOTAL DE CONTRATO:	\$2,624,846.11				
					\$7,499,560.31

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	SEGUN PROYECTO			HASTA ESTA ESTIM	HASTA ESTIM	EXCEDENTE	DE ESTA ESTIMACIÓN SUB-TOTAL	IMPORTE
			CANT	P.U.	TOTAL					
										246,362.06
									IVA	\$ 39,417.93
									MONTO TOTAL	\$ 285,779.99
								POR CIERRE DE ESTIMACION		\$ 202,899.64

Jesus Amado
C. JESUS AMADO CAMACHO OSUNA
REPRESENTANTE LEGAL

ING. JOSE RODOLFO CONTRERAS LOPEZ
COSTOS Y PRESUPUESTOS.

~~C. ING. RUBIEL RINCON RAMOS
DIRECTOR DE O.P.D.U. Y E.~~



JESUS AMADO CAMACHO OSUNA

RFC:	CAOJ810630ST4.
------	----------------

ELABORÓ: Jesus Amado
C. JESUS AMADO CAMACHO OSUNA
REPRESENTANTE LEGAL

SUPERVISOR DE OBRA

ING. RUBIEL RINCON RAMOS
DIRECTOR DE O.P.D.U.YE.



VOLUMENES GENERADORES

CONTRATISTA

JESUS AMADO CAMACHO OSUNA

RFC: CAOJ810630ST4.

CLAVE	CONCEPTO	LOCALIZACION		UNIDAD	LARGO	ANCHO	ALTO	PZA	TOTAL	OBSERVACIONES
		EJE	TRAMO							
EXT05	REGISTRO DE ALBAÑAL DE 0.40X0.60 M. DE CLARO LIBRE DE 1.00 M. DE PROFUNDIDAD, FABRICADO CON TABIQUE DE BARRO ROJO RECOCIDO, 7X14X28 CM. PLANTILLA DE CONCRETO SIMPLE F'C=150 KG/CM2 T.M.A. 3/4" DE 8 CMS. DE ESPESOR, MARCO 1 1/2"X1/8", CONTRAMARCO DE 1 1/4"X1/8", TAPA DE CONCRETO ARMADO DE 8 CMS. VARILLAS DE 3/8" @ 15 CMS. INCLUYE: APLANADO INTERIOR ACABADO PULIDO CON MORTERO CEMENTO-ARENA PROPORCION 1:3, EXCAVACIÓN, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTAS	CADENAMIENTO 0+000.00	0+280.00	PZA	6.00				6.00	VER CROQUIS
								TOTAL EJECUTADO	6.00	
EXT06	REPARACIONES DE DESCARGAS DOMICILIARIAS CON TUBERIAS DE PVC DE 8". INCLUYE: EXCAVACIONES, SILLETAS, MATERIAL NECESARIO, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA NECESARIA PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO.	CADENAMIENTO 0+000.00	0+280.00	PZA	6.00				6.00	VER CROQUIS
								TOTAL EJECUTADO	6.00	

ELABORO:-
Jesús Amado
C. JESUS AMADO CAMACHO OSUNA
REPRESENTANTE LEGAL

REVISO:-
[Firma]
SUPERVISOR DE OBRA

AUTORIZO:-
[Firma]
ING. RUBIEL RINCON RAMOS
DIRECTOR DE O.P.D.U.Y.E.

CONTRATISTA:
JESUS AMADO CAMACHO OSUNA

DEPENDENCIA:
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS,
DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA

DOMICILIO: Calle sin nombre s/n. Colonia: Loc. Los Naranjos, C.P. 80080, Culiacán, Sinaloa


R.F.C. CAOJ810630ST4.

OBRA: CONSTRUCCIÓN DE RECUBRIMIENTO DE UN SUELO CON CONCRETO HIDRÁULICO, EN LA CALLE MOCORITO (ARROYO DE ARENA) ENTRE BOULEVARD JUAN S MILLÁN Y CALLE ELIGIO ABITIA, COLONIA CENTRO, MUNICIPIO DE BADIRAGUATO, SINALOA.

CROQUIS ESTIMACION:

CROQUIS ESTIMACION:

CLAVE	CONCEPTO
	EXTRAORDINARIO
EXT01	RELLENO EN BANQUETAS CON MATERIAL INERTE COMPACTADO PARA EL 95% CON PLACA VIBRATORIA EN CAPAS NO MAYORES DE 20 CMS.
EXT02	BANQUETA DE 10 CMS DE ESPESOR CONCRETO PREMEZCLADO CON F'C=150 KG/CM2 T.M.A. 3/4", ACABADO ESCOBILLADO, INCLUYE: TRAZO Y
EXT03	ALCANTARILLA PLUVIAL DE 1.75X1.65, ARMADA CON ANDULAR DE 3"X3"X1/2 Y SOLERAS DE 3"X1/2" UNIDAS CON ANGULAR DE 3"X3"1/2",REFORZADO
EXT04	ALCANTARILLA PLUVIAL DE 1.55X1.55, ARMADA CON ANDULAR DE 3"X3"X1/2 Y SOLERAS DE 3"X1/2" UNIDAS CON ANGULAR DE 3"X3"1/2",REFORZADO
EXT05	REGISTRO DE ALBANAL DE 0.40X0.60 M. DE CLARO LIBRE DE 1.00 M. DE PROFUNDIDAD, FABRICADO CON TABIQUE DE BARRO ROJO RECOCIDO.
EXT06	REPARACIONES DE DESCARGAS DOMICILIARIAS CON TUBERIAS DE PVC DE 8": INCLUYE: EXCAVACIONES, SILLETAS, MATERIAL NECESARIO, MANO

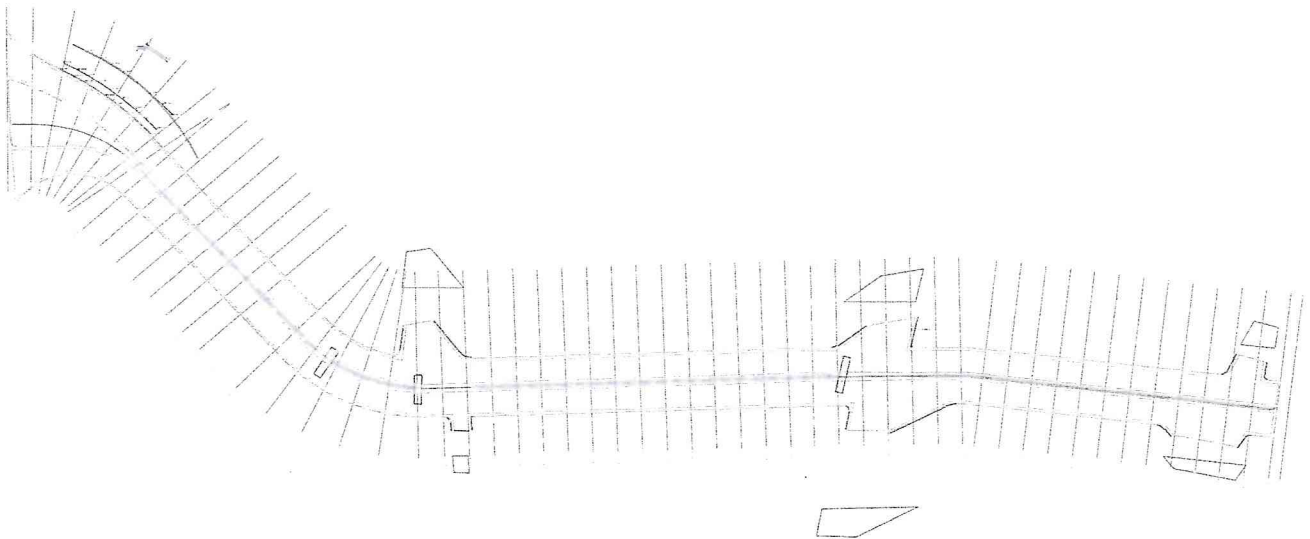

ELABORO.-
JESUS AMADO CAMACHO OSUNA
REPRESENTANTE LEGAL

REVISO.-
[Signature]
SUPERVISOR DE OBRA

AUTORIZO.-
[Signature]
C. ING. RUBIEL RINCON RAMOS.
DIRECTOR DE O.P.D.U. Y E.



CONTRATISTA:

JESUS AMADO CAMACHO OSUNA

DOMICILIO:

Calle sin nombre s/n. Colonia: Loc. Los Naranjos, C.P. 80080, Culiacán, Sinaloa

R.F.C.

CAOJ810630ST4.

OBRA:

CONSTRUCCIÓN DE RECUBRIMIENTO DE UN SUELO CON CONCRETO HIDRÁULICO, EN LA CALLE MOCORITO (ARROYO DE ARENA) ENTRE BOULEVARD JUAN S MILLÁN Y CALLE ELIGIO ABITIA, COLONIA CENTRO, MUNICIPIO DE BADIRAGUATO, SINALOA.

DEPENDENCIA:

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS,
DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA



FOTOS DE ESTIMACION:

FOTOS DE ESTIMACION:


FOTOS DE ESTIMACION:	
CVE	CONCEPTO
EXTRAORDINARIO	
EXT0	RELLENO EN BANQUETAS CON MATERIAL INERTE COMPACTADO PARA EL 95% CON PLACA VIBRATORIA EN CAPAS NO MAYORES DE 20 CMS, INCLUYE:
EXT0	BANQUETA DE 10 CMS DE ESPESOR CONCRETO PREMEZCLADO CON F'C=150 KG/CM2 T.M.A. 3/4", ACABADO ESCOBILLADO, INCLUYE: TRAZO Y
EXT0	ALCANTARILLA PLUVIAL DE 1.75X1.65, ARMADA CON ANDULAR DE 3"X3"X1/2 Y SOLERAS DE 3"X1/2" UNIDAS CON ANGULAR DE 3"X3"1/2",REFORZADO CON
EXT0	ALCANTARILLA PLUVIAL DE 1.55X1.55, ARMADA CON ANDULAR DE 3"X3"X1/2 Y SOLERAS DE 3"X1/2" UNIDAS CON ANGULAR DE 3"X3"1/2",REFORZADO CON
EXT0	REGISTRO DE ALBAÑAL DE 0.40X0.60 M. DE CLARO LIBRE DE 1.00 M. DE PROFUNDIDAD, FABRICADO CON TABIQUE DE BARRO ROJO RECOCIDO. 7X14X28
EXT0	REPARACIONES DE DESCARGAS DOMICILIARIAS CON TUBERIAS DE PVC DE 8": INCLUYE: EXCAVACIONES, SILLETAS, MATERIAL NECESARIO, MANO DE



ELABORO:-

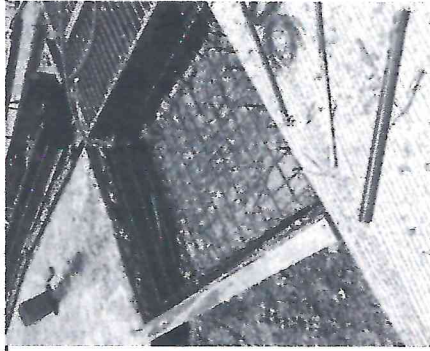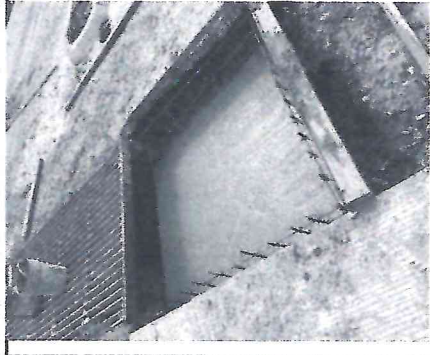

REVISO:-

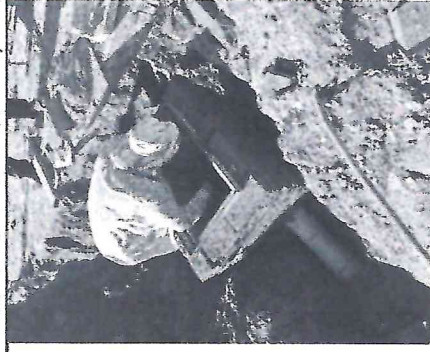

Jesús Amado
C. JESUS AMADO CAMACHO OSUNA
REPRESENTANTE LEGAL

AUTORIZO:-
Rubiel Rincon Ramos
C.ING. RUBIEL RINCON RAMOS
DIRECTOR DE OBRAS Y E



Fecha y hora de consulta

10/12/2025 7:24:33 PM

Contrato

00798320

Nombre del Cliente

MUNICIPIO DE BADIRAGUATO

BBVA Net Cash - Pagos Interbancarios

Operación autorizada

Transferencia en proceso de validación y aplicación.

Datos del firmante

Usuario: ADMIN1

Poder: 100%

Datos de la operación

Tipo de operación: Pago Interbancario

Descripción: EST 01 EXT FIN LP004

Importe de la operación: 126,637.36 MXP

Cuenta de retiro: 0124174836

Cuenta de depósito: 072730012781361749

Divisa de la cuenta: MXP

Divisa de la cuenta: MXP

Titular de la cuenta: MUNICIPIO DE BADIRAG
UATOTitular de la cuenta: JESUS AMADO CAMACHO
OSUNA

Nombre banco destino: BANORTE

Fecha valor: 11/12/2025

Fecha de creación: 10/12/2025

Fecha de aplicación: 10/12/2025

Concepto de pago: EST 01 EXT FIN LP004

Referencia numérica:

Instrumento de seguridad: ASD 6551749382

Hora de captura en el canal: 19:24:29

Datos de confirmación de la transferencia

Folio interbancario: 0000221630

Clave de rastreo: 002601002512110000221630

Folio de firma: 0069267068

Folio único: I401202512101924290069267074

Estado operación

Porcentaje Firmado: 100%

Estado: Operado

Detalle de firmas

Acción	Usuario	Porcentaje aportado	Fecha
CREO	ADMIN1	— %	10/12/2025
FIRMO	ADMIN1	100 %	10/12/2025

BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México

www.bbvanetcash.mx
