



Badiraguato

GENERANDO BUENOS RESULTADOS



OFICIO No. OPDUyE/490/2025
ASUNTO: SOLICITUD PAGO ESTIMACIÓN
02 NORMAL

Badiraguato, Sin., a 04 de Septiembre de 2025


MTRO. GONZALO IRINEO CABALLERO TERRAZAS
TESORERO MUNICIPAL
P R E S E N T E.-

POR MEDIO DE LA PRESENTE, LE SOLICITO EL PAGO POR: CONCEPTO DE PAGO DE ESTIMACIÓN 02 NORMAL, DEL IMPORTE DEL CONTRATO, A FAVOR DE LA EMPRESA: JESUS AMADO CAMACHO OSUNA, LA CUAL REALIZA LOS TRABAJOS APROBADOS POR EL SUBCOMITE DE BIENESTAR MUNICIPAL, A CONTINUACIÓN, SE DETALLA:

- NOMBRE DE LA OBRA: CONSTRUCCIÓN DE RECUBRIMIENTO DE UN SUELO CON CONCRETO HIDRÁULICO, EN LA CALLE MOCORITO (ARROYO DE ARENA) ENTRE BOULEVARD JUAN S. MILLAN Y CALLE ELIGIO ABITIA, COLONIA CENTRO, MUNICIPIO DE BADIRAGUATO, SINALOA.
- No. DE CONTRATO: MBGBR-LP-FAISMUN-004/2025
- IMPORTE DEL CONTRATO: \$7,499,560.31 (SIETE MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS SESENTA PESOS 31/100 MN.)
- CONCEPTO DEL PAGO: PAGO DE ESTIMACIÓN 01 NORMAL
- IMPORTE A PAGAR: \$909,408.50 (NOVECIENTOS NUEVE MIL CUATROCIENTOS OCHO PESOS 50/100 M.N)
- RECURSOS: FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FAISMUN) EJERCICIO 2025.
- EMPRESA: JESÚS AMADO CAMACHO OSUNA
- R.F.C. CAOJ810630ST4
- DOMICILIO FISCAL: CALLE SIN NOMBRE, S/N, COLONIA: LOC. LOS NARANJOS, C.P. 80080, CULIACÁN, SINALOA.
- No. DE FACTURA: # 56, DE FECHA 02 DE SEPTIEMBRE DE 2025.

SE ANEXA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DE SOPORTE, COMO AMPARO DE DICHO PAGO.

AGRADECIENDO DE ANTEMANO LA ATENCIÓN QUE SE SIRVA DAR A LA PRESENTE, ME DESPIDO QUEDANDO A SUS ÓRDENES.



DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS,
DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA,
BADIRAGUATO, SINALOA.
C.C.P. ARCHIVO.

ATENTAMENTE

C. ING. RUBIEL RINCÓN RAMOS
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS,
DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA




**MUNICIPIO DE
BADIRAGUATO**
TESORERÍA

Alexis
04 SEP 2025

11:09 AM

RECIBIDO



JESUS AMADO CAMACHO OSUNA

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Serie:

Folio: 56

Fecha: 02/Sep/2025 14:15:23

Lugar de expedición (C.P.) 80080

Emisor

JESUS AMADO CAMACHO OSUNA

RFC: CAOJ810630ST4

Régimen Fiscal: 612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y

Domicilio: Profesionales

LOS NARANJOS Culiacán Sinaloa México 80080

Receptor

Cliente: MUNICIPIO DE BADIRAGUATO

RFC: MBA850101214

Uso CFDI: I01 - Construcciones

Exportación: 01 - No aplica

Domicilio Fiscal: 80500

Régimen Fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

Domicilio: GABRIEL LEYVA SOLANO S/N Badiraguato Badiraguato Sinaloa México 80500

Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición

Forma de Pago: 03 - Transferencia electrónica de

Tipo de cambio: 1.00000

Moneda: MXN - Peso Mexicano

Cantidad	Clave Unid ad SAT	Clave Prod/Servi cio	Descripción	Valor unitario	Impuestos	Importe
1.00	E48 - Unidad de servicio	72121101 - Servicio de construcción de edificios comerciales y de oficinas nuevos	<p>PAGO DE ESTIMACION 02 NORMAL</p> <p>DE LA OBRA: CONSTRUCCIÓN DE RECUBRIMIENTO DE UN SUELO CON CONCRETO HIDRÁULICO, EN LA CALLE MOCORITO (ARROYO DE ARENA) ENTRE BOULEVARD JUAN S MILLÁN Y CALLE ELIGIO ABITIA, COLONIA CENTRO, MUNICIPIO DE BADIRAGUATO, SINALOA.</p> <p>CONTRATO NO.: MBGBR-LP-FAISMUN-004/2025 MONTO DEL CONTRATO: \$ 7,499,560.31</p> <p>IMPORTE DE LA OBRA EJECUTADA SIN IVA \$ 1,256,089.09 MAS I.V.A 16 % \$ 200,974.25 TOTAL DE LA OBRA EJECUTADA CON IVA \$ 1,457,063.34</p> <p>AMORTIZACIÓN ANTICIPO 35% \$ 439,631.18 MAS I.V.A.: \$ 70,340.99 TOTAL AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO: \$ 509,972.17</p> <p>Importe TOTAL A FACTURAR \$ 816,457.91 MAS I.V.A \$ 130,633.26 MONTO NETO A FACTURAR \$ 947,091.17</p> <p>RETENCION 3% (S.V.I.F.Y C.): \$ 37,682.67 TOTAL DEDUCCIONES: \$ 547,654.84</p> <p>MONTO LIQUIDO A RECIBIR: \$ 909,408.50</p>	\$816,457.91	IVA, - Importe: 130633.26	\$816,457.91

Información de cancelación

Motivo de cancelación:

Folio relacionado:

CFDI RELACIONADOS

Tipo de relación:

Lista de CFDI's relacionados:

Total con letra:

novecientos cuarenta y siete mil noventa y un Pesos 17/100 M.N.

Subtotal: \$816,457.91

IVA 16 %: \$130,633.26

Total: \$947,091.17



Este documento es una representación impresa de un CFDI

Serie del Certificado del emisor: 00001000000711830284
Folio Fiscal: 6FD013DF-A2AE-4CD9-BAE6-D4FBA2342939
No. de serie del Certificado del SAT: 00001000000709182898
Fecha y hora de certificación: 2025-09-03T15:10:28

Sello digital del CFDI

SwmhKishZmpauSZIEeu/61mlMeCjQdfMIJZWRDkR6amShcEshxEVZ6UOx8qXYHY9vXl2fB2Arcecf7OuoqXj82Bfec0vHT9wodnLBCG/Viny1Gz3rzkl4Z3Pge2fwUr/vPWuf+j9xKKBZih+f0DOxYf8ec9Xwzv/pzpaWiv9AYOd4KddN2J5O58/V9FQgb/Yl+2VnUgrqjLJ/gtB+N9VyzFvMTPdM7JuPLZFKS+79tqr7fUgnMMq+ypHzoO+KHUXVXvUd8IA4seeJcOwZ7reC9MHQN4vZLvNMDJHjNLDi3n2m19tjUAX6x0ZHRmAX1uirwig+3c/UQU8g==

Sello del SAT

am+xo+nZLzLYnrcFZTbP3ncGvMY8w8f8dWbUJlK0CvNwV1TQH9LmNVH5RBEFdwVucfH2V3Fr8V2D7+hdAoP65re8nCuazOBks/e8a2KWESv/19dqKB9EJym0AAiHkRtFgYya1fQqAr0UQyyQFbh+7fABoodlBY9199Tz5of9THueFelb64OY2TIUV15Q+9qSr7EOP1nywpH2CIPV3APk3O0lvs3hjwvt+nRVaPykJBtBXHPC8pVYw7NqOze9UKAkhDGOpgks+vp91anVonD5E37cvDgL7s2oDR+1wS/FYc01i7hYiwRRgbv0+/IRxT0MICoH9UUVaR93dte==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|6FD013DF-A2AE-4CD9-BAE6-D4FBA2342939|2025-09-03T15:10:28|MAS0610247C0|SwmhKishZmpauSZIEeu/61mlMeCjQdfMIJZWRDkR6amShcEshxEVZ6UOx8qXYHY9vXl2fB2Arcecf7OuoqXj82Bfec0vHT9wodnLBCG/Viny1Gz3rzkl4Z3Pge2fwUr/vPWuf+j9xKKBZih+f0DOxYf8ec9Xwzv/pzpaWiv9AYOd4KddN2J5O58/V9FQgb/Yl+2VnUgrqjLJ/gtB+N9VyzFvMTPdM7JuPLZFKS+79tqr7fUgnMMq+ypHzoO+KHUXVXvUd8IA4seeJcOwZ7reC9MHQN4vZLvNMDJHjNLDi3n2m19tjUAX6x0ZHRmAX1uirwig+3c/UQU8g==j00001000000709182898

This XML file does not appear to have any style information associated with it. The document tree is shown below.

```
<cfdi:Comprobante xmlns:cfdi="http://www.sat.gob.mx/cfd/4" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/cfd/4 http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/4/cfdv40.xsd"
Certificado="MIIGCDDCA/CgAwIBAgIUMDAwMDEwMDAwMDA3MTE4MzAyODQwODQyJkZlZmVhbnQwQWwYdVQ0ODQxODQyBERUwGU0VSU0gREUgQURNSUSU1RSQUNJT04gVFJlQ1VU
Exportacion="01" Fecha="2025-09-02T14:15:23" Folio="56" FormaPago="03" LugarExpedicion="80000" MetodoPago="PUE" Moneda="MXN"
NoCertificado="00001000000711830284"
Sello="SwmhKishZmpauSZIEeu/61mImeCjQdfdmIJZWRdR6amShcEshxEVZ6U0xa8qXYHY9vXt2fB2ArcecF70uqXj82Bfiec0v1HT9wcdnLBCG/Viny1Gz3rzkk4Z3Pge2fwUr/vPWuf+j9xPKBZI
SubTotal="816457.91" TipoDeComprobante="I" Total="947091.17" Version="4.0">
<cfdi:Emisor Nombre="JESUS AMADO CAMACHO OSUNA" RegimenFiscal="612" Rfc="CA03810630ST4"/>
<cfdi:Receptor DomicilioFiscalReceptor="80500" Nombre="MUNICIPIO DE BADIRAGUATO" RegimenFiscalReceptor="603" Rfc="MBA850101214" UsoCFDI="I01"/>
<cfdi:Conceptos>
<cfdi:Concepto Cantidad="1.00" ClaveProdServ="72121101" ClaveUnidad="E48" Descripcion="SERVICIO DE CONSTRUCCIONPAGO DE ESTIMACION 02 NORMALDE LA
OBRA: CONSTRUCCIÓN DE RECUBRIMIENTO DE UN SUELO CON CONCRETO HIDRÁULICO, EN LA CALLE MOCORITO (ARROYO DE ARENA) ENTRE BOULEVARD JUAN S MILLÁN Y CALLE
ELIGIO ABITIA, COLONIA CENTRO, MUNICIPIO DE BADIRAGUATO, SINALOA.CONTRATO NO.: MBGBR-LP-FAISMUN-004/2025MONTO DEL CONTRATO: $ 7,499,560.31IMPORTE DE
LA OBRA EJECUTADA SIN IVA $ 1,256,009.09MAS I.V.A 16 % $ 200,974.25TOTAL DE LA OBRA EJECUTADA CON IVA $ 1,457,063.34AMORTIZACIÓN ANTICIPO 35% $
439,631.18MAS I.V.A.: $ 70,340.99TOTAL AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO: $ 509,972.17 Importe TOTAL A FACTURAR $ 816,457.91MAS I.V.A $ 130,633.26MONTO NETO A
FACTURAR $ 947,091.17RETENCIÓN 3% ( S.V.I.F.V C.) : $ 37,682.67TOTAL DEDUCCIONES: $ 547,654.84MONTO LIQUIDO A RECIBIR: $ 909,408.50"
Importe="816457.91" NoIdentificacion="SER07" ObjetoImp="02" ValorUnitario="816457.91">
<cfdi:Impuestos>
<cfdi:Traslados>
<cfdi:Traslado Base="816457.91" Importe="130633.26" Impuesto="002" TasaOCuota="0.160000" TipoFactor="Tasa"/>
</cfdi:Traslados>
</cfdi:Impuestos>
</cfdi:Concepto>
</cfdi:Conceptos>
<cfdi:Impuestos TotalImpuestosTrasladados="130633.26">
<cfdi:Traslados>
<cfdi:Traslado Base="816457.91" Importe="130633.26" Impuesto="002" TasaOCuota="0.160000" TipoFactor="Tasa"/>
</cfdi:Traslados>
</cfdi:Impuestos>
<cfdi:Complemento>
<tfd:TimbreFiscalDigital xmlns:tfd="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital" xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital
http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/TimbreFiscalDigital/TimbreFiscalDigitalv11.xsd" Version="1.1" UUID="6FD013DF-A2AE-4CD9-BAE6-D4FBA2342939"
FechaTimbrado="2025-09-03T15:10:28" RfcProvCertif="MA50010247C0"
SelloCFD="SwmhKishZmpauSZIEeu/61mImeCjQdfdmIJZWRdR6amShcEshxEVZ6U0xa8qXYHY9vXt2fB2ArcecF70uqXj82Bfiec0v1HT9wcdnLBCG/Viny1Gz3rzkk4Z3Pge2fwUr/vPWuf+j
NoCertificadoSAT="00001000000709182898"
SelloSAT="arr+xo+nZLzLYnycEZTbPi3oc6xMXs8w8cfSchbUJU0CvNwV1TQHSLimNVHSRBEWvucFH21V3FrBV2D7+hdAoP65reSnCuazQBks/e8a2KWFSv/19dqKB9EJym0AAiHkRtFgYya1fQ
</cfdi:Complemento>
</cfdi:Comprobante>
```



Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
CAOJ810630ST4	JESUS AMADO CAMACHO OSUNA	MBA850101214	MUNICIPIO DE BADIRAGUATO
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
6FD013DF-A2AE-4CD9-BAE6-D4FBA2342939	2025-09-02T14:15:23	2025-09-03T15:10:28	MAS0810247C0
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$947,091.17	Ingreso	Vigente	Cancelable con aceptación

Imprimir



Fecha: 6 de agosto de 2025

CARATULA DE ESTIMACIÓN

CONTRATISTA: JESUS AMADO CAMACHO OSUNA		ESTIMACIÓN No: 02 NORMAL	
DOMICILIO: Calle sin nombre s/n. Colonia: Loc. Los Naranjos, C.P. 80080, Culiacán, Sinaloa		PERÍODO DE ESTIMACIÓN:	
TELÉFONO:	CEL:	DEL	23-jul-25
		AL	05-ago-25
R.F.C.		FECHA DE CONTRATO:	
CAOJ810630ST4.		19-jul-25	
DEPENDENCIA:			
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA			
LOCALIDAD:		MUNICIPIO:	PERÍODO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO:
BADIRAGUATO		BADIRAGUATO	INICIO: 23-jul-25
			TERMINACIÓN: 19-nov-25
DESCRIPCIÓN:			
CONSTRUCCIÓN DE RECUBRIMIENTO DE UN SUELO CON CONCRETO HIDRAULICO, EN LA CALLE MOCORIÑO (ARROYO DE ARENA) ENTRE BOULEVARD JUAN S MILLÁN Y CALLE ELIGIO ABITIA, COLONIA CENTRO, MUNICIPIO DE BADIRAGUATO, SINALOA			
CONTRATO No:			
MBGBR-LP-FAISMUN-004/2025			
IMPORTE SIN IVA DE LA OBRA	IMPORTE CON IVA DE LA OBRA	35% ANTICIPO DE LA OBRA	IMPORTE TOTAL DE CONTRATO:
\$6,465,138.20	\$7,499,560.31	\$2,624,846.11	\$7,499,560.31
RECIBI:			BUENO POR: \$ 909,408.50
\$ 909,408.50			(SON NOVECIENTOS NUEVE MIL CUATROCIENTOS OCHO PESOS 50/100 M.N.)
EN PAGO DE ESTIMACIÓN:		02 NORMAL	
DEDUCCIONES:		CÁLCULO DE ESTIMACIÓN	
AMORTIZACIÓN ANTICIPO 35%	\$ 439,631.18	IMPORTE DE LA OBRA EJECUTADA SIN IVA	\$ 1,256,089.09
MAS I.V.A.:	\$ 70,340.99	MAS I.V.A 16 %	\$ 200,974.25
TOTAL AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO:	\$ 509,972.17	TOTAL DE LA OBRA EJECUTADA CON IVA	\$ 1,457,063.34
3 % SVIFYC:	\$ 37,682.67	MENOS TOTAL DEDUCCIONES:	\$ 547,654.84
TOTAL DEDUCCIONES:	\$ 547,654.84	MONTO A FACTURAR MAS IVA	\$ 947,091.17
		SALDO A PAGAR: \$ 909,408.50	

ELABORO.-

Jesús Amado Camacho Osuna
C. JESUS AMADO CAMACHO OSUNA
REPRESENTANTE LEGAL

REVISÓ.-

Ing. José Rodolfo Contreras López
ING. JOSE RODOLFO CONTRERAS LOPEZ
COSTOS Y PRESUPUESTOS.

AUTORIZÓ

C. Ing. Rubiel Rincon Ramo
C. ING. RUBIEL RINCON RAMO
DIRECTOR DE O.P.D.U.



JESUS AMADO CAMACHO OSUNA

Dependencia :

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS,
DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA

Control de Estimaciones

CONSTRUCCIÓN DE RECUBRIMIENTO DE UN SUELO CON CONCRETO HIDRÁULICO, EN LA CALLE MOCORITO (ARROYO DE ARENA) ENTRE BOULEVARD JUAN S MILLÁN Y CALLE ELIGIO ABITIA, COLONIA CENTRO, MUNICIPIO DE BADIRAGUATO, SINALOA			Fecha:	Estimacion:
			6 de agosto de 2025	02 NORMAL
Periodo de la estimación:	23/07/2025	05/08/2025	Localidad:	No. De contrato:
Periodo de Ejecución:	23/07/2025	19/11/2025	BADIRAGUATO	MBGBR-LP-FAISMUN-004/2025
Importe del contrato con I.V.A.	Imp. Contratado sin I.V.A.	Anticipo	Importe Anticipo sin I.V.A.	% de Avance
\$ 7,499,560.31	\$ 6,465,138.20	\$ 2,624,846.11	\$ 2,262,798.37	19%
				% Avance Total
				52%

Control Del Anticipo	Liquidacion de Estimacion	Control de Estimacion
AMORTIZA ESTA ESTIMACION	Importe de la Estimacion (+) \$ 1,256,089.09	ESTA ESTIMACION
\$ 509,972.17	16 % I.V.A (+) \$ 200,974.25	\$ 1,457,063.34
	Sub- Total A (=) \$ 1,457,063.34	
	Amortizacion Anticipo 35% \$ 439,631.18	
AMORTIZACION ANTERIOR	16 % I.V.A (+) \$ 70,340.99	ACUMULADO ANTERIOR
\$ 856,883.55	Total (=) \$ 509,972.17	\$ 2,448,238.72
	Importe TOTAL A FACTURAR \$ 816,457.91	
TOTAL AMORTIZADO	16 % I.V.A (+) \$ 130,633.26	TOTAL ACUMULADO
\$ 1,366,855.72	Total (=) \$ 947,091.17	\$ 3,905,302.06
	3 % SWIFYC: \$ 37,682.67	
ANTICIPO OTORGADO	Total Deducciones (=) \$ 547,654.84	CONTRATADO
\$ 2,624,846.11	Importe TOTAL \$ 909,408.50	\$ 7,499,560.31
	NETO A PAGAR	
SALDO DEL ANTICIPO	\$ 909,408.50	SALDO
\$1,257,990.39	Son:	\$ 3,594,258.25
	(SON NOVECIENTOS NUEVE MIL CUATROCIENTOS OCHO PESOS 50/100 M.N.)	

ELABORO.-

C. JESUS AMADO CAMACHO OSUNA
REPRESENTANTE LEGAL

REVISO

ING. JOSE RODOLFO CONTRERAS LOPEZ
COSTOS Y PRESUPUESTOS.

AUTORIZO

C. ING. RUBIEL RINCON RAMOS.
DIRECTOR O.P.D.U. Y E.

ELABORO:-

C. JESUS AMADO CAMACHO OSUNA
REPRESENTANTE LEGAL

REVISO:-

AUTORIZO:-
C. ING. RUBIEL RINCON RAMOS
DIRECTOR DE Q.P.D.U. Y E.

AUTORIZO



CONTRATISTA:		FECHA:	
JESUS AMADO CAMACHO OSUNA		6 de agosto de 2025	
DOMICILIO:		DEPENDENCIA:	
Calle sin nombre s/n. Colonia: Loc. Los Naranjos, C.P. 80080, Culiacán, Sinaloa		DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA	
R.F.C.	CAOJ810630ST4.		

RESÚMEN DE ESTIMACIÓN

	LOCALIDAD:	BADIRAGUATO	ESTIMACIÓN:	02 NORMAL
DESCRIPCIÓN:	CONSTRUCCIÓN DE RECUBRIMIENTO DE UN SUELO CON CONCRETO HIDRÁULICO, EN LA CALLE MOCORITO (ARROYO DE ARENA) ENTRE BOULEVARD JUAN S MILLÁN Y CALLE ELIGIO ABITIA, COLONIA CENTRO, MUNICIPIO DE BADIRAGUATO, SINALOA			

IMPORTE DE OBRA SIN IVA:	\$ 6,465,138.20
IMPORTE DE ANTICIPO DE OBRA:	\$ 2,624,846.11
IMPORTE TOTAL DE CONTRATO:	\$ 7,499,560.31

DESTAJOS		IMPORTE
1	PRELIMINARES	\$ -
2	ESTRUCTURA	\$ 1,256,089.09
3	OTROS	\$ -
SUBTOTAL ESTIMACIÓN:		\$ 1,256,089.09

SUB TOTAL=	\$ 1,256,089.09
I.V.A AL 16 %	\$ 200,974.25
TOTAL =	\$ 1,457,063.34

ELABORO.-

C. JESUS AMADO CAMACHO OSUNA
REPRESENTANTE LEGAL

REVISÓ.-

ING. JOSE RODOLFO CONTRERAS LOPEZ
COSTOS Y PRESUPUESTOS.

AUTORIZO.-

C. ING. RUBIEL RINCON RAMOS.
DIRECTOR DE O.P.D.U. Y E.

ELABORO:-

ELABORO:-
Jesús Amado Camacho Osuna
C. JESUS AMADO CAMACHO OSUNA
REPRESENTANTE LEGAL

ING. JOSE RODOLFO CONTRERAS LOPEZ
COSTOS Y PRESUPUESTOS

AUTORIZO
C. ING. RUBIEL RINCON RAMOS
DIRECTOR DE O.P.D.U.Y.E.



CONTRATISTA: JESUS AMADO CAMACHO OSUNA		DEPENDENCIA: DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA		FECHA: miércoles, 6 de agosto de 2025
DOMICILIO: Calle sin nombre s/n. Colonia: Loc. Los Marañones, C.P. 80080, Culiacán, Sinaloa		R.F.C.: CAOJ810630ST4		2 de 2
DESGLÓSE DE CONCEPTOS DE ESTIMACIÓN				
DESCRIPCIÓN: CONSTRUCCIÓN DE RECUBRIMIENTO DE UN SUELO CON CONCRETO HIDRÁULICO, EN LA CALLE MOCORITO (ARROYO DE ARENA) ENTRE BOULEVARD JUAN S MILLÁN Y CALLE ELIGIO ABITIA, COLONIA CENTRO, MUNICIPIO DE BADIRAGUATO, SINALOA		LOCALIDAD: BADIRAGUATO		02 NORMAL
IMPORTE DE OBRA SIN IVA: \$6,465,138.20		IMPORTE TOTAL DE OBRA: \$2,624,846.11		IMPORTE TOTAL DE CONTRATO: \$7,489,560.31


CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANT.	SEGUN PROYECTO	P.U.	TOTAL	HASTA ESTIM.	HASTA ESTIM.	EXCEDENTE	DE ESTA ESTIMACIÓN	IMPORTE
GP109	LOSA DE CONCRETO DE 15 CMS DE ESPESOR CON CONCRETO PREMEZCLADO F'c=3000 KG/CM², INCLUYE: MANO DE OBRA, MATERIALES, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	M2	3,214.47	\$	839.01	\$ 2,696,972.47	-	0.00	0.00	1,072.33	\$ 8,969,559
GP133	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONTRA JUNTA DE PVC TIPO C-3 PARA LOSAS DE 15 CM. EN PAVIMENTOS. INCLUYE: TRAZO, ALINEACIÓN, HINCADO Y REMOCIÓN DE TAPA.	ML	1,613.22	\$	32.67	\$ 52,703.50	-	0.00	0.00	652.82	\$ 21,327.63
GP13	CALAFATEO EN LOSAS DE CONCRETO HIDRÁULICO CON ASPALTEX 505, INCLUYE: UN RIEGO CON EMULTEX T.P. (PRIMER), UN RIEGO DE ASPALTEX 505 Y BARRIDO DE LA SUPERFICIE.	ML	1,137.84	\$	33.75	\$ 38,402.10	-	0.00	0.00	506.90	\$ 17,175.38
GP15	SUMINISTRO, HABILITADO Y COLOCACIÓN DE ACERO DE REFUERZO LISO EN PASAJUNTAS DE 5/8" DE DIAMETRO, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	ML	89.12	\$	77.12	\$ 6,872.93	-	0.00	0.00	15.00	\$ 1,156.60
										SUB-TOTAL	\$ 1,256,089.09
										IVA	\$ 200,974.25
										MONTO TOTAL	\$ 1,457,063.34

ELABORO:  JESUS AMADO CAMACHO OSUNA
REPRESENTANTE LEGAL

ING. JOSE ROBERTO CONTRERAS LOPEZ
COSTOS Y PRESUPUESTOS.

REVISÓ  REVISO

AUTORIZO  C. ING. RUBIEL RINCON RAMOS
DIRECTOR DE O.P.D.U. Y IE.

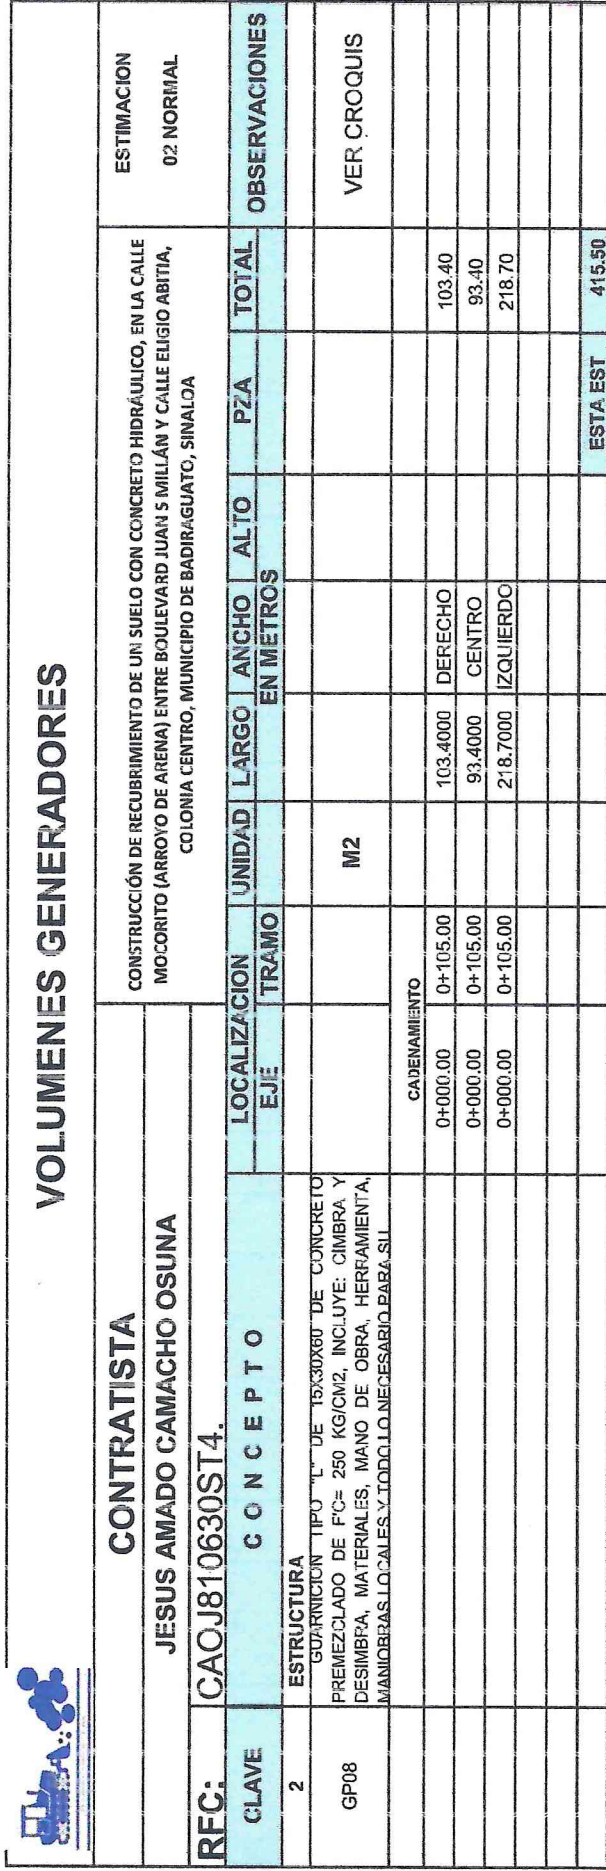

REVISOR: *BSJ*
ARQ. BRICEIDA GPE NIEBLAS MARTINEZ
SUPERVISOR

AUTORIZO.-
ING. RUBIEL RINCON RAMOS
DIRECTOR DE O.P.D.U Y E



ELABORO: 
C. JESUS AMADO CAMACHO OSUNA
REPRESENTANTE LEGAL

REVISOR: *PRSD*
ARQ. BRICEIDA GONZALEZ MARTINEZ
SUPERVISOR

AUTORIZO.-
ING. RUBIEL RINCON RAMOS
DIRECTOR DE O.P.D.U.Y.E.



VOLUMENES GENERADORES

CONTRATISTA

JESUS AMADO CAMACHO OSUNA

RFC: CAOJ810630ST4.

CLAVE	C O N C E P T O	LOCALIZACION		UNIDAD	EN METROS			PZA	TOTAL	OBSERVACIONES		
		EJE	TRAMO		LARGO	ANCHO	ALTO					
GP109	LOSA DE CONCRETO DE 15 CMS DE ESPESOR CON CONCRETO PREMEZCLADO F'C=300 KG/CM". INCLUYE: MANO DE OBRA, MATERIALES, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	CADENAMIENTO		M2						VER CROQUIS		
		0+000.00	0+005.00		LONG	ANCHO						
		0+005.00	0+010.00		5.0000	18.60					93.00	
		0+010.00	0+015.00		5.0000	12.70					63.50	
		0+015.00	0+020.00		5.0000	10.62					53.10	
		0+020.00	0+025.00		5.0000	10.07					50.35	
		0+025.00	0+030.00		5.0000	9.80					49.00	
		0+030.00	0+035.00		5.0000	9.58					47.90	
		0+035.00	0+040.00		2.5300	9.43					23.86	
		0+040.00	0+045.00		2.4700	9.42					23.27	
		0+045.00	0+050.00		5.0000	9.42					47.10	
		0+050.00	0+055.00		5.0000	9.47					47.35	
		0+055.00	0+060.00		5.0000	9.48					47.40	
		0+060.00	0+065.00		5.0000	9.43					47.15	
		0+065.00	0+070.00		5.0000	9.40					47.00	
		0+070.00	0+075.00		5.0000	9.40					47.00	
		0+075.00	0+080.00		5.0000	9.42					47.10	
		0+080.00	0+085.00		5.0000	9.40					47.00	
		0+085.00	0+090.00		5.0000	9.40					47.00	
		0+090.00	0+095.00		5.0000	11.25					56.25	
		0+095.00	0+100.00		5.0000	9.40					47.00	
		0+100.00	0+105.00		5.0000	9.40					47.00	

ELABORO.-

C. JESUS AMADO CAMACHO OSUNA
REPRESENTANTE LEGAL

REVISO.-

ARQ. BRICEIDA GPE NIEBLAS MARTINEZ
SUPERVISOR

AUTORIZO.-
ING. RUBIEL RINCON RAMOS
DIRECTOR DE O.P.D.U.Y.E.

CONTRATISTA:
JESUS AMADO CAMACHO OSUNA

DEPENDENCIA:
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS,
DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA

DOMICILIO: Calle sin nombre s/n. Colonia: Loc. Los Naranjos, C.P. 80080, Culiacán, Sinaloa


R.F.C. CAOJ810630ST4.

OBRA: CONSTRUCCIÓN DE RECUBRIMIENTO DE UN SUELO CON CONCRETO HIDRÁULICO, EN LA CALLE MOCORITO (ARROYO DE ARENA) ENTRE BOULEVARD JUAN S MILLÁN Y CALLE ELIGIO ABITIA, COLONIA CENTRO, MUNICIPIO DE BADIRAGUATO, SINALOA

CROQUIS ESTIMACION:

CROQUIS ESTIMACION:

CLAVE	CONCEPTO
1	ESTRUCTURA
GP08	GUARNICIÓN TIPO "L" DE 15x30x50 DE CONCRETO PREMEZCLADO DE F'C= 250 KG/CM2, INCLUYE: CIMBRA Y DESIMBRA, MATERIALES, MANO DE
GP088	PATIN DE 15x60 DE CONCRETO PREMEZCLADO DE F'C= 250 KG/CM2, INCLUYE: CIMBRA Y DESIMBRA, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA,
GP109	LOSA DE CONCRETO DE 15 CMS DE ESPESOR CON CONCRETO PREMEZCLADO F'C=300 KG/CM", INCLUYE: MANO DE OBRA, MATERIALES,
GP133	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONTRA JUNTA DE PVC TIPO C-3 PARA LOSAS DE 15 CM, EN PAVIMENTOS, INCLUYE: TRAZO, ALINEACIÓN,
GP13	CALAFATEO EN LOSAS DE CONCRETO HIDRÁULICO CON ASFALTEX 505, INCLUYE: UN RIEGO CON EMULTEX T.P. (PRIMER), UN RIEGO DE ASFALTEX
GP15	SUMINISTRO, HABILITADO Y COLOCACIÓN DE ACERO DE REFUERZO LISO EN PASAJUNTAS DE 5/8" DE DIAMETRO, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE

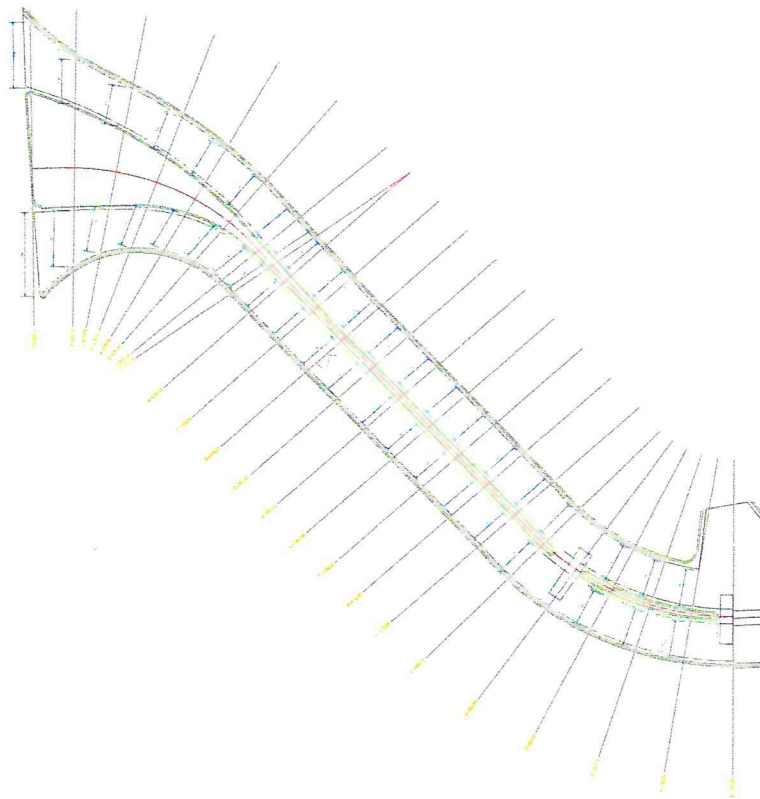

ELABORO.- *Jesús Amado*
C. JESUS AMADO CAMACHO OSUNA
REPRESENTANTE LEGAL

REVISO.- *Brisa*
ARQ. BRICEIDA GPE NIEBLAS MARTINEZ
SUPERVISOR DE OBRA

AUTORIZO.- *[Signature]*
C. ING. RUBIEL RINCON RAMOS,
DIRECTOR DE O.P.D.U. Y E.



CONTRATISTA:

JESUS AMADO CAMACHO OSUNA

DEPENDENCIA:

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS,
DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA

DOMICILIO:

Calle sin nombre s/n. Colonia: Loc. Los Naranjos, C.P. 80080, Culiacán, Sinaloa

R.F.C.

CAOJ810630ST4.


OBRA:

CONSTRUCCIÓN DE RECUBRIMIENTO DE UN SUELO CON CONCRETO HIDRÁULICO, EN LA CALLE MOCORITO (ARROYO DE ARENA) ENTRE BOULEVARD JUAN S MILLÁN Y CALLE ELIGIO ABITIA, COLONIA CENTRO, MUNICIPIO DE BADIRAGUATO, SINALOA

FOTOS DE ESTIMACION:

FOTOS DE ESTIMACION:

CVE	CONCEPTO
2	ESTRUCTURA
GP08	GUARNICIÓN TIPO "L" DE 15X30X60 DE CONCRETO PREMEZCLADO DE F'C= 250 KG/CM2, INCLUYE: CIMBRA Y DESIMBRA, MATERIALES, MANO DE OBRA,
GP08	PATIN DE 15X60 DE CONCRETO PREMEZCLADO DE F'C= 250 KG/CM2, INCLUYE: CIMBRA Y DESIMBRA, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA,
GP10	LOSA DE CONCRETO DE 15 CMS DE ESPESOR CON CONCRETO PREMEZCLADO F'C=300 KG/CM", INCLUYE: MANO DE OBRA, MATERIALES, HERRAMIENTA
GP13	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONTRA JUNTA DE PVC TIPO C-3 PARA LOSAS DE 15 CM. EN PAVIMENTOS, INCLUYE: TRAZO, ALINEACIÓN, HINCADO Y
GP13	CALAFATEO EN LOSAS DE CONCRETO HIDRÁULICO CON ASFALTEX 505, INCLUYE: UN RIEGO CON EMULTEX T.P. (PRYMER), UN RIEGO DE ASFALTEX 505
GP15	SUMINISTRO, HABILITADO Y COLOCACIÓN DE ACERO DE REFUERZO LISO EN PASAJUNTAS DE 5/8" DE DIAMETRO, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y

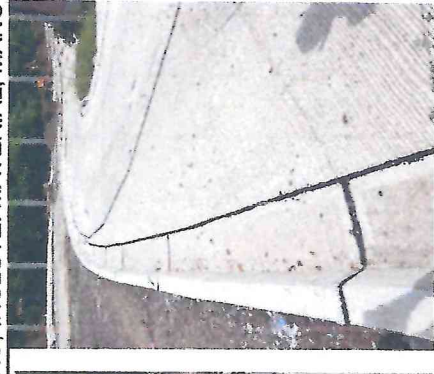

ELABORO.-

Jesús Pardo
C. JESUS AMADO CAMACHO OSUNA
REPRESENTANTE LEGAL

REVISO.-

Briceida GPE Nieblas Martínez
ARQ. BRICEIDA GPE NIEBLAS MARTINEZ
SUPERVISOR DE OBRA

AUTORIZO.-

Rubiel Rincón Ramos
C. ING. RUBIEL RINCON RAMOS
DIRECTOR DE O.P.D.U. Y E.



Fecha y hora de consulta07/09/2025 4:26:12 PM

Contrato00798320

Nombre del ClienteMUNICIPIO DE BADIRAGUATO

BBVA Net Cash - Pagos Interbancarios

Operación autorizada

Transferencia en proceso de validación y aplicación.

Datos del firmante

Usuario:ADMIN1

Poder:100%

Datos de la operación

Tipo de operación:Pago Interbancario

Descripción:EST 02 NOR LP004

Importe de la operación:909,408.50 MXP

Cuenta de retiro:0124174836

Cuenta de depósito:072730012781361749

Divisa de la cuenta: MXP

Divisa de la cuenta: MXP

Titular de la cuenta:MUNICIPIO DE BADIRAGUATO

Titular de la cuenta: JESUS AMADO CAMACHO OSUNA

Nombre banco destino: BANORTE

Fecha valor: 08/09/2025

Fecha de creación: 07/09/2025

Fecha de aplicación: 07/09/2025

Concepto de pago: EST 02 NOR LP004

Referencia numérica:

Instrumento de seguridad: ASD 6551749382

Hora de captura en el canal: 16:26:10

Datos de confirmación de la transferencia

Folio interbancario:0000997914

Clave de rastreo:002601002509080000997914

Folio de firma:0048661021

Folio único:I401202509071626100048661027

Estado operación

Porcentaje Firmado:100%

Estado:Operado

Detalle de firmas

Acción	Usuario	Porcentaje aportado	Fecha
CREO	ADMIN1	— %	07/09/2025
FIRMO	ADMIN1	100 %	07/09/2025
