



Badiraguato

GENERANDO BUENOS RESULTADOS



OFICIO No. OPDUyE/721/2025
ASUNTO: SOLICITUD PAGO ESTIMACIÓN

04 NORMAL

Badiraguato, Sin., a 04 de Diciembre de 2025


MTRO. GONZALO IRINEO CABALLERO TERRAZAS
TESORERO MUNICIPAL
P R E S E N T E.-

POR MEDIO DE LA PRESENTE, LE SOLICITO EL PAGO POR: CONCEPTO DE PAGO DE ESTIMACIÓN 04 NORMAL, DEL IMPORTE DEL CONTRATO, A FAVOR DE LA EMPRESA: JESUS AMADO CAMACHO OSUNA, LA CUAL REALIZA LOS TRABAJOS APROBADOS POR EL SUBCOMITE DE BIENESTAR MUNICIPAL, A CONTINUACIÓN, SE DETALLA:

- NOMBRE DE LA OBRA: CONSTRUCCIÓN DE RECUBRIMIENTO DE UN SUELO CON CONCRETO HIDRÁULICO, EN LA CALLE MOCORITO (ARROYO DE ARENA) ENTRE BOULEVARD JUAN S. MILLAN Y CALLE ELIGIO ABITIA, COLONIA CENTRO, MUNICIPIO DE BADIRAGUATO, SINALOA.
- No. DE CONTRATO: MBGBR-LP-FAISMUN-004/2025
- IMPORTE DEL CONTRATO: \$7,499,560.31 (SIETE MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS SESENTA PESOS 31/100 MN.)
- CONCEPTO DEL PAGO: PAGO DE ESTIMACIÓN 04 NORMAL
- IMPORTE A PAGAR: \$1,121,101.82 (UN MILLON CIENTO VEINTIUN MIL CIENTO UN PESOS 82/100 M.N)
- RECURSOS: FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FAISMUN) EJERCICIO 2025.
- EMPRESA: JESÚS AMADO CAMACHO OSUNA
- R.F.C. CAOJ810630ST4
- DOMICILIO FISCAL: CALLE SIN NOMBRE, S/N, COLONIA: LOC. LOS NARANJOS, C.P. 80080, CULIACÁN, SINALOA.
- No. DE FACTURA: # AB5D, DE FECHA 04 DE DICIEMBRE DE 2025.

SE ANEXA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DE SOPORTE, COMO AMPARO DE DICHO PAGO.

AGRADECIENDO DE ANTEMANO LA ATENCIÓN QUE SE SIRVA DAR A LA PRESENTE, ME DESPIDO QUEDANDO A SUS ÓRDENES.



DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS,
DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA,
BADIRAGUATO, SINALOA.
C.C.P. ARCHIVO.

ATENTAMENTE

C. ING. RUBIEL RINCÓN RAMOS
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS,
DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA



MUNICIPIO DE
BADIRAGUATO
TESORERÍA

04 DIC 2025

06:43 PM

RECIBIDO



JESUS AMADO CAMACHO OSUNA

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Serie:

Folio: 88

Fecha: 04/Dic/2025 16:47:51

Lugar de expedición (C.P.) 80080

Emisor

JESUS AMADO CAMACHO OSUNA

RFC: CAOJ810630ST4

Régimen Fiscal: 612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

Domicilio: LOS NARANJOS Culiacán Sinaloa México 80080

Receptor

Cliente: MUNICIPIO DE BADIRAGUATO

RFC: MBA850101214

Uso CFDI: I01 - Construcciones

Exportación: 01 - No aplica

Domicilio Fiscal: 80500

Régimen Fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

Domicilio: GABRIEL LEYVA SOLANO S/N Badiraguato Badiraguato Sinaloa México 80500

Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición

Forma de Pago: 03 - Transferencia electrónica de

Tipo de cambio: 1.000000

Moneda: MXN - Peso Mexicano

Cantidad	Clave Unid ad SAT	Clave Prod/Servi cio	Descripción	Valor unitario	Impuestos	Importe
1.00	E48 - Unidad de servicio	72141103 - Servicio de pavimentación de calles y carreteras	<p>PAGO DE ESTIMACION 04 NORMAL</p> <p>DE LA OBRA: CONSTRUCCIÓN DE RECUBRIMIENTO DE UN SUELO CON CONCRETO HIDRAULICO, EN LA CALLE MOCORITO (ARROYO DE ARENA) ENTRE BOULEVARD JUAN S MILLÁN Y CALLE ELIGIO ABITIA, COLONIA CENTRO, MUNICIPIO DE BADIRAGUATO, SINALOA.</p> <p>CONTRATO NO.: MBGBR-LP-FAISMUN-004/2025 MONTO DEL CONTRATO: \$ 7,499,560.31</p> <p>IMPORTE DE LA OBRA EJECUTADA SIN IVA \$ 1,548,483.16 MAS I.V.A 16 % \$ 247,757.31 TOTAL DE LA OBRA EJECUTADA CON IVA \$ 1,796,240.47</p> <p>AMORTIZACIÓN ANTICIPO 35% \$ 541,969.10 MAS I.V.A.: \$ 86,715.06 TOTAL AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO: \$ 628,684.16</p> <p>Importe TOTAL A FACTURAR \$ 1,006,514.06 MAS I.V.A \$ 161,042.25 MONTO NETO A FACTURAR \$ 1,167,556.31</p> <p>RETENCION 3% (S.V.I.F.Y C.) : \$ 46,454.49 TOTAL DEDUCCIONES: \$ 675,138.65</p> <p>MONTO LIQUIDO A RECIBIR: \$ 1,121,101.82</p>	\$1,006,514.06	IVA, - Importe: 161042.25	\$1,006,514.06

Información de cancelación

Motivo de cancelación:

Folio relacionado:

CFDI RELACIONADOS

Tipo de relación:

Lista de CFDI's relacionados:

Total con letra:

un millón ciento sesenta y siete mil quinientos cincuenta y seis Pesos 31/100 M.N.

Subtotal: \$1,006,514.06
I.E.S.P.S \$0.00
IVA 16 %: \$161,042.25

Total: \$1,167,556.31



Este documento es una representación impresa de un CFDI

Serie del Certificado del emisor: 00001000000711830284
Folio Fiscal: A696BF25-8D00-4497-A591-28214A97AB5D
No. de serie del Certificado del SAT: 00001000000709182898
Fecha y hora de certificación: 2025-12-04T17:47:58

Sello digital del CFDI

hsFkmsAAydcwFFChdN668zOoLEvAqFNXupUuBpRyd4/DT18BS0doBePgHj30cLkczP7xRTXC8Ay25sVADctV1AAk7hIFNQ4kFTXVnFSpA80box9CFQLCBiWk8e5JLj6Q+4Ni4m6qo2lg
eDtiUBqXFFSpGeUr/uJfazCUyD9wngfs9xp9+6Rok0Kj8GHX43AmTUqv9NkWDaZRkbl2FxllvVXSzTXcSGJHeVzMy4nuSmanfzpAU+i3aQHLLrf1xr5r5Cyn7clShcEoVQniWssECgti6Q
3G2Ve2qFIFDk4y4Q6pmfncrOSNFVHlagSdzVudrsFcy1XGZGcoqolNGmS+A==

Sello del SAT

Ba8DrL2XHgwpEi6rN25P1fw8Dn3DyTerj0PZiQh0h7ZmNEDYjll899nBhPnM6hNoo0oNVHKJZA6+CJgq56pwFNFe1IXg2wnCUkJFjcWplaE1FCSo4eM+SbWSA0XPUZpvpkxTQKZa7
d3U9S5UeB3EtGfTsp9T0grcq7ibwyHKLvypSAr021CsmekWme2YQREIHATBO5KvLWglUmVB6Q6oc5RCXCg7RihN5SMxZTw6F9LdTKHfuCCiW/JJByCHmrQza+iWgZqk68ggk7ry0b
HAzIHKfP09WN8B7Lmtrspmdv96cRsjbQnzZ73oHn4c/Liifszn6VZjWJRNoHg==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|A696BF25-8D00-4497-A591-28214A97AB5D|2025-12-04T17:47:58|MA30810247C0|hsFkmsAAydcwFFChdN668zOoLEvAqFNXupUuBpRyd4/DT18BS0doBePgHj30cLkczP7
xRTXC8Ay25sVADctV1AAk7hIFNQ4kFTXVnFSpA80box9CFQLCBiWk8e5JLj6Q+4Ni4m6qo2lgDtiUBqXFFSpGeUr/uJfazCUyD9wngfs9xp9+6Rok0Kj8GHX43AmTUqv9NkWDaZRkbl2Fx
llvVXSzTXcSGJHeVzMy4nuSmanfzpAU+i3aQHLLrf1xr5r5Cyn7clShcEoVQniWssECgti6Q3G2Ve2qFIFDk4y4Q6pmfncrOSNFVHlagSdzVudrsFcy1XGZGcoqolNGmS+A==|00001000000
709182898||

This XML file does not appear to have any style information associated with it. The document tree is shown below.

```
<cfdi:Comprobante xmlns:cfdi="http://www.sat.gob.mx/cfd/4" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/cfd/4 http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/4/cfdv40.xsd">
  <Certificado><"MIG6DCCA/CgAmIBagIUMDAWMDA3MTE4MzAyODQwYjZKozZhvcnNAQEUBQAwGGVMTUkwYDVQQDDC8yOBERUwGjB0VSVKIDSuR8UGURQURNSU5JUIRSQUJNT04eVFJJQlVUOVVJTOTEUEMCwGAIEUCGwLU0VSVKIDSU8REUpQURNSU5JU1RSQSUExportacion="01" Fecha="2025-12-04T16:47:51" Folio="88" FormaPago="03" LugarExpedicion="80080" MetodoPago="PUE" Moneda="MXN" NoCertificado="00001000000711830284" Sellto="hsFkmxAydvcWFChdN6618z0oLEvaqFNxuplbprydx/DT18BS0doBePBHJ30cLkczP7XtXC8AY2SSADctVIAAK7hIFNQ4KFtXvNFSpA80Lxx9CFQLCBTKW8e5LJj6Q+4nt4m6q02:geDtUBqXFfSPgsUr/u/fazCUyp9wxgfs9xp9+6RoK0Ki8GHX43AmTUgSubtotal="1006514.06" TipoDeComprobante="I" Total="1167556.31" Version="4.0">
    <cfdi:Emisor Nombre="JESUS ANADO CAMACHO OSUNA" RegimenFiscal="612" Rfc="CA01810630ST4"/>
    <cfdi:Receptor DomicilioFiscalReceptor="80500" Nombre="MUNICIPIO DE BADIRAGUATO" RegimenFiscalReceptor="603" Rfc="MBA850101214" UsoCFDI="I01"/>
    <cfdi:Conceptos>
      <cfdi:Concepto Cantidad="1.00" ClaveProdServ="72141103" ClaveUnidad="E48" Descripcion="SERVICIO DE PAVIMENTACION DE CALLES Y CARRETERASPAJO DE ESTIMACION 04. NORMALDE LA OBRA: CONSTRUCCIÓN DE RECURRIMIENTO DE UN SUELO CON CONCRETO HIDRÁULICO, EN LA CALLE MOCORITO (ARROYO DE ARENA) ENTRE BOULEVARD JUAN S MILLÁN Y CALLE ELIGIO ABITIA, COLONIA CENTRO, MUNICIPIO DE BADIAGUATO, SINALOJA.CONTRATO NO.: MBGR-LP-FAISUN-004/2025MONTO DEL CONTRATO: $ 7,499,569.31IMPORTE DE LA OBRA EJECUTADA SIN IVA $ 1,548,483.10MAS I.V.A 16 % 2 47,757.31TOTAL DE LA OBRA EJECUTADA CON IVA $ 1,796,240.47AMORTIZACION ANTICIPO 35% $ 5 43,969.10MAS I.V.A.: $ 8 6,715.06TOTAL AMORTIZACION DE ANTICIPO: $ 6 28,684.16IMPORTE TOTAL A FACTURAR $ 1,006,514.06MAS I.V.A $ 1 61,042.25MONTO NETO A FACTURAR $ 1,167,556.31RETENCION 3% (S.V.I.F.V.C.): $ 4 6,454.49TOTAL DEDUCCIONES: $ 6 75,138.65MONTO LIQUIDO A RECIBIR: $ 1,121,101.82" Importe="1006514.06" NoIdentificacion="SER05" ObjetoImp="02" ValorUnitario="1006514.06">
        <cfdi:Impuestos>
          <cfdi:Traslados>
            <cfdi:Traslado Base="1006514.06" Importe="161042.25" Impuesto="002" TasaOCuota="0.160000" TipoFactor="Tasa"/>
          </cfdi:Traslados>
          <cfdi:Impuestos>
            <cfdi:Conceptos>
              <cfdi:Impuestos TotalImpuestosTrasladados="161042.25">
                <cfdi:Traslados>
                  <cfdi:Traslado Base="1006514.06" Importe="161042.25" Impuesto="002" TasaOCuota="0.160000" TipoFactor="Tasa"/>
                </cfdi:Traslados>
                <cfdi:Impuestos>
                  <cfdi:Implemento>
                    <cfdi:TimbreFiscalDigital xmlns:tfd="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital" xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/TimbreFiscalDigitalv11.xsd" Version="1.1" UUID="A696BF25-8D00-4497-A591-28214A97A05D" FechaTimbrado="2025-12-04T17:47:58" RfcProvCertif="MAS0810247C0">
                      <tfd:TimbreFiscalDigital>
                        <Id>FcmXAydcWFChdN6618z0oLEvaqFNxuplbprydx/DT18BS0doBePBHJ30cLkczP7XtXC8AY2SSADctVIAAK7hIFNQ4KFtXvNFSpA80Lxx9CFQLCBTKW8e5LJj6Q+4nt4m6q02:geDtUBqXFfSPgsUr/u/fazCUyp9wxgfs9xp9+6RoK0Ki8GHX43AmTUg</Id>
                        <FechaEmision>2025-12-04T16:47:51</FechaEmision>
                        <FormaPago>03</FormaPago>
                        <LugarExpedicion>80080</LugarExpedicion>
                        <MetodoPago>PUE</MetodoPago>
                        <Moneda>MXN</Moneda>
                        <NoCertificado>00001000000711830284</NoCertificado>
                        <ObjetoImp>02</ObjetoImp>
                        <RegimenFiscal>612</RegimenFiscal>
                        <RfcEmisor>CA01810630ST4</RfcEmisor>
                        <RfcReceptor>MBA850101214</RfcReceptor>
                        <Versión>4.0</Versión>
                      </tfd:TimbreFiscalDigital>
                    </cfdi:Implemento>
                  </cfdi:Impuestos>
                </cfdi:Conceptos>
              </cfdi:Impuestos>
            </cfdi:Conceptos>
          </cfdi:Impuestos>
        </cfdi:Impuestos>
      </cfdi:Concepto>
    </cfdi:Conceptos>
  </cfdi:Comprobante>

```



Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
CAOJ810630ST4	JESUS AMADO CAMACHO OSUNA	MBA850101214	MUNICIPIO DE BADIRAGUATO
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
A696BF25-8D00-4497-A591-28214A97AB5D	2025-12-04T16:47:51	2025-12-04T17:47:58	MAS0810247C0
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$1,167,556.31	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir



Fecha: 28 de noviembre de 2025

CARATULA DE ESTIMACIÓN

CONTRATISTA: JESUS AMADO CAMACHO OSUNA		ESTIMACIÓN No: 04 NORMAL	
DOMICILIO: Calle sin nombre s/n. Colonia: Loc. Los Naranjos, C.P. 80080, Culiacán, Sinaloa		PERIODO DE ESTIMACION:	
TELÉFONO:	CEL:	DEL	03-oct-25
R.F.C.		AL	19-nov-25
CAOJ810630ST4.		FECHA DE CONTRATO:	
DEPENDENCIA.-		19-jul-25	
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA			
LOCALIDAD:		MUNICIPIO:	PERIODO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO:
BADIRAGUATO		BADIRAGUATO	INICIO: 23-jul-25
			TERMINACIÓN: 19-nov-25
DESCRIPCIÓN:			
CONSTRUCCIÓN DE RECUBRIMIENTO DE UN SUELO CON CONCRETO HIDRAULICO, EN LA CALLE MOCORITO (ARROYO DE ARENA) ENTRE BOULEVARD JUAN S MILLÁN Y CALLE ELIGIO ABITIA, COLONIA CENTRO, MUNICIPIO DE BADIRAGUATO, SINALOA.			
CONTRATO No:			
MBGBR-LP-FAISMUN-004/2025			
IMPORTE SIN IVA DE LA OBRA	IMPORTE CON IVA DE LA OBRA	35% ANTICIPO DE LA OBRA	IMPORTE TOTAL DE CONTRATO:
\$6,465,138.20	\$7,499,560.31	\$2,624,846.11	\$7,499,560.31
RECIBI :			BUENO POR: \$ 1,121,101.82
\$ 1,121,101.82 (SON UN MILLÓN CIENTO VEINTIUNO MIL CIENTO UN PESOS 82/100 M.N.)			
EN PAGO DE ESTIMACIÓN: 04 NORMAL			
DEDUCCIONES:		CALCULO DE ESTIMACIÓN	
AMORTIZACIÓN ANTICIPO 35%	\$ 541,969.10	IMPORTE DE LA OBRA EJECUTADA SIN IVA	\$ 1,548,483.16
MAS I.V.A.:	\$ 86,715.06	MAS I.V.A 16 %	\$ 247,757.31
TOTAL AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO:	\$ 628,684.16	TOTAL DE LA OBRA EJECUTADA CON IVA	\$ 1,796,240.47
3 % SVIFYC:	\$ 46,454.49	MENOS TOTAL DEDUCCIONES:	\$ 675,138.65
TOTAL DEDUCCIONES:	\$ 675,138.65	MONTO A FACTURAR MAS IVA	\$ 1,167,556.31
		SALDO A PAGAR: \$ 1,121,101.82	

ELABORO.-

C. JESUS AMADO CAMACHO OSUNA
REPRESENTANTE LEGAL

REVISO.-

ING. JOSE RODOLFO CONTRERAS LOPEZ
COSTOS Y PRESUPUESTOS.

AUTORIZO.-

C. ING. RUBIEL RINCON RAMOS.
DIRECTOR DE O.P.D.U. Y E.



JESUS AMADO CAMACHO OSUNA

Dependencia:

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS,
DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA

Control de Estimaciones

CONSTRUCCIÓN DE RECUBRIMIENTO DE UN SUELO CON CONCRETO HIDRÁULICO, EN LA CALLE MOCORITO (ARROYO DE ARENA) ENTRE BOULEVARD JUAN S MILLÁN Y CALLE ELIGIO ABITIA, COLONIA CENTRO, MUNICIPIO DE BADIRAGUATO, SINALOA.		Fecha:	28 de noviembre de 2025	Estimacion:	04 NORMAL
Periodo de la estimación:	03/10/2025	19/11/2025	Localidad:	No. De contrato:	
Periodo de Ejecución:	03/10/2025	19/11/2025	BADIRAGUATO	MBGBR-LP-FAISMUN-004/2025	
Importe del contrato con I.V.A:		Imp. Contratado sin I.V.A	Anticipo	Importe Anticipo sin I.V.A	% de Avance
\$ 7,499,560.31		\$ 6,465,138.20	\$ 2,624,846.11	\$ 2,262,798.37	24%
					% Avance Total
					76%

Control Del Anticipo	Liquidacion de Estimacion	Control de Estimacion
AMORTIZA ESTA ESTIMACION	Importe de la Estimacion (+) \$ 1,548,483.16	ESTA ESTIMACION
\$ 628,684.16	16 % I.V.A (+) \$ 247,757.31	
	Sub- Total A (=) \$ 1,796,240.47	\$ 1,796,240.47
	Amortizacion Anticipo 35% \$ 541,969.10	
AMORTIZACION ANTERIOR	16 % I.V.A (+) \$ 86,715.06	ACUMULADO ANTERIOR
\$ 1,366,855.72	Total (=) \$ 628,684.16	\$ 3,905,302.06
	Importe TOTAL A FACTURAR \$ 1,006,514.06	
TOTAL AMORTIZADO	16 % I.V.A (+) \$ 161,042.25	TOTAL ACUMULADO.
\$ 1,995,539.88	Total (=) \$ 1,167,556.31	\$ 5,701,542.53
	3 % SVIFYC: \$ 46,454.49	
ANTICIPO OTORGADO	Total Deducciones (=) \$ 675,138.65	CONTRATADO
\$ 2,624,846.11	Importe T O T A L \$ 1,121,101.82	\$ 7,499,560.31
	NETO A PAGAR	
SALDO DEL ANTICIPO	\$ 1,121,101.82	SALDO
\$629,306.23	Son:	\$ 1,798,017.78
	(SON UN MILLÓN CIENTO VEINTIUNO MIL CIENTO UN PESOS 82/100 M.N.)	

ELABORO.-


C. JESUS AMADO CAMACHO OSUNA
REPRESENTANTE LEGAL

REVISO

ING. JOSE RODOLFO CONTRERAS LOPEZ
COSTOS Y PRESUPUESTOS.

AUTORIZO

C. ING. RUBIEL RINCON RAMOS.
DIRECTOR O.P.D.U. Y E.



		LOCALIDAD:	BADIRAGUATO	ESTIMACIÓN:	04 NORMAL
DESCRIPCIÓN:	CONSTRUCCIÓN DE RECUBRIMIENTO DE UN SUELO CON CONCRETO HIDRAÚLICO, EN LA CALLE MOCORITO (ARROYO DE ARENA) ENTRE BOULEVARD JUAN S MILLÁN Y CALLE ELIGIO ABITIA, COLONIA CENTRO, MUNICIPIO DE BADIRAGUATO, SINALOA.				
FECHA INICIO CONTRATO:	23-jul-25	FECHA TERMINACION CONTRATO:	19-nov-25	CONTRATO:	MGBGR-LP-FAISMUN-004/2025
				FECHA CONTRATO:	19-Jul-25

[illegible]

AUTORIZO.-

C. ING. RUBIEL RINCON RAMOS
DIRECTOR DE O.P.D.U. Y E.



CONTRATISTA:		FECHA:	28 de noviembre de 2025
JESUS AMADO CAMACHO OSUNA		DEPENDENCIA:	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA
DOMICILIO:	Calle sin nombre s/n. Colonia: Loc. Los Naranjos, C.P. 80080, Culiacán, Sinaloa		
R.F.C.	CAOJ810630ST4.		

RESÚMEN DE ESTIMACIÓN

	LOCALIDAD:	BADIRAGUATO	ESTIMACIÓN:	04 NORMAL
DESCRIPCIÓN:	CONSTRUCCIÓN DE RECUBRIMIENTO DE UN SUELO CON CONCRETO HIDRÁULICO, EN LA CALLE MOCORITO (ARROYO DE ARENA) ENTRE BOULEVARD JUAN S MILLÁN Y CALLE ELIGIO ABITIA, COLONIA CENTRO, MUNICIPIO DE BADIRAGUATO, SINALOA.			

IMPORTE DE OBRA SIN IVA:	\$ 6,465,138.20
IMPORTE DE ANTICIPO DE OBRA:	\$ 2,624,846.11
IMPORTE TOTAL DE CONTRATO:	\$ 7,499,560.31

DESTAJO		IMPORTE
1	PRELIMINARES	\$ -
2	ESTRUCTURA	\$ 995,266.80
3	OTROS	\$ 553,216.36
SUBTOTAL ESTIMACIÓN:		\$ 1,548,483.16

SUB TOTAL=	\$ 1,548,483.16
I.V.A AL 16 %	\$ 247,757.31
TOTAL =	\$ 1,796,240.47

ELABORO.-

Jesús Amado
C. JESUS AMADO CAMACHO OSUNA
REPRESENTANTE LEGAL

REVISÓ.-

Ing. José Rodolfo Contreras López
ING. JOSE RODOLFO CONTRERAS LOPEZ
COSTOS Y PRESUPUESTOS.

AUTORIZO.-

C. Ing. Rubiel Rincon Ramos
C. ING. RUBIEL RINCON RAMOS.
DIRECTOR DE O.P.D.U. Y E.



DESGLÓSE

CONTRATISTA:		JESUS AMADO CAMACHO OSUNA		DEPENDENCIA:		DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA		FECHA		viernes, 28 de noviembre de 2025		
DOMICILIO:		Calle sin nombre s/n. Colonia: Loc. Los Naranjos, C.P. 80080, Culiacán, Sinaloa		R.F.C.		CAQJ810630ST4.		1 de 2				
DESGLÓSE DE CONCEPTOS DE ESTIMACIÓN												
DESCRIPCIÓN:		LOCALIDAD:		BADIRAGUATO		ESTIMACIÓN:		04 NORMAL				
CONSTRUCCIÓN DE RECUBRIMIENTO DE UN SUELO CON CONCRETO HIDRÁULICO, EN LA CALLE MOCORITO (ARROYO DE ARENA) ENTRE BOULEVARD JUAN S MILLÁN Y CALLE ELIGIO ABITIA, COLONIA CENTRO, MUNICIPIO DE BADIRAGUATO, SINALOA.												
IMPORTE DE OBRA SIN IVA:		\$6,465,138.20		IMPORTE DE ANTICIPO DE OBRA:		\$2,624,846.11		IMPORTE TOTAL DE CONTRATO:		\$7,499,560.31		
CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	SEGUN PROYECTO		HASTA ESTIM	HASTA ESTIM	EXCEDENTE	DE ESTA ESTIMACIÓN	IMPORTE			
1	PRELIMINARES		CANT	P.U.	TOTAL							
2	ESTRUCTURA											
GP08	GUARNICIÓN TIPO "L" DE 15X30X60 DE CONCRETO PREMEZCLADO DE F'C= 250 KG/CM2, INCLUYE: CIMBRA Y DESIMBRA, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, MANIOBRAS LOCALES Y TODO LO NECESARIO PARA LA TERMINACIÓN.	ML	1,198.62	\$	719.19	\$	862,035.52	1,005.96	711.74	0.00	284.22 \$	211,600.08
GP088	PATIN DE 15X60 DE CONCRETO PREMEZCLADO DE F'C= 250 KG/CM2, INCLUYE: CIMBRA Y DESIMBRA, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, MANIOBRAS LOCALES Y TODO LO NECESARIO PARA SU TERMINACIÓN.	ML	65.39	\$	624.05	\$	40,806.63	65.39	28.70	0.00	36.69 \$	22,896.39
GP109	LOSAS DE CONCRETO DE 15 CMS DE ESPESOR CON CONCRETO PREMEZCLADO F'C=300 KG/CM". INCLUYE: MANO DE OBRA, MATERIALES, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	M2	3,214.47	\$	839.01	\$	2,696,972.47	3,044.61	2,269.98	0.00	774.63 \$	649,922.32
GP133	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONTRA JUNTA DE PVC TIPO C-3 PARA LOSAS DE 15 CM. EN PAVIMENTOS. INCLUYE: TRAZO, ALINEACIÓN, HINCADO Y REMOCIÓN DE TAPA.	ML	1,613.22	\$	32.67	\$	52,703.90	1,522.30	1,371.41	0.00	150.89 \$	4,929.58
GP13	CALAFATEO EN LOSAS DE CONCRETO HIDRÁULICO CON ASFALTEX 505, INCLUYE: UN RIEGO CON EMULTEX T.P. (PRYMER), UN RIEGO DE ASFALTEX 505 Y BARRIDO DE LA SUPERFICIE.	ML	1,137.84	\$	33.75	\$	38,402.10	1,013.79	963.14	0.00	60.65 \$	2,046.94
GP15	SUMINISTRO, HABILITADO Y COLOCACIÓN DE ACERO DE REFUERZO LISO EN PASAJUNTAS DE 5/8" DE DIAMETRO. INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	ML	89.12	\$	77.12	\$	6,872.93	89.12	15.00	0.00	74.12 \$	5,716.13
GP11	PINTURA EN GUARNICIÓN DE 20 X 15 CM. CON PINTURA TIPO TRAFICO SCT COLOR AMARILLO O BLANCO, CON USO DE MAQUINA PINTARRAYAS, INCLUYE: PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, MATERIAL, MANO DE OBRA, CALIFICADA Y EQUIPO ADECUADO.	ML	800.68	\$	122.59	\$	98,154.99	800.68	-	0.00	800.68 \$	98,155.36
OTROS												
3	RENUELO DE POZO DE VISITA INCLUYE: MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3, APLANADO INTERIOR PULIDO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3, MATERIAL PUESTO EN OBRA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	7.00	\$	3,211.90	\$	22,483.30	7.00	-	0.00	7.00 \$	22,483.30
GP550	CAJA DE DISTRIBUCIÓN DE 2.07 MTS X 1.92 MTS CON UNA PROFUNDIDAD DE 2.50 MTS, ARMADO CON VARILLA DE 3/8" @ 20 CMS EN AMBAS DIRECCIONES Y DOBLE PARRILLA, COLADA CON CONCRETO HECHO EN OBRA CON F'C=200 KG/CM. INCLUYE: MANO DE OBRA, MATERIALES, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	1.00	\$	42,864.24	\$	42,864.24	1.00	-	0.00	1.00 \$	42,864.24

ELABORÓ:

C. JESUS AMADO CAMACHO OSUNA
REPRESENTANTE LEGAL

REVISÓ:

ING. JOSE RODOLFO CONTRERAS LOPEZ
COSTOS Y PRESUPUESTOS.

AUTORIZO

C. ING. RUBIEL RINCON RAMOS
DIRECTOR DE CONTABILIDAD



DESGLOSE

CONTRATISTA:		JESUS AMADO CAMACHO OSUNA		DEPENDENCIA:		DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA		FECHA		viernes, 28 de noviembre de 2025	
DOMICILIO:		Calle sin nombre s/n. Colonia: Loc. Los Naranjos, C.P. 80080, Culiacán, Sinaloa		R.F.C.		CAOJ810630ST4.		2 de 2			
DESGLOSE DE CONCEPTOS DE ESTIMACIÓN											
DESCRIPCIÓN:		LOCALIDAD:		BADIRAGUATO		ESTIMACIÓN:		04 NORMAL			
CONSTRUCCIÓN DE RECUBRIMIENTO DE UN SUELO CON CONCRETO HIDRÁULICO, EN LA CALLE MOCORITO (ARROYO DE ARENA) ENTRE BOULEVARD JUAN S MILLÁN Y CALLE ELIGIO ABITIA, COLONIA CENTRO, MUNICIPIO DE BADIRAGUATO, SINALOA.											
IMPORTE DE OBRA SIN IVA:		\$6,465,138.20		IMPORTE DE ANTICIPO DE OBRA:		\$2,624,846.11		IMPORTE TOTAL DE CONTRATO:		\$7,499,560.31	
CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANT	SEGUN PROYECTO P.U.	TOTAL	HASTA ESTA ESTIM	HASTA ESTIM	EXCEDENTE	DE ESTA ESTIMACIÓN	IMPORTE	
GP552	CANAL PLUVIAL DE 1.30 CON VARIACIÓN A 2.10 X 1.30 MTS A BASE DE LOSA DE CIMENTACIÓN Y MUROS DE CONCRETO REFORZADOS CON DOBLE PARRILLA DE ACERO DE 3/8" Y COLADOS CON CONCRETO FC=250 KG/CM2, INCLUYE: CONCRETO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.	PZA	14.25	\$ 24,953.05	\$ 355,580.96	14.25	-	0.00	14.25	\$ 355,580.96	
GP49	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BROCAL Y TAPA DE FO. FO. INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	1.00	\$ 5,422.68	\$ 5,422.68	-	-	0.00	-	\$ -	
GP499	RENOVELACION DE REGISTRO INCLUYE: MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3, APLANADO INTERIOR PULIDO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3, MATERIAL PUESTO EN OBRA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	8.00	\$ 2,223.33	\$ 17,786.64	8.00	-	0.00	8.00	\$ 17,786.64	
GP034	REPARACION DE TOMAS DOMICILIARIAS QUE DESTRUYEN EN EL PROCESO DE CORTE DE CAJA, A BASE DE MANGUERA EXTRU-PAK EN UNA LONGITUD APROXIMADA DE 2.00 M. INSERTOR P.V.C. 1/2" EN CADA EXTREMO DE LA REPARACIÓN Y ABRAZADERA SINFIN DE 1/2" EN AMBOS EXTREMOS PARA AJUSTAR EL INSERTOR Y EVITAR POSIBLES FUGAS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	6.00	\$ 2,899.57	\$ 17,397.42	6.00	-	0.00	6.00	\$ 17,397.42	
GBR671	LETRERO INFORMATIVO ALUSIVO A LA OBRA FABRICADO CON PTR VER PLANO. INCLUYE: INFORMACIÓN DE LA OBRA, PATAS DE METAL COLADA CON CONCRETO HECHO EN OBRA DE F'C=150 KG/CM2, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	1.00	\$ 4,526.11	\$ 4,526.11	1.00	-	0.00	1.00	\$ 4,526.11	
GP101	LIMPIEZA DE OBRA. INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	M2	4,063.99	\$ 22.78	\$ 92,577.69	4,063.99	-	0.00	4,063.99	\$ 92,577.69	
									SUB-TOTAL	\$ 1,548,483.16	
									IVA	\$ 247,757.31	
									MONTO TOTAL	\$ 1,796,240.47	

ELABORÓ:

Jesús Amado
C. JESUS AMADO CAMACHO OSUNA
REPRESENTANTE LEGAL

REVISÓ:

ING. JOSE BOBOLFO CONTRERAS LOPEZ
COSTOS Y PRESUPUESTOS.

AUTORIZO
C. ING. RUBIEL RINCON RAMOS
DIRECTOR DE OBRAS

VOLUMENES GENERADORES

[illegible]

ELABORO: *Jesús Amado*
 Q. JESUS AMADO CAMACHO OSUNA
 REPRESENTANTE LEGAL

REVISOR: 
SUPERVISOR DE OBRA

AUTORIZO.-
ING. RUBIEL RINCÓN RAMOS
DIRECTOR DE O.P.D.U.Y.E.



VOLUMENES GENERADORES

CONTRATISTA				CONSTRUCCIÓN DE RECLUBIMIENTO DE UN SUELO CON CONCRETO HIDRÁULICO, EN LA CALLE MOCORITO (ARROYO DE ARENA) ENTRE BOULEVARD JUAN S MILLÁN Y CALLE ELIGIO ABITIA, COLONIA CENTRO, MUNICIPIO DE BADIRAGUATO, SINALOA						ESTIMACION		
JESUS AMADO CAMACHO OSUNA										04 NORMAL		
RFC:	CAQJ810630ST4											
CLAVE	CONCEPTO			LOCALIZACION		UNIDAD	LARGO	ANCHO	ALTO	PZA	TOTAL	OBSERVACIONES
				EJE	TRAMO		EN METROS					
				0+235.00	0+240.00		5.0000	13.50			67.50	
				0+240.00	0+245.00		5.0000	13.50			67.50	
				0+245.00	0+250.00		5.0000	13.50			67.50	
				0+250.00	0+255.00		5.0000	13.50			67.50	
				0+255.00	0+260.00		5.0000	13.50			67.50	
				0+260.00	0+265.00		5.0000	13.50			67.50	
				0+265.00	0+270.00		5.0000	13.50			67.50	
				0+270.00	0+275.00		5.0000	13.50			67.50	
				0+275.00	0+280.00		5.0000	13.50			67.50	
				0+280.00	0+282.32		2.3200	13.50			31.32	
										TOTAL	4,064.03	
										TOTAL CONTRATADO	4,063.98	

ELABORÓ:
Jesús Amado
C. JESUS AMADO CAMACHO OSUNA
REPRESENTANTE LEGAL

REVISÓ:
[Signature]
SUPERVISOR DE OBRA

AUTORIZÓ:
[Signature]
ING. RUBIEL RINCON RAMOS
DIRECTOR DE O.P.D.U.Y.E.

CONTRATISTA:
JESUS AMADO CAMACHO OSUNA

DEPENDENCIA:
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS,
DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA


DOMICILIO: Calle sin nombre s/n. Colonia: Loc. Los Naranjos, C.P. 60060, Culiacán, Sinaloa

R.F.C. CAOJ910630ST4.

OBRA: CONSTRUCCIÓN DE RECUBRIMIENTO DE UN SUELO CON CONCRETO HIDRÁULICO, EN LA CALLE MOCORITO (ARROYO DE ARENA) ENTRE BOULEVARD JUAN S MILLÁN Y CALLE ELIGIO ABITIA, COLONIA CENTRO, MUNICIPIO DE BADIRAGUATO, SINALOA.

CROQUIS ESTIMACION:

CROQUIS ESTIMACION:	
CLAVE	CONCEPTO
1	ESTRUCTURA
GP08	GUARNICIÓN TIPO "L" DE 15X30X60 DE CONCRETO PREMEZCLADO DE F'c= 250 KG/CM2, INCLUYE: CIMBRA Y DESIMBRA, MATERIALES, MANO DE
GP088	PATIN DE 15X60 DE CONCRETO PREMEZCLADO DE F'c= 250 KG/CM2, INCLUYE: CIMBRA Y DESIMBRA, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA,
GP109	LOSA DE CONCRETO DE 15 CMS DE ESPESOR CON CONCRETO PREMEZCLADO F'c=300 KG/CM", INCLUYE: MANO DE OBRA, MATERIALES,
GP133	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONTRA JUNTA DE PVC TIPO C-3 PARA LOSAS DE 15 CM. EN PAVIMENTOS, INCLUYE: TRAZO, ALINEACIÓN,
GP13	CALAFATEO EN LOSAS DE CONCRETO HIDRÁULICO CON ASFALTEX 505, INCLUYE: UN RIEGO CON EMULTEX T.P. (PRIMER), UN RIEGO DE ASFALTEX
GP15	SUMINISTRO, HABILITADO Y COLOCACIÓN DE ACERO DE REFUERZO LISO EN PASAJUNTAS DE 5/8" DE DIAMETRO, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE
GP11	PINTURA EN GUARNICIÓN DE 20 X 15 CM. CON PINTURA TIPO TRAFICO SCT COLOR AMARILLO O BLANCO, CON USO DE MAQUINA PINTARRAYAS,

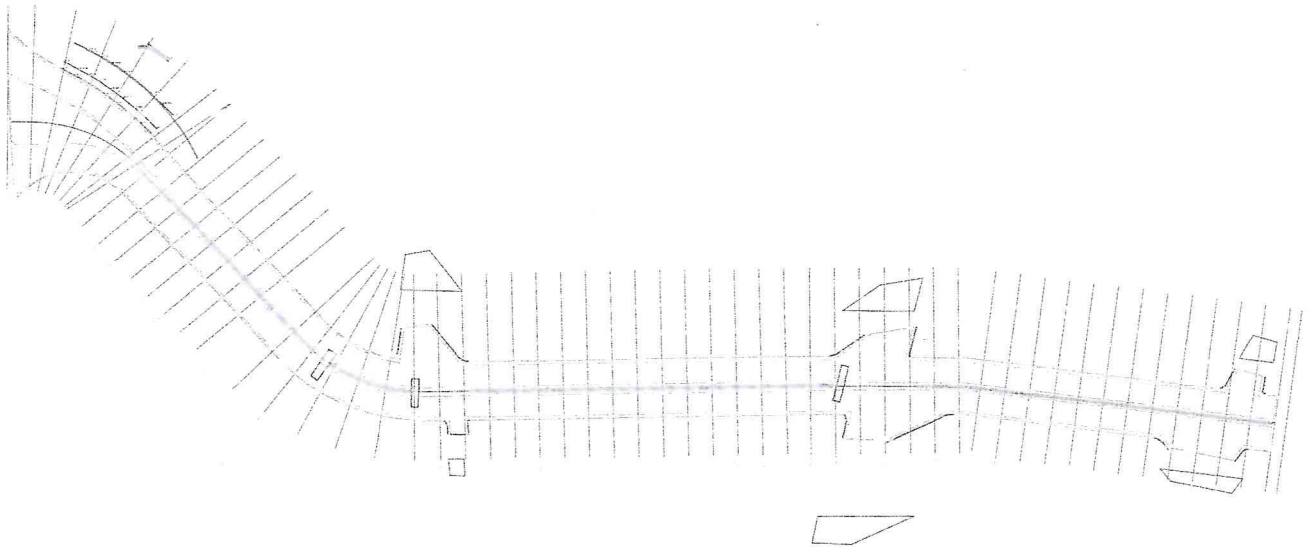

ELABORÓ:
C. JESUS AMADO CAMACHO OSUNA
REPRESENTANTE LEGAL

REVISÓ:-
SUPERVISOR DE OBRA

AUTORIZÓ:-
C. ING. RUBIEL RINCON RAMOS.
DIRECTOR DE O.P.D.U. Y E.

CONTRATISTA:
JESUS AMADO CAMACHO OSUNA

DEPENDENCIA:
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS,
DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA


DOMICILIO: Calle sin nombre s/n. Colonia: Loc. Los Naranjos, C.P. 80080, Culiacán, Sinaloa

R.F.C. CAOJ810630ST4.

OBRA: CONSTRUCCIÓN DE RECUBRIMIENTO DE UN SUELO CON CONCRETO HIDRÁULICO, EN LA CALLE MOCORITO (ARROYO DE ARENA) ENTRE BOULEVARD JUAN S MILLÁN Y CALLE ELIGIO ABITIA, COLONIA CENTRO, MUNICIPIO DE BADIRAGUATO, SINALOA.

CROQUIS ESTIMACION:

3	OTROS
GP550	RENIVELACION DE POZO DE VISITA INCLUYE: MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3, APLANADO INTERIOR PULIDO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3,
GP551	CAJA DE DISTRIBUCIÓN DE 2.07 MTS X 1.92 MTS CON UNA PROFUNDIDAD DE 2.50 MTS, ARMADO CON VARILLA DE 3/8" @ 20 CMS EN AMBAS
GP552	CANAL PLUVIAL DE 1.30 CON VARIACIÓN A 2.10 X 1.30 MTS A BASE DE LOSA DE CIMENTACIÓN Y MUROS DE CONCRETO REFORZADOS CON DOBLE
GP49	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BROCAL Y TAPA DE FO. FO. INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.
GP499	RENIVELACION DE REGISTRO INCLUYE: MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3, APLANADO INTERIOR PULIDO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3,
GP634	REPARACIÓN DE TOMAS DOMICILIARIAS QUE DESTRUYEN EN EL PROCESO DE CORTE DE CAJA, A BASE DE MANGUERA EXTRU-PAK EN UNA
GBR671	LETRERO INFORMATIVO ALUSIVO A LA OBRA FABRICADO CON PTR VER PLANO, INCLUYE: INFORMACIÓN DE LA OBRA, PATAS DE METAL COLADA

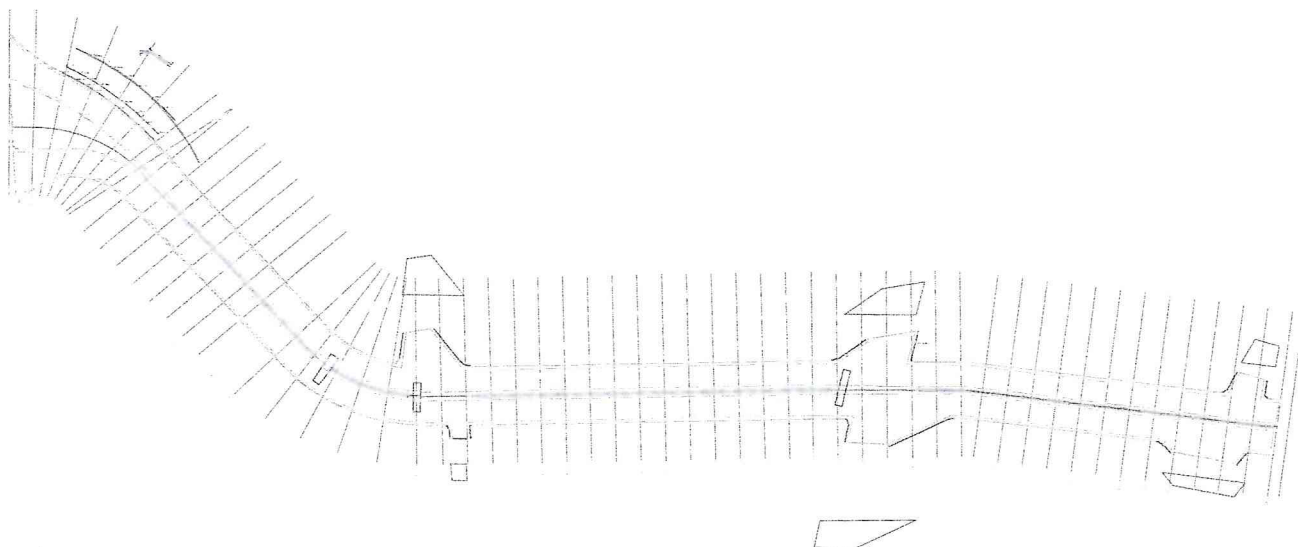

ELABORO:
JESUS AMADO CAMACHO OSUNA
REPRESENTANTE LEGAL

REVISOR:-
SUPERVISOR DE OBRA

AUTORIZO:-
C. ING. RUBIEL RINCON RAMOS.
DIRECTOR DE O.P.D.U. Y E.



CONTRATISTA:

JESUS AMADO CAMACHO OSUNA

DEPENDENCIA:

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS,
DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA

DOMICILIO:

Calle sin nombre s/n. Colonia: Loc. Los Naranjos, C.P. 80080, Culiacán, Sinaloa

R.F.C.

CAOJ810630ST4.

OBRA:

CONSTRUCCIÓN DE RECUBRIMIENTO DE UN SUELO CON CONCRETO HIDRÁULICO, EN LA CALLE MOCORITO (ARROYO DE ARENA) ENTRE BOULEVARD JUAN S MILLÁN Y CALLE ELIGIO ABITIA, COLONIA CENTRO, MUNICIPIO DE BADIRAGUATO, SINALOA.

FOTOS DE ESTIMACION:

FOTOS DE ESTIMACION:

CVE	CONCEPTO
2	ESTRUCTURA
GP08	GUARNICIÓN TIPO "L" DE 15X30X60 DE CONCRETO PREMEZCLADO DE F'C= 250 KG/CM2, INCLUYE: CIMBRA Y DESIMBRA, MATERIALES, MANO DE OBRA,
GP08	PATIN DE 15X60 DE CONCRETO PREMEZCLADO DE F'C= 250 KG/CM2, INCLUYE: CIMBRA Y DESIMBRA, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA,
GP10	LOSA DE CONCRETO DE 15 CMS DE ESPESOR CON CONCRETO PREMEZCLADO F'C=300 KG/CM", INCLUYE: MANO DE OBRA, MATERIALES, HERRAMIENTA
GP13	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONTRA JUNTA DE PVC TIPO C-3 PARA LOSAS DE 15 CM. EN PAVIMENTOS, INCLUYE: TRAZO, ALINEACIÓN, HINCADO Y
GP13	CALAFATEO EN LOSAS DE CONCRETO HIDRÁULICO CON ASFALTEX 505, INCLUYE: UN RIEGO CON EMULTEX T.P. (PRYMER), UN RIEGO DE ASFALTEX 505
GP15	SUMINISTRO, HABILITADO Y COLOCACIÓN DE ACERO DE REFUERZO LISO EN PASAJUNTAS DE 5/8" DE DIAMETRO, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y
GP11	PINTURA EN GUARNICIÓN DE 20 X 15 CM. CON PINTURA TIPO TRAFICO SCT COLOR AMARILLO O BLANCO, CON USO DE MAQUINA PINTARRAYAS,



ELABORO.-

Jesús Amado

C. JESUS AMADO CAMACHO OSUNA
REPRESENTANTE LEGAL

REVISO.-

Rubiel Rincon Ramos

SI DE VISOR DE ODDA

AUTORIZO.-

Rubiel Rincon Ramos

C.ING. RUBIEL RINCON RAMOS



CONTRATISTA:

JESUS AMADO CAMACHO OSUNA

DEPENDENCIA:

**DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS,
DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA**

DOMICILIO:

Calle sin nombre s/n. Colonia: Loc. Los Naranjos, C.P. 80080, Culiacán, Sinaloa

R.F.C.

CAOJ810630ST4.

OBRA:

CONSTRUCCIÓN DE RECUBRIMIENTO DE UN SUELO CON CONCRETO HIDRÁULICO, EN LA CALLE MOCORITO (ARROYO DE ARENA) ENTRE BOULEVARD JUAN S MILLÁN Y CALLE ELIGIO ABITIA, COLONIA CENTRO, MUNICIPIO DE BADIRAGUATO, SINALOA.

FOTOS DE ESTIMACION:

FOTOS DE ESTIMACION:


CVE

3

CONCEPTO

OTROS

GP55	RENIVELACION DE POZO DE VISITA INCLUYE: MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3, APLANADO INTERIOR PULIDO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3,
GP55	CAJA DE DISTRIBUCIÓN DE 2.07 MTS X 1.92 MTS CON UNA PROFUNDIDAD DE 2.50 MTS, ARMADO CON VARILLA DE 3/8" @ 20 CMS EN AMBAS
GP55	CANAL PLUVIAL DE 1.30 CON VARIACIÓN A 2.10 X 1.30 MTS A BASE DE LOSA DE CIMENTACION Y MUROS DE CONCRETO REFORZADOS CON DOBLE
GP49	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BROCAL Y TAPA DE FO. FO. INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.
GP49	RENIVELACION DE REGISTRO INCLUYE: MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3, APLANADO INTERIOR PULIDO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3, MATERIAL
GP03	REPARACIÓN DE TOMAS DOMICILIARIAS QUE DESTRUYEN EN EL PROCESO DE CORTE DE CAJA, A BASE DE MANGUERA EXTRU-PAK EN UNA LONGITUD
GBR6	LETRERO INFORMATIVO ALUSIVO A LA OBRA FABRICADO CON PTR VER PLANO, INCLUYE: INFORMACIÓN DE LA OBRA, PATAS DE METAL COLADA CON

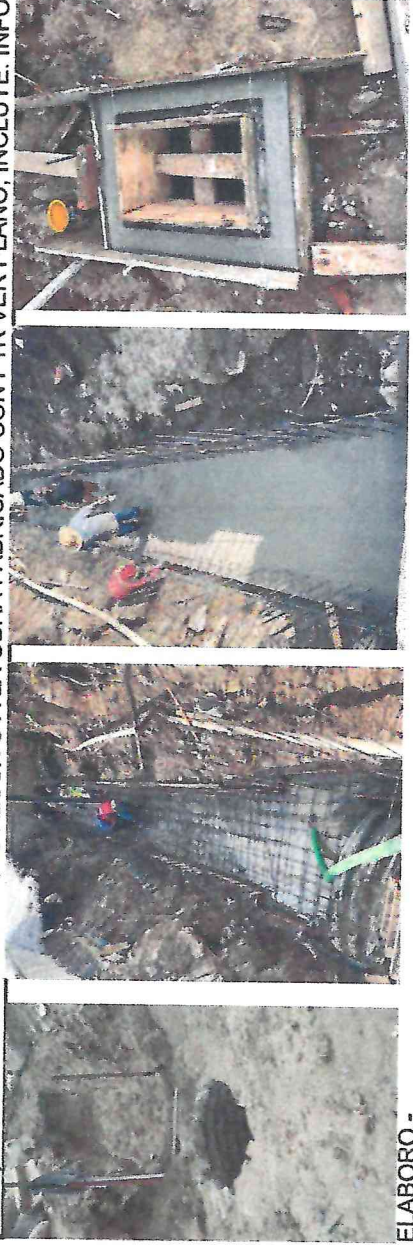

ELABORO.-

Jesús Amado
C. JESÚS AMADO CAMACHO OSUNA
REPRESENTANTE LEGAL

REVISO.-

[Signature]
SUPERVISOR DE OBRA

AUTORIZO.-

[Signature]
C.ING. RUBIEL RINCON RAMOS



Fecha y hora de consulta

10/12/2025 7:04:24 PM

Contrato

00798320

BBVA Net Cash - Pagos Interbancarios

Nombre del Cliente

MUNICIPIO DE BADIRAGUATO

Operación autorizada

Transferencia en proceso de validación y aplicación.

Datos del firmante

Usuario: ADMIN1

Poder: 100%

Datos de la operación

Tipo de operación: Pago Interbancario

Descripción: EST 04 NOR LP 004

Importe de la operación: 1,121,101.82 MXP

Cuenta de retiro: 0124174836

Cuenta de depósito: 072730012781361749

Divisa de la cuenta: MXP

Divisa de la cuenta: MXP

Titular de la cuenta: MUNICIPIO DE BADIRAG
UATOTitular de la cuenta: JESUS AMADO CAMACHO
OSUNA

Nombre banco destino: BANORTE

Fecha valor: 11/12/2025

Fecha de creación: 10/12/2025

Fecha de aplicación: 10/12/2025

Concepto de pago: EST 04 NOR LP 004

Referencia numérica:

Instrumento de seguridad: ASD 6551749382

Hora de captura en el canal: 19:04:22

Datos de confirmación de la transferencia

Folio interbancario: 0000220178

Clave de rastreo: 002601002512110000220178

Folio de firma: 0068150021

Folio único: I401202512101904220068150027

Estado operación

Porcentaje Firmado: 100%

Estado: Operado

Detalle de firmas

Acción	Usuario	Porcentaje aportado	Fecha
CREO	ADMIN1	— %	10/12/2025
FIRMO	ADMIN1	100 %	10/12/2025

BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México

www.bbvanetcash.mx
