

OFICIO No. OPDUyE/571/2025
ASUNTO: SOLICITUD PAGO ESTIMACIÓN
03 NORMAL
Badiraguato, Sin., a 14 de Octubre de 2025

MTRO. GONZALO IRINEO CABALLERO TERRAZAS
TESORERO MUNICIPAL
P R E S E N T E.-

POR MEDIO DE LA PRESENTE, LE SOLICITO EL PAGO POR: CONCEPTO DE PAGO DE ESTIMACIÓN 03 NORMAL, DEL IMPORTE DEL CONTRATO, A FAVOR DE LA EMPRESA: JESUS AMADO CAMACHO OSUNA, LA CUAL REALIZA LOS TRABAJOS APROBADOS POR EL SUBCOMITE DE BIENESTAR MUNICIPAL, A CONTINUACIÓN, SE DETALLA:

- NOMBRE DE LA OBRA: CONSTRUCCIÓN DE RECUBRIMIENTO DE UN SUELO CON CONCRETO HIDRÁULICO, EN LA CALLE MOCORITO (ARROYO DE ARENA) ENTRE BOULEVARD JUAN S. MILLAN Y CALLE ELIGIO ABITIA, COLONIA CENTRO, MUNICIPIO DE BADIRAGUATO, SINALOA.
- No. DE CONTRATO: MBGBR-LP-FAISMUN-004/2025
- IMPORTE DEL CONTRATO: \$7,499,560.31 (SIETE MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS SESENTA PESOS 31/100 MN.)
- CONCEPTO DEL PAGO: PAGO DE ESTIMACIÓN 03 NORMAL
- IMPORTE A PAGAR: \$909,606.54 (NOVECIENTOS NUEVE MIL SEISCIENTOS SEIS PESOS 54/100 M.N)
- RECURSOS: FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FAISMUN) EJERCICIO 2025.
- EMPRESA: JESÚS AMADO CAMACHO OSUNA
- R.F.C. CAOJ810630ST4
- DOMICILIO FISCAL: CALLE SIN NOMBRE, S/N, COLONIA: LOC. LOS NARANJOS, C.P. 80080, CULIACÁN, SINALOA.
- No. DE FACTURA: # 72, DE FECHA 13 DE OCTUBRE DE 2025.

SE ANEXA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DE SOPORTE, COMO AMPARO DE DICHO PAGO.

AGRADECIENDO DE ANTEMANO LA ATENCIÓN QUE SE SIRVA DAR A LA PRESENTE, ME DESPIDO QUEDANDO A SUS ÓRDENES.



DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS,
DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA.
C.C.P. ARCHIVO
BADIRAGUATO, SINALOA.


ATENTAMENTE

C. ING. RUBIEL RINCÓN RAMOS
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS,
DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA



MUNICIPIO DE
BADIRAGUATO
TESORERÍA

14 OCT 2025
Adrián G.
RECIBIDO
18:09



JESUS AMADO CAMACHO OSUNA

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Serie:

Folio: 72

Fecha: 13/Oct/2025 13:59:08

Lugar de expedición (C.P.) 80080

Emisor

JESUS AMADO CAMACHO OSUNA

RFC: CAOJ810630ST4

Régimen Fiscal: 612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y

Domicilio: Profesionales

LOS NARANJOS Culiacán Sinaloa México 80080

Receptor

Cliente: MUNICIPIO DE BADIRAGUATO

RFC: MBA850101214

Uso CFDI: I01 - Construcciones

Exportación: 01 - No aplica

Domicilio Fiscal: 80500

Régimen Fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

Domicilio: GABRIEL LEYVA SOLANO S/N Badiraguato Badiraguato Sinaloa México 80500

Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición

Forma de Pago: 03 - Transferencia electrónica de

Tipo de cambio: 1.000000

Moneda: MXN - Peso Mexicano

Cantidad	Clave Unid ad SAT	Clave Prod/Servi cio	Descripción	Valor unitario	Impuestos	Importe
1.00	E48 - Unidad de servicio	72141103 - Servicio de pavimentación de calles y carreteras	<p>PAGO DE ESTIMACION 03 NORMAL DE LA OBRA: CONSTRUCCIÓN DE RECUDRIMIENTO DE UN SUELO CON CONCRETO HIDRÁULICO, EN LA CALLE MOCORITO (ARROYO DE ARENA) ENTRE BOULEVARD JUAN S MILLÁN Y CALLE ELIGIO ABITIA, COLONIA CENTRO, MUNICIPIO DE BADIRAGUATO, SINALOA.</p> <p>CONTRATO NO.: MBGBR-LP-FAISMUN-004/2025 MONTO DEL CONTRATO: \$ 7,499,560.31</p> <p>IMPORTE DE LA OBRA EJECUTADA SIN IVA \$ 1,256,362.62 MAS I.V.A 16 % \$ 201,018.02 TOTAL DE LA OBRA EJECUTADA CON IVA \$ 1,457,380.64</p> <p>AMORTIZACIÓN ANTICIPO 35% \$ 439,726.91 MAS I.V.A.: \$ 70,356.31 TOTAL AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO: \$ 510,083.22</p> <p>Importe TOTAL A FACTURAR \$ 816,635.71 MAS I.V.A \$ 130,661.71 MONTO NETO A FACTURAR \$ 947,297.42</p> <p>RETENCION 3% (S.V.I.F.Y C.) : \$ 37,690.88 TOTAL DEDUCCIONES: \$ 547,774.10</p> <p>MONTO LIQUIDO A RECIBIR: \$ 909,606.54</p>	\$816,635.71	IVA, - Importe: 130661.71	\$816,635.71

Información de cancelación

Motivo de cancelación:

Folio relacionado:

CFDI RELACIONADOS

Tipo de relación:

Lista de CFDI's relacionados:

Total con letra:
novecientos cuarenta y siete mil doscientos noventa y siete Pesos 42/100 M.N.

Subtotal:	\$816,635.71
I.E.S.P.S	\$0.00
IVA 16 %:	\$130,661.71
3% Insp. de obra	\$0.00
Total:	\$947,297.42



Este documento es una representación impresa de un CFDI

Serie del Certificado del emisor: 00001000000711830284
Folio Fiscal: E80F2B63-F2D9-4F19-B75F-4D4CFA79938B
No. de serie del Certificado del SAT: 00001000000709182898
Fecha y hora de certificación: 2025-10-14T14:54:17

Sello digital del CFDI

PhC38ilGd4UAwmcBb2rj8Q8zgedzUDqOQw9UES0/MA4/Bv5Z6L69VTTN02KYwBih4gghTjkVVFYK4nY4DKjkSyu1Hh9zOnRDZnl/bO6fwqXPMsMnyen9LHvD942jjwEwyib24+QTLXe8IMMv4SkphCG1+9/r6mOKXN0Nid0dyaX8CKoHufmZblyqAWH8j6gDX241MxgLech8CjEvR197mqo78CmNb5Owk/gFhn6jFzR7LJ5sZ/Si7xon6FpfwKhndDU44CbuWz1M8ByvmH/e7IQ5duAfrimoiyeJkEBMHmaJkveafNSWC7Aq5hixFLYb+5sQpmsX7JJDg==

Sello del SAT

GnaviIzQicXpy4S41VQnJ49173+N8vajOHNLRFgXCTTEKvzHi1fOO2dumRlp7AHJBM+LYMAwhic2nnMVuVTHWM2KpX2HzIVrR6n6Zh2HXYVVMsR82ko7rZ0CigfhtsiYPyteT3/I5aCjo44gsWgNAHOPLTf6iilwJQXR71RSXp8/6P6OofQe7a8Uz07TBmT1zVqyxXqLyYEJChdhXW6wPeK62J0E6k3vpz4bCIZ9r6MrLsY507pofjbyseUg8HGTjmD3Bts0lb3teNBccx4o9oxtfTlnNWYGTUEUNI30tiNyLQGxipUZ0RBv/g69ELLfmXZ8+mFKQ2pRw==

Cadena original del complemento del certificación digital del SAT

[|1.1|E80F2B63-F2D9-4F19-B75F-4D4CFA79938B|2025-10-14T14:54:17|MAS0810247C0|PhC38ilGd4UAwmcBb2rj8Q8zgedzUDqOQw9UES0/MA4/Bv5Z6L69VTTN02KYwBih4gghTjkVVFYK4nY4DKjkSyu1Hh9zOnRDZnl/bO6fwqXPMsMnyen9LHvD942jjwEwyib24+QTLXe8IMMv4SkphCG1+9/r6mOKXN0Nid0dyaX8CKoHufmZblyqAWH8j6gDX241MxgLech8CjEvR197mqo78CmNb5Owk/gFhn6jFzR7LJ5sZ/Si7xon6FpfwKhndDU44CbuWz1M8ByvmH/e7IQ5duAfrimoiyeJkEBMHmaJkveafNSWC7Aq5hixFLYb+5sQpmsX7JJDg==|00001000000709182898|

This XML file does not appear to have any style information associated with it. The document tree is shown below.

```
<cfdi:Comprobante xmlns:cfdi="http://www.sat.gob.mx/cfd/4" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/cfd/4 http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/4/cfdv40.xsd"
Certificado="MIIGCDCCA/CgAwIBAgIUMDAwMDEwMDAwMDA3MTE4MzAyODQwDQYJKoZIhvcNAQELBQAwggVMUwMwYDVQ00DCx8QyBERUwgU0VSVk1DSUSgREUGQURNSUSU1R5QUNJT04gVFJJQ1VU
Exportacion="01" Fecha="2025-10-13T13:59:08" Folio="72" FormaPago="03" LugarExpedicion="80000" MetodoPago="PUE" Moneda="MXN"
NoCertificado="00001000000711830284"
Sello="PhC381lgd4UAWmcBb2rj8Q8zgedzUDqOQw9UES0/MA4/Bv5Z6L69fVTTN02KYwBih4gqhTjKVVfYK4nY4DKjkSyu1Hh9zOnRDZnt/b06fwqiXPMsXmNyen9LHvD942fjjwEwyib24+QTLXe81P
SubTotal="816635.71" TipoDeComprobante="I" Total="947297.42" Version="4.0">
<cfdi:Emisor Nombre="JESUS AMADO CAMACHO OSUNA" RegimenFiscal="612" Rfc="CA01810630ST4"/>
<cfdi:Receptor DomicilioFiscalReceptor="80500" Nombre="MUNICIPIO DE BADIRAGUATO" RegimenFiscalReceptor="603" Rfc="MBA850101214" UsoCFDI="I01"/>
<cfdi:Conceptos>
<cfdi:Concepto Cantidad="1.00" ClaveProdServ="72141103" ClaveUnidad="E48" Descripcion="SERVICIO DE PAVIMENTACION DE CALLES Y CARRETERAS PAGO DE
ESTIMACION 03 NORMAL DE LA OBRA: CONSTRUCCIÓN DE RECUBRIMIENTO DE UN SUELO CON CONCRETO HIDRÁULICO, EN LA CALLE MOCORITO (ARROYO DE ARENA) ENTRE
BOULEVARD JUAN S MILLÁN Y CALLE ELIGIO ABITIA, COLONIA CENTRO, MUNICIPIO DE BADIRAGUATO, SINALOA. CONTRATO NO.: MBGBR-LP-FAISMUN-004/2025 MONTO DEL
CONTRATO: $ 7,499,560.31 IMPORTE DE LA OBRA EJECUTADA SIN IVA $ 1,256,362.62 MAS I.V.A 16 % $ 201,018.02 TOTAL DE LA OBRA EJECUTADA CON IVA $
1,457,380.64 AMORTIZACIÓN ANTICIPO 35% $ 439,726.91 MAS I.V.A.: $ 70,356.31 TOTAL AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO: $ 510,083.22 Importe TOTAL A FACTURAR $
816,635.71 MAS I.V.A $ 130,661.71 MONTO NETO A FACTURAR $ 947,297.42 RETENCION 3% ( S.V.I.F.Y C.) : $ 37,690.88 TOTAL DEDUCCIONES: $ 547,774.10 MONTO
LIQUIDO A RECIBIR: $ 909,606.54 Importe="816635.71" NoIdentificacion="SER05" ObjetoImp="02" ValorUnitario="816635.71">
<cfdi:Impuestos>
<cfdi:Traslados>
<cfdi:Traslado Base="816635.71" Importe="130661.71" Impuesto="002" TasaOCuota="0.160000" TipoFactor="Tasa"/>
</cfdi:Traslados>
</cfdi:Impuestos>
</cfdi:Concepto>
</cfdi:Conceptos>
<cfdi:Impuestos TotalImpuestosTrasladados="130661.71">
<cfdi:Traslados>
<cfdi:Traslado Base="816635.71" Importe="130661.71" Impuesto="002" TasaOCuota="0.160000" TipoFactor="Tasa"/>
</cfdi:Traslados>
</cfdi:Impuestos>
<cfdi:Complemento>
<tfd:TimbreFiscalDigital xmlns:tfd="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital" xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital
http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/TimbreFiscalDigital/TimbreFiscalDigitalv11.xsd" Version="1.1" UUID="E80F2B63-F2D9-4F19-B75F-4D4CFA79938B"
FechaTimbrado="2025-10-14T14:54:17" RfcProvCertif="MA50010247C0"
SelloCFD="PhC381lgd4UAWmcBb2rj8Q8zgedzUDqOQw9UES0/MA4/Bv5Z6L69fVTTN02KYwBih4gqhTjKVVfYK4nY4DKjkSyu1Hh9zOnRDZnt/b06fwqiXPMsXmNyen9LHvD942fjjwEwyib24+Q
NoCertificadoSAT="00001000000709182898"
SelloSAT="GosvUzQicXpy4543VQoj4j9L73zN6vajJOHNLrfGXTCTFKVczHj1f002dvmRlp7AHJBM+LYMAWhio2nnMVuVTHWmt2KpX2HztVcR6nfjZ2HDXVVMsR82k0/71rZ0Clghl5itYpytcT
</cfdi:Complemento>
</cfdi:Comprobante>
```

Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
CAOJ810630ST4	JESUS AMADO CAMACHO OSUNA	MBA850101214	MUNICIPIO DE BADIRAGUATO
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
E80F2B63-F2D9-4F19-B75F-4D4CFA79938B	2025-10-13T13:59:08	2025-10-14T14:54:17	MAS0810247C0
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$947,297.42	Ingreso	Vigente	Cancelable con aceptación

Imprimir



Fecha: 3 de octubre de 2025

CARATULA DE ESTIMACIÓN

CONTRATISTA:		JESUS AMADO CAMACHO OSUNA		ESTIMACIÓN No:	03 NORMAL
DOMICILIO:		Calle sin nombre s/n. Colonia: Loc. Los Naranjos, C.P. 80080, Culiacán, Sinaloa		PERIODO DE ESTIMACION:	
TELÉFONO:	CEL:			DEL	08-sep-25
				AL	02-oct-25
R.F.C.			FECHA DE CONTRATO:		
CAOJ810630ST4.			19-jul-25		
DEPENDENCIA -	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA				
		LOCALIDAD:	MUNICIPIO:	PERIODO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO:	
		BADIRAGUATO	BADIRAGUATO	INICIO:	23-jul-25
				TERMINACIÓN:	19-nov-25
DESCRIPCIÓN:					
CONSTRUCCIÓN DE RECUBRIMIENTO DE UN SUELO CON CONCRETO HIDRAULICO, EN LA CALLE MOCORITO (ARROYO DE ARENA) ENTRE BOULEVARD JUAN S MILLÁN Y CALLE ELIGIO ABITIA, COLONIA CENTRO, MUNICIPIO DE BADIRAGUATO, SINALOA					
CONTRATO No:					
MBGBR-LP-FAISMUN-004/2025					
IMPORTE SIN IVA DE LA OBRA		IMPORTE CON IVA DE LA OBRA		35% ANTICIPO DE LA OBRA	
\$6,465,138.20		\$7,499,560.31		\$2,624,846.11	
				IMPORTE TOTAL DE CONTRATO:	
				\$7,499,560.31	
RECIBI:				BUENO POR:	\$ 909,606.54
\$ 909,606.54				(SON NOVECIENTOS NUEVE MIL SEISCIENTOS SEIS PESOS 54/100 M.N.)	
EN PAGO DE ESTIMACIÓN:		03 NORMAL			
DEDUCCIONES:		CALCULO DE ESTIMACIÓN			
AMORTIZACIÓN ANTICIPO 35%		\$ 439,726.91	IMPORTE DE LA OBRA EJECUTADA SIN IVA		\$ 1,256,362.62
MAS I.V.A.:		\$ 70,356.31	MAS I.V.A 16 %		\$ 201,018.02
TOTAL AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO:		\$ 510,083.22	TOTAL DE LA OBRA EJECUTADA CON IVA		\$ 1,457,380.64
3 % SVIFYC:		\$ 37,690.88	MENOS TOTAL DEDUCCIONES:		\$ 547,774.10
TOTAL DEDUCCIONES:		\$ 547,774.10	MONTO A FACTURAR MAS IVA		\$ 947,297.42
				SALDO A PAGAR:	
				\$ 909,606.54	

ELABORO.-

JESUS Amado
C. JESUS AMADO CAMACHO OSUNA
REPRESENTANTE LEGAL

REVISÓ.-

NG
ING. JOSE RODOLFO CONTRERAS LOPEZ
COSTOS Y PRESUPUESTOS.

AUTORIZ

R
C. ING. RUBIEL RINCON RAMO
DIRECTOR DE O.P.D.U. Y



JESUS AMADO CAMACHO OSUNA

Dependencia :

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS,
DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA

Control de Estimaciones

CONSTRUCCIÓN DE RECUBRIMIENTO DE UN SUELO CON CONCRETO HIDRÁULICO, EN LA CALLE MOCORITO (ARROYO DE ARENA) ENTRE BOULEVARD JUAN S MILLÁN Y CALLE ELIGIO ABITIA, COLONIA CENTRO, MUNICIPIO DE BADIRAGUATO, SINALOA				Fecha:	Estimacion:	
				3 de octubre de 2025	03 NORMAL	
Periodo de la estimación:	08/09/2025	02/10/2025	Localidad:		No. De contrato:	
Periodo de Ejecución:	08/09/2025	19/11/2025	BADIRAGUATO		MBGBR-LP-FAISMUN-004/2025	
Importe del contrato con I.V.A.		Imp. Contratado sin I.V.A		Anticipo	Importe Anticipo sin I.V.A	% de Avance
\$ 7,499,560.31		\$ 6,465,138.20		\$ 2,624,846.11	\$ 2,262,798.37	19%
						% Avance Total
						72%

Control Del Anticipo	Liquidacion de Estimacion	Control de Estimacion
AMORTIZA ESTA ESTIMACION	Importe de la Estimacion (+) \$ 1,256,362.62	ESTA ESTIMACION
\$ 510,083.22	16 % I.V.A (+) \$ 201,018.02	\$ 1,457,380.64
	Sub- Total A (=) \$ 1,457,380.64	
	Amortizacion Anticipo 35% \$ 439,726.91	
AMORTIZACION ANTERIOR	16 % I.V.A (+) \$ 70,356.31	ACUMULADO ANTERIOR
\$ 1,366,855.72	Total (=) \$ 510,083.22	\$ 3,905,302.06
	Importe TOTAL A FACTURAR \$ 816,635.71	
TOTAL AMORTIZADO	16 % I.V.A (+) \$ 130,661.71	TOTAL ACUMULADO.
\$ 1,876,938.94	Total (=) \$ 947,297.42	\$ 5,362,682.70
	3 % SVIFYC: \$ 37,690.88	
ANTICIPO OTORGADO	Total Deducciones (=) \$ 547,774.10	CONTRATADO
\$ 2,624,846.11	Importe T O T A L \$ 909,606.54	\$ 7,499,560.31
SALDO DEL ANTICIPO	NETO A PAGAR \$ 909,606.54	SALDO
\$747,907.17	Son:	\$ 2,136,877.61
	(SON NOVECIENTOS NUEVE MIL SEISCIENTOS SEIS PESOS 54/100 M.N.)	

ELABORO.-


Jesus Amado
C. JESUS AMADO CAMACHO OSUNA
REPRESENTANTE LEGAL

REVISO

Jose Rodolfo Contreras Lopez
ING. JOSE RODOLFO CONTRERAS LOPEZ
COSTOS Y PRESUPUESTOS.

AUTORIZO

Rubiel Rincon Ramos
C. ING. RUBIEL RINCON RAMOS.
DIRECTOR O.P.D.U. Y E.



			LOCALIDAD:	BADIRAGUATO	ESTIMACIÓN:	03 NORMAL
DESCRIPCIÓN:	CONSTRUCCIÓN DE RECUBRIMIENTO DE UN SUELO CON CONCRETO HIDRÁULICO, EN LA CALLE MOCORITO (ARROYO DE ARENA) ENTRE BOULEVARD JUAN S MILLAN Y CALLE ELIGIO ABITIA, COLONIA CENTRO, MUNICIPIO DE BADIRAGUATO, SINALOA					
FECHA INICIO CONTRATO:	23-jul-25	FECHA TERMINACION CONTRATO:	19-nov-25	CONTRATO:	MBGBR-LP-FAISMUN-004/2025	FECHA CONTRATO: 19-jul-25

[illegible]

ELABORÓ.- *Jesus Amado*
C. JESUS AMADO CAMACHO OSUNA
REPRESENTANTE LEGAL

AUTORIZO.-
C. ING. RUBIEL RINCON RAMOS
DIRECTOR DE O.P.D.U. Y E.



CONTRATISTA:		FECHA:	
JESUS AMADO CAMACHO OSUNA		3 de octubre de 2025	
DOMICILIO:		DEPENDENCIA:	
Calle sin nombre s/n. Colonia: Loc. Los Naranjos, C.P. 80080, Culiacán, Sinaloa		DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA	
R.F.C.	CAOJ810630ST4.		

RESÚMEN DE ESTIMACIÓN

	LOCALIDAD:	BADIRAGUATO	ESTIMACIÓN:	03 NORMAL
DESCRIPCIÓN:	CONSTRUCCIÓN DE RECUBRIMIENTO DE UN SUELO CON CONCRETO HIDRÁULICO, EN LA CALLE MOCORITO (ARROYO DE ARENA) ENTRE BOULEVARD JUAN S MILLÁN Y CALLE ELIGIO ABITIA, COLONIA CENTRO, MUNICIPIO DE BADIRAGUATO, SINALOA			

IMPORTE DE OBRA SIN IVA.	\$ 6,465,138.20
IMPORTE DE ANTICIPO DE OBRA:	\$ 2,624,846.11
IMPORTE TOTAL DE CONTRATO:	\$ 7,499,560.31

DESTAJO		IMPORTE
1	PRELIMINARES	\$ -
2	ESTRUCTURA	\$ 1,256,362.62
3	OTROS	\$ -
SUBTOTAL ESTIMACIÓN:		\$ 1,256,362.62

SUB TOTAL=	\$ 1,256,362.62
I.V.A AL 16 %	\$ 201,018.02
TOTAL =	\$ 1,457,380.64

ELABORO.-

Jesus Amado
C. JESUS AMADO CAMACHO OSUNA
REPRESENTANTE LEGAL

REVISÓ.-

ING. JOSE RODOLFO CONTRERAS LOPEZ
COSTOS Y PRESUPUESTOS.


AUTORIZO.-

Rubiel Rincon Ramos
C. ING. RUBIEL RINCON RAMOS.
DIRECTOR DE O.P.D.U. Y E.



CONTRATISTA: JESUS AMADO CAMACHO OSUNA		DEPENDENCIA:		FECHA: viernes, 3 de octubre de 2025	
DOMICILIO: Calle sin nombre s/n. Colonia: Loc. Los Naranjos, C.P. 80080, Culiacán, Sinaloa		R.F.C.: CAOJ810630ST4.		DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA	
DESGLASE DE CONCEPTOS DE ESTIMACIÓN					
DESCRIPCIÓN: CONSTRUCCIÓN DE RECUBRIMIENTO DE UN SUELO CON CONCRETO HIDRÁULICO, EN LA CALLE MOCORITO (ARROYO DE ARENA) ENTRE BOULEVARD JUAN S MILLÁN Y CALLE ELIGIO ABITIA, COLONIA CENTRO, MUNICIPIO DE BADIRAGUATO, SINALOA		LOCALIDAD: BADIRAGUATO		ESTIMACIÓN: 03 NORMAL	
IMPORTE DE OBRA SIN IVA: \$6,465,138.20		IMPORTE DE ANTICIPO DE OBRA: \$2,624,846.11		IMPORTE TOTAL DE CONTRATO: \$7,489,560.31	

CLAVE	CONCEPTO	UNID/D	SEGUN PROYECTO			HASTA ESTIM	HASTA ESTIM	EXCEDENTE	DE ESTA ESTIMACIÓN	IMPORTE
			CANT	P.U.	TOTAL					
1	PRELIMINARES									
2	ESTRUCTURA									
GP08	GUARNICIÓN TIPO "L" DE 15X30X60 DE CONCRETO PREMEZCLADO DE F'C= 250 KG/CM2, INCLUYE: CIMBRA Y DESMIBRA, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, MANIOBRAS LOCALES Y TODO LO NECESARIO PARA SU TERMINACIÓN.	ML	1,198.62	\$ 719.19	\$ 862,035.52	711.74	415.50	0.00	296.24	\$ 213,052.85
GP109	LOSA DE CONCRETO DE 15 CMS DE ESPESOR CON CONCRETO PREMEZCLADO F'C=300 KG/CM", INCLUYE: MANO DE OBRA, MATERIALES, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	M2	3,214.47	\$ 839.01	\$ 2,696,972.47	2,269.98	1,072.33	0.00	1,197.65	\$ 1,004,840.33
GP133	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONTRA JUNTA DE PVC TIPO C-3 PARA LOSAS DE 15 CM. EN PAVIMENTOS. INCLUYE: TRAZO, ALINEACIÓN, HINCADO Y REMOCIÓN DE TAPA.	ML	1,613.22	\$ 32.67	\$ 52,703.50	1,371.41	652.82	0.00	718.59	\$ 23,476.34
GP13	CALAFATEO EN LOSAS DE CONCRETO HIDRÁULICO CON ASFALTEX 505, INCLUYE: UN RIEGO CON EMULTEX T.P. (PRYMER), UN RIEGO DE ASFALTEX 505 Y BARRIDO DE LA SUPERFICIE.	ML	1,137.84	\$ 33.75	\$ 38,402.10	953.14	508.90	0.00	444.24	\$ 14,993.10
									SUB-TOTAL	\$ 1,256,362.62
									IVA	\$ 201,018.02
									MONTO TOTAL	\$ 1,457,380.64

ELABORÓ:

 C. JESUS AMADO CAMACHO OSUNA
 REPRESENTANTE LEGAL

REVISÓ:

 ING. JOSE RODOLFO CONTRERAS LOFEZ
 COSTOS Y PRESUPUESTOS

AUTORIZO

 C. ING. RUBIEL RINCON RAMOS
 DIRECTOR DE O.P.D.U. Y E.



VOLUMENES GENERADORES

CONTRATISTA		CONSTRUCCIÓN DE RECURRIMIENTO DE UN SUELO CON CONCRETO HIDRÁULICO, EN LA CALLE IMOCORITO (ARROYO DE ARENA) ENTRE BOULEVARD JUAN S MILLÁN Y CALLE ELIGIO ABITIA, COLONIA CENTRO, MUNICIPIO DE BADIRAGUATO, SINALOA										ESTIMACION
JESUS AMADO CAMACHO OSUNA												03 NORMAL
RFC:	CAOJ810630ST4.											
CLAVE	C O N C E P T O	LOCALIZACION EJE	TRAMO	UNIDAD	LARGO	ANCHO EN METROS	ALTO	PZA	TOTAL	OBSERVACIONES		
2	ESTRUCTURA											
GP08	GUARNICIÓN TIPO "L" DE 15X30X60 DE CONCRETO FREMEZCLADO DE FC= 250 KG/CN2. INCLUYE: CIMBRA Y DESIMBRA, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, MANIOBRAS LOCALES Y TODO LO NECESARIO PARA SU TERMINACIÓN.			M2						VER CROQUIS		
		CADENAMIENTO										
		0+105.00	0+210.00		70.2400	DERECHO			70.24			
		0+105.00	0+210.00		148.0000	CENTRO			148.00			
		0+105.00	0+210.00		78.0000	IZQUIERDO			78.00			
								ESTA EST	296.24			

ELABORÓ:

C. JESUS AMADO CAMACHO OSUNA
REPRESENTANTE LEGAL

REVISÓ:-

ARQ. BRICEIDA OPE NIEBLAS MARTINEZ
SUPERVISOR

AUTORIZÓ:-

ING. RUBIEL RINCON RAMOS
DIRECTOR DE O.P.D.U.Y.E.



VOLUMENES GENERADORES

CONTRATISTA

JESUS AMADO CAMACHO OSUNA

RFC: CAOJ810630ST4.

C O N C E P T O

LOSA DE CONCRETO DE 15 CMS DE ESPESOR CON CONCRETO PREMEZCLADO F'C=300 KG/CM². INCLUYE: MANO DE OBRA, MATERIALES, HERRAMIENTA Y EQUIPO.

LOCALIZACION

EJE

UNIDAD

M2

LARGO

EN METROS

ANCHO

EN METROS

PZA

TOTAL

OBSERVACIONES

VER CROQUIS

ESTIMACION
03 NORMAL

CONSTRUCCIÓN DE RECUBRIMIENTO DE UN SUELO CON CONCRETO HIDRÁULICO, EN LA CALLE MOCORITO (ARROYO DE ARENA) ENTRE BOULEVARD JUAN S MILLÁN Y CALLE ELIGIO ABITIA, COLONIA CENTRO, MUNICIPIO DE BADIRAGUATO, SINALOA

GP109

CADENAMIENTO

0+105.00

0+110.00

0+115.00

0+120.00

0+125.00

0+130.00

0+135.00

0+140.00

0+145.00

GP110

0+150.00

0+155.00

0+160.00

0+165.00

0+170.00

0+175.00

0+180.00

0+185.00

0+190.00

0+195.00

GP111

0+200.00

0+205.00

0+210.00

0+215.00

0+220.00

0+225.00

0+230.00

0+235.00

0+240.00

0+245.00

GP112

0+250.00

0+255.00

0+260.00

0+265.00

0+270.00

0+275.00

0+280.00

0+285.00

0+290.00

0+295.00

GP113

0+300.00

0+305.00

0+310.00

0+315.00

0+320.00

0+325.00

0+330.00

0+335.00

0+340.00

0+345.00

GP114

0+350.00

0+355.00

0+360.00

0+365.00

0+370.00

0+375.00

0+380.00

0+385.00

0+390.00

0+395.00

GP115

0+400.00

0+405.00

0+410.00

0+415.00

0+420.00

0+425.00

0+430.00

0+435.00

0+440.00

0+445.00

GP116

0+450.00

0+455.00

0+460.00

0+465.00

0+470.00

0+475.00

0+480.00

0+485.00

0+490.00

0+495.00

GP117

0+500.00

0+505.00

0+510.00

0+515.00

0+520.00

0+525.00

0+530.00

0+535.00

0+540.00

0+545.00

GP118

0+550.00

0+555.00

0+560.00

0+565.00

0+570.00

0+575.00

0+580.00

0+585.00

0+590.00

0+595.00

GP119

0+600.00

0+605.00

0+610.00

0+615.00

0+620.00

0+625.00

0+630.00

0+635.00

0+640.00

0+645.00

GP120

0+650.00

0+655.00

0+660.00

0+665.00

0+670.00

0+675.00

0+680.00

0+685.00

0+690.00

0+695.00

GP121

0+700.00

0+705.00

0+710.00

0+715.00

0+720.00

0+725.00

0+730.00

0+735.00

0+740.00

0+745.00

GP122

0+750.00

0+755.00

0+760.00

0+765.00

0+770.00

0+775.00

0+780.00

0+785.00

0+790.00

0+795.00

GP123

0+800.00

0+805.00

0+810.00

0+815.00

0+820.00

0+825.00

0+830.00

0+835.00

0+840.00

0+845.00

GP124

0+850.00

0+855.00

0+860.00

0+865.00

0+870.00

0+875.00

0+880.00

0+885.00

0+890.00

0+895.00

GP125

0+900.00

0+905.00

0+910.00

0+915.00

0+920.00

0+925.00

0+930.00

0+935.00

0+940.00

0+945.00

GP126

0+950.00

0+955.00

0+960.00

0+965.00

0+970.00

0+975.00

0+980.00

0+985.00

0+990.00

0+995.00

GP127

0+1000.00

0+1005.00

0+1010.00

0+1015.00

0+1020.00

0+1025.00

0+1030.00

0+1035.00

0+1040.00

0+1045.00

GP128

0+1050.00

0+1055.00

0+1060.00

0+1065.00

0+1070.00

0+1075.00

0+1080.00

0+1085.00

0+1090.00

0+1095.00

GP129

0+1100.00

0+1105.00

0+1110.00

0+1115.00

0+1120.00

0+1125.00

0+1130.00

0+1135.00

0+1140.00

0+1145.00

GP130

0+1150.00

0+1155.00

0+1160.00

0+1165.00

0+1170.00

0+1175.00

0+1180.00

0+1185.00

0+1190.00

0+1195.00

GP131

0+1200.00

0+1205.00

0+1210.00

0+1215.00

0+1220.00

0+1225.00

0+1230.00

0+1235.00

0+1240.00

0+1245.00

GP132

0+1250.00

0+1255.00

0+1260.00

0+1265.00

0+1270.00

0+1275.00

0+1280.00

0+1285.00

0+1290.00

0+1295.00

GP133

0+1300.00

0+1305.00

0+1310.00

0+1315.00

0+1320.00

0+1325.00

0+1330.00

0+1335.00

0+1340.00

0+1345.00

GP134

0+1350.00

0+1355.00

0+1360.00

0+1365.00

0+1370.00

0+1375.00

0+1380.00



VOLUMENES GENERADORES

CONTRATISTA

JESUS AMADO CAMACHO OSUNA

RFC: CAOJ810630ST4.

ESTIMACION
03 NORMAL

CONSTRUCCIÓN DE RECUBRIMIENTO DE UN SUELO CON CONCRETO HIDRÁULICO, EN LA CALLE
IMOCORITO (ARROYO DE ARENA) ENTRE BOULEVARD JUAN S MILLÁN Y CALLE ELIGIO ABITIA,
COLONIA CENTRO, MUNICIPIO DE BADIRAGUATO, SINALOA


CLAVE	CONCEPTO	LOCALIZACION		UNIDAD	LARGO EN METROS	ANCHO EN METROS	ALTO	PZA	TOTAL	OBSERVACIONES
		EJE	TRAMO							
		0+150.00	0+155.00		5.0000	9.40		2.50	28.20	
		0+155.00	0+160.00		5.0000	9.40		2.50	28.20	
		0+160.00	0+165.00		5.0000	9.40		2.50	28.20	
		0+165.00	0+170.00		5.0000	9.40		2.50	28.20	
		0+170.00	0+175.00		5.0000	9.40		2.50	28.20	
		0+175.00	0+180.00		5.0000	9.40		2.50	28.20	
		0+180.00	0+185.00		5.0000	9.40		2.50	28.20	
		0+185.00	0+190.00		5.0000	9.40		2.50	28.20	
		0+190.00	0+195.00		5.0000	12.11		2.50	36.33	
		0+195.00	0+200.00		5.0000	21.63		2.50	64.89	
		0+200.00	0+205.00		5.0000	22.90		2.50	68.70	
		0+205.00	0+210.00		5.0000	14.28		2.50	42.84	
								ESTA EST	718.59	
GP13	CALAFATEO EN LOS/AS DE CONCRETO HIDRÁULICO CON ASFALTEX 505. INCLUYE: UN RIEGO CON EMULTEX T.P. (PRYMER), UN RIEGO DE ASFALTEX 505 Y BARRIDO DE LA SUPERFICIE.			ML						
		CADENAMIENTO								
		0+105.00	0+210.00		70.2400		DERECHO		70.24	
		0+105.00	0+210.00		148.0000	2.00	CENTRO		296.00	
		0+105.00	0+210.00		78.0000		IZQUIERDO		78.00	
								ESTA EST	444.24	

ELABORO:-
C. JESUS AMADO CAMACHO OSUNA
REPRESENTANTE LEGAL

REVISO:-
ARQ. BRICEIDA GPE NIEBLAS MARTINEZ
SUPERVISOR

AUTORIZO:-
ING. RUBIEL RINCON RAMOS
DIRECTOR DE O.P.D.U.Y.E.

CONTRATISTA: JESUS AMADO CAMACHO OSUNA		DEPENDENCIA: DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA	
DOMICILIO: Calle sin nombre s/n. Colonia: Loc. Los Naranjos, C.P. 80080, Culiacán, Sinaloa			
R.F.C.: CAOJ810630ST4.			
OBRA: CONSTRUCCIÓN DE RECUBRIMIENTO DE UN SUELO CON CONCRETO HIDRÁULICO, EN LA CALLE MOCORITO (ARROYO DE ARENA) ENTRE BOULEVARD JUAN S MILLÁN Y CALLE ELIGIO ABITIA, COLONIA CENTRO, MUNICIPIO DE BADIRAGUATO, SINALOA			
CROQUIS ESTIMACION:			
CROQUIS ESTIMACION:			
CLAVE	CONCEPTO		
1	ESTRUCTURA		
GP08	GUARNICIÓN TIPO "L" DE 15x30x60 DE CONCRETO PREMEZCLADO DE F'C= 250 KG/CM2, INCLUYE: CIMBRA Y DESIMBRA, MATERIALES, MANO DE		
GP08B	LOSA DE CONCRETO DE 15 CMS DE ESPESOR CON CONCRETO PREMEZCLADO FC=300 KG/CM", INCLUYE: MANO DE OBRA, MATERIALES,		
GP109	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONTRA JUNTA DE PVC TIPO C-3 PARA LOSAS DE 15 CM. EN PAVIMENTOS, INCLUYE: TRAZO, ALINEACIÓN,		
GP13	CALAFATEO EN LOSAS DE CONCRETO HIDRÁULICO CON ASFALTEX 505, INCLUYE: UN RIEGO CON EMULTEX T.P. (PRIMER), UN RIEGO DE ASFALTEX		

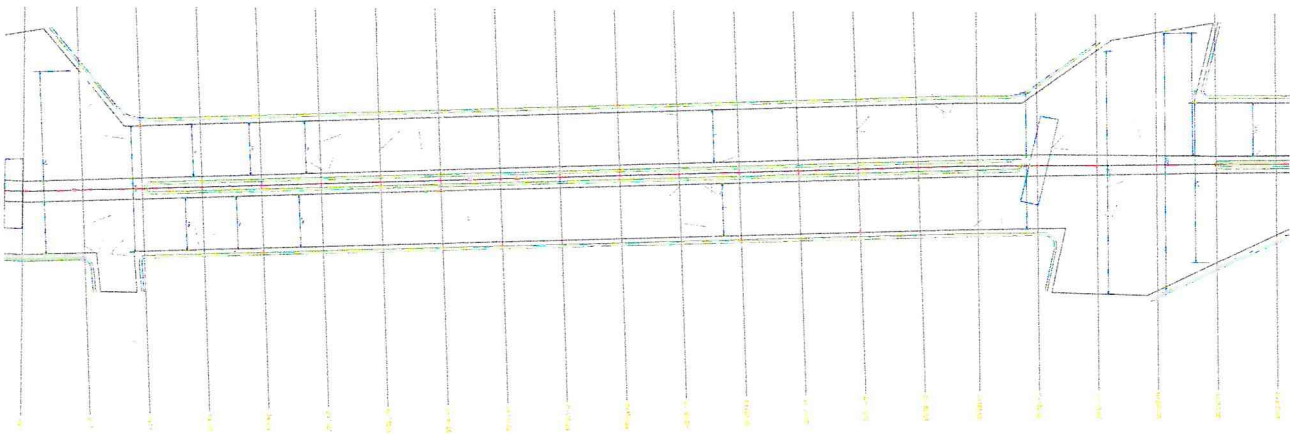

ELABORO.-
Jesus Amado
 C. JESUS AMADO CAMACHO OSUNA
 REPRESENTANTE LEGAL

REVISOR.-
PAE
 SUPERVISOR

AUTORIZO.-
[Signature]
 C. ING. RUBIEL RINGON RAMOS.
 DIRECTOR DE O.P.D.U. Y E.



CONTRATISTA:

JESUS AMADO CAMACHO OSUNA

DEPENDENCIA:

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS,
DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA

DOMICILIO:

Calle sin nombre s/n. Colonia: Loc. Los Naranjos, C.P. 80080, Culiacán, Sinaloa

R.F.C.

CAOJ810630ST4.

OBRA:

CONSTRUCCIÓN DE RECUBRIMIENTO DE UN SUELO CON CONCRETO HIDRÁULICO, EN LA CALLE MOCORITO (ARROYO DE ARENA) ENTRE BOULEVARD JUAN S MILLÁN Y CALLE ELIGIO ABITIA, COLONIA CENTRO, MUNICIPIO DE BADIRAGUATO, SINALOA

FOTOS DE ESTIMACION:

FOTOS DE ESTIMACION:

CVE

2

CONCEPTO

ESTRUCTURA

GP08	GUARNICIÓN TIPO "L" DE 15X30X60 DE CONCRETO PREMEZCLADO DE F'C= 250 KG/CM2, INCLUYE: CIMBRA Y DESIMBRA, MATERIALES, MANO DE OBRA,
GP10	LOSA DE CONCRETO DE 15 CMS DE ESPESOR CON CONCRETO PREMEZCLADO F'C=300 KG/CM", INCLUYE: MANO DE OBRA, MATERIALES, HERRAMIENTA
GP13	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONTRA JUNTA DE PVC TIPO C-3 PARA LOSAS DE 15 CM. EN PAVIMENTOS, INCLUYE: TRAZO, ALINEACIÓN, HINCADO Y
GP13	CALAFATEO EN LOSAS DE CONCRETO HIDRÁULICO CON ASFALTEX 505, INCLUYE: UN RIEGO CON EMULTEX T.P. (PRYMER), UN RIEGO DE ASFALTEX 505



ELABORO.-

Jesús Amado

C. JESUS AMADO CAMACHO OSUNA
REPRESENTANTE LEGAL

REVISO.-

R. R. R.

SUPERVISOR

AUTORIZO.-

R. R. R.

C.ING. RUBIEL RINCON RAMOS
DIRECTOR DE O.P.D.U. Y E.



Fecha y hora de consulta

17/10/2025 2:30:17 PM

Contrato

00798320

BBVA Net Cash - Pagos Interbancarios

Nombre del Cliente

MUNICIPIO DE BADIRAGUATO

Operación autorizada

Transferencia en proceso de validación y aplicación.

Datos del firmante

Usuario: ADMIN1

Poder: 100%

Datos de la operación

Tipo de operación: Pago Interbancario

Descripción: EST 03 NORM LP004

Importe de la operación: 909,606.54 MXP

Cuenta de retiro: 0124174836

Cuenta de depósito: 072730012781361749

Divisa de la cuenta: MXP

Divisa de la cuenta: MXP

Titular de la cuenta: MUNICIPIO DE BADIRAG
UATOTitular de la cuenta: JESUS AMADO CAMACHO
OSUNA

Nombre banco destino: BANORTE

Fecha de creación: 17/10/2025

Fecha de aplicación: 17/10/2025

Concepto de pago: EST 03 NORM LP004

Referencia numérica:

Instrumento de seguridad: ASD 6551749382

Hora de captura en el canal: 14:30:15

Datos de confirmación de la transferencia

Folio interbancario: 0000668434

Clave de rastreo: 002601002510170000668434

Folio de firma: 0030369042

Folio único: I401202510171430150030369048

Estado operación

Porcentaje Firmado: 100%

Estado: Operado

Detalle de firmas

Acción	Usuario	Porcentaje aportado	Fecha
CREO	ADMIN1	— %	17/10/2025
FIRMO	ADMIN1	100 %	17/10/2025

BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México

www.bbvanetcash.mx
