



MUNICIPIO DE SINALOA
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
ESTIMACION DE OBRA



OBRA: CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO ASFALTICO EN AVENIDA NUMERO DOS ENTRE CALLE NUMERO DOS Y CALLE NUMERO TRES EN LA LOCALIDAD DE AGUA FRIA, MUNICIPIO DE SINALOA.



DAGBA CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.
CALLE IGNACIO ZARAGOZA # 200-1, COL. CENTRO, GUADALUPE, SINALOA, C.P. 61000
(646) 104-43-51
email: info@dagba.com.mx

CONTRATO: IPR-DOP-SIN-2024-007

PERIODO CONTRATO: DEL 09 DE DICIEMBRE DEL 2024 AL 06 DE FEBRE

IMPORTE CONTRATO: \$1,887,271.23 CON I.V.A.

IMPORTE ANTICIPO \$660,544.93

ESTIMACIÓN No.: 1 (UNO)

PERIODO: DEL 09 DE DICIEMBRE DEL 2024 AL 17 DE ENERO DEL 2025.

FECHA: 17 DE ENERO DEL 2025.

HOJA: 1 DE 1

ESTADO DE CUENTA

ESTIMACION	PERIODO	IMPORTE DE ESTIMACION	DEDUCCION DEL 3.0%				AMORTIZACION DEL ANTICIPO 35%	TOTAL DE DEDUCCIONES	LIQUIDO A PAGAR
ESTIMACION 1 (UNO)	DEL 09 DE DICIEMBRE DEL 2024 AL 17 DE ENERO DEL 2025.	\$ 840,069.75	\$ 21,725.94				\$ 294,024.41	\$ 315,750.35	\$ 524,319.40
TOTALES		\$ 840,069.75	\$ 21,725.94				\$ 294,024.41	\$ 315,750.35	\$ 524,319.40
SALDO DEL CONTRATO:		\$ 1,047,201.48		SALDO POR AMORTIZAR DEL ANTICIPO			\$ 366,520.52		

CONFORME:

ARQ. MARTIN ALBERTO DAGMINO FONSECA
REPRESENTANTE LEGAL

CONFORME:

ING. JOEL ERNESTO RUBIO ACOSTA
SUPERVISOR DE OBRAS PÚBLICAS

CONFORME:

JUAN MANUEL LOPEZ MENCHACA
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS



MUNICIPIO DE SINALOA
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
ESTIMACION DE OBRA



OBRA: CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO ASFALTICO EN AVENIDA NUMERO DOS ENTRE CALLE NUMERO DOS Y CALLE NUMERO TRES EN LA LOCALIDAD DE AGUA FRIA, MUNICIPIO DE SINALOA.		 DAGBA CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V. <small>CALLE IGNACIO ZARAGOZA # 000-1, COL. CENTRO, GUADALUPE, S.N. MEXICO C.P. 01000 (546) 104-4351 email: info@dagba.com</small>	
CONTRATO: IPR-DOP-SIN-2024-007	IMPORTE: \$1,626,957.96 MAS I.V.A.	PERIODO CONTRATO: DEL 09 DE DICIEMBRE DEL 2024 AL 06 DE FEB	
ESTIMACIÓN No.: 1 (UNO)	PERIODO: DEL 09 DE DICIEMBRE DEL 2024 AL 17 DE ENERO DEL 2025.	FECHA: 17 DE ENERO DEL 2025.	HOJA: 1 DE 1

RESUMEN GENERAL DE ESTIMACIÓN

\$ 724,198.06

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO ASFALTICO EN AVENIDA
NUMERO DOS ENTRE CALLE NUMERO DOS Y CALLE NUMERO TRES EN LA
LOCALIDAD DE AGUA FRIA, MUNICIPIO DE SINALOA.

SUB-TOTAL DE OBRA: \$ 724,198.06

I.V.A. (16%): \$ 115,871.69

TOTAL DE ESTIMACION: \$ 840,069.75

DEDUCCIONES:

AMORTIZACION DEL ANTICIPO 35% \$ 294,024.41

DEDUCCION DEL 3.0% \$ 21,725.94

Suma de deducciones \$ 315,750.35

Neto a pagar de esta estimacion: **\$ 524,319.40**

(Son: QUINIENTOS VEINTICUATRO MIL TRESCIENTOS DIECINUEVE PESOS 40/100 M.N.)

CONFORME:

ARO. MARTIN ALBERTO BASTIEN CONSECA
REPRESENTANTE LEGAL

CONFORME:

ING. JOEL ERNESTO RUBIO ACOSTA
SUPERVISOR DE OBRAS PÚBLICAS

CONFORME:

JUAN MANUEL LOPEZ MENCHACA
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS



MUNICIPIO DE SINALOA
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
ESTIMACION DE OBRA



OBRA: CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO ASFALTICO EN AVENIDA NUMERO DOS ENTRE CALLE NUMERO DOS Y CALLE NUMERO TRES EN LA LOCALIDAD DE AGUA FRIA, MUNICIPIO DE SINALOA.				 DAGBA CONSTRUCTORA	<div>DAGBA CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V. CALLE IGNACIO ZARAGOZA # 200-1, COL. CENTRO, GUADALUPE, SIN. MEXICO C.P. 51000 (CAG) 184-48-51 e-mail: dagba@dagba.com</div>
CONTRATO: IPR-DOP-SIN-2024-007	IMPORTE: \$1,626,957.96 MAS I.V.A.	PERIODO CONTRATO:	DEL 09 DE DICIEMBRE DEL 2024 AL 06 DE FEBRERO DEL 2025.		
ESTIMACIÓN No.: 1 (UNO)	PERIODO EST: DEL 09 DE DICIEMBRE DEL 2024 AL 17 DE ENERO DEL 2025.	FECHA: 17 DE ENERO DEL 2025.		HOJA: 1 DE 1	

RESUMEN DE ESTIMACIÓN

TRABAJOS PRELIMINARES	\$ 486,083.62
SISTEMA DE AGUA POTABLE	
PRELIMINARES	\$ 10,789.99
TUBERIAS	\$ 25,534.46
TOMAS DOMICILIARIAS	\$ 51,931.09
SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO	
PRELIMINARES	\$ 10,088.90
TUBERIAS	\$ 55,304.70
DESCARGAS DOMICILIARIAS	\$ 84,465.30

SUB-TOTAL DE OBRA: \$ 724,198.06
I.V.A. (16%): \$ 115,871.69
TOTAL DE ESTIMACION: \$ 840,069.75

DEDUCCIONES:
AMORTIZACION DEL ANTICIPO 35% \$ 294,024.41
DEDUCCION DEL 3.0% \$ 21,725.94

Suma de deducciones \$ 315,750.35

Neto a pagar de esta estimacion: \$ 524,319.40

(Son: QUINIENTOS VEINTICUATRO MIL TRESCIENTOS DIECINUEVE PESOS 40/100 M.N.)

CONFORME:

RQ. MARTIN ALBERTO DAGNINO FONSECA
REPRESENTANTE LEGAL

CONFORME:

ING. JOEL ERNESTO RUBIO ACOSTA
SUPERVISOR DE OBRAS PÚBLICAS

CONFORME:

JUAN MANUEL LOPEZ MENCHACA
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS



MUNICIPIO DE SINALOA
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
ESTIMACION DE OBRA



OBRA: CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO ASFALTICO EN AVENIDA NUMERO DOS ENTRE CALLE NUMERO DOS Y CALLE NUMERO TRES EN LA LOCALIDAD DE AGUA FRIA, MUNICIPIO DE SINALOA.			 DAGBA CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V. <small>CALLE IGNACIO LINAKUA # 200 I, COL. CENTRO, GUADALUPE, SINALOA, MEXICO C.P. 81000 (546) 154-4851 email: modagba@outlook.com</small>	
CONTRATO: IPR-DOP-SIN-2024-007	IMPORTE: \$ 1,626,957.96 MAS I.V.A.	PERIODO CONTRATO: DEL 09 DE DICIEMBRE DEL 2024 AL 06 DE FEBRERO DEL 2025.		
ESTIMACIÓN No.: 1 (UNO)	PERIODO EST: DEL 09 DE DICIEMBRE DEL 2024 AL 17 DE ENERO DEL 2025.	FECHA: 17 DE ENERO DEL 2025.		

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	SEGUN PROYECTO	HASTA ESTA ESTIMACIÓN	HASTA LA ESTIMACIÓN ANTERIOR	EXCEDENTE	DE ESTA ESTIMACIÓN	P. U.	IMPORTE
1.-	TRABAJOS PRELIMINARES								
1.1	TRAZO Y NIVELACIÓN DE OBRAS DE TERRACERIA Y PAVIMENTACIÓN ESTABLECIENDO EJES, NIVELES, PUNTOS DE REFERENCIA Y SU CONSERVACIÓN TOTAL DURANTE TODO EL PROCESO CONSTRUCTIVO DE LAS DIFERENTES CAPAS QUE COMPONEN EL CUERPO DEL PAVIMENTO, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	M2	1,034.00	1,034.00			1,034.00	\$ 12.23	\$ 12,645.82
1.2	CORTE EN CAJA CON EQUIPO MECANICO EN MATERIAL TIPO "B"	M3	507.15	507.15			507.15	\$ 55.66	\$ 28,227.97
1.4	CARGA Y ACARREO POR MEDIOS MECANICOS EN EL 1er KM, DE MATERIAL AL QUE SE REFIERE EL CONCEPTO; 1.2, INCLUYE: EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M3	659.30	659.30			659.30	\$ 32.28	\$ 21,282.20
1.5	SOBRE ACARREO DE MATERIAL AL QUE SE REFIERE EL CONCEPTO 1.4 AL KILOMETRO SUBSECUENTES AL PRIMERO, INCLUYE: EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, DESCARGA DE MATERIAL Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M³/KM	1,318.59	1,318.59			1,318.59	\$ 10.14	\$ 13,370.50
1.6	COMPACTACIÓN DE TERRENO NATURAL AL 90 % DE SU PVSM, INCLUYE: PRUEBAS DE COMPACTACION.	M2	924.00	924.00			924.00	\$ 25.13	\$ 23,220.12
1.7	CONSTRUCCIÓN DE BASE CON MATERIAL PRODUCTO DE BANCO, INCLUYE: CARGA Y ACARREO, HOMOGENIZADO, TENDIDO, INCORPORACION DE HUMEDAD, COMPACTADO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, PRUEBAS DE CALIDAD Y COMPACTACION.	M3	184.80	184.80			184.80	\$ 832.39	\$ 153,825.67
1.8	CONSTRUCCIÓN DE SUB BASE CON MATERIAL PRODUCTO DE BANCO, INCLUYE: CARGA Y ACARREO, HOMOGENIZADO, TENDIDO, INCORPORACION DE HUMEDAD, COMPACTADO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, PRUEBAS DE CALIDAD Y COMPACTACION.	M3	184.80	184.80			184.80	\$ 832.39	\$ 153,825.67
1.9	RIEGO DE IMPREGNACION CON ASFALTO FM1 A RAZON DE 1.5 LTS POR M2, INCLUYE: EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	M2	924.00	924.00			924.00	\$ 60.47	\$ 55,874.28
1.10	ARENEO PARA PROTECCIÓN DE BASE DE LA SUPERFICIE. INCLUYE: SUMINISTRO DE ARENA	M2	924.00	924.00			924.00	\$ 2.49	\$ 2,300.76
1.11	BARRIDO DE SUPERFICIE CON TRACTOR.	HAS.	0.09	0.09			0.09	\$ 2,052.36	\$ 184.71
1.12	RIEGO DE LIGA CON EMULSION CATIONICA.	M2	924.00	924.00			924.00	\$ 23.08	\$ 21,325.92
	TOTAL DE TRABAJOS PRELIMINARES:								\$ 486,083.62
	SISTEMA DE AGUA PÓTABLE								
5.-	PRELIMINARES								
5.1	TRAZO DE TERRENO CON LA FINALIDAD DE EJECUTAR TRABAJOS DE AGUA POTABLE.	ML	110.00	110.00			110.00	\$ 17.33	\$ 1,906.30
5.2	SONDEO DE TUBERÍA CON MEDIOS MECÁNICOS EN MATERIAL TIPO B EN SECO DE 0.00 A 3.00 MTS DE PROFUNDIDAD	PZA	1.00	1.00			1.00	\$ 1,381.37	\$ 1,381.37
5.3	EXCAVACION A MAQUINA EN MATERIAL TIPO COMUN SECO EN ZONA "C" DE 0.00 A 2.00 MTS. DE PROFUNDIDAD EN SECO	M3	36.30	36.30			36.30	\$ 69.42	\$ 2,519.95

CONFORME:

ARQ. MARTIN ALBERTO DAGNINO FONSECA
REPRESENTANTE LEGAL

CONFORME:

ING. JOEL ERNESTO RUBIO ACOSTA
SUPERVISOR DE OBRAS PÚBLICAS

CONFORME:

JUAN MANUEL LOPEZ MENCHACA
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS



MUNICIPIO DE SINALOA
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
ESTIMACION DE OBRA



OBRA: CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO ASFALTICO EN AVENIDA NUMERO DOS ENTRE CALLE NUMERO DOS Y CALLE NUMERO TRES EN LA LOCALIDAD DE AGUA FRIA, MUNICIPIO DE SINALOA.				 DAGBA CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V. <small>CALLE EMILIO URANGOLA # 200 1, COL. CENTRO, GUADALUPE, SINALOA, MEXICO C.P. 81000 (646) 134-4331</small> ventas.dagba@gmail.com	
CONTRATO: IPR-DOP-SIN-2024-007	IMPORTE: \$ 1,626,957.96 MAS I.V.A.	PERIODO CONTRATO:	DEL 09 DE DICIEMBRE DEL 2024 AL 06 DE FEBRERO DEL 2025.		
ESTIMACIÓN No.: 1 (UNO)	PERIODO EST: DEL 09 DE DICIEMBRE DEL 2024 AL 17 DE ENERO DEL 2025.	FECHA:	17 DE ENERO DEL 2025.		

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	SEGUN PROYECTO	HASTA ESTA ESTIMACIÓN	HASTA LA ESTIMACIÓN ANTERIOR	EXCEDENTE	DE ESTA ESTIMACIÓN	P. U.	IMPORTE
5.4	PLANTILLA APISONADA Y COMPACTADA CON PISON DE MANO Y AGUA, CON ESPESOR DE PROYECTO CON MATERIAL SELECCIONADO PRODUCTO DE LA EXCAVACION.	M3	6.60	6.60			6.60	\$ 172.94	\$ 1,141.40
5.5	RELLENO ACOSTILLADO Y COMPACTADO AL 95% PROCTOR CON EQUIPO MECANICO, CON MATERIAL SELECCIONADO PRODUCTO DE LA EXCAVACION, INCLUYE PRUEBA DE LABORATORIO.	M3	16.50	16.50			16.50	\$ 193.29	\$ 3,189.29
5.6	RELLENO A VOLTEO A MAQUINA CON MATERIAL SELECCIONADO PRODUCTO DE LA EXCAVACION.	M3	13.20	13.20			13.20	\$ 49.37	\$ 651.68
TOTAL DE PRELIMINARES:									\$ 10,789.99
6.-	TUBERIAS								
6.1	SUMINISTRO DE TUBERIA DE PVC HIDRAULICO CON CAMPANA ANGER 3", RD-32.5, INCLUYE ANILLO CUMPLIENDO CON LAS NORMAS DE CNA Y EL IMTA.	ML	110.00	110.00			110.00	\$ 184.45	\$ 20,289.50
6.2	INSTALACION JUNTEO Y PRUEBA DE TUBERIA DE PVC HIDRAULICO CON CAMPANA ANGER 3" RD-32.5, INCLUYE ANILLO CUMPLIENDO CON LAS NORMAS DE CNA Y EL IMTA	ML	110.00	110.00			110.00	\$ 37.59	\$ 4,134.90
6.7	SUMINISTRO E INSTALACION DE PIEZA ESPECIAL DE CRUZ DE 3" X 3" DE PVC HIDRAULICA, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA	PZA	2.00	2.00			2.00	\$ 555.03	\$ 1,110.06
TOTAL DE TUBERIAS:									\$ 25,534.46
7.-	TOMAS DOMICILIARIAS								
7.1	EXCAVACION Y RELLENO COMPACTADO PARA LA INSTALACION DE MATERIALES EN TOMA DOMICILIARIA.	ML	36.75	36.75			36.75	\$ 187.11	\$ 6,876.29
7.2	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA EXTRUPAK RD-9 EN TOMA DOMICILIARIA.	ML	36.75	36.75			36.75	\$ 50.28	\$ 1,847.79
7.3	TOMA DOMICILIARIA, INCLUYE: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LLAVE DE BANQUETA 1/2", BOTA DE FoFo, TUBO GAL DE 1/2", 3 CODOS DE 90° DE 1/2" GALV, VÁLVULA LIMITADORA DE BRONCE DE 1/2", MEDIDOR DE 1/2", TEE DE 1/2" GALV, MANGUERA DE 4 MTS, LLAVE DE JARDÍN DE 1/2" EN BRONCE, ADAPTADOR YUCATAN DE 1/2", PLANTILLA Y RELLENO DE ZANJA PRODUCTO DE BANCO	PZA	7.00	7.00			7.00	\$ 6,172.43	\$ 43,207.01
TOTAL DE TOMAS DOMICILIARIAS:									\$ 51,931.09
SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO									
8.-	PRELIMINARES								
8.1	TRAZO Y NIVELACION CON LA FINALIDAD DE EFECTUAR TRABAJOS DE ALCANTARRILLADO SANITARIO, ESTABLECIENDO BANCOS DE NIVEL A UN MAXIMO DE 3.00 MTS. ENTRE BANCO Y BANCO.	ML	110.00	110.00			110.00	\$ 17.33	\$ 1,906.30
8.2	SONDEO DE TUBERÍA CON MEDIOS MECÁNICOS EN MATERIAL TIPO B EN SECO DE 0.00 A 3.00 MTS DE PROFUNDIDAD.	PZA	1.00	1.00			1.00	\$ 1,381.37	\$ 1,381.37
8.3	EXCAVACION A MAQUINA EN MATERIAL TIPO COMUN SECO EN ZONA "B" DE 0.00 A 2.00 MTS. DE PROFUNDIDAD.	M3	26.40	26.40			26.40	\$ 69.42	\$ 1,832.69

CONFORME:

ARQ. MARTIN ALBERTO DAGNINO FONSECA
REPRESENTANTE LEGAL

CONFORME:

ING. JOEL ERNESTO RUBIO ACOSTA
SUPERVISOR DE OBRAS PÚBLICAS

CONFORME:

JUAN MANUEL LOPEZ MENCHACA
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS



MUNICIPIO DE SINALOA
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
ESTIMACION DE OBRA



OBRA: CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO ASFALTICO EN AVENIDA NUMERO DOS ENTRE CALLE NUMERO DOS Y CALLE NUMERO TRES EN LA LOCALIDAD DE AGUA FRIA, MUNICIPIO DE SINALOA.			 DAGBA CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V. <small>CALLE IMPACTO ZARAGOZA # 1000 1, COL. CENTRO, GUADALUPE, SIN. MEXICO C.P. 81000 (544) 104-43-51 email: dagba@dagba.com.mx</small>
CONTRATO: IPR-DOP-SIN-2024-007	IMPORTE: \$ 1,626,957.96 MAS I.V.A.	PERIODO CONTRATO: DEL 09 DE DICIEMBRE DEL 2024 AL 06 DE FEBRERO DEL 2025.	
ESTIMACIÓN No.: 1 (UNO)	PERIODO EST: DEL 09 DE DICIEMBRE DEL 2024 AL 17 DE ENERO DEL 2025.	FECHA: 17 DE ENERO DEL 2025.	

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	SEGUN PROYECTO	HASTA ESTA ESTIMACIÓN	HASTA LA ESTIMACIÓN ANTERIOR	EXCEDENTE	DE ESTA ESTIMACIÓN	P. U.	IMPORTE
8.4	PLANTILLA DE ARENA DE 10 CMS DE ESPESOR, APISONADA Y COMPACTADA CON PISON DE MANO.	M3	6.60	6.60			6.60	\$ 172.94	\$ 1,141.40
8.5	RELLENO ACOSTILLADO Y COMPACTADO AL 95% PROCTOR CON EQUIPO MECANICO, CON MATERIAL SELECCIONADO PRODUCTO DE LA EXCAVACION, INCLUYE PRUEBA DE LABORATORIO.	M3	19.80	19.80			19.80	\$ 193.29	\$ 3,827.14
TOTAL DE PRELIMINARES:									\$ 10,088.90
9.-	TUBERIAS								
9.1	SUMINISTRO DE TUBERIA DE PVC DE 8" SERIE 20.	ML	110.00	110.00			110.00	\$ 397.27	\$ 43,699.70
9.2	INSTALACION, JUNTEO Y PRUEBA DE TUBERIA DE PVC DE 8" SERIE 20.	ML	110.00	110.00			110.00	\$ 105.50	\$ 11,605.00
TOTAL DE TUBERIAS:									\$ 55,304.70
10.-	DESCARGAS DOMICILIARIAS								
10.1	CONSTRUCCION DE DESCARGA DOMICILIARIA CON TUBERIA DE 6" SERIE 20, INTERCONECTADA A TUBERIA DE 8" SERIE 20, INCLUYE: EXCAVACION, PLANTILLA, ACOSTILLADO Y VOLTEO.	ML	31.50	31.50			31.50	\$ 555.90	\$ 17,510.85
10.2	SUMINISTRO DE TUBERIA DE PVC DE 6" SERIE 20 PARA CONSTRUCCION DE DESCARGA DOMICILIARIA.	ML	31.50	31.50			31.50	\$ 244.61	\$ 7,705.22
10.3	SUMINISTRO E INSTALACION DE PIEZAS ESPECIALES PARA DESCARGA DOMICILIARIA DE 6" PARA SER INTERCONECTADAS A TUBERIA DE 8" SERIE 20: CODO DE PVC DE 45°X6" Y YEE DE 8"X6".	LOTE	7.00	7.00			7.00	\$ 1,703.35	\$ 11,923.45
10.4	SUMINISTRO DE MATERIALES Y CONSTRUCCION DE REGISTROS DE 0.60 X 0.40 MTS DE PROFUNDIDAD VARIABLE. A BASE DE TABIQUE ROJO RECOCIDO JUNTEADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA PROPORCION 1:3 CON BASE DE CONCRETO DE 0.10 MTS. DE ESPESOR ACABADO INTERIOR PULIDO CON CEMENTO- ARENA 1:3 Y MARCO Y CONTRAMARCO CON SOLERA DE 3" A 45° Y TAPA CON CONCRETO F'C= 200 KG/CM2 REFORZADA CON VARILLA DE 3/8" CORRUGADA @10 CM. INCLUYE EXCAVACIONES Y RELLENOS.	LOTE	7.00	7.00			7.00	\$ 4,549.51	\$ 31,846.57
10.6	BROCALES Y TAPAS DE POZOS DE VISITA DE FIERRO FUNDIDO, INSTALACION MEDIANO CON TAPA CIEGA DE 135 KG	LOTE	1.00	1.00			1.00	\$ 7,915.01	\$ 7,915.01
10.7	RENIVELACION DE POZO DE VISITA TIPO COMUN HASTA 2.00 MTS DE PROFUNDIDAD, INCLUYE: PLANTILLA DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2. APLANADO CON MORTERO CEM-ARENA PRP. 1:3 ACABADO INTERIOR PULIDO, ESCALON TIPO MARINO.	LOTE	1.00	1.00			1.00	\$ 7,564.20	\$ 7,564.20
TOTAL DE DESCARGAS DOMICILIARIAS:									\$ 84,465.30

SUB-TOTAL	\$ 724,198.06
IVA (16%)	\$ 115,871.69
Total:	\$ 840,069.75

CONFORME:

ARG. MARTIN ALBERTO DAGNINO FONSECA
REPRESENTANTE LEGAL

CONFORME:

ING. JOEL ERNESTO RUBIO ACOSTA
SUPERVISOR DE OBRAS PÚBLICAS

CONFORME:

JUAN MANUEL LOPEZ MENCHACA
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

JUAN MANUEL LOPEZ MENCHACA
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS



MUNICIPIO DE SINALOA
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
ESTIMACION DE OBRA



OBRA: CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO ASFALTICO EN AVENIDA NUMERO DOS ENTRE CALLE NUMERO DOS Y CALLE NUMERO TRES EN LA LOCALIDAD DE AGUA FRIA, MUNICIPIO DE SINALOA.

CONTRATO: IPR-DOP-SIN-2024-007

IMPORTE: \$ 1,626,957.96 MAS I.V.A.

ESTIMACIÓN No.: 1 (UNO)

PERIODO CONTRATO: DEL 09 DE DICIEMBRE DEL 2024 AL 06 DE FEBRERO DEL 2025.

FECHA 17 DE ENERO DEL 2025.

CALCULÓ: ARQ. OMAR ISIDRO DAGNINO FONSECA



DAGBA CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.
CALLE SINALOA TRAZADO # 200-1, COL. CENTRO, GUASAVE, S.N.L. MEXICO C.P. 81000
(546) 104-43-51

HOJA: 2 DE 5

GENERADORES DE OBRA

CLAVE	DESCRIPCION	UNIDAD	TRAMO	EJE	LARGO	ANCHO	ALTO	PIEZA	AREA	RESULTADO		OBSERVACIONES
										PARCIAL	TOTAL	
1.8	CONSTRUCCIÓN DE SUB BASE CON MATERIAL PRODUCTO DE BANCO, INCLUYE: CARGA Y ACARREO, HOMOGENIZADO, TENDIDO, INCORPORACION DE HUMEDAD, COMPACTADO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, PRUEBAS DE CALIDAD Y COMPACTACION.	M³	AV.NUMERO DOS DEL KM 0+000.00 AL 0+110.00		110.00	8.40	0.20			184.80		
1.9	RIEGO DE IMPREGNACION CON ASFALTO FM1 A RAZON DE 1.5 LTS POR M2, INCLUYE: EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	M²	AV.NUMERO DOS DEL KM 0+000.00 AL 0+110.00		110.00	8.40				924.00		
										TOTAL	924.00	
1.10	ARENEO PARA PROTECCIÓN DE BASE DE LA SUPERFICIE. INCLUYE: SUMINISTRO DE ARENA	M²	AV.NUMERO DOS DEL KM 0+000.00 AL 0+110.00		110.00	8.40				924.00		
										TOTAL	924.00	
1.11	BARRIDO DE SUPERFICIE CON TRACTOR.	HAS.	AV.NUMERO DOS		SUPERFICIE IGUAL AL CONCEPTO 1.11/ 10,000					0.09		
										TOTAL	0.09	
1.12	RIEGO DE LIGA CON EMULSION CATIONICA.	M²	AV.NUMERO DOS					924.00		924.00		
										TOTAL	924.00	
5.-	PRELIMINARES											
5.1	TRAZO DE TERRENO CON LA FINALIDAD DE EJECUTAR TRABAJOS DE AGUA POTABLE.	ML	AV.NUMERO DOS		110.00					0.00		
										110.00		
										TOTAL	110.00	
5.2	SONDEO DE TUBERÍA CON MEDIOS MECÁNICOS EN MATERIAL TIPO B EN SECO DE 0.00 A 3.00 MTS DE PROFUNDIDAD	PZAS	AV.NUMERO DOS					1.00		1.00		
										TOTAL	1.00	
5.3	EXCAVACION A MAQUINA EN MATERIAL TIPO COMUN SECO EN ZONA "C" DE 0.00 A 2.00 MTS. DE PROFUNDIDAD EN SECO	M3	AV.NUMERO DOS		110.00	0.60	0.55			36.30		
										TOTAL	36.30	
5.4	PLANTILLA APISONADA Y COMPACTADA CON PISON DE MANO Y AGUA, CON ESPESOR DE PROYECTO CON MATERIAL SELECCIONADO PRODUCTO DE LA EXCAVACION.	M3	AV.NUMERO DOS		110.00	0.60	0.10			6.60		
										TOTAL	6.60	

CONFORME:

ARQ. MARTIN ALBERTO DAGNINO FONSECA
REPRESENTANTE LEGAL

CONFORME:

ING. JOEL ERNESTO RUBIO ACOSTA
SUPERVISOR DE OBRAS PÚBLICAS

CONFORME:

JUAN MANUEL LOPEZ MENCHACA
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS



MUNICIPIO DE SINALOA
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
ESTIMACION DE OBRA



OBRA: CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO ASFALTICO EN AVENIDA NUMERO DOS ENTRE CALLE NUMERO DOS Y CALLE NUMERO TRES EN LA LOCALIDAD DE AGUA FRIA, MUNICIPIO DE SINALOA.

CONTRATO: IPR-DOP-SIN-2024-007

IMPORTE: \$ 1,626,957.96 MAS I.V.A.

ESTIMACIÓN No.: 1 (UNO)

PERIODO CONTRATO: DEL 09 DE DICIEMBRE DEL 2024 AL 06 DE FEBRERO DEL 2025.

FECHA 17 DE ENERO DEL 2025.

CALCULÓ: ARQ. OMAR ISIDRO DAGNINO FONSECA



DAGBA CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.
CALLE IGNACIO ZAPALOTLA # 200-1, COL. CENTRO, GUASAVE, SINALOA, MEXICO C.P. 81000
(C4C) 154-43-51

HOJA: 3 DE 5

GENERADORES DE OBRA

CLAVE	DESCRIPCION	UNIDAD	TRAMO	EJE	LARGO	ANCHO	ALTO	PIEZA	AREA	RESULTADO		OBSERVACIONES
										PARCIAL	TOTAL	
5.5	RELLENO ACOSTILLADO Y COMPACTADO AL 95% PROCTOR CON EQUIPO MECANICO, CON MATERIAL SELECCIONADO PRODUCTO DE LA EXCAVACION, INCLUYE PRUEBA DE LABORATORIO	M3	AV.NUMERO DOS		110.00	0.60	0.25			16.50		
										TOTAL	16.50	
5.6	RELLENO A VOLTEO A MAQUINA CON MATERIAL SELECCIONADO PRODUCTO DE LA EXCAVACION.	M3	AV.NUMERO DOS		110.00	0.60	0.20			13.20		
										TOTAL	13.20	
6.-	TUBERIAS											
6.1	SUMINISTRO DE TUBERIA DE PVC HIDRAULICO CON CAMPANA ANGER 3", RD-32.5, INCLUYE ANILLO CUMPLIENDO CON LAS NORMAS DE CNA Y EL IMTA.	ML	AV.NUMERO DOS		110.00					110.00		
										TOTAL	110.00	
6.2	INSTALACION JUNTEO Y PRUEBA DE TUBERIA DE PVC HIDRAULICO CON CAMPANA ANGER 3" RD-32.5, INCLUYE ANILLO CUMPLIENDO CON LAS NORMAS DE CNA Y EL IMTA	ML	AV.NUMERO DOS		110.00					110.00		
										TOTAL	110.00	
6.7	SUMINISTRO E INSTALACION DE PIEZA ESPECIAL DE CRUZ DE 3" X 3" DE PVC HIDRAULICA, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA	PZA	AV.NUMERO DOS					2.00		2.00		
										TOTAL	2.00	
7.-	TOMAS DOMICILIARIAS											
7.1	EXCAVACION Y RELLENO COMPACTADO PARA LA INSTALACION DE MATERIALES EN TOMA DOMICILIARIA.	ML	AV.NUMERO DOS		5.25			7.00		36.75		
										TOTAL	36.75	
7.2	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA EXTRUPAK RD-9 EN TOMA DOMICILIARIA.	ML	AV.NUMERO DOS		5.25			7.00		36.75		
										TOTAL	36.75	
7.3	TOMA DOMICILIARIA, INCLUYE: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LLAVE DE BANQUETA 1/2", BOTA DE FOF, TUBO GAL DE 1/2", 3 CODOS DE 90° DE 1/2" GALV, VÁLVULA LIMITADORA DE BRONCE DE 1/2", MEDIDOR DE 1/2", TEE DE 1/2" GALV, MANGUERA DE 4 MTS, LLAVE DE JARDÍN DE 1/2" EN BRONCE, ADAPTADOR YUCATAN DE 1/2", PLANTILLA Y RELLENO DE ZANJA PRODUCTO DE BANCO	PZA	AV.NUMERO DOS					7.00		7.00		
										TOTAL	7.00	

CONFORME:

ARQ. MARTIN ALBERTO DAGNINO FONSECA
REPRESENTANTE LEGAL

CONFORME:

ING. JOEL ERNESTO RUBIO ACOSTA
SUPERVISOR DE OBRAS PÚBLICAS

CONFORME:

JUAN MANUEL LOPEZ MENCHACA
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS



MUNICIPIO DE SINALOA
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
ESTIMACION DE OBRA



OBRA: CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO ASFALTICO EN AVENIDA NUMERO DOS ENTRE CALLE NUMERO DOS Y CALLE NUMERO TRES EN LA LOCALIDAD DE AGUA FRIA, MUNICIPIO DE SINALOA.

CONTRATO: IPR-DOP-SIN-2024-007

IMPORTE: \$ 1,626,957.96 MAS I.V.A.

ESTIMACIÓN No.: 1 (UNO)

PERIODO CONTRATO: DEL 09 DE DICIEMBRE DEL 2024 AL 06 DE FEBRERO DEL 2025.

FECHA 17 DE ENERO DEL 2025.

CALCULÓ: ARQ. OMAR ISIDRO DAGNINO FONSECA



DAGBA CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.
CALLE IGNACIO ZAPATA # 200-1, COL. CENTRO, GUASAVE, SINALOA, MEXICO C.P. 81000
(C.A.C.) 154-43-51

HOJA: 4 DE 5

GENERADORES DE OBRA

CLAVE	DESCRIPCION	UNIDAD	TRAMO	EJE	LARGO	ANCHO	ALTO	PIEZA	AREA	RESULTADO		OBSERVACIONES
										PARCIAL	TOTAL	
	SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO											
8.-	PRELIMINARES											
8.1	TRAZO Y NIVELACION CON LA FINALIDAD DE EFECTUAR TRABAJOS DE ALCANTARRILLADO SANITARIO, ESTABLECIENDO BANCOS DE NIVEL A UN MAXIMO DE 3.00 MTS. ENTRE BANCO Y BANCO.	ML	AV.NUMERO DOS		110.00					0.00	110.00	
										TOTAL	110.00	
8.2	SONDEO DE TUBERÍA CON MEDIOS MECÁNICOS EN MATERIAL TIPO B EN SECO DE 0.00 A 3.00 MTS DE PROFUNDIDAD.	PZAS	AV.NUMERO DOS					1.00		1.00	1.00	
										TOTAL	1.00	
8.3	EXCAVACION A MAQUINA EN MATERIAL TIPO COMUN SECO EN ZONA "B" DE 0.00 A 2.00 MTS. DE PROFUNDIDAD.	M³	AV.NUMERO DOS		110.00	0.60	0.40			26.40	26.40	
										TOTAL	26.40	
8.4	PLANTILLA DE ARENA DE 10 CMS DE ESPESOR, APISONADA Y COMPACTADA CON PISON DE MANO.	M³	AV.NUMERO DOS		110.00	0.60	0.10			6.60	6.60	
										TOTAL	6.60	
8.5	RELLENO ACOSTILLADO Y COMPACTADO AL 95% PROCTOR CON EQUIPO MECANICO, CON MATERIAL SELECCIONADO PRODUCTO DE LA EXCAVACION, INCLUYE PRUEBA DE LABORATORIO.	M³	AV.NUMERO DOS		110.00	0.60	0.30			19.80	19.80	
										TOTAL	19.80	
9.-	TUBERIAS											
9.1	SUMINISTRO DE TUBERIA DE PVC DE 8" SERIE 20.	ML	AV.NUMERO DOS		110.00					110.00	110.00	
										TOTAL	110.00	
9.2	INSTALACION, JUNTEO Y PRUEBA DE TUBERIA DE PVC DE 8" SERIE 20.	ML	AV.NUMERO DOS		110.00					110.00	110.00	
										TOTAL	110.00	
10.-	DESCARGAS DOMICILIARIAS											
10.1	CONSTRUCCION DE DESCARGA DOMICILIARIA CON TUBERIA DE 6" SERIE 20, INTERCONECTADA A TUBERIA DE 8" SERIE 20, INCLUYE: EXCAVACION, PLANTILLA, ACOSTILLADO Y VOLTEO.	ML	AV.NUMERO DOS		4.50			7.00		31.50	31.50	
										TOTAL	31.50	

CONFORME:

ARQ. MARTIN ALBERTO DAGNINO FONSECA
REPRESENTANTE LEGAL

CONFORME:

ING. JOEL ERNESTO RUBIO ACOSTA
SUPERVISOR DE OBRAS PÚBLICAS

CONFORME:

JUAN MANUEL LOPEZ MENCHACA
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS



MUNICIPIO DE SINALOA
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
ESTIMACION DE OBRA



OBRA: CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO ASFALTICO EN AVENIDA NUMERO DOS ENTRE CALLE NUMERO DOS Y CALLE NUMERO TRES EN LA LOCALIDAD DE AGUA FRIA, MUNICIPIO DE SINALOA.

CONTRATO: IPR-DOP-SIN-2024-007

IMPORTE: \$ 1,626,957.96 MAS I.V.A.

ESTIMACIÓN No.: 1 (UNO)

PERIODO CONTRATO: DEL 09 DE DICIEMBRE DEL 2024 AL 06 DE FEBRERO DEL 2025.

FECHA 17 DE ENERO DEL 2025.

CALCULÓ: ARQ. OMAR ISIDRO DAGNINO FONSECA



DAGBA CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.
CALLE IGNACIO DAPAGUZA # 200-1, COL. CENTRO, GUASAVE, SINALOA, MEXICO C.P. 81000
(CAG) 154-43-51

HOJA: 5 DE 5

GENERADORES DE OBRA

CLAVE	DESCRIPCION	UNIDAD	TRAMO	EJE	LARGO	ANCHO	ALTO	PIEZA	AREA	RESULTADO		OBSERVACIONES
										PARCIAL	TOTAL	
10.2	SUMINISTRO DE TUBERIA DE PVC DE 6" SERIE 20 PARA CONSTRUCCION DE DESCARGA DOMICILIARIA.	ML	AV.NUMERO DOS		4.50			7.00		31.50		
										TOTAL	31.50	
10.3	SUMINISTRO E INSTALACION DE PIEZAS ESPECIALES PARA DESCARGA DOMICILIARIA DE 6" PARA SER INTERCONECTADAS A TUBERIA DE 8" SERIE 20: CODO DE PVC DE 45°X6" Y YEE DE 8°X6".	LOTE	AV.NUMERO DOS					7.00		7.00		
										TOTAL	7.00	
10.4	SUMINISTRO DE MATERIALES Y CONSTRUCCION DE REGISTROS DE 0.60 X 0.40 MTS DE PROFUNDIDAD VARIABLE. A BASE DE TABIQUE ROJO RECOCIDO JUNTEADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA PROPORCION 1:3 CON BASE DE CONCRETO DE 0.10 MTS. DE ESPESOR ACABADO INTERIOR PULIDO CON CEMENTO- ARENA 1:3 Y MARCO Y CONTRAMARCO CON SOLERA DE 3" A 45° Y TAPA CON CONCRETO F'C= 200 KG/CM2 REFORZADA CON VARILLA DE 3/8" CORRUGADA @10 CM. INCLUYE EXCAVACIONES Y RELLENOS.	LOTE	AV.NUMERO DOS					7.00		7.00		
										TOTAL	7.00	
10.6	BROCALES Y TAPAS DE POZOS DE VISITA DE FIERRO FUNDIDO, INSTALACION MEDIANO CON TAPA CIEGA DE 135 KG	LOTE	AV.NUMERO DOS					1.00		1.00		
										TOTAL	1.00	
10.7	RENIVELACION DE POZO DE VISITA TIPO COMUN HASTA 2.00 MTS DE PROFUNDIDAD, INCLUYE: PLANTILLA DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2. APLANADO CON MORTERO CEM-ARENA PRP. 1:3 ACABADO INTERIOR PULIDO, ESCALON TIPO MARINO.	LOTE	AV.NUMERO DOS					1.00		1.00		
										TOTAL	1.00	

CONFORME:

ARQ. MARTIN ALBERTO DAGNINO FONSECA
REPRESENTANTE LEGAL

CONFORME:

ING. JOEL ERNESTO RUBIO ACOSTA
SUPERVISOR DE OBRAS PÚBLICAS

CONFORME:

JUAN MANUEL LOPEZ MENCHACA
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS




MUNICIPIO DE SINALOA
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
ESTIMACION DE OBRA



OBRA: CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO ASFALTICO EN AVENIDA NUMERO DOS ENTRE CALLE NUMERO DOS Y CALLE NUMERO TRES EN LA LOCALIDAD DE AGUA FRIA, MUNICIPIO DE SINALOA.		<div><div>DAGBA CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V. CALLE IGNACIO ZARAGOZA # 200-1, COL. CENTRO, GUADALUPE, SINALOA, MEXICO C.P. 81000 (646) 104-43-51 info.dagba@gmail.com</div></div>
CONTRATO: IPR-DOP-SIN-2024-007	IMPORTE: \$ 1,626,957.96 MAS IVA	
ESTIMACIÓN No.: 1 (UNO)		
FECHA: 17 DE ENERO DEL 2025.	PERIODO: DEL 09 DE DICIEMBRE DEL 2024 AL 17 DE ENERO DEL 2025.	

REPORTE FOTOGRAFICO

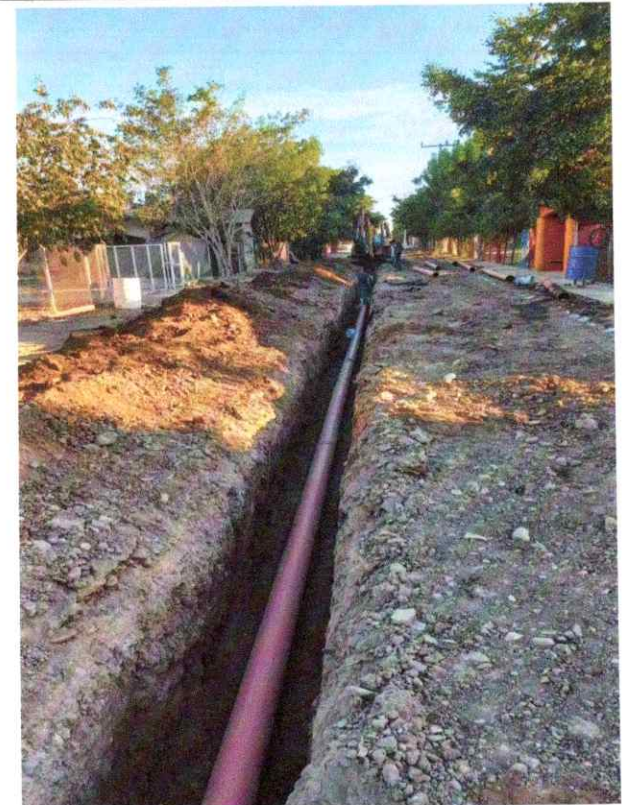

CONFORME:

ARQ. MARTIN ALBERTO DAGMINO FONSECA
REPRESENTANTE LEGAL

CONFORME:

ING. JOEL ERNESTO RUBIO ACOSTA
SUPERVISOR DE OBRAS PÚBLICAS

CONFORME:

JUAN MANUEL LOPEZ MENCHACA
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS



MUNICIPIO DE SINALOA
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
ESTIMACION DE OBRA



OBRA: CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO ASFALTICO EN AVENIDA NUMERO DOS ENTRE CALLE NUMERO DOS Y CALLE NUMERO TRES EN LA LOCALIDAD DE AGUA FRIA, MUNICIPIO DE SINALOA.



DAGBA CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.
CALLE IGNACIO ZARAGOZA # 200-1, COL. CENTRO, GUADALUPE, SIN. MEXICO C.P. 81000
(546) 154-43-51
construccion@dagba.com.mx

CONTRATO: IPR-DOP-SIN-2024-007

IMPORTE: \$ 1,626,957.96 MAS IVA

ESTIMACIÓN No.: 1 (UNO)

FECHA: 17 DE ENERO DEL 2025.

PERIODO: DEL 09 DE DICIEMBRE DEL 2024 AL 17 DE ENERO DEL 2025.

REPORTE FOTOGRAFICO



CONFORME:

ARQ. MARTIN ALBERTO DAGMINO FONSECA
REPRESENTANTE LEGAL

CONFORME:

ING. JOEL ERNESTO RUBIO ACOSTA
SUPERVISOR DE OBRAS PÚBLICAS

CONFORME:

JUAN MANUEL LOPEZ MENCHACA
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS



MUNICIPIO DE SINALOA
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
ESTIMACION DE OBRA



OBRA: CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO ASFALTICO EN AVENIDA NUMERO DOS ENTRE CALLE NUMERO DOS Y CALLE NUMERO TRES EN LA LOCALIDAD DE AGUA FRIA, MUNICIPIO DE SINALOA.

CONTRATO: IPR-DOP-SIN-2024-007

IMPORTE: \$ 1,626,957.96 MAS IVA

ESTIMACIÓN No.: 1 (UNO)

FECHA: 17 DE ENERO DEL 2025.

PERIODO: DEL 09 DE DICIEMBRE DEL 2024 AL 17 DE ENERO DEL 2025.



DAGBA CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.
CALZ. SINALOA ZAPAGOZA # 200-1, COL. CENTRO, GUADALUPE, SINALOA, MEXICO C.P. 81000
(646) 184-43-51
info@dagba.com.mx

REPORTE FOTOGRAFICO



CONFORME:

ARQ. MARTIN ALBERTO DAGMINO FONSECA
REPRESENTANTE LEGAL

CONFORME:

ING. JOEL ENRIQUE RUBIO ACOSTA
SUPERVISOR DE OBRAS PÚBLICAS

CONFORME:

JUAN MANUEL LOPEZ MENCHACA
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS



MUNICIPIO DE SINALOA
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
ESTIMACION DE OBRA



OBRA: CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO ASFALTICO EN AVENIDA NUMERO DOS ENTRE CALLE NUMERO DOS Y CALLE NUMERO TRES EN LA LOCALIDAD DE AGUA FRIA, MUNICIPIO DE SINALOA.

CONTRATO: IPR-DOP-SIN-2024-007

IMPORTE: \$ 1,626,957.96 MAS IVA

ESTIMACIÓN No.: 1 (UNO)

FECHA: 17 DE ENERO DEL 2025.

PERIODO: DEL 09 DE DICIEMBRE DEL 2024 AL 17 DE ENERO DEL 2025.



DAGBA CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.
CALLE IGNACIO ZARAGOZA # 200-1, COL. CENTRO, GUASAVE, SIN. MEXICO C.P. 81000
(646) 124-43-81
email: dagba@dagba.com

REPORTE FOTOGRAFICO



CONFORME:

ARQ. MARTIN ALBERTO DAGNINO FONSECA
REPRESENTANTE LEGAL

CONFORME:

ING. JOEL ERNESTO RUBIO ACOSTA
SUPERVISOR DE OBRAS PÚBLICAS

CONFORME:

JUAN MANUEL LOPEZ MENCHACA
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS



MUNICIPIO DE SINALOA
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
ESTIMACION DE OBRA



OBRA: CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO ASFALTICO EN AVENIDA NUMERO DOS ENTRE CALLE NUMERO DOS Y CALLE NUMERO TRES EN LA LOCALIDAD DE AGUA FRIA, MUNICIPIO DE SINALOA.

CONTRATO: IPR-DOP-SIN-2024-007

IMPORTE: \$ 1,626,957.96 MAS IVA

ESTIMACIÓN No.: 1 (UNO)


FECHA: 17 DE ENERO DEL 2025.

PERIODO: DEL 09 DE DICIEMBRE DEL 2024 AL 17 DE ENERO DEL 2025.



DAGBA CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.
CALLE IGNACIO ZARAGOZA # 200-1, COL. CENTRO, GUADALUPE, SINALOA, S.N.L. 81000
(646) 184-43-51
info.dagba@hotmail.com

REPORTE FOTOGRAFICO

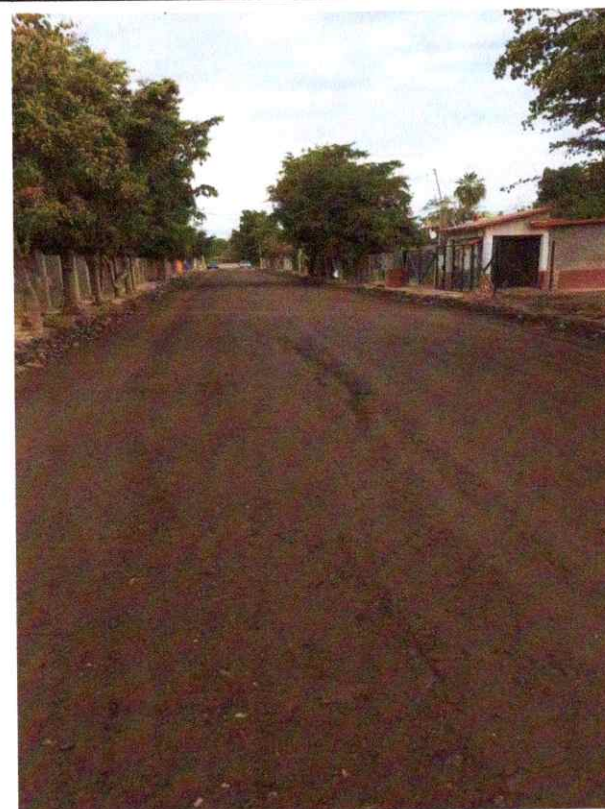

CONFORME:

ARQ. MARTIN ALBERTO DAGMINO FONSECA
REPRESENTANTE LEGAL

CONFORME:

ING. JOEL ERNESTO RUBIO ACOSTA
SUPERVISOR DE OBRAS PÚBLICAS

CONFORME:

JUAN MANUEL LOPEZ MENCHACA
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS



MUNICIPIO DE SINALOA
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
ESTIMACION DE OBRA



OBRA: CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO ASFALTICO EN AVENIDA NUMERO DOS ENTRE CALLE NUMERO DOS Y CALLE NUMERO TRES EN LA LOCALIDAD DE AGUA FRIA, MUNICIPIO DE SINALOA.

CONTRATO: IPR-DOP-SIN-2024-007

IMPORTE: \$ 1,626,957.96 MAS IVA

ESTIMACIÓN No.: 1 (UNO)

FECHA: 17 DE ENERO DEL 2025.

PERIODO: DEL 09 DE DICIEMBRE DEL 2024 AL 17 DE ENERO DEL 2025.



DAGBA CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.

CALLE IGNACIO ZARAGOZA # 200-1, COL. CENTRO, GUADALUPE, S.N. MEXICO C.P. 81000
(646) 104-43-51 info.dagba@gmail.com

REPORTE FOTOGRAFICO



CONFORME:

ARQ. MARTIN ALBERTO DAGNINO FONSECA
REPRESENTANTE LEGAL

CONFORME:

ING. JOEL ERNESTO RUBIO ACOSTA
SUPERVISOR DE OBRAS PÚBLICAS

CONFORME:

JUAN MANUEL LOPEZ MENCHACA
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS


LOCALIZACION

SIMBOLOGIA

-  EJE DE PROYECTO
-  CERCO
-  TUBERIA PVC DE 8"
-  REGISTROS SANITARIOS
-  RENIVELACION DE POZO

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A
 BASE DE CONCRETO ASFALTICO EN
 AVENIDA NUMERO DOS ENTRE CALLE
 NUMERO DOS Y CALLE NUMERO TRES
 EN LA LOCALIDAD DE AGUA FRIA,
 MUNICIPIO DE SINALOA.

CROQUIS DE ESTIMACION 1

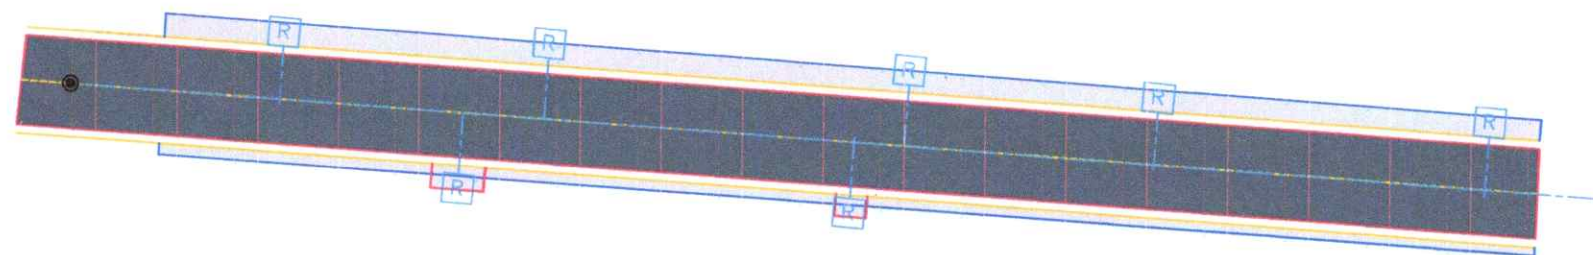

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]


LOCALIZACION

SIMBOLOGIA

-  EJE DE PROYECTO
-  CERCO
-  TUBERIA PVA DE 3"
-  TOMAS DOMICILIARIAS

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A
 BASE DE CONCRETO ASFALTICO EN
 AVENIDA NUMERO DOS ENTRE CALLE
 NUMERO DOS Y CALLE NUMERO TRES
 EN LA LOCALIDAD DE AGUA FRIA,
 MUNICIPIO DE SINALOA.

CROQUIS DE ESTIMACION 1

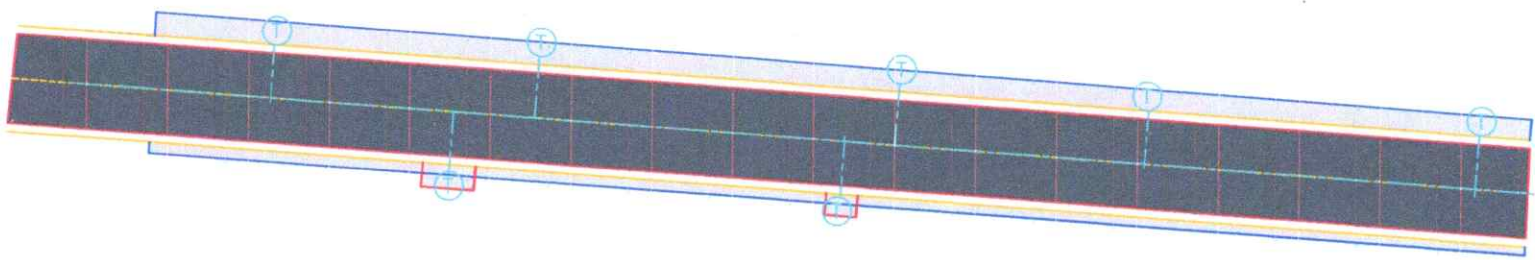

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Large handwritten mark or signature]
