



MUNICIPIO DE SINALOA
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
ESTIMACION DE OBRA



OBRA: CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO ASFALTICO EN AVENIDA NUMERO DOS ENTRE CALLE NUMERO DO
Y CALLE NUMERO TRES EN LA LOCALIDAD DE AGUA FRIA, MUNICIPIO DE SINALOA.



DAGBA CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.
CALLE IGNACIO ZARAGOZA # 200-I, COL. CENTRO, GUADALUPE, SIN. MEXICO C.P. 81000
(646) 184-43-51
info.dagba@gmail.com

CONTRATO: IPR-DOP-SIN-2024-007

PERIODO CONTRATO: DEL 09 DE DICIEMBRE DEL 2024 AL 06 DE FEBRERO

IMPORTE CONTRATO: \$1,884,651.30

CON I.V.A.

IMPORTE ANTICIPO: \$659,627.96

ESTIMACIÓN No.: 2 (FINIQUITO)

PERIODO: 17 DE ENERO AL 06 DE FEBRERO DEL 2025.

FECHA: 12 DE FEBRERO DEL 2025.

HOJA: 1 DE 1

ESTADO DE CUENTA

ESTIMACION	PERIODO	IMPORTE DE ESTIMACION	DEDUCCION DEL 3.0%				AMORTIZACION DEL ANTICIPO 35%	TOTAL DE DEDUCCIONES	LIQUIDO A PAGAR
ESTIMACION 1 (UNO)	09 DE DICIEMBRE DEL 2024 AL 17 DE ENERO DEL 2025.	\$ 840,069.75	\$ 21,725.94				\$ 294,024.41	\$ 315,750.35	\$ 524,319.40
ESTIMACION 2 (FINIQUITO)	17 DE ENERO AL 06 DE FEBRERO DEL 2025.	\$ 1,044,581.55	\$ 27,015.04				\$ 365,603.55	\$ 392,618.59	\$ 651,962.96
TOTALES		\$ 1,884,651.30	\$ 48,740.98				\$ 659,627.96	\$ 708,368.94	\$ 1,176,282.36
SALDO DEL CONTRATO:		\$0.00		SALDO POR AMORTIZAR DEL ANTICIPO			\$0.00		

CONFORME:

ARQ. MARTIN ALBERTO DAGNINO FONSECA
REPRESENTANTE LEGAL

CONFORME:

ING. JOEL ERNESTO RUBIO ACOSTA
SUPERVISOR DE OBRAS PÚBLICAS

CONFORME:

JUAN MANUEL LOPEZ MENCHACA
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS



MUNICIPIO DE SINALOA
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
ESTIMACION DE OBRA



OBRA: CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO ASFALTICO EN AVENIDA NUMERO DOS ENTRE CALLE NUMERO DOS Y CALLE NUMERO TRES EN LA LOCALIDAD DE AGUA FRIA, MUNICIPIO DE SINALOA.			 DAGBA CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V. <small>CALLE IGNACIO ZARAGOZA # 200-1, COL. CENTRO, GUADALUPE, SIN. MEXICO C.P. 81000 (546) 184-43-51 email.dagba@gmail.com</small>	
CONTRATO: IPR-DOP-SIN-2024-007	IMPORTE: \$1,624,699.40 MAS I.V.A.	PERIODO CONTRATO: DEL 09 DE DICIEMBRE DEL 2024 AL 06 DE F		
ESTIMACIÓN No.: 2 (FINIQUITO)	PERIODO: 17 DE ENERO AL 06 DE FEBRERO DEL 2025.	FECHA: 12 DE FEBRERO DEL 2025	HOJA: 1 DE 1	

RESUMEN GENERAL DE ESTIMACIÓN

\$ 900,501.34

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO ASFALTICO EN AVENIDA
NUMERO DOS ENTRE CALLE NUMERO DOS Y CALLE NUMERO TRES EN LA
LOCALIDAD DE AGUA FRIA, MUNICIPIO DE SINALOA.

SUB-TOTAL DE OBRA: \$ 900,501.34

I.V.A. (16%): \$ 144,080.21

TOTAL DE ESTIMACION: \$ 1,044,581.55

DEDUCCIONES:

AMORTIZACION DEL ANTICIPO 35% \$ 365,603.55

DEDUCCION DEL 3.0% \$ 27,015.04

Suma de deducciones \$ 392,618.59

Neto a pagar de esta estimacion: \$ 651,962.96

(Son: SEISCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL NOVECIENTOS SESENTA Y DOS PESOS 96/100 M.N.)

CONFORME:

ARO. MARTIN ALBERTO DAGNINO FONSECA
REPRESENTANTE LEGAL

CONFORME:

ING. JOEL ERNESTO RUBIO ACOSTA
SUPERVISOR DE OBRAS PÚBLICAS

CONFORME:

JUAN MANUEL LOPEZ MENCHACA
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS



MUNICIPIO DE SINALOA
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
ESTIMACION DE OBRA



OBRA: CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO ASFALTICO EN AVENIDA NUMERO DOS ENTRE CALLE NUMERO DOS Y CALLE NUMERO TRES EN LA LOCALIDAD DE AGUA FRIA, MUNICIPIO DE SINALOA.			 DAGBA CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V. <small>CALLE IGNACIO ZAPAGOTA # 200-1, COL. CENTRO, GUADALUPE, SIN. MEXICO C.P. 81000 (546) 184-43-81 email: info@dagba.com.mx</small>	
CONTRATO: IPR-DOP-SIN-2024-007	IMPORTE: \$1,624,699.40 MAS I.V.A.	PERIODO CONTRATO:	DEL 09 DE DICIEMBRE DEL 2024 AL 06 DE	
ESTIMACIÓN No.: 2 (FINIQUITO)	PERIODO EST: 17 DE ENERO AL 06 DE FEBRERO DEL 2025.	FECHA: 12 DE FEBRERO DEL 2025	HOJA: 1 DE 1	

RESUMEN DE ESTIMACIÓN

GUARNICION, BANQUETAS Y PAVIMENTOS	\$ 659,838.82
SEÑALIZACION	\$ 11,885.13
VARIOS	\$ 28,426.87
ALUMBRADO PUBLICO	\$ 200,350.52

SUB-TOTAL DE OBRA: \$ 900,501.34
I.V.A. (16%): \$ 144,080.21
TOTAL DE ESTIMACION: \$ 1,044,581.55

DEDUCCIONES:
AMORTIZACION DEL ANTICIPO 35% \$ 365,603.55
DEDUCCION DEL 3.0% \$ 27,015.04
Suma de deducciones \$ 392,618.59

Neto a pagar de esta estimacion: **\$ 651,962.96**
(Son: SEISCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL NOVECIENTOS SESENTA Y DOS PESOS 96/100 M.N.)

CONFORME:

ARQ. MARTIN ALBERTO DAGNINO FONSECA
REPRESENTANTE LEGAL

CONFORME:

ING. JOEL ERNESTO RUBIO ACOSTA
SUPERVISOR DE OBRAS PÚBLICAS

CONFORME:

JUAN MANUEL LOPEZ MENCHACA
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS



MUNICIPIO DE SINALOA
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
ESTIMACION DE OBRA



OBRA: CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO ASFALTICO EN AVENIDA NUMERO DOS ENTRE CALLE NUMERO DOS Y CALLE NUMERO TRES EN LA LOCALIDAD DE AGUA FRIA, MUNICIPIO DE SINALOA.			 DAGBA CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V. <small>CALLE ERASMO ZARAGOZA # 200 I, COL. CENTRO, GUADALUPE, SINALOA, S.N.L. MEXICO C.P. 81000 (646) 104-4518 www.dagbaconstructora.com</small>	
CONTRATO: IPR-DOP-SIN-2024-007	IMPORTE: \$ 1,624,699.40 MAS I.V.A.	PERIODO CONTRATO:	DEL 09 DE DICIEMBRE DEL 2024 AL 06 DE FEBRERO DEL 2025.	
ESTIMACIÓN No.: 2 (FINIQUITO)	PERIODO EST: 17 DE ENERO AL 06 DE FEBRERO DEL 2025.	FECHA: 12 DE FEBRERO DEL 2025.		

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	SEGUN PROYECTO	HASTA ESTA ESTIMACIÓN	HASTA LA ESTIMACIÓN ANTERIOR	EXCEDENTE	DE ESTA ESTIMACIÓN	P. U.	IMPORTE
2.-	GUARNICION, BANQUETAS Y PAVIMENTOS								
2.1	CONSTRUCCION DE GUARNICION DE CONCRETO F'C=300 KG/CM2 EN TRAMO RECTO CON PATIN DE 62 CM Y BORDILLO DE 15 CM INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y PRUEBAS.	ML	220.00	221.50		1.50	220.00	\$ 744.53	\$ 163,796.60
2.2	CONSTRUCCION DE BANQUETA DE CONCRETO F'C=200 KG/CM2 DE 10CM DE ESPESOR INCLUYE: EXCAVACIONES, TODOS LOS MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, PRUEBAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	203.71	250.55		46.84	203.71	\$ 608.03	\$ 123,861.79
2.5	CALAFATEO EN JUNTAS DE PAVIMENTOS A BASE DE ASFALTEX 505, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	ML	53.28	53.28		0.00	53.28	\$ 52.91	\$ 2,819.04
2.6	CONSTRUCCION DE CARPETA ASFALTICA DE 5 CMS DE ESPESOR. INCLUYE: CARGA Y ACARREO, HOMOGENIZADO, TENDIDO, COMPACTADO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	M3	50.51	50.86		0.35	50.51	\$ 7,236.58	\$ 365,519.66
2.7	DENTELLON DE CONCRETO F'C=300 KG/CM2.	ML	6.56	6.56		0.00	6.56	\$ 585.63	\$ 3,841.73
	TOTAL DE GUARNICION, BANQUETAS Y PAVIMENTOS								\$ 659,838.82
3.-	SEÑALIZACION								
3.1	PINTURA TIPO TRANSITO EN GUARNICION CON USO DE MAQUINA PINTARRAYAS.	ML	201.00	201.20		0.20	201.00	\$ 59.13	\$ 11,885.13
	TOTAL DE SEÑALIZACION:								\$ 11,885.13
4.-	VARIOS								
4.1	RETIRO DE TAPONES EN LOS EXTREMOS Y BARRIDO TOTAL DE LOS MISMOS	M3	33.60	33.60		0.00	33.60	\$ 55.31	\$ 1,858.42
4.2	LIMPIEZA TOTAL DE LA OBRA, INCLUYE: LA MANO DE OBRA NECESARIA.	M2	1,034.00	1,034.00		0.00	1,034.00	\$ 15.75	\$ 16,285.50
4.3	ROTULO DE INICIO DE OBRA A BASE DE UNA LAMINA CON VINIL CON INFORMACION BASICA DE LA OBRA COMO SE ANEXA EN EL CROQUIS DE 1.20 MTS DE LARGO POR 0.90 MTS DE ANCHO EN UNA BASE DE PTR DE 1" X 1" CAL. 14 DE 1.50 MTS DE LARGO Y SE AHOgara EN CONCRETO 30 CMS.	M2	1.00	1.00		0.00	1.00	\$ 5,216.40	\$ 5,216.40
4.4	SUMINISTRO E INSTALACION DE PLACA ALUSIVA A LA OBRA; INCLUYE: MATERIALES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	M2	1.00	1.00		0.00	1.00	\$ 3,868.56	\$ 3,868.56
4.5	DEMOLICION DE FIRME DE CONCRETO HIDRAULICO; INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, CARGA Y ACARREO AL 1ER KILOMETRO.	M2	6.47	6.47		0.00	6.47	\$ 185.16	\$ 1,197.99
	TOTAL DE VARIOS:								\$ 28,426.87
11.-	ALUMBRADO PUBLICO								

CONFORME:

ARG. MARTIN ALBERTO DAGNINO FONSECA
REPRESENTANTE LEGAL

CONFORME:

ING. JOEL ERNESTO RUBIO ACOSTA
SUPERVISOR DE OBRAS PÚBLICAS

CONFORME:

JUAN MANUEL LOPEZ MENCHACA
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS



MUNICIPIO DE SINALOA
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
ESTIMACION DE OBRA



OBRA: CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO ASFALTICO EN AVENIDA NUMERO DOS ENTRE CALLE NUMERO DOS Y CALLE NUMERO TRES EN LA LOCALIDAD DE AGUA FRIA, MUNICIPIO DE SINALOA.



DAGBA CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.
CALLE IGNACIO ZARAGOZA # 200 I, COL. CENTRO, GUADALUPE, SIN. MEXICO C.P. 81000
(C.A.E.) 1-94-48-81 email: dagba@dagba.com

CONTRATO: IPR-DOP-SIN-2024-007

IMPORTE: \$ 1,624,699.40 MAS I.V.A.

PERIODO DEL 09 DE DICIEMBRE DEL 2024 AL 06 DE FEBRERO DEL 2025.

ESTIMACIÓN No.: 2 (FINIQUITO)

PERIODO EST: 17 DE ENERO AL 06 DE FEBRERO DEL 2025.

FECHA: 12 DE FEBRERO DEL 2025.

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	SEGUN PROYECTO	HASTA ESTA ESTIMACIÓN	HASTA LA ESTIMACIÓN ANTERIOR	EXCEDENTE	DE ESTA ESTIMACIÓN	P. U.	IMPORTE
11.1	SUMINISTRO E INST. DE POLIDUCTO NARANJA REFORZADO DE 41 MM (1 1/2) INCLUYE EXCAVACION EN TERRENO TIPO II, CONCRETO FC=100 KG/CM2, RELLENO CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO	ML	95.00	95.00		0.00	95.00	\$ 63.58	\$ 6,040.10
11.2	SUMINISTRO E INST. DE CABLE AL XLP 2+1 CAL. 4 SUBTERRANEO INCLUYE MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO	ML	95.00	95.00		0.00	95.00	\$ 136.96	\$ 13,011.20
11.3	SUMINISTRO E INSTALACION DE ALIMENTADOR PARA MURETE INCLUYE: CABLE THW CAL. 4, VATHW. CAL 6, CABLE COBRE DESNUDO CAL. 8, TUBO PVC PESADO DE 1-1/2 EXCAVACION ENTERRENO TIPO II, CONCRETO FC=100 KG/CM2, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	MTS	10.00	10.00		0.00	10.00	\$ 695.33	\$ 6,953.30
11.4	SUMINISTRO E INST. DE SISTEMA DE TIERRA PARA FINAL DE CIRCUITO. INCLUYE: VARILLA PARA TIERRA 5/8" X 1.5 MTS. NORMAL, CONECTOR PARA VARILLA DE TIERRA MECANICO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	1.00	1.00		0.00	1.00	\$ 1,666.42	\$ 1,666.42
11.5	SUMINISTRO E INST. DE REGISTRO DE CONCRETO DE 40X40X40 CMS MEDIDAS EXTERIORES CON MARCO Y CONTRA MARCO DE FE, ANGULO 1 1/2 X 1/8" Y 1 1/4"X 1/8" INCLUYE MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO	PZA	4.00	4.00		0.00	4.00	\$ 2,106.12	\$ 8,424.48
11.6	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MURETE PRECOLADO PARA ALOJAR EQUIPO DE MEDICION, CONTROL Y RELEVADOR DE TIEMPO 0-5 HRS, INCLUYE: TUBOS CENTRO DE CARGA, INTERRUPTORES, GABINETES, PUERTA DE PROTECCION Y TODO LO NECESARIO PARA SU MEJOR FUNCIONAMIENTO.	PZA	1.00	1.00		0.00	1.00	\$ 22,676.01	\$ 22,676.01
11.7	PAGO C.F.E POR CONTRATACIÓN	LOTE	1.00	1.00		0.00	1.00	\$ 16,890.63	\$ 16,890.63
11.8	PAGO POR UNIDAD VERIFICACIÓN	LOTE	1.00	1.00		0.00	1.00	\$ 18,917.50	\$ 18,917.50
11.9	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BASE PIRAMIDAL PARA LUMINARIA, INCLUYE: BASE PIRAMIDAL 40X90X90, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	PZA	4.00	4.00		0.00	4.00	\$ 26,442.72	\$ 105,770.88
TOTAL DE ALUMBRADO PUBLICO:									\$ 200,350.52

Sub-total \$ 900,501.34
IVA (16%) \$ 144,080.21
Total: \$ 1,044,581.55

CONFORME:

ARQ. MARTIN ALBERTO DAGNINO FONSECA
REPRESENTANTE LEGAL

CONFORME:

ING. JOEL ERNESTO RUBIO ACOSTA
SUPERVISOR DE OBRAS PÚBLICAS

CONFORME:

JUAN MANUEL LOPEZ MENCHACA
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS



MUNICIPIO DE SINALOA
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
ESTIMACION DE OBRA



OBRA: CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO ASFALTICO EN AVENIDA NUMERO DOS ENTRE CALLE NUMERO DOS Y CALLE NUMERO TRES EN LA LOCALIDAD DE AGUA FRIA, MUNICIPIO DE SINALOA.

CONTRATO: IPR-DOP-SIN-2024-007

IMPORTE: \$ 1,624,699.40 MAS I.V.A.

ESTIMACIÓN No.: 2 (FINIQUITO)

PERIODO CONTRATO: DEL 09 DE DICIEMBRE DEL 2024 AL 06 DE FEBRERO DEL 2025.

FECHA 12 DE FEBRERO DEL 2025.

CALCULO: ARQ. OMAR ISIDRO DAGNINO MEZA



DAGBA CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.
CALLE IGNACIO ZARAGOZA # 200-1, COL. CENTRO, GUADALUPE, SIN. MEXICO C.P. 81000
(646) 184-43-51
email: sindagba@outlook.com

HOJA: 1 DE 3

GENERADORES DE OBRA

CLAVE	DESCRIPCION	UNIDAD	TRAMO	EJE	LARGO	ANCHO	ALTO	PIEZA	AREA	RESULTADO		OBSERVACIONES
										PARCIAL	TOTAL	
2.-	GUARNICION, BANQUETAS Y PAVIMENTOS											
2.1	CONSTRUCCION DE GUARNICION DE CONCRETO F'C=300 KG/CM2 EN TRAMO RECTO CON PATIN DE 62 CM Y BORDILLO DE 15 CM INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y PRUEBAS.	ML	AV.NUMERO DOS KM 0+000.00 AL 0+110.75		110.75			2.00		221.50		
										TOTAL	221.50	
2.2	CONSTRUCCION DE BANQUETA DE CONCRETO F'C=200 KG/CM2 DE 10CM DE ESPESOR INCLUYE: EXCAVACIONES, TODOS LOS MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, PRUEBAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M²	AV.NUMERO DOS									
			LADO IZQ		110.60	1.63				180.28		(1.75+1.50)/2
			MENOS MACETEROS		1.15	1.30				-1.50		
					1.00	0.76				-0.76		
					0.58	0.70				-0.41		
					0.62	0.54				-0.33		
					0.94	1.05				-0.99		
					0.75	0.94				-0.71		
					0.61	0.82				-0.50		
					1.02	0.64				-0.65		
			LADO DER									
					100.00	0.70				70.00		(0.80+0.60)/2
			ACCESO ESC.		3.86	1.05				4.05		
					2.30	0.90				2.07		
										TOTAL	250.55	
2.5	CALAFATEO EN JUNTAS DE PAVIMENTOS A BASE DE ASFALTEX 505, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	ML	GUARNICION LADO IZQUIERDO 110.75/3.00= (0.42+0.15+0.15)=		0.72			37.00		26.64		
			GUARNICION LADO DERECHO 110.75/3.00= (0.42+0.15+0.15)=		0.72			37.00		26.64		
										TOTAL	53.28	
2.6	CONSTRUCCION DE CARPETA ASFALTICA DE 5 CMS DE ESPESOR.INCLUYE: CARGA Y ACARREO, HOMOGENIZADO, TENDIDO, COMPACTADO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	M³	AV.NUMERO DOS KM 0+000.00 AL 0+110.75		110.75	6.56	0.07			50.86		(7.96+5.76)/2
										TOTAL	50.86	
2.7	DENTELLON DE CONCRETO F'C=300 KG/CM2.	ML	AV.NUMERO DOS		6.56					6.56		
										TOTAL	6.56	

CONFORME:

ARQ. MARTIN ALBERTO DAGNINO FONSECA
REPRESENTANTE LEGAL

CONFORME:

ING. JOEL ERNESTO RUBIO ACOSTA
SUPERVISOR DE OBRAS PÚBLICAS

CONFORME:

JUAN MANUEL LOPEZ MENCHACA
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS



MUNICIPIO DE SINALOA
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
ESTIMACION DE OBRA



OBRA: CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO ASFALTICO EN AVENIDA NUMERO DOS ENTRE CALLE NUMERO DOS Y CALLE NUMERO TRES EN LA LOCALIDAD DE AGUA FRIA, MUNICIPIO DE SINALOA.

CONTRATO: IPR-DOP-SIN-2024-007

IMPORTE: \$ 1,624,699.40 MAS I.V.A.

ESTIMACIÓN No.: 2 (FINIQUITO)

PERIODO CONTRATO: DEL 09 DE DICIEMBRE DEL 2024 AL 06 DE FEBRERO DEL 2025.

FECHA 12 DE FEBRERO DEL 2025.

CALCULÓ: ARQ. OMAR ISIDRO DAGNINO MEZA



DAGBA CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.
CALLE IGNACIO ZARAGOZA # 200-1, COL. CENTRO, GUADALUPE, SIN. MEXICO C.P. 81000
(646) 154-43-51
www.dagba.com.mx

HOJA: 2 DE 3

GENERADORES DE OBRA

CLAVE	DESCRIPCION	UNIDAD	TRAMO	EJE	LARGO	ANCHO	ALTO	PIEZA	AREA	RESULTADO		OBSERVACIONES
										PARCIAL	TOTAL	
3.-	SEÑALIZACION											
3.1	PINTURA TIPO TRANSITO EN GUARNICION CON USO DE MAQUINA PINTARRAYAS.	ML	AV.NUMERO DOS		100.60			2.00		201.20		
										TOTAL	201.20	
4.-	VARIOS											
4.1	RETIRO DE TAPONES EN LOS EXTREMOS Y BARRIDO TOTAL DE LOS MISMOS	ML	AV.NUMERO DOS									
				PROM.	10.50	0.80	4.00			33.60		
										TOTAL	33.60	
4.2	LIMPIEZA TOTAL DE LA OBRA, INCLUYE: LA MANO DE OBRA NECESARIA.	M²	AV.NUMERO DOS									
				IDEA AL CONCEPTO 1.1				1.00		1,034.00		
										TOTAL	1,034.00	
4.3	ROTULO DE INICIO DE OBRA A BASE DE UNA LAMINA CON VINIL CON INFORMACION BASICA DE LA OBRA COMO SE ANEXA EN EL CROQUIS DE 1.20 MTS DE LARGO POR 0.90 MTS DE ANCHO EN UNA BASE DE PTR DE 1" X 1" CAL. 14 DE 1.50 MTS DE LARGO Y SE AHOGARA EN CONCRETO 30 CMS.	PZA	AV.NUMERO DOS					1.00		1.00		
										TOTAL	1.00	
4.4	SUMINISTRO E INSTALACION DE PLACA ALUSIVA A LA OBRA; INCLUYE: MATERIALES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	PZA	AV.NUMERO DOS					1.00		1.00		
										TOTAL	1.00	
4.5	DEMOLICION DE FIRME DE CONCRETO HIDRAULICO; INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, CARGA Y ACARREO AL 1ER KILOMETRO.	M2	AV.NUMERO DOS									
					3.86	1.00				3.86		
					2.90	0.90				2.61		
										TOTAL	6.47	
11.-	ALUMBRADO PUBLICO											
11.1	SUMINISTRO E INST. DE POLIDUCTO NARANJA REFORZADO DE 41 MM (1 1/2) INCLUYE EXCAVACION EN TERRENO TIPO II, CONCRETO FC=100 KG/CM2, RELLENO CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO	ML	AV.NUMERO DOS		92.00					92.00		
										TOTAL	92.00	
11.2	SUMINISTRO E INST. DE CABLE AL XLP 2+1 CAL. 4 SUBTERRANEO INCLUYE MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO	ML	AV.NUMERO DOS		92.00					92.00		
										TOTAL	92.00	

CONFORME:

ARQ. MARTIN ALBERTO DAGNINO FONSECA
REPRESENTANTE LEGAL

CONFORME:

ING. JOEL ERNESTO RUBIO ACOSTA
SUPERVISOR DE OBRAS PÚBLICAS

CONFORME:

JUAN MANUEL LOPEZ MENCHACA
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

DAGBA CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.
 CALLE IGNACIO ZARAGOZA # 200-1, COL. CENTRO, GUADALUPE, S.N. MEXICO C.P. 51000
 (546) 154-43-51 info.dagba@gmail.com

CLAVE	DESCRIPCION	UNIDAD	TRAMO	EJE	LARGO	ANCHO	ALTO	PIEZA	AREA	RESULTADO		OBSERVACIONES
										PARCIAL	TOTAL	
11.3	SUMINISTRO E INSTALACION DE ALIMENTADOR PARA MURETE INCLUYE: CABLE THW CAL. 4, VATHW. CAL 6, CABLE COBRE DESNUDO CAL. 8, TUBO PVC PESADO DE 1-1/2 EXCAVACION ENTERRENO TIPO II, CONCRETO FC=100 KG/CM2, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	MTS	AV.NUMERO DOS		10.00					10.00		
										TOTAL	10.00	
11.4	SUMINISTRO E INST. DE SISTEMA DE TIERRA PARA FINAL DE CIRCUITO, INCLUYE: VARILLA PARA TIERRA 5/8" X 1.5 MTS. NORMAL, CONECTOR PARA VARILLA DE TIERRA MECANICO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA.	AV.NUMERO DOS					1.00		1.00		
										TOTAL	1.00	
11.5	SUMINISTRO E INST. DE REGISTRO DE CONCRETO DE 40X40X40 CMS MEDIDAS EXTERIORES CON MARCO Y CONTRA MARCO DE FE, ANGULO 1 1/2 X 1/8" Y 1 1/4"X 1/8" INCLUYE MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO	PZA.	AV.NUMERO DOS					4.00		4.00		
										TOTAL	4.00	
11.6	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MURETE PRECOLADO PARA ALOJAR EQUIPO DE MEDICION, CONTROL Y RELEVADOR DE TIEMPO 0-5 HRS, INCLUYE: TUBOS CENTRO DE CARGA, INTERRUPTORES, GABINETES, PUERTA DE PROTECCION Y TODO LO NECESARIO PARA SU MEJOR FUNCIONAMIENTO.	PZA.	AV.NUMERO DOS					1.00		1.00		
										TOTAL	1.00	
11.7	PAGO C.F.E POR CONTRATACIÓN	LOTE	AV.NUMERO DOS					1.00		1.00		
										TOTAL	1.00	
11.8	PAGO POR UNIDAD VERIFICACIÓN	LOTE	AV.NUMERO DOS					1.00		1.00		
										TOTAL	1.00	
11.9	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BASE PIRAMIDAL PARA LUMINARIA, INCLUYE: BASE PIRAMIDAL 40X90X90, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	PZA.	AV.NUMERO DOS					4.00		4.00		
										TOTAL	4.00	

JUAN MANUEL LOPEZ MENCHACA
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS



MUNICIPIO DE SINALOA
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
ESTIMACION DE OBRA



OBRA: CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO ASFALTICO EN AVENIDA NUMERO DOS ENTRE CALLE NUMERO DOS Y CALLE NUMERO TRES EN LA LOCALIDAD DE AGUA FRIA, MUNICIPIO DE SINALOA.

CONTRATO: IPR-DOP-SIN-2024-007

IMPORTE: \$ 1,624,699.40 MAS IVA

ESTIMACIÓN No.: 2 (FINIQUITO)

FECHA: 12 DE FEBRERO DEL 2025.

PERIODO: 17 DE ENERO AL 06 DE FEBRERO DEL 2025.



DAGBA CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.
CALLE IGNACIO SARAGOZA # 200-1, COL. CENTRO, GUANAJUATO, SINALOA, SINALOA, SINALOA, SINALOA
(546) 104-43-51 info@dagba.com.mx

REPORTE FOTOGRAFICO



CONFORME:

ARQ. MARTIN ALBERTO DAGMINO FONSECA
REPRESENTANTE LEGAL

CONFORME:

ING. JOEL ERNESTO RUBIO ACOSTA
SUPERVISOR DE OBRAS PÚBLICAS

CONFORME:

JUAN MANUEL LOPEZ MENCHACA
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS



MUNICIPIO DE SINALOA
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
ESTIMACION DE OBRA



OBRA: CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO ASFALTICO EN AVENIDA NUMERO DOS ENTRE CALLE NUMERO DOS Y CALLE NUMERO TRES EN LA LOCALIDAD DE AGUA FRIA, MUNICIPIO DE SINALOA.		 DAGBA CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V. CALLE IGNACIO SARAGOZA # 200-1, COL. CENTRO, GUADALUPE, SINALOA, MEXICO C.P. 81000 (646) 1184-43-51 construccion@dagba.com.mx
CONTRATO: IPR-DOP-SIN-2024-007	IMPORTE: \$ 1,624,699.40 MAS IVA	
ESTIMACIÓN No.: 2 (FINIQUITO)		
FECHA: 12 DE FEBRERO DEL 2025.	PERIODO: 17 DE ENERO AL 06 DE FEBRERO DEL 2025.	

REPORTE FOTOGRAFICO



CONFORME:

ARQ. MARTIN ALBERTO DAGNINO FONSECA
REPRESENTANTE LEGAL

CONFORME:

ING. JOEL ERNESTO RUBIO ACOSTA
SUPERVISOR DE OBRAS PÚBLICAS

CONFORME:

JUAN MANUEL LOPEZ MENCHACA
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS



MUNICIPIO DE SINALOA
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
ESTIMACION DE OBRA



OBRA: CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO ASFALTICO EN AVENIDA NUMERO DOS ENTRE CALLE NUMERO DOS Y CALLE NUMERO TRES EN LA LOCALIDAD DE AGUA FRIA, MUNICIPIO DE SINALOA.

CONTRATO: IPR-DOP-SIN-2024-007

IMPORTE: \$ 1,624,699.40 MAS IVA

ESTIMACIÓN No.: 2 (FINQUITO)


FECHA: 12 DE FEBRERO DEL 2025.

PERIODO: 17 DE ENERO AL 06 DE FEBRERO DEL 2025.



DAGBA CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.
CALLE IGNACIO ZAPAGODA # 200-1, COL. CENTRO, GUADALUPE, SIN. MEXICO C.P. 81000
(646) 104-43-51
info.dagba@telcel.com

REPORTE FOTOGRAFICO

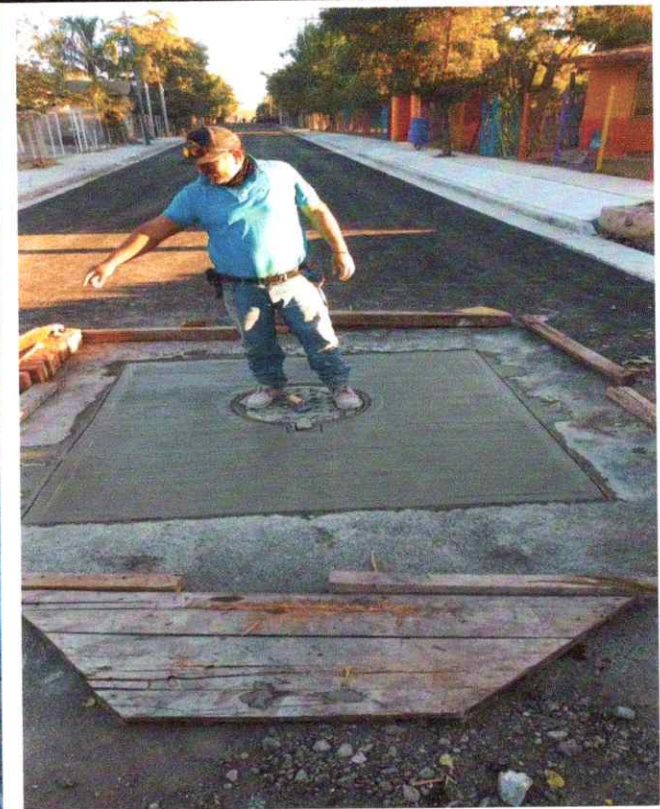

CONFORME:

ARQ. MARTIN ALBERTO DAGMINO FONSECA
REPRESENTANTE LEGAL

CONFORME:

ING. JOEL ERNESTO RUBIO ACOSTA
SUPERVISOR DE OBRAS PÚBLICAS

CONFORME:

JUAN MANUEL LOPEZ MENCHACA
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS



MUNICIPIO DE SINALOA
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
ESTIMACION DE OBRA



OBRA: CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO ASFALTICO EN AVENIDA NUMERO DOS ENTRE CALLE NUMERO DOS Y CALLE NUMERO TRES EN LA LOCALIDAD DE AGUA FRIA, MUNICIPIO DE SINALOA.		 <div>DAGBA CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V. CALLE IGNACIO ZARAGOZA # 200-1, COL. CENTRO, GUASAVE, SINALOA, MEXICO C.P. 81000 (646) 164-43-51 info.dagba@gmail.com</div>
CONTRATO: IPR-DOP-SIN-2024-007	IMPORTE: \$ 1,624,699.40 MAS IVA	
ESTIMACIÓN No.: 2 (FINIQUITO)		
FECHA: 12 DE FEBRERO DEL 2025.	PERIODO: 17 DE ENERO AL 06 DE FEBRERO DEL 2025.	

REPORTE FOTOGRAFICO



CONFORME:

ARQ. MARTIN ALBERTO DAGMINO FONSECA
REPRESENTANTE LEGAL

CONFORME:

ING. JOEL ERNESTO RUBIO ACOSTA
SUPERVISOR DE OBRAS PÚBLICAS

CONFORME:

JUAN MANUEL LOPEZ MENCHACA
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS




MUNICIPIO DE SINALOA
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
ESTIMACION DE OBRA



OBRA:		CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO ASFALTICO EN AVENIDA NUMERO DOS ENTRE CALLE NUMERO DOS Y CALLE NUMERO TRES EN LA LOCALIDAD DE AGUA FRIA, MUNICIPIO DE SINALOA.		<div><div>DAGBA CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V. CALLE IGNACIO ZARAGOZA # 200-1, COL. CENTRO, GUASAVE, SIN. MEXICO C.P. 81000 (646) 104-43-51 info.dagba@gmail.com</div></div>
CONTRATO: IPR-DOP-SIN-2024-007		IMPORTE: \$ 1,624,699.40 MAS IVA		
ESTIMACIÓN No.: 2 (FINIQUITO)				
FECHA: 12 DE FEBRERO DEL 2025.		PERIODO: 17 DE ENERO AL 06 DE FEBRERO DEL 2025.		

REPORTE FOTOGRAFICO

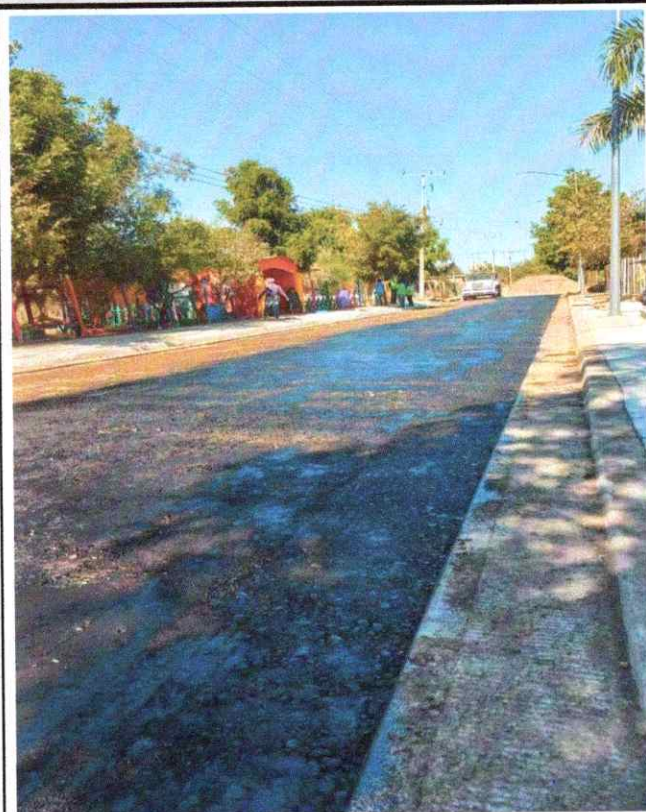

CONFORME:

ARQ. MARTIN ALBERTO DAGMINO FONSECA
REPRESENTANTE LEGAL

CONFORME:

ING. JOEL ERNESTO RUBIO ACOSTA
SUPERVISOR DE OBRAS PÚBLICAS

CONFORME:

JUAN MANUEL LOPEZ MENCHACA
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS



MUNICIPIO DE SINALOA
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
ESTIMACION DE OBRA



OBRA: CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO ASFALTICO EN AVENIDA NUMERO DOS ENTRE CALLE NUMERO DOS Y CALLE NUMERO TRES EN LA LOCALIDAD DE AGUA FRIA, MUNICIPIO DE SINALOA.		<div><div>DAGBA CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V. CALLE IGNACIO SARAGOZA # 200-1, COL. CENTRO, GUADALUPE, DIN. MEXICO C.P. 81000 (646) 104-43-51 info@dagba.com.mx</div></div>
CONTRATO: IPR-DOP-SIN-2024-007	IMPORTE: \$ 1,624,699.40 MAS IVA	
ESTIMACIÓN No.: 2 (FINIQUITO)		
FECHA: 12 DE FEBRERO DEL 2025.	PERIODO: 17 DE ENERO AL 06 DE FEBRERO DEL 2025.	

REPORTE FOTOGRAFICO



CONFORME:

ARQ. MARTIN ALBERTO DAGNINO FONSECA
REPRESENTANTE LEGAL

CONFORME:

ING. JOEL ERNESTO RUBIO ACOSTA
SUPERVISOR DE OBRAS PÚBLICAS

CONFORME:

JUAN MANUEL LOPEZ MENCHACA
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS


LOCALIZACION

SIMBOLOGIA

-  EJE DE PROYECTO
-  CERCO
-  CONCRETO F'C 300KG/CM2
-  CONCRETO F'C 200KG/CM2
-  BANQUETA EXISTENTE
-  BANCO DE NIVEL
-  POZO EXISTENTE
-  POSTE CFE

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO ASFALTICO EN AVENIDA NUMERO DOS ENTRE CALLE NUMERO DOS Y CALLE NUMERO TRES EN LA LOCALIDAD DE AGUA FRIA, MUNICIPIO DE SINALOA.


CROQUIS DE ESTIMACION 2

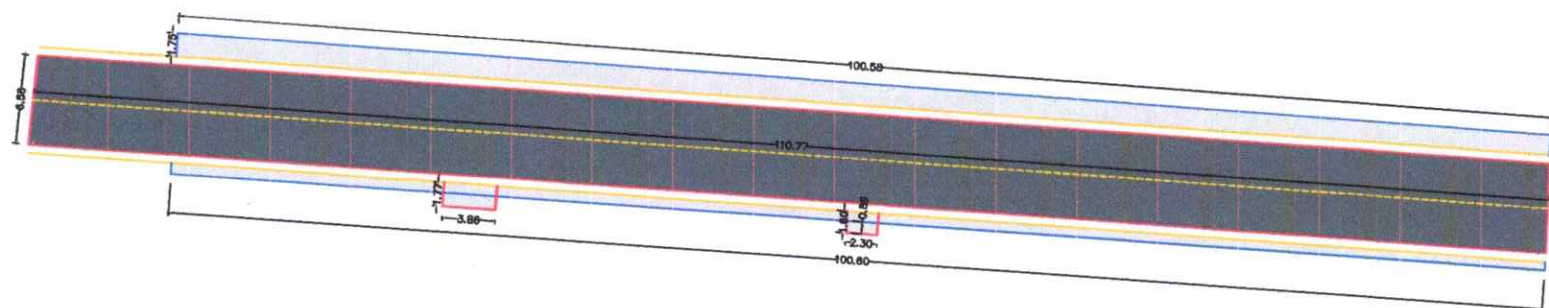

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



LOCALIZACION

SIMBOLOGIA

— EJE DE PROYECTO

— CERCOS

— CABLE XLP 2+1

□ LUMINARIA

□ MURETE

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A
BASE DE CONCRETO ASFALTICO EN
AVENIDA NUMERO DOS ENTRE CALLE
NUMERO DOS Y CALLE NUMERO TRES
EN LA LOCALIDAD DE AGUA FRIA,
MUNICIPIO DE SINALOA.

CRONIS DE ESTIMACION 2

