

UPPU - EST - LP - FEDNS - VIAL - 0703 - 2023

Obra: Rehabilitación de la carretera Navolato-
El castillo del km. 0+000 al km. 8+100. Tramo
Puerto Rico - Villamoros, Municipio de Navolato
Estado de Sinaloa

01.- Se pone a disposición vía (carretera) a
contratista para que inicie trabajos contemplados
en el contrato

02.- inician trabajos con preparación de caminos
alternos para desviar tráfico

Fecha: 20/Mar/2023

03.- Se trabaja en mebramiento de base
(sección invertida) de 20cms de espesor
agregando 10 cm de material triturado de
3/4 a 1/2" para formar una capa de 30cm

Fecha: 24/Mar/2023

04.- Continúan con mebramiento de base
(sección invertida)

Fecha: 27/Mar/2023

05.- Riego de impregnación y aseo los primeros
2.00 km y se trabaja en el km siguiente


Supervisor sop


Superintendente

Obra: Rehabilitación de la carretera Navolato -
El castillo del Km 0+000 al Km 8+100 tramo
Puerto rico - Villamoros, Municipio de Navolato
Estado de Sinaloa

06.- Mejoramiento de base seccion invertida en
Km 2+000 al 3+000 ya para impegnar

Fecha: 05/Abr/2023

07.- Tendido y compactacion de Carpeta Asfaltica
Mezcla caliente

Fecha: 08/Abr/2023

08.- Continuan con tendido y compactacion de
carpeta Asfaltica

Fecha: 11/Abr/2023


09.- Continuan con tendido de carpeta asfaltica
en caliente

Fecha: 14/Abr/2023

10.- Recibo Numeros generadores para estimacion
OI Normal Periodo del 15/03/2023 al 14/04/2023

Fecha: 17/Abr/2023

11.- Aprobacion de Numeros generadores para
estimacion OI Normal Periodo del 15/03/2023 al
14/04/2023


Supervisor SOP


Superintendente

OPPO - EST - LP - FEDNS - VIAL - 0703 - 2023

Obra: Rehabilitación de la Carretera Navolato -
El castillo del km. 0+000 al km 8+100 tramo
Puerto rico - Villamoros, Municipio de Navolato
estado de Sinaloa

12.- Recibo Estimacion 01 Normal, por un importe
de \$ 10,329,763.76 IVA incluido menos deduc-
iones de acuerdo al contrato periodo del
15/03/2023 al 14/04/2023

" AUTORIZACION DE ESTIMACION "


Supervisor SOP


Superintendente

20 Abr 2023

Obra: Rehabilitación de la carretera Navolato - El
castillo del km 0+000 al km 8+100. Tramo
Puerto rico - Villamoros, Municipio de Navolato
Estado de Sinaloa

13.- Continúan con mebramiento de base Sección
invertida de 20 cm de espesor

Fecha: 26 / Abr / 2023

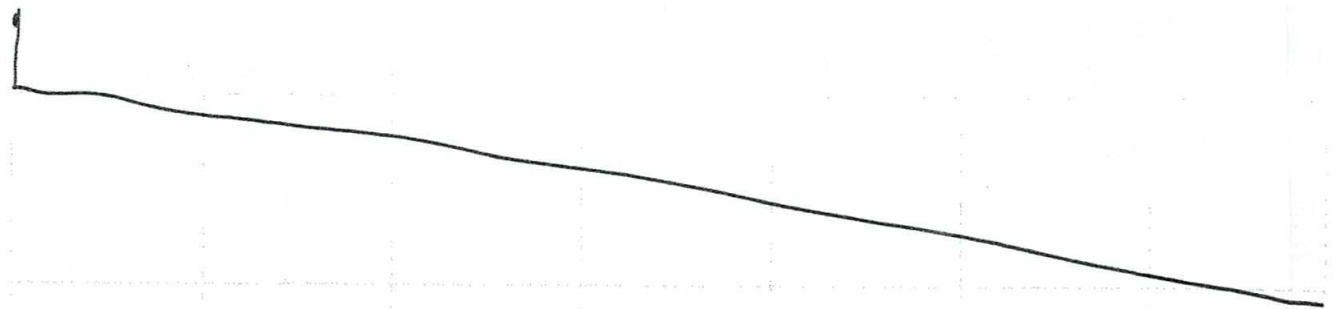
14.- Mezclado de material desgregado previamente
agregando le material triturado (Grava) en 50%

Fecha: 03 / Mayo / 2023


15.- Tendido y compactación de material desgregado
mejorado con material Gravas trituradas.
Se programa Para impregnar km 3+000 →

Fecha: 08 / Mayo / 2023

16.- Tendido de Carpete asfáltica Mezcla caliente
km 3+000 → cuerpo derecho




SUPERVISOR SOP.


Superintendente

OPPV-EST-LP-FEDNS-VIAL-0703-2023

Obra: Rehabilitación de la carretera Navolato -
El castillo del km 0+000 al km 8+100 tramo
Puerto Rico - Villamoros, Municipio de Navolato
Estado de Sinaloa

17.- Continúan con tendido y compactación de
material carpeta asfáltica km 3+000
lado izquierdo

18.- Recibo numeros generadores para estimacion
No. 02 Normal Periodo del 15 / Abril 2023 al
10 / Mayo / 2023


Fecha: 12 / Mayo / 2023

19.- Aprobacion de numeros generadores para Estimacion
02 Normal periodo del 15 / Abril / 2023 al
10 / Mayo / 2023

Fecha: 17 / Mayo / 2023

20.- Recibo Numeros generadores para estimacion 02
Normal por un importe de \$ 10,379,888.77 IVA
incluido menos deducciones de acuerdo al
contrato Periodo del 15 / Abril / 2023 al
10 / Mayo / 2023

" Autorizacion de Estimacion "


SUPERVISOR SEP


Superintendente

OPPV-EST-LP-FEDNS-VIAL-0703-2023

Obra: Rehabilitación de la carretera Navolato-El castillo
del Km. 0+000 al Km. 8+100 tramo Puerto Rico
- villamora Municipio de Navolato Estado de Sinaloa

21.- Mejoramiento de base (sección vertida de 20
cm de espesor disgregando y recuperando añadiendo
10 cm de material triturado.) ya en finalizado
Km. 6+60.6.33

22.- Suministro, tendido y compactación de carpeta
asfáltica. Hasta la fecha registra un Avance del
80 %

Fecha: 31/ Mayo/2023

23.- Recibo Numeros generadores para estimacion N. 03
Normal Periodo del 11-05-2023 al 31-05-
2023

Fecha: 02/ Junio/2023

24.- Aprobacion de Numeros generadores para Estimacion
03 Normal Periodo del 11-05-2023 Al 31-05-2023

Fecha: 05/ Junio/2023

25.- Recibo Estimacion N. 03 Normal Por un importe
de \$638,651.92 IVA incluido menos deduc-
iones de acuerdo al contrato Periodo del
11-05-2023 al 31-05-2023

"Autorización de Estimación"


Supervisor SOP


Superintendente

Obra: Rehabilitación de la carretera Navolato -
el castillo del km. 0700 al km 8400 tramo
Puerto rico - Villamoros Municipio de Navolato
Estado de Sinaloa.

- 26.- Recibo solicitud de Precios Extraordinarios
Necesarios para la ejecución de la obra

Fecha: 13/Junio/2023

- 27.- continúan con tiro de carpeta asfáltica
(tendido y compactación)

Fecha: 21/Junio/2023

- 28.- Tendido y compactación de carpeta Asfáltica

Fecha: 30/Junio/2023

- 29.- Recibo Numeros generadores para estimación
04 Adicional periodo del 01/06/2023 al
30/06/2023

Fecha: 03/Julio/2023

- 30.- Aprobación de numeros generadores para estimación
04 Adicional Periodo del 01/06/2023 al
30/06/2023

Fecha: 06/Julio/2023

- 31.- Recibo Estimación No. 04 Adicional por un
importe de \$263,436.15 IVA incluido
menos deducciones de acuerdo al contrato
Periodo del 01/06/2023 al 30/06/2023

"Autorización de Estimación"


Supervisor SOP


Superintendente

OPPV-EST-LP-FEDNS-VIAL-0703-2023

Obra: Rehabilitación de la carretera Navolato - al castillo del km 0+000 al km 8+100 tramo Puerto Rico - Villamoros, Municipio de Navolato Estado de Sinaloa

32.- Carpeta esta terminada

33.- Se procede a Premarca para posteriormente marcado de raya central y lateral

Fecha: 11/Jul/2023

34.- Recibo solicitud por parte del contratista por convenio de Monto

Fecha: 19/Jul/2023

35.- Arapamiento de taludes con material de banco

Fecha: 25/Jul/2023

36.- instalacion de señalamientos verticales

Fecha: 01/Ago/2023

37.- Recibo numeros generadores para estimacion No. 05 Normal Periodo del 01/Jul/2023 al 01/Ago/2023

Fecha: 03/Ago/2023

38.- Aprobacion de numeros generadores para est. 05 Normal Periodo del 01/Jul/2023 al 01/Ago/2023

Fecha: 07/Ago/2023

39.- Recibo Estimacion No. 05 Normal por un importe de \$883,233.27 - IVA incluido Menos deducciones de acuerdo al contrato Periodo del 01/Jul/2023 al 01/Ago/2023

" Autorizacion de Estimacion "


Supervisor SOP


Superintendente

Obra: Rehabilitacion de la carretera Navolato - el castillo del km 0+000 al km 8+100 tramo Puerto rico - Villamoros, Municipio de Navolato Estado de Sinaloa

40.- Marcado de raya lateral continua de 10cm de Ancho color blanco

Fecha: 27 / Ago / 2023

41.- colocacion de violetas reflejantes Por las curvas

Fecha: 15 / sep / 2023

42.- Trabajos estan terminados

43.- Recibo Numeros generadores para estimacion No. 06 Finiquito Periodo del 02 / Ago / 2023 al 15 / sep / 2023

44.- Se cita a contratista en el lugar de la obra para el proximo 22 de sept. del presente Año para realizar Recorrido y verificar trabajos terminados y su calidad y si es el caso se procede a la entrega y Recepcion

Fecha: 22 / sep / 2023

45.- se realizo recorrido por la obra verificando trabajos terminados y su calidad. se procede a la entrega y Recepcion


Fecha: 29 / sep / 2023

46.- Recibo Estimacion No. 6 Finiquito por un importe de \$2,318,061.55 - IVA incluido menos deducciones de acuerdo al contrato Periodo del 02 / Ago / 2023 al 15 / sep / 2023

"Autorizacion de Estimacion"

47.- Se declara Cerrada esta bitacora


Supervisor SLP


Superintendente
