

ERNESTO ALONSO BORQUEZ GUTIERREZ

AV. RAMON CORONA S/N. BAMOA PUEBLO,
GUASAVE, SINALOA C.P. 81140



H. AYUNTAMIENTO DE GUASAVE
JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DE GUASAVE

ESTADO DE CUENTA

CONTRATO: JUMAPAG/R33/52/2025
OBRA: AMPLIACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE PARA LA LOCALIDAD EL
SABINO, MUNICIPIO DE GUASAVE, SINALOA.

UBICACION: EL SABINO, MUNICIPIO DE GUASAVE, SINALOA.

IMPORTE DE CONTRATO CON IVA: \$972,812.96
IMPORTE DE ANTICIPO CON IVA: \$486,406.48

FECHA: 15 DE DICIEMBRE DE 2025

ESTIMACION	PERIODO	IMPORTE C/IVA ESTIMACIONES	0.2% C.M.I.C. S/IVA	AMORTIZACION ANTICIPO C/IVA	OTROS	TOTAL DEDUCCIONES	LIQUIDO A PAGAR
No:							
UNO	10/12/2025 - 15/12/2025	\$144,851.52		\$72,425.76	\$0.00	\$72,425.76	\$72,425.76

TOTALES		\$144,851.52	\$0.00	\$72,425.76	\$0.00	\$72,425.76	\$72,425.76
SALDO OBRA		\$827,961.44					
SALDO POR AMORTIZAR				\$413,980.72			

ING. CLAUDIA MARTINA CERVANTES LEYVA
GERENTE TECNICO JUMAPAG
CONFORME

ING. VIANEY DENISSE LEYVA CERVANTES
SUPERVISOR DE OBRAS JUMAPAG
AUTORIZO

ING. JOSÉ DE JESÚS LÓPEZ PEREZ
JEFE DE SUPERVISION
REVISÓ

ING. ERNESTO ALONSO BORQUEZ GUTIERREZ
CONTRATISTA
ELABORO

ING. JUAN MANUEL MEDINA GERARDO
COORDINADOR DE P.C.O.
Vo. Bo.

ERNESTO ALONSO BORQUEZ GUTIERREZ



AV. RAMON CORONA S/N. BAMOA PUEBLO, GUASAVE, SINALOA C.P. 81140
CONTROL ACUMULATIVO DE ESTIMACIONES

ESTIMACION NUM. 1 (UNO)

PERIODO DEL : DEL 10 DE DICIEMBRE AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2025

IMPORTE:

\$72,426.76

LUGAR: EL SABINO, GUASAVE, SIN.

CONTRATISTA: ERNESTO ALONSO BORQUEZ GUTIERREZ

IMPORTE:

\$72,426.76

OBRA: AMPLIACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE PARA LA LOCALIDAD EL SABINO, MUNICIPIO DE GUASAVE, SINALOA

CONTRATO N°: JUMAPAG/R33/62/2025

IMPORTE:

\$72,426.76

PRESUPUESTO: \$838,631.86 SIN INCLUIR I.V.A. CANTIDAD DE OBRA ESTIMACION ANTERIOR ESTIMACION ESTIMACION PRECIO UNITARIO IMPORTE IMPORTE TOTAL 15/12/2025

NUMERO	PARTIDA DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD DE OBRA				PRECIO UNITARIO	IMPORTE		
			SEGUN PROYECTO	HASTA ESTA ESTIMACION	ESTIMACION ANTERIOR	ESTA ESTIMACION		IMPORTE TOTAL		
1. PRELIMINARES										
1.1	TRAZO DE TERRENO CON LA FINALIDAD DE EFECTUAR TRABAJOS DE AGUA POTABLE	ML	1210.00				\$ 10.48	\$	-	
1.2	EXCAVACION A MAQUINA EN MATERIAL TIPO COMUN SECO EN ZONA "B" DE 0.00 A 2.00 MTS DE PROFUNDIDAD	M3	940.68				\$ 79.79	\$	-	
1.3	PLANTILLA ARISONADA Y COMPACTADA CON PISON DE MANO Y AGUA, CON ESPESOR DE PROYECTO CON MATERIAL SELECCIONADO PRODUCTO DE LA EXCAVACION.	M3	78.39				\$ 257.17	\$	-	
1.4	RELLENO ACOSTILLADO Y COMPACTADO CON PISON DE MANO Y AGUA EN CAPAS DE 20 CM. DE ESPESOR CON MATERIAL SELECCIONADO PRODUCTO DE LA EXCAVACION	M3	313.56				\$ 296.53	\$	-	
1.5	RELLENO A VOLTEO A MAQUINA CON MATERIAL SELECCIONADO PRODUCTO DE LA EXCAVACION	M3	549.00				\$ 42.72	\$	-	
2. TUBERIAS										
2.1	SUMINISTRO DE TUBERIA DE PVC HIDRAULICO CON CAMPANA ANGER 3" ø, RD-32.5, INCLUYE ANILLO CUMPLIENDO CON LAS NORMAS DE CNA Y EL IMTA	ML	1210.00			1,210.00	\$ 103.20	\$	124,872.00	
2.2	INSTALACIÓN JUNTEO Y PRUEBA DE TUBERIA DE PVC HIDRAULICO CON CAMPANA ANGER 3" ø, RD-32.5, INCLUYE ANILLO CUMPLIENDO CON LAS NORMAS DE CNA Y EL IMTA	ML	1210.00				\$ 32.04	\$	-	
3. PIEZAS ESPECIALES										
3.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CRUZ DE PVC DE 3" X 3" ø	PZA	1.00				\$ 1,037.38	\$	-	
3.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TEE DE PVC DE 3" X 3" ø	PZA	7.00				\$ 853.96	\$	-	
3.3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO DE PVC DE 90° X 3" ø	PZA	1.00				\$ 563.64	\$	-	
3.4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO DE PVC DE 45° X 3" ø	PZA	3.00				\$ 552.32	\$	-	
3.5	SUMINISTRO E INSTALACION DE COUPLE DE PVC DE 3"	PZA	3.00				\$ 309.33	\$	-	
3.6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPON CAMPANA DE PVC DE 3" ø	PZA	2.00				\$ 414.88	\$	-	
3.7	SUMINISTRO DE MATERIALES Y ELABORACIÓN DE ATAQUE DE CONCRETO SIMPLE (30X30X30) F'c=150 KG/CM²	PZA	14.00				\$ 351.66	\$	-	
							SUMA HOJA:	124,872.00		

NOTAS:

CONFORME: ING. CLAUDIA MARTHA CERVANTES LEIVA
GERENCIA TECNICA

LUGAR: GUASAVE, SINALOA
FECHA: 15/12/2025
AUTORIZO: ING. VIANEY DENISE LEIVA CERVANTES
SUPERVISOR DE OBRA
Vo.Bo: ING. JUAN MANUEL MEDINA GERRARDO
COORDINADOR DE PLANEACION Y CONTROL DE OBRA

ELABORO: C. ERNESTO ALONSO BORQUEZ GUTIERREZ
REPRESENTANTE LEGAL
REVISO: ING. JOSE DE JESUS LOPEZ PEREZ
JEFE DE SUPERVISION DE OBRA

CONTROL ACUMULATIVO DE ESTIMACIONES

IMPORTE: **\$72,425.76**

025

FECHA: 15/12/2025

[illegible]

Dealing with the

JUMAPAG

CONTROL ACUMULATIVO DE ESTIMACIONES

\$72,425.76

TOTAL HOJA: 72,425.76	
NOTAS:	<p>CONFORME: ING. CLAUDIA MARTINA CERVANTES LEYVA GERENCIA TECNICA</p> <p>LUGAR: GUASAVE, SIMALOA FECHA: 15/12/2025 AUTORIZO: ING. VANNEY DENISSE LEYVA CERVANTES SUPERVISOR DE OBRA</p> <p>Vo.Bo: ING. JUAN MANUEL MEDINA GERARDO COORDINADOR DE PLANEACION Y CONTROL DE OBRA</p> <p>ELABORO: C. ERNESTO ALONSO BORQUEZ GUTIERREZ REPRESENTANTE LEGAL</p> <p>REVISO: ING. JOSE DE JESUS LOPEZ PEREZ JEFE DE SUPERVISION DE OBRA</p>

JEFF DE SUPERVISION D

72.425.76

100

1997952

144,851.52 \$

72425 76

10

JUMAPAG

ESTIMACION NO: 1 (UNO)
PERIODO DE ESTIMACION:
DEL 10 DE DICIEMBRE AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2025

REVISOR: ING. JOSE DE JESUS LOPEZ PEREZ
JEFE DE SUPERVISION DE OBRA



OBRA: AMPLIACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE PARA LA LOCALIDAD EL SABINO,
MUNICIPIO DE GUASAVE, SINALOA.
UBICACIÓN: EL SABINO, MUNICIPIO DE GUASAVE, SINALOA.
CONTRATISTA: ERNESTO ALONSO BORQUEZ GUTIERREZ
IMPORTE DE CONTRATO: \$972,812.96 CON I.V.A.
PROGRAMA: RAMO 33
CONTRATO N°: JUMAPAG/R33/52/2025

ESTIMACION NO: 1 (UNO)
PERIODO DE ESTIMACION:

DEL 10 DE DICIEMBRE AL 16 DE DICIEMBRE DE 2026

CLAVE		CONCEPTO	UNIDAD	EJE	ENTRE	LARGO	ANCHO	ALTURA	PIEZA	CANTIDAD		OBSERVACION
										PARCIAL	TOTAL	

FOTOS



AUTORIZO:

ING. VANEY DENISSE LEIVA GERVANTES

SUPERVISOR DE OBRAS JUMAPAG

ELABORO:

C. ERNESTO ALONSO BORQUEZ GUTIERREZ

CONTRATISTA

REVISO:


ING. JOSE DE JESUS LOPEZ PEREZ

JEFE DE SUPERVISION DE OBRA

ESTIMACION NO:	1 (UNO)
PERIODO DE ESTIMACION:	
DEL 10 DE DICIEMBRE AL 15 DE DICIEMBRE E	

DEL 10 DE DICIEMBRE AL 15 DE DICIEMBRE DE 2025

ANEXOS

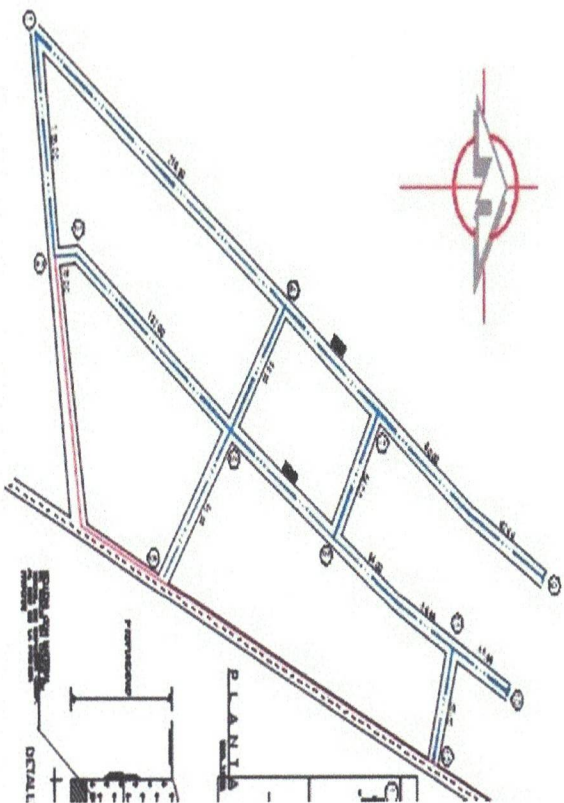

REVISO:
ING. JOSE DE JESUS LOPEZ BEREZ
JEFE DE SUPERVISION DE OBRA
