

ERNESTO ALONSO BORQUEZ GUTIERREZ

AV. RAMON CORONA S/N, BAMOA PUEBLO,
GUASAVE, SINALOA C.P. 81140

H. AYUNTAMIENTO DE GUASAVE
JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DE GUASAVE



ESTADO DE CUENTA

CONTRATO: JUMAPAG/R33/52/2025

OBRA: AMPLIACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE PARA LA LOCALIDAD EL
SABINO, MUNICIPIO DE GUASAVE, SINALOA.

UBICACION: EL SABINO, MUNICIPIO DE GUASAVE, SINALOA.

IMPORTE DE CONTRATO CON IVA: \$972,812.96

IMPORTE DE ANTICIPO CON IVA: \$486,406.48

FECHA: 31 DE DICIEMBRE DE 2025

ESTIMACIÓN No:	PERIODO	IMPORTE C/IVA ESTIMACIONES	0.2% C.M.I.C. S/IVA	AMORTIZACIÓN ANTICIPO C/IVA	OTROS	TOTAL DEDUCCIONES	LIQUIDO A PAGAR
UNO	10/12/2025 - 15/12/2025	\$144,851.52		\$72,425.76	\$0.00	\$72,425.76	\$72,425.76
DOS(FINQUITO)	16/12/2025 - 31/12/2025	\$827,961.44		\$413,980.72	\$0.00	\$413,980.72	\$413,980.72

TOTALES		\$972,812.96	\$0.00	\$486,406.48	\$0.00	\$486,406.48	\$486,406.48
SALDO OBRA		\$0.00					
SALDO POR AMORTIZAR				\$0.00			

ING. CLAUDIA MARTINA CERVANTES LEYVA
GERENTE TECNICO JUMAPAG
CONFORME

ING. VIANEY DENISSE LEYVA CERVANTES
SUPERVISOR DE OBRAS JUMAPAG
AUTORIZO

ING. JOSÉ DE JESÚS LÓPEZ PÉREZ
JEFE DE SUPERVISION
REVISÓ

ING. JUAN MANUEL MEDINA GERARDO
COORDINADOR DE P.C.O.
Vo. Bo.

ING. ERNESTO ALONSO BORQUEZ GUTIERREZ
CONTRATISTA
ELABORÓ



ERNESTO ALONSO BORQUEZ GUTIERREZ

AV. RAMON CORONA S/N, BAMOA PUEBLO, GUASAVE, SINALOA C.P. 84140

CONTROL ACUMULATIVO DE ESTIMACIONES

ESTIMACION NUM. 2 (FINIQUITO)

PERIODO DEL : DEL 16 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025

IMPORTE: \$413,980.72

LUGAR: EL SABINO, GUASAVE, SIN.

CONTRATISTA: ERNESTO ALONSO BORQUEZ GUTIERREZ

OBRA: AMPLIACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE PARA LA LOCALIDAD EL SABINO, MUNICIPIO DE GUASAVE, SINALOA

CONTRATO N°: JUMAPAG/R33/62/2025

PRESUPUESTO: \$838,631.86 SIN INCLUIR I.V.A.

FECHA : 31/12/2025

NUMERO	PARTIDA DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD DE OBRA				PRECIO UNITARIO	IMPORTE	
			SEGUN PROYECTO	HASTA ESTA ESTIMACION	ESTIMACION ANTERIOR	ESTA ESTIMACION		IMPORTE TOTAL	
1.1	1. PRELIMINARES TRAZO DE TERRENO CON LA FINALIDAD DE EFECTUAR TRABAJOS DE AGUA POTABLE	ML	1210.00	1,285.10		1,285.10	\$ 10.48	\$	13,467.85
1.2	EXCAVACION A MAQUINA EN MATERIAL TIPO COMUN SECO EN ZONA "B" DE 0.00 A 2.00 MTS DE PROFUNDIDAD	M3	940.68	918.85		918.85	\$ 79.79	\$	73,314.76
1.3	PLANTILLA APISONADA Y COMPACTADA CON PISON DE MANO Y AGUA, CON ESPESOR DE PROYECTO CON MATERIAL SELECCIONADO PRODUCTO DE LA EXCAVACION	M3	78.39	83.53		83.53	\$ 257.17	\$	21,481.80
1.4	RELLENO ACOSTILLADO Y COMPACTADO CON PISON DE MANO Y AGUA EN CAPAS DE 20 CM. DE ESPESOR CON MATERIAL SELECCIONADO PRODUCTO DE LA EXCAVACION	M3	313.56	328.99		328.99	\$ 296.53	\$	97,554.10
1.5	RELLENO A VOLTEO A MAQUINA CON MATERIAL SELECCIONADO PRODUCTO DE LA EXCAVACION	M3	549.00	501.19		501.19	\$ 42.72	\$	21,410.79
2.1	2. TUBERIAS SUMINISTRO DE TUBERIA DE PVC HIDRAULICO CON CAMPANA ANGER 3" Ø, RD-32.5, INCUTE ANILLO CUMPLIENDO CON LAS NORMAS DE CNA Y EL IMTA	ML	1210.00	1,285.10	1,210.00	75.10	\$ 103.20	\$	7,750.32
2.2	INSTALACION JUNTO Y PRUEBA DE TUBERIA DE PVC HIDRAULICO CON CAMPANA ANGER 3" Ø, RD-32.5, INCUTE ANILLO CUMPLIENDO CON LAS NORMAS DE CNA Y EL IMTA	ML	1210.00	1,285.10		1,285.10	\$ 32.04	\$	41,174.60
3.1	3. PIEZAS ESPECIALES SUMINISTRO E INSTALACION DE CRUZ DE PVC DE 3" X 3" Ø	PZA	1.00	1.00		1.00	\$ 1,037.38	\$	1,037.38
3.2	SUMINISTRO E INSTALACION DE TEE DE PVC DE 3" X 3" Ø	PZA	7.00	6.00		6.00	\$ 853.96	\$	5,123.76
3.3	SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO DE PVC DE 90° X 3" Ø	PZA	1.00				\$ 563.64	\$	-
3.4	SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO DE PVC DE 45° X 3" Ø	PZA	3.00	3.00		3.00	\$ 552.32	\$	1,656.96
3.5	SUMINISTRO E INSTALACION DE COPL. DE PVC DE 3"	PZA	3.00	5.00		5.00	\$ 309.33	\$	1,546.65
3.6	SUMINISTRO E INSTALACION DE TAPON CAMPANA DE PVC DE 3" Ø	PZA	2.00	3.00		3.00	\$ 414.88	\$	1,244.64
3.7	SUMINISTRO DE MATERIALES Y ELABORACION DE ATRAQUE DE CONCRETO SIMPLE (30X30X30) F-C-150 KGCM2	PZA	14.00	13.00		13.00	\$ 351.66	\$	4,571.58
SUMA HOJA:									291,335.19

NOTAS:

CONFORME: ING. CLAUDIA MARTINA CERVANTES LEYVA
GERENCIA TECNICA

LUGAR: GUASAVE, SINALOA
FECHA: 31/12/2025

AUTORIZO: ING. VIANEY DENISE LEYVA CERVANTES
SUPERVISOR DE OBRA

Vo.Bo: ING. JUAN MANUEL MEDINA GERARDO
COORDINADOR DE PLANEACION Y CONTROL DE OBRA

ELABORO: C. ERNESTO ALONSO BORQUEZ GUTIERREZ
REPRESENTANTE LEGAL

REVISO: ING. JOSE DE JESUS LOPEZ PEREZ
JEFE DE SUPERVISION DE OBRA

ERNESTO ALONSO BORQUEZ GUTIERREZ



AV. RAMON CORONA S/N, BAMOA PUEBLO, GUASAVE, SINALOA C.P. 81140

CONTROL ACUMULATIVO DE ESTIMACIONES

ESTIMACION NUM. 2 (FINIQUITO)

PERIODO DEL : DEL 16 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025

IMPORTE:

\$413,980.72

LUGAR: EL SABINO, GUASAVE, SIN.

CONTRATISTA: ERNESTO ALONSO BORQUEZ GUTIERREZ

OBRA: AMPLIACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE PARA LA LOCALIDAD EL SABINO, MUNICIPIO DE GUASAVE, SINALOA

CONTRATO N°: PRESUPUESTO: \$838,631.86 SIN INCLUIR I.V.A. JUMAPAG/R33/62/2025

FECHA : 31/12/2025

NUMERO	PARTIDA DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD DE OBRA				IMPORTE	
			SEGUN PROYECTO	HASTA ESTA ESTIMACION	ESTIMACION ANTERIOR	ESTA ESTIMACION	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
4.1	4.- TOMAS DOMICILIARIAS SUMINISTRO E INSTALACION DE MATERIALES EN TOMA DOMICILIARIA. INCLUYE: 1 ABRACADERA DE PVC DE 3" CON SALIDA DE 1/2", 1 LLAVE DE INSERCCION, 1 LLAVE DE BANQUETA, 1 CONECTOR DE PVC ROSCADO, 4 CODOS DE PVC, 2 MTS. DE TUBO DE PVC, 1 LLAVE DE GLOBO, 1 TEE DE PVC, 1 LLAVE DE JARDIN, TODOS LOS MATERIALES CON DIAMETRO DE 1/2".	PZA	82.00			82.00	\$ 2,390.76	\$ 196,042.32
4.2	EXCAVACION Y RELLENO COMPACTADO PARA LA INSTALACION DE MATERIALES EN TOMA DOMICILIARIA	ML	820.00			344.10	\$ 163.67	\$ 56,318.85
4.3	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA EXTRUPAK RD-9 EN TOMA DOMICILIARIA EXTRAORDINARIO	ML	820.00			344.10	\$ 127.43	\$ 43,848.66
EXT-01	MOTOCONFORMADO DE CALLES DESPUES DE INSTALAR LA TUBERIA DE 3"	M2				6,442.80	\$ 5.30	\$ 34,146.84
EXT-02	MOTOCONFORMADO DE CALLES POSTERIORES A LA INSTALACION DE LINEAS DE AGUA POTABLE Y TOMAS CON UN ESPESOR DE 8 CMS. INCLUYE: HERRAMIENTA, MATERIAL DE BANCO, TENDIDO DE MATERIAL Y TODO LO NECESARIO PARA LOS TRABAJOS.	M2				1,218.00	\$ 75.93	\$ 92,482.74
							SUMA HOJA:	422,839.41

NOTAS:

CONFORME: ING. CLAUDIA MARTHA CERVANTES LEIVA
GERENCIA TECNICA

LUGAR: GUASAVE, SINALOA
FECHA: 31/12/2025
AUTORIZO: ING. MANEY DENISE LEIVA CERVANTES
SUPERVISOR DE OBRA
Vo.Bo: ING. JUAN MANUEL MEDINA GERARDO
COORDINADOR DE PLANIFICACION Y CONTROL DE OBRA

ELABORO: C. ERNESTO ALONSO BORQUEZ GUTIERREZ
REPRESENTANTE LEGAL
REVISO: ING. JOSE DE JESUS LOPEZ PEREZ
JEFE DE SUPERVISION DE OBRA

JUMAPAG

CONTROL ACUMULATIVO DE ESTIMACIONES

IMPORTE: **\$413,980.72**

026	
-----	--

31/12/2025

TOTAL HOJA:	413,980.72
-------------	------------

ELABORO: C. ERNESTO ALONSO BORQUEZ GUTIERREZ

REPRESENTANTE LEGAL

1

REVISOR: ING. JOSE DE JESU

JEFE DE SUPERVISION DE OBRA

4

OBRA: AMPLIACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE PARA LA LOCALIDAD EL SABINO,
MUNICIPIO DE GUASAVE, SINALOA
UBICACION: EL SABINO, MUNICIPIO DE GUASAVE, SINALOA
CONTRATISTA: ERNESTO ALONSO BORQUEZ GUTIERREZ
IMPORTE DE CONTRATO: \$972,812.96 CON I.V.A.
CONTRATO N°: JUMAPAG/R33/52/2025



ESTIMACION NO: 2 (FINQUITO)
PERIODO DE ESTIMACION:
DEL 16 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	EJE	ENTRE	LARGO	ANCHO	ALTURA	PIEZA	CANTIDAD		OBSERVACION
									PARCIAL	TOTAL	
	1. PRELIMINARES										
1.1	TRAZO DE TERRENO CON LA FINALIDAD DE EFECTUAR TRABAJOS DE AGUA POTABLE	ML			93.5				1285.10	1285.10	ML
					88						
					442						
					71						
					65						
					44.5						
					102						
					55.4						
					86.6						
					83.5						
					153.6						
1.2	EXCAVACION A MAQUINA EN MATERIAL TIPO COMUN SECO EN ZONA "B" DE 0.00 A 2.00 MTS DE PROFUNDIDAD	M3			93.5	0.65	1.10		66.85	918.65	M3
					88	0.65	1.10		62.92		
					442	0.65	1.10		316.03		
					71	0.65	1.10		50.77		
					65	0.65	1.10		46.48		
					44.5	0.65	1.10		31.82		
					102	0.65	1.10		72.93		
					55.4	0.65	1.10		39.61		
					86.6	0.65	1.10		61.92		
					83.5	0.65	1.10		59.70		
					153.6	0.65	1.10		109.82		

AUTORIZO:
ING. VIANEY DENISSELLEMA CERVANTES
SUPERVISOR DE OBRAS JUMAPAG

ELABORO: 
C. ERNESTO ALONSO BORQUEZ GUTIERREZ
CONTRATISTA

REVISOR:
ING. JOSE DE JESUS LOPEZ PEREZ
JEFE DE SUPERVISION DE OBRA

NUMEROS GENERADORES

OBRA: AMPLIACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE PARA LA LOCALIDAD EL SABINO,
MUNICIPIO DE GUASAVE, SINALOA
UBICACIÓN: EL SABINO, MUNICIPIO DE GUASAVE, SINALOA
CONTRATISTA: ERNESTO ALONSO BORQUEZ GUTIERREZ
IMPORTE DE CONTRATO: \$972,812.96 CON I.V.A.
CONTRATO N°: JUMAPAG/R33/52/2025



ESTIMACION NO: 2 (FINQUITO)
PERIODO DE ESTIMACION:
DEL 16 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	EJE	ENTRE	LARGO	ANCHO	ALTURA	PIEZA	CANTIDAD		OBSERVACION
									PARCIAL	TOTAL	
1,3	PLANTILLA APISONADA Y COMPACTADA CON PISON DE MANO Y AGUA, CON ESPESOR DE PROYECTO CON MATERIAL SELECCIONADO PRODUCTO DE LA EXCAVACION.	M3			93.5	0.65	0.10		6.08	83.53 M3	
					88	0.65	0.10		5.72		
					442	0.65	0.10		28.73		
					71	0.65	0.10		4.62		
					65	0.65	0.10		4.23		
					44.5	0.65	0.10		2.89		
					102	0.65	0.10		6.63		
					55.4	0.65	0.10		3.60		
					86.6	0.65	0.10		5.63		
					83.5	0.65	0.10		5.43		
					153.6	0.65	0.10		9.98		
1,4	RELLENO ACOSTILLADO Y COMPACTADO CON PISON DE MANO Y AGUA EN CAPAS DE 20 CM. DE ESPESOR CON MATERIAL SELECCIONADO PRODUCTO DE LA EXCAVACION	M3			93.5	0.65	0.40		24.31	328.99 M3	
					88	0.65	0.40		22.88		
					442	0.65	0.40		114.92		
					71	0.65	0.40		18.46		
					65	0.65	0.40		16.80		
					44.5	0.65	0.40		11.57		
					102	0.65	0.40		26.52		
					55.4	0.65	0.40		14.40		
					86.6	0.65	0.40		22.52		
					83.5	0.65	0.40		21.71		
					153.6	0.65	0.40		39.94		
					AREA TUBO						
					Ø	LONG.					
					0.004	1285.10			-5.14		

AUTORIZO:
ING. VIANEY DENISE LEIVA CERVANTES
SUPERVISOR DE OBRAS JUMAPAG

ELABORO:
C. ERNESTO ALONSO BORQUEZ GUTIERREZ
CONTRATISTA

REVISO:
ING. JOSE DE JESUS LOPEZ PEREZ
JEFE DE SUPERVISION DE OBRA

NUMEROS GENERADORES

OBRA: AMPLIACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE PARA LA LOCALIDAD EL SABINO,
MUNICIPIO DE GUASAVE, SINALOA.
UBICACIÓN: EL SABINO, MUNICIPIO DE GUASAVE, SINALOA
CONTRATISTA: ERNESTO ALONSO BORQUEZ GUTIERREZ
IMPORTE DE CONTRATO: \$972,812.96 CON I.V.A.
CONTRATO N°: JUMAPAG/R33/52/2025



ESTIMACION NO: 2 (FINQUITO)
PERIODO DE ESTIMACION:
DEL 16 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	EJE	ENTRE	LARGO	ANCHO	ALTURA	PIEZA	CANTIDAD		OBSERVACION
									PARCIAL	TOTAL	
1.5	RELLENO A VOLTEO A MAQUINA CON MATERIAL SELECCIONADO PRODUCTO DE LA EXCAVACION	M3			93.5	0.65	0.60		36.47	501.19	M3
					88	0.65	0.60		34.32		
					442	0.65	0.60		172.38		
					71.00	0.65	0.60		27.69		
					65.00	0.65	0.60		25.35		
					44.50	0.65	0.60		17.36		
					102.00	0.65	0.60		39.78		
					55.40	0.65	0.60		21.61		
					86.60	0.65	0.60		33.77		
					83.50	0.65	0.60		32.57		
					153.60	0.65	0.60		59.90		
2.1	2. TUBERIAS SUMINISTRO DE TUBERIA DE PVC HIDRAULICO CON CAMPANA ANGER 3" Ø. RD-32.5. INCUTE ANILLO CUMPLIENDO CON LAS NORMAS DE CNA Y EL IMTA	ML			75.1				75.10	75.10 ML	

AUTORIZO:
ING. VANEY DENISSE LEIZAOLA CERVANTES
SUPERVISOR DE OBRAS JUMAPAG

ELABORO:
C. ERNESTO ALONSO BORQUEZ GUTIERREZ
CONTRATISTA

REVISO:
ING. JOSE DE JESUS LOPEZ PEREZ
JEFE DE SUPERVISION DE OBRA

JUMAPAG

ESTIMACION NO: 2 (FINQUITO)
PERIODO DE ESTIMACION:
DEL 16 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	EJE	ENTRE	LARGO	ANCHO	ALTURA	PIEZA	CANTIDAD		OBSERVACION
									PARCIAL	TOTAL	
2.2	INSTALACIÓN JUNTEO Y PRUEBA DE TUBERÍA DE PVC HIDRÁULICO CON CAMPAÑA ANGER 3" Ø, RD-32.5, INCUIE ANILLO CUMPLIENDO CON LAS NORMAS DE CNA Y EL IMTA	ML			93.5				1285.10	1285.10	ML
					88						
					442						
					71.00						
					65.00						
					44.50						
					102.00						
					55.40						
					86.80						
					83.50						
					153.60						
	3. PIEZAS ESPECIALES										
3.1	SUMINISTRO E INSTALACION DE CRUZ DE PVC DE 3" X 3" Ø	PZA						1.00	1.00	1.00	PZA
3.2	SUMINISTRO E INSTALACION DE TEE DE PVC DE 3" X 3" Ø	PZA						6.00	6.00	6.00	PZA
3.3	SUMINISTRO E INSTALACION DE CODDO DE PVC DE 90° X 3" Ø	PZA									PZA
3.4	SUMINISTRO E INSTALACION DE CODDO DE PVC DE 45° X 3" Ø	PZA						3.00	3.00	3.00	PZA
3.5	SUMINISTRO E INSTALACION DE COUPLE DE PVC DE 3"	PZA						5.00	5.00	5.00	PZA

REVISOR:
ING. JOSE DE JESUS LOPEZ PEREZ
JEFE DE SUPERVISION DE OBRA

NUMEROS GENERADORES

OBRA: AMPLIACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE PARA LA LOCALIDAD EL SABINO,
MUNICIPIO DE GUASAVE, SINALOA.
UBICACIÓN: EL SABINO, MUNICIPIO DE GUASAVE, SINALOA
CONTRATISTA: ERNESTO ALONSO BORQUEZ GUTIERREZ
IMPORTE DE CONTRATO: \$972,812.96 CON I.V.A.
CONTRATO N°: JUMAPAG/R33/62/2025



ESTIMACION NO: 2 (FINQUITO)
PERIODO DE ESTIMACION:
DEL 16 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	EJE	ENTRE	LARGO	ANCHO	ALTURA	PIEZA	CANTIDAD		OBSERVACION
									PARCIAL	TOTAL	
36	SUMINISTRO E INSTALACION DE TAPON CAMPANA DE PVC DE 3"	PZA						3.00	3.00	3.00 PZA	
37	SUMINISTRO DE MATERIALES Y ELABORACIÓN DE ATRAQUE DE CONCRETO SIMPLE (30X30X30) F'c=150 KG/CM2	PZA						13.00	13.00	13.00 PZA	
41	4.- TOMAS DOMICILIARIAS SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MATERIALES EN TOMA DOMICILIARIA, INCLUYE: 1 ABRAZADERA DE PVC DE 3" CON SALIDA DE 1/2", 1 LLAVE DE INSERCIÓN, 1 LLAVE DE BANQUETA, 1 CONECTOR DE PVC ROSCADO, 4 CODO DE PVC, 2 MTS. DE TUBO DE PVC, 1 LLAVE DE GLOBO, 1 TEE DE PVC, 1 LLAVE DE JARDIN, TODOS LOS MATERIALES CON DIAMETRO DE 1/2".	PZA						82.00	82.00	82.00 PZA	
42	EXCAVACION Y RELLENO COMPACTADO PARA LA INSTALACIÓN DE MATERIALES EN TOMA DOMICILIARIA.	ML			2.80			7.00	19.60	344.10	
					3.70			4.00	14.80		
					4.00			3.00	12.00		
					7.60			1.00	7.60		
					2.00			4.00	8.00		
					1.80			7.00	12.60		
					3.00			6.00	18.00		
					3.30			6.00	19.80		
					3.20			3.00	9.60		
					6.00			1.00	6.00		
					1.90			3.00	5.70		
					1.40			1.00	1.40		
					2.60			2.00	5.20		
					2.20			1.00	2.20		

AUTORIZO:
ING. VIANEY DENISSE LEJVA CERANTES
SUPERVISOR DE OBRAS JUMAPAG

ELABORO:
C. ERNESTO ALONSO BORQUEZ GUTIERREZ
CONTRATISTA

REVISO:
ING. JOSÉ DE JESÚS LÓPEZ PÉREZ
JEFE DE SUPERVISIÓN DE OBRA

NUMEROS GENERADORES

OBRA: AMPLIACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE PARA LA LOCALIDAD EL SABINO,
MUNICIPIO DE GUASAVE, SINALOA.
UBICACIÓN: EL SABINO, MUNICIPIO DE GUASAVE, SINALOA
CONTRATISTA: ERNESTO ALONSO BORQUEZ GUTIERREZ
IMPORTE DE CONTRATO: \$972,812.96 CON I.V.A.
CONTRATO N°: JUMAPAG/R33/52/2025



ESTIMACION NO: 2 (FINQUITO)
PERIODO DE ESTIMACION:
DEL 16 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	EJE	ENTRE	LARGO	ANCHO	ALTURA	PIEZA	CANTIDAD		OBSERVACION
									PARCIAL	TOTAL	
					2.50			5.00	12.50		
					3.90			2.00	7.80		
					3.80			1.00	3.80		
					6.40			1.00	6.40		
					10.00			1.00	10.00		
					7.50			1.00	7.50		
					7.80			3.00	23.40		
					8.50			1.00	8.50		
					3.40			1.00	3.40		
					9.00			1.00	9.00		
					8.00			3.00	24.00		
					4.30			1.00	4.30		
					7.20			2.00	14.40		
					7.30			2.00	14.60		
					9.40			1.00	9.40		
					5.90			1.00	5.90		
					5.70			1.00	5.70		
					7.00			2.00	14.00		
					6.00			2.00	12.00		
					5.00			1.00	5.00		

AUTORIZO: 
ING. VANEY DENISSE LEIZA CERANTES
SUPERVISOR DE OBRAS JUMAPAG

ELABORO: 
C. ERNESTO ALONSO BORQUEZ GUTIERREZ
CONTRATISTA

REVISO: 
ING. JOSE DE JESUS LOPEZ PEREZ
JEFE DE SUPERVISION DE OBRA

NUMEROS GENERADORES

OBRA: AMPLIACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE PARA LA LOCALIDAD EL SABINO,
MUNICIPIO DE GUASAVE, SINALOA.
UBICACIÓN: EL SABINO, MUNICIPIO DE GUASAVE, SINALOA
CONTRATISTA: ERNESTO ALONSO BORQUEZ GUTIERREZ
IMPORTE DE CONTRATO: \$972,812.96 CON I.V.A.
CONTRATO N°: JUMAPAG/R33/52/2025



ESTIMACION NO: 2 (FINQUITO)
PERIODO DE ESTIMACION:
DEL 16 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	EJE	ENTRE	LARGO	ANCHO	ALTURA	PIEZA	CANTIDAD		OBSERVACION
									PARCIAL	TOTAL	
43	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA EXTRUPAK RD-9 EN TOMA DOMICILIARIA.	ML			2.80			7.00	19.60	344.10 ML	
					3.70			4.00	14.80		
					4.00			3.00	12.00		
					7.60			1.00	7.60		
					2.00			4.00	8.00		
					1.80			7.00	12.60		
					3.00			6.00	18.00		
					3.30			6.00	19.80		
					3.20			3.00	9.60		
					6.00			1.00	6.00		
					1.90			3.00	5.70		
					1.40			1.00	1.40		
					2.60			2.00	5.20		
					2.20			1.00	2.20		
					2.50			5.00	12.50		
					3.90			2.00	7.80		
					3.80			1.00	3.80		
					6.40			1.00	6.40		
					10.00			1.00	10.00		
					7.50			1.00	7.50		
					7.80			3.00	23.40		
					8.50			1.00	8.50		
					3.40			1.00	3.40		

AUTORIZO:

ING. VANEY DENISS LEYVA CERVANTES
SUPERVISOR DE OBRAS JUMAPAG

ELABORO:

C. ERNESTO ALONSO BORQUEZ GUTIERREZ
CONTRATISTA

REVISO:

ING. JOSÉ DE JESUS LOPEZ GUTIERREZ
JEFE DE SUPERVISION DE OBRA

JUMAPAG

ESTIMACION NO: 2 (FINQUITO)
PERIODO DE ESTIMACION:
DEL 16 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025

AUTORIZO:  ING. VIANEY DENISSE LEMYA CERVANTES SUPERVISOR DE OBRAS LUMAPAG	ELABORO:  C. ERNESTO ALONSO BORQUEZ GUTIERREZ CONTRATISTA	REVISO:  ING. JOSÉ DE JESÚS LÓPEZ NERI JEFE DE SUPERVISIÓN DE OBRA
---	---	---

JUMAPAG

ESTIMACION NO: 2 (FINQUITO)
PERIODO DE ESTIMACION:
DEL 16 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025

[illegible]

FOTOS







OBRA: AMPLIACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE PARA LA LOCALIDAD EL SABINO,
MUNICIPIO DE GUASAVE, SINALOA.
UBICACION: EL SABINO, MUNICIPIO DE GUASAVE, SINALOA.
CONTRATISTA: ERNESTO ALONSO BORQUEZ GUTIERREZ
IMPORTE DE CONTRATO: \$972,812.96 CON I.V.A.
PROGRAMA: RAMO 33
CONTRATO N°: JUMAPAG/R33/52/2025

ESTIMACION NO: 2 (FINIQUITO)
PERIODO DE ESTIMACION:

DEL 16 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	EJE	ENTRE	LARGO	ANCHO	ALTURA	PIEZA	CANTIDAD		OBSERVACION
									PARCIAL	TOTAL	

FOTOS

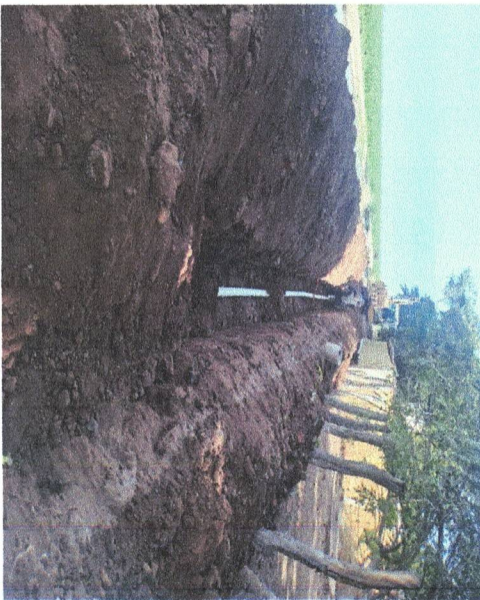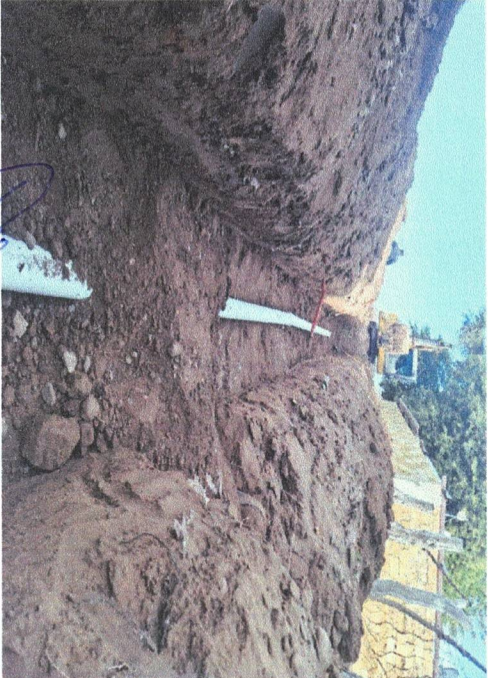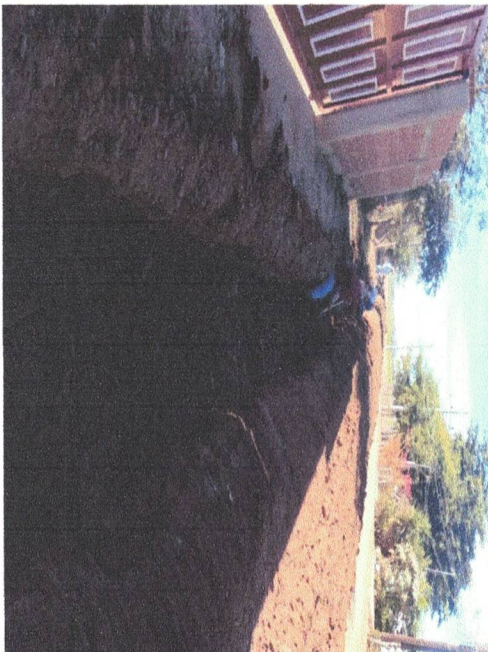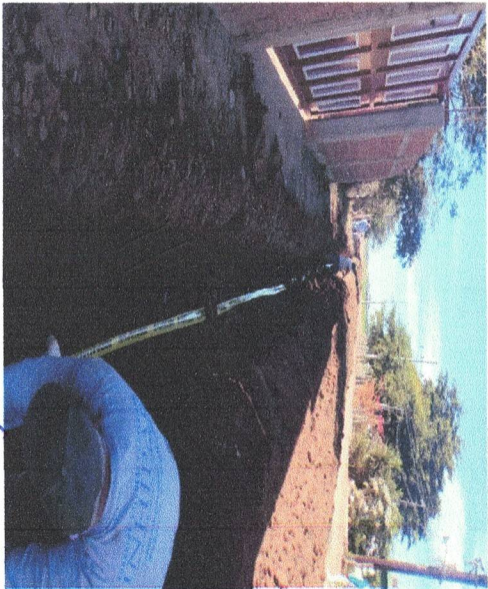

AUTORIZO:
ING. VANEY DENISSE LEYVA CERMANTE
SUPERVISOR DE OBRAS JUMAPAG

ELABORO:
C. ERNESTO ALONSO BORQUEZ GUTIERREZ
CONTRATISTA

REVISO:
ING. JOSE DE JESUS LOPEZ PEREZ
JEFE DE SUPERVISION DE OBRA

FOTOS







OBRA: AMPLIACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE PARA LA LOCALIDAD EL SABINO,
MUNICIPIO DE GUASAVE, SINALOA.
UBICACIÓN: EL SABINO, MUNICIPIO DE GUASAVE, SINALOA.
CONTRATISTA: ERNESTO ALONSO BORQUEZ GUTIERREZ
IMPORTE DE CONTRATO: \$972,812.96 CON I.V.A.
PROGRAMA: RAMO 33
CONTRATO N°: JUMAPAG/R33/52/2025

ESTIMACION NO: 2 (FINIQUITO)
PERIODO DE ESTIMACION:

DEL 16 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	EJE	ENTRE	LARGO	ANCHO	ALTURA	PIEZA	CANTIDAD		OBSERVACION
									PARCIAL	TOTAL	

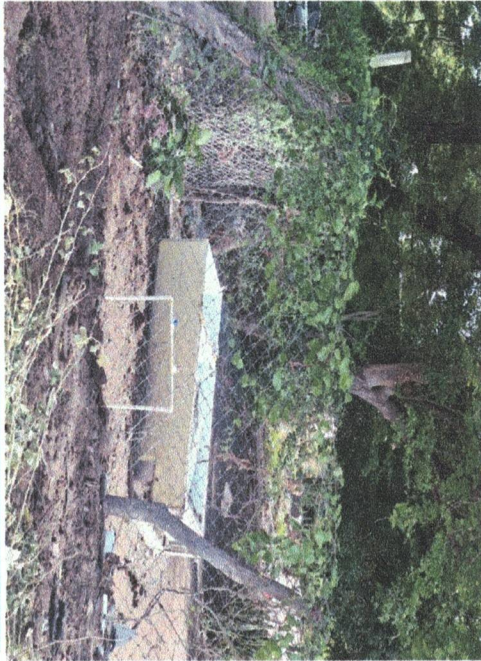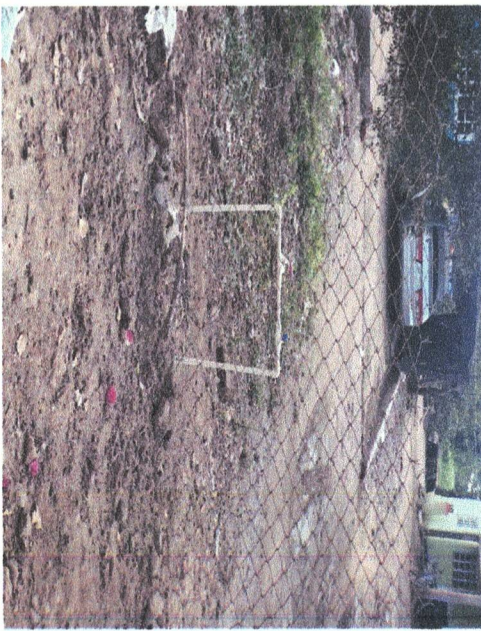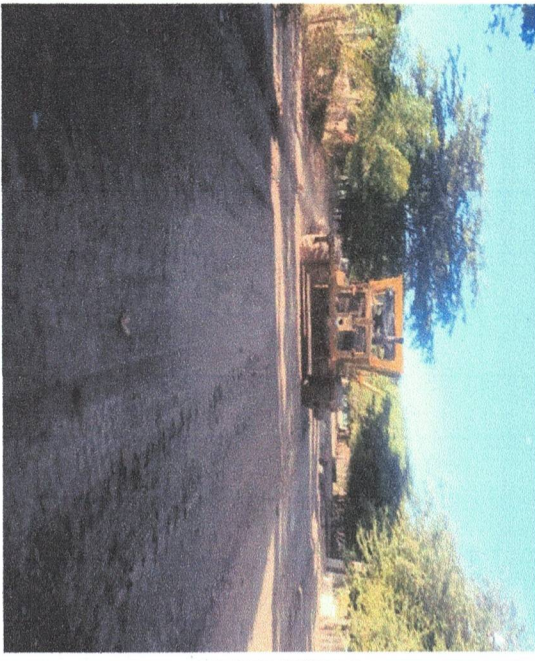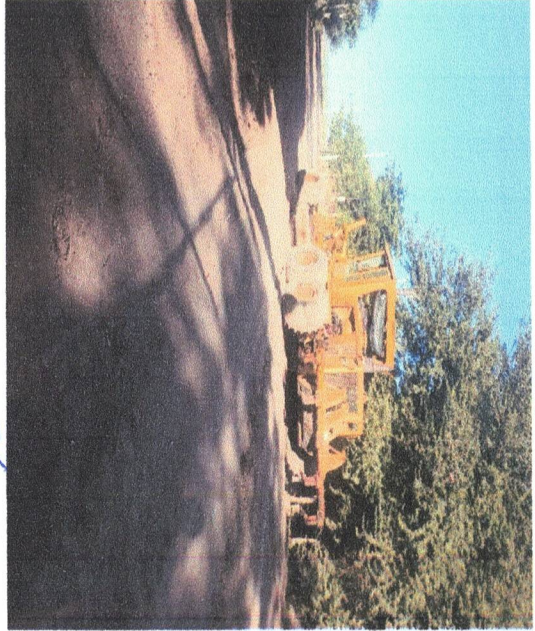

AUTORIZO:
ING. VIANEY DENISSE LEYVA GONZALEZ
SUPERVISOR DE OBRAS JUMAPAG

ELABORO:
C. ERNESTO ALONSO BORQUEZ GUTIERREZ
CONTRATISTA

REVISO:
ING. JOSÉ DE JESÚS LÓPEZ BÉRRIZ
JEFE DE SUPERVISIÓN DE OBRA

FOTOS



OBRA: AMPLIACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE PARA LA LOCALIDAD EL SABINO,
MUNICIPIO DE GUASAVE, SINALOA.
UBICACION: EL SABINO, MUNICIPIO DE GUASAVE, SINALOA.
CONTRATISTA: ERNESTO ALONSO BORQUEZ GUTIERREZ
IMPORTE DE CONTRATO: \$972,812.96 CON I.V.A.
PROGRAMA: RAMO 33
CONTRATO N°: JUMAPAG/R33/52/2025

ESTIMACION NO: 2 (FINIQUITO)
PERIODO DE ESTIMACION:

DEL 16 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	EJE	ENTRE	LARGO	ANCHO	ALTURA	PIEZA	CANTIDAD		OBSERVACION
									PARCIAL	TOTAL	



AUTORIZO:
ING. VANEY DENISSE LEYVA CERVANTES
SUPERVISOR DE OBRAS JUMAPAG

ELABORO:
C. ERNESTO ALONSO BORQUEZ GUTIERREZ
CONTRATISTA

REVISO:
ING. JOSE DE JESUS LOPEZ PEREZ
JEFE DE SUPERVISION DE OBRA

ANEXOS




OBRA: AMPLIACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE PARA LA LOCALIDAD EL SABINO, MUNICIPIO DE GUASAVE, SINALOA.
 UBICACION: EL SABINO, GUASAVE, SINALOA.
 CONTRATISTA: ERNESTO ALONSO BORQUEZ GUTIERREZ
 IMPORTE DE CONTRATO: \$972,812.96 CON IVA.
 PROGRAMA: RAMO 33
 CONTRATO N°: JUMAPAG/R33/52/2025

ESTIMACION NO: 2 (FINQUITO)
 PERIODO DE ESTIMACION:

DEL 16 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	EJE	ENTRE	LARGO	ANCHO	ALTURA	PIEZA	CANTIDAD		OBSERVACION
									PARCIAL	TOTAL	

ANEXOS

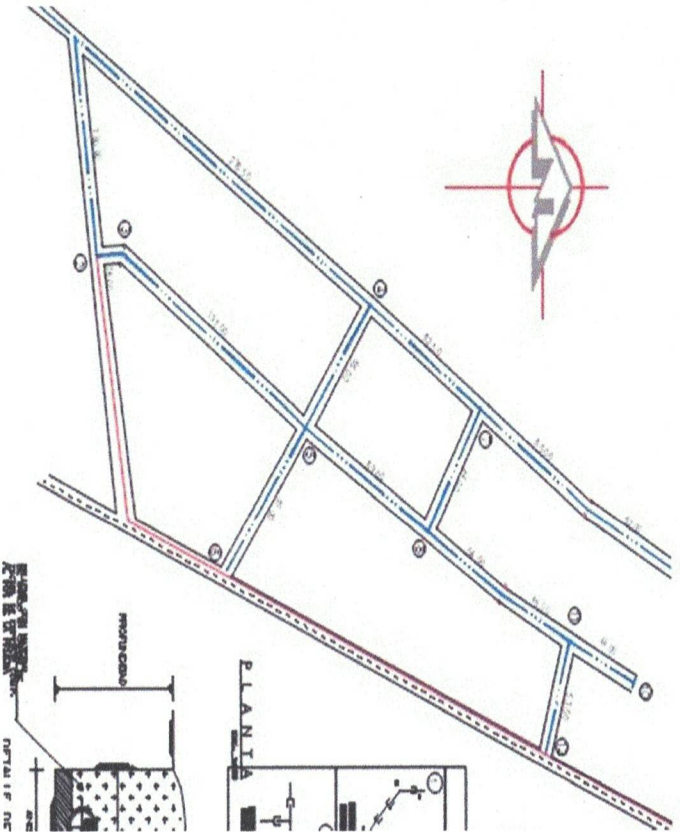

AUTORIZO:
 ING. VANEY DENISE LEMMA CERVANTES
 SUPERVISOR DE OBRAS JUMAPAG

ELABORO:
 C. ERNESTO ALONSO BORQUEZ GUTIERREZ
 CONTRATISTA

REVISO:
 ING. JOSE DE JESUS LOPEZ PEREZ
 JEFE DE SUPERVISION DE OBRA
