

 MUNICIPIO DE SINALOA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS ESTIMACION DE OBRA 												
OBRA: CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN ESCUELA PRIMARIA JUAN ESCUTIA EN LA LOCALIDAD DE CAMPO SEIS, MUNICIPIO DE SINALOA ESTADO DE SINALOA.												
CONTRATO: FAIS-DOP-SIN-2025-014			IMPORTE: \$ 704,047.18 SIN I.V.A.									
ESTIMACIÓN No.: 1			PERIODO CONTRATO: DEL 16 DE JUNIO AL 30 DE JULIO DE 2025									
FECHA: 01/07/2025			CALCULO: ING. RAMON LEYVA GUTIERREZ									
GENERADORES DE OBRA												
CLAVE	DESCRIPCIÓN	LOCALIZACION			LARGO	ANCHO	ALTO	PZA	AREA	RESULTADOS		OBSERVACIONES
		UNIDAD	TRAMO	EJE						PARCIAL	TOTAL	
I	TRABAJOS PRELIMINARES											
1.1	DEMOLICION Y RETIRO DE CERCA EXISTENTE EN MAL ESTADO A BASE DE POSTES GALVANIZADO, TELA CICLONICA, ALAMBRE DE PUAS Y DALA DE CERRAMIENTO; INCLUYE HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA NECESARIA	ML			361.59					361.59		
										TOTAL	361.59	
1.2	LIMPIEZA, TRAZO Y NIVELACION DE TERRENO NATURAL	M2							723.18	723.18		
										TOTAL	723.18	

ING. RAMON LEYVA GUTIERREZ


 REPRESENTANTE LEGAL.

JUAN MANUEL LOPEZ MENCHACA

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS.

ING. AMILKAR IMANOL RUBIO OSUNA


 RESIDENTE DE SUPERVISION.

 MUNICIPIO DE SINALOA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS ESTIMACION DE OBRA 												
OBRA: CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN ESCUELA PRIMARIA JUAN ESCUTIA EN LA LOCALIDAD DE CAMPO SEIS, MUNICIPIO DE SINALOA ESTADO DE SINALOA.												
CONTRATO: FAIS-DOP-SIN-2025-014					IMPORTE: \$ 704,047.18 SIN I.V.A.							
ESTIMACIÓN No.: 1					PERIODO CONTRATO: DEL 16 DE JUNIO AL 30 DE JULIO DE 2025							
FECHA: 01/07/2025					CALCULO: ING. RAMON LEYVA GUTIERREZ							
GENERADORES DE OBRA												
CLAVE	DESCRIPCIÓN	LOCALIZACION			LARGO	ANCHO	ALTO	PZA	AREA	RESULTADOS		OBSERVACIONES
		UNIDAD	TRAMO	EJE						PARCIAL	TOTAL	
1.3	EXCAVACION A MANO EN MATERIAL "C" EN SECO A UNA PROFUNDIDAD DE 0.00 A 2.00 MTS.	M3							4.68	4.68		
										TOTAL	4.68	
II	CERCA PERIMETRAL											
2.1	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE POSTE ESQUINERO O REFUERZO DE TUBO GALVANIZADO DE 2 7/8" Y 2.50 MTS. DE ALTURA.	PZA						18.00		18.00		
										TOTAL	18.00	


ING. RAMON LEYVA GUTIERREZ


 REPRESENTANTE LEGAL.

JUAN MANUEL LOPEZ MENCHACA

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS.

ING. AMILKAR IMANOL RUBIO OSUNA


 RESIDENTE DE SUPERVISION.


MUNICIPIO DE SINALOA												
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS												
ESTIMACION DE OBRA												
OBRA:		CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN ESCUELA PRIMARIA JUAN ESCUTIA EN LA LOCALIDAD DE CAMPO SEIS, MUNICIPIO DE SINALOA ESTADO DE SINALOA.										
CONTRATO:		FAIS-DOP-SIN-2025-014		IMPORTE: \$ 704,047.18 SIN I.V.A.								
ESTIMACIÓN No.:		1		PERIODO CONTRATO: DEL 16 DE JUNIO AL 30 DE JULIO DE 2025								
FECHA:		01/07/2025		CALCULO: ING. RAMON LEYVA GUTIERREZ								
GENERADORES DE OBRA												
CLAVE	DESCRIPCIÓN	LOCALIZACION			LARGO	ANCHO	ALTO	PZA	AREA	RESULTADOS		OBSERVACIONES
		UNIDAD	TRAMO	EJE						PARCIAL	TOTAL	
2.2	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE POSTE DE LÍNEA DE TUBO GALVANIZADO DE 1 7/8" Y 2.50 MTS. DE ALTURA.	PZA						112.00		112.00		
2.3	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TELA CICLÓNICA GALVANIZADA DE 2.00 MTS DE ALTURA C-10.5.	ML						361.59		361.59		
2.4	DALA DE DESPLANTE DE 15X20 CMS ARMADA CON ARMEX Y CONCRETO F'C=150 KG/CM2. HECHO EN OBRA	ML						361.59		361.59		
III	VARIOS											
3.1	ROTULO INFORMATIVO DE OBRA A BASE DE UNA LAMINA CON VINIL CON INFORMACION BASICA DE LA OBRA COMO SE ANEXA EN EL CROQUIS DE 1.20 MTS DE LARGO POR 0.90 MTS DE ANCHO EN UNA BASE DE PTR DE 1 1/2" DE 1.90 MTS DE ALTO Y SE AHOGARA EN CONCRETO 30 CMS.	PZA						1.00		1.00		
										TOTAL	1.00	

ING.RAMON LEYVA GUTIERREZ

REPRESENTANTE LEGAL.

JUAN MANUEL LOPEZ MENCHACA

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS.

ING. AMILKAR IMANOL RUBIO OSUNA

RESIDENTE DE SUPERVISION.



GRUPO REYGH


REPRESENTANTE LEGAL.

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS.

RESIDENTE DE SUPERVISION.



**MUNICIPIO DE SINALOA
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
ESTIMACION DE OBRA**




OBRA:		CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN ESCUELA PRIMARIA JUAN ESCUTIA EN LA LOCALIDAD DE CAMPO SEIS, MUNICIPIO DE SINALOA, ESTADO DE SINALOA.					<div></div>				
CONTRATO: FAIS-DOP-SIN-2025-014		IMPORTE \$ 704,047.18 SIN I.V.A.			PERIODO DEL 16 DE JUNIO AL 30 DE JULIO DE 2025					CONTRATO:	
ESTIMACIÓN No.: 1		PERIODO: 16 DE JUNIO AL 1 DE JULIO			FECHA: 01/07/2025						
CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	SEGÚN PROYECTO	HASTA ESTA ESTIMACIÓN	HASTA LA ESTIMACIÓN ANTERIOR	EXCEDENTE	DE ESTA ESTIMACIÓN	P.U.	IMPORTE		
2.1	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE POSTE ESQUINERO O REFUERZO DE TUBO GALVANIZADO DE 2 7/8" Y 2.50 MTS. DE ALTURA.	PZA	18.00	18.00	0.00	0.00	18.00	1,692.89	30,472.02		
2.3	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TELA CICLÓNICA GALVANIZADA DE 2.00 MTS DE ALTURA C-10.5.	ML	361.59	361.59	0.00	0.00	361.59	399.23	144,357.58		
2.4	DALA DE DESPLANTE DE 15X20 CMS ARMADA CON ARMEX Y CONCRETO F´C=150 KG/CM2. HECHO EN OBRA	ML	361.59	361.59	0.00	0.00	361.59	478.35	172,966.58		

ING. RAMON LEYVA GUTIERREZ


REPRESENTANTE LEGAL.

JUAN MANUEL LOPEZ MENCHACA


DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS.

ING. AMILKAR IMANOL RUBIO OSUNA



RESIDENTE DE SUPERVISION.



MUNICIPIO DE SINALOA
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
ESTIMACION DE OBRA




OBRA:		CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN ESCUELA PRIMARIA JUAN ESCUTIA EN LA LOCALIDAD DE CAMPO SEIS, MUNICIPIO DE SINALOA, ESTADO DE SINALOA.						 GRUPO REYGH CONSTRUCTORES		
CONTRATO: FAIS-DOP-SIN-2025-014		IMPORTE \$ 704,047.18 SIN I.V.A.			PERIODO DEL 16 DE JUNIO AL 30 DE JULIO DE 2025		CONTRATO:			
ESTIMACIÓN No.: 1		PERIODO: 16 DE JUNIO AL 1 DE JULIO			FECHA: 01/07/2025					
CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	SEGÚN PROYECTO	HASTA ESTA ESTIMACIÓN	HASTA LA ESTIMACIÓN ANTERIOR	EXCEDENTE	DE ESTA ESTIMACIÓN	P.U.	IMPORTE	
2.2	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE POSTE DE LÍNEA DE TUBO GALVANIZADO DE 1 7/8" Y 2.50 MTS. DE ALTURA.	PZA	112.00	112.00	0.00	0.00	112.00	928.51	103,993.12	
		TOTAL CERCA PERIMETRAL							451,789.30	

ING. RAMON LEYVA GUTIERREZ

REPRESENTANTE LEGAL.

JUAN MANUEL LOPEZ MENCHACA

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS.

ING. AMILKAR IMANOL RUBIO OSUNA

RESIDENTE DE SUPERVISION.



**MUNICIPIO DE SINALOA
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
ESTIMACION DE OBRA**



OBRA:	CONSTRUCCION DE BARDAS PERIMETRALES EN ESCUELA PRIMARIA JUAN ESCUTIA EN LA LOCALIDAD DE CAMPO SEIS, MUNICIPIO DE SINALOA, ESTADO DE SINALOA.					
CONTRATO:	FAIS-DOP-SIN-2025-014	IMPORTE	\$ 704,047.18 SIN I.V.A.	PERIODO CONTRATO:	DEL 16 DE JUNIO AL 30 DE JULIO DE 2025	
ESTIMACIÓN No.:	1	PERIODO:	16 DE JUNIO AL 1 DE JULIO	FECHA:	01/07/2025	

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	SEGÚN PROYECTO	HASTA ESTA ESTIMACIÓN	HASTA LA ESTIMACIÓN ANTERIOR	EXCEDENTE	DE ESTA ESTIMACIÓN	P.U.	IMPORTE
III	VARIOS								
3.1	ROTULO INFORMATIVO DE OBRA A BASE DE UNA LAMINA CON VINIL CON INFORMACION BASICA DE LA OBRA COMO SE ANEXA EN EL CROQUIS DE 1.20 MTS DE LARGO POR 0.90 MTS DE ANCHO EN UNA BASE DE PTR DE 1 1/2" DE 1.90 MTS DE ALTO Y SE AHOGARA EN CONCRETO 30 CMS.	PZA	1.00	1.00	0.00	0.00	1.00	4,772.79	4,772.79
TOTAL VARIOS									4,772.79

IMPORTE SIN I.V.A.	510,035.49
IVA (16%)	81,605.68
Total:	591,641.17

ING. RAMON LEYVA GUTIERREZ

REPRESENTANTE LEGAL.

JUAN MANUEL LOPEZ MENCHACA

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS.

ING. AMILKAR IMANOL RUBIO OSUNA

RESIDENTE DE SUPERVISION.



MUNICIPIO DE SINALOA
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
ESTIMACION DE OBRA



OBRA: CONSTRUCCION DE BARDAS PERIMETRALES EN ESCUELA PRIMARIA JUAN ESCUTIA EN LA LOCALIDAD DE CAMPO SEIS, MUNICIPIO DE SINALOA ESTADO DE SINALOA.			
CONTRATO: FAIS-DOP-SIN-2025-014	IMPORTE: \$ 704,047.18 SIN I.V.A.	PERIODO CONTRATO: DEL 16 DE JUNIO AL 30 DE JULIO DE 2025	
ESTIMACIÓN No.: 1	PERIODO: 16 DE JUNIO AL 1 DE JULIO	FECHA: 01/07/2025	
			HOJA: 1 DE 1

RESUMEN DE ESTIMACIÓN

TRABAJOS PRELIMINARES	\$53,473.40
CERCA PERIMETRAL	\$451,789.30
VARIOS	\$4,772.79

SUB-TOTAL DE OBRA:	\$510,035.49
I.V.A. (16%):	\$81,605.68
SUB-TOTAL DE ESTIMACION:	\$591,641.17

DEDUCCIONES:	
Amortización 35.00%	\$207,074.41
INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y CONTROL DE LOS TRABAJOS: 3%	\$15,301.06
Suma de deducciones	\$222,375.47


Neto a pagar de esta estimación: **\$369,265.70**

(Son: TRESCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS SESENTA Y CINCO 70/100 M.N.)

ING. RAMON LEYVA GUTIERREZ


REPRESENTANTE LEGAL.

JUAN MANUEL LOPEZ MENCHACA


DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS.

ING. AMILKAR IMANOL RUBIO OSUNA


RESIDENTE DE SUPERVISION.



MUNICIPIO DE SINALOA
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
ESTIMACION DE OBRA



OBRA: CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN ESCUELA PRIMARIA JUAN ESCUTIA EN LA LOCALIDAD DE CAMPO SEIS, MUNICIPIO DE SINALOA ESTADO DE SINALOA.			 GRUPO REYGH
CONTRATO: FAIS-DOP-SIN-2025-014	IMPORTE: \$ 704,047.18 SIN I.V.A.	PERIODO CONTRATO: DEL 16 DE JUNIO AL 30 DE JULIO DE 2025	
ESTIMACIÓN No.: 1	PERIODO: 16 DE JUNIO AL 1 DE JULIO	FECHA: 45839	
			HOJA: 1 DE 1

RESUMEN GENERAL DE ESTIMACIÓN

CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN ESCUELA PRIMARIA JUAN ESCUTIA EN LA LOCALIDAD DE CAMPO SEIS, MUNICIPIO DE SINALOA ESTADO DE SINALOA. \$510,035.49

SUB-TOTAL DE OBRA: \$510,035.49
I.V.A. (16%): \$81,605.68
SUB-TOTAL DE ESTIMACION: \$591,641.17


DEDUCCIONES:
Amortización 35.00% \$207,074.41
INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y CONTROL DE LOS TRABAJOS: 3% \$15,301.06

Suma de deducciones \$222,375.47


Neto a pagar de esta estimacion: **\$369,265.70**

(Son: TRESCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS SESENTA Y CINCO 70/100 M.N.)

ING. RAMON LEYVA GUTIERREZ


REPRESENTANTE LEGAL.

JUAN MANUEL LOPEZ MENCHACA


DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS.

ING. AMILKAR IMANOL RUBIO OSUNA


RESIDENTE DE SUPERVISION.



MUNICIPIO DE SINALOA
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
ESTIMACION DE OBRA




CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN ESCUELA PRIMARIA JUAN ESCUTIA EN LA LOCALIDAD DE CAMPO SEIS, OBRA: MUNICIPIO DE SINALOA ESTADO DE SINALOA.					 GRUPO REYGH CONSTRUCTORES			
CONTRATO: FAIS-DOP-SIN-2025-014		PERIODO CONTRATO: DEL 16 DE JUNIO AL 30 DE JULIO DE 2025						
IMPORTE CONTRATO: \$816,694.73 CON I.V.A.		IMPORTE ANTICIPO: \$285,843.16 CON I.V.A.						
ESTIMACIÓN No.: 1		PERIODO: 16 DE JUNIO AL 1 DE JULIO			FECHA: ##		HOJA: 1 DE 1	

ESTADO DE CUENTA									
ESTIMACION	PERIODO	IMPORTE DE ESTIMACION	INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y CONTROL: 3 %				AMORTIZACION DE ANTICIPO (35%)	TOTAL DE DEDUCCIONES	LIQUIDO A PAGAR
ESTIMACION 1(UNICA)	16 DE JUNIO AL 1 DE JULIO	\$591,641.17	\$15,301.06				\$207,074.41	\$222,375.47	\$369,265.70
TOTALES		\$591,641.17	\$15,301.06				\$207,074.41	\$222,375.47	\$369,265.70
SALDO DEL CONTRATO:		\$225,053.56	SALDO POR AMORTIZAR DEL ANTICIPO				\$78,768.75		

ING. RAMON LEYVA GUTIERREZ


REPRESENTANTE LEGAL.

JUAN MANUEL LOPEZ MENCHACA


DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS.

ING. AMILKAR IMANOL RUBIO OSUNA

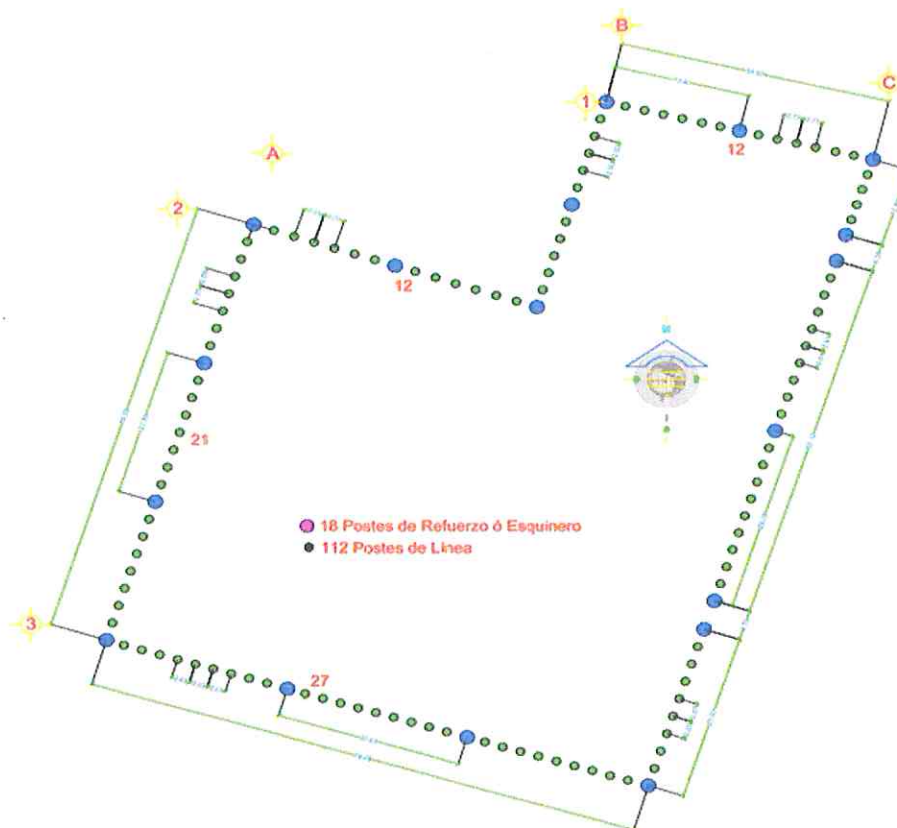

RESIDENTE DE SUPERVISION.




MUNICIPIO DE SINALOA
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
ESTIMACION DE OBRA




OBRA: CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN ESCUELA PRIMARIA JUAN ESCUTIA EN LA LOCALIDAD DE CAMPO SEIS, MUNICIPIO DE SINALOA ESTADO DE SINALOA.			<div> GRUPO REYGH CONSTRUCTORES</div> <div>Hoja:1 de 13</div>
CONTRATO: FAIS-DOP-SIN-2025-014		PERIODO CONTRATO: DEL 16 DE JUNIO AL 30 DE JULIO DE 2025	
IMPORTE CONTRATO: \$ 704,047.18 SIN I.V.A.		IMPORTE ANTICIPO: \$ 285,843.15 CON I.V.A.	
ESTIMACIÓN No.: 1	PERIODO: 16 DE JUNIO AL 1 DE JULIO	FECHA: 01/07/2025	
CROQUIS			



ING. RAMON LEYVA GUTIERREZ


REPRESENTANTE LEGAL.

JUAN MANUEL LOPEZ MENCHACA


DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS.

ING. AMILKAR IMANOL RUBIO OSUNA


RESIDENTE DE SUPERVISION.



MUNICIPIO DE SINALOA
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
ESTIMACION DE OBRA



OBRA: CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN ESCUELA PRIMARIA JUAN ESCUTIA EN LA LOCALIDAD DE CAMPO SEIS, MUNICIPIO DE SINALOA ESTADO DE SINALOA.

CONTRATO: FAIS-DOP-SIN-2025-014

PERIODO CONTRATO: DEL 16 DE JUNIO AL 30 DE JULIO DE 2025

IMPORTE CONTRATO: \$ 704,047.18 SIN I.V.A.

IMPORTE ANTICIPO: \$ 121,618.94 CON I.V.A.

ESTIMACIÓN No.: 1

PERIODO: 16 DE JUNIO AL 1 DE JULIO

FECHA:

01/07/2025



Hoja:1 de 5

REPORTE FOTOGRAFICO



ING. RAMON LEYVA GUTIERREZ

REPRESENTANTE LEGAL.

JUAN MANUEL LOPEZ MENCHACA

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS.

ING. AMILKAR IMANOL RUBIO OSUNA

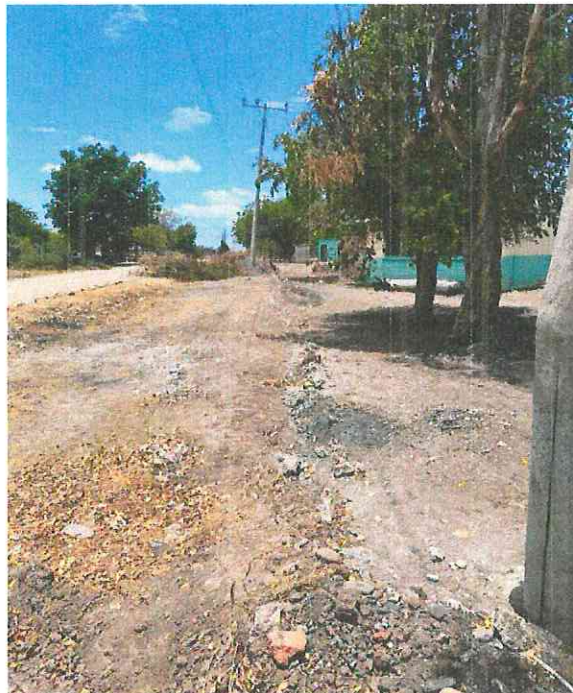
RESIDENTE DE SUPERVISION.



MUNICIPIO DE SINALOA
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
ESTIMACION DE OBRA




OBRA: CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN ESCUELA PRIMARIA JUAN ESCUTIA EN LA LOCALIDAD DE CAMPO SEIS, MUNICIPIO DE SINALOA ESTADO DE SINALOA.			
CONTRATO: FAIS-DOP-SIN-2025-014	PERIODO CONTRATO: DEL 16 DE JUNIO AL 30 DE JULIO DE 2025		
IMPORTE CONTRATO: \$ 704,047.18 SIN I.V.A.	IMPORTE ANTICIPO: \$ 121,618.94 CON I.V.A.		
ESTIMACIÓN No.: 1	PERIODO: 16 DE JUNIO AL 1 DE JULIO	FECHA: 01/07/2025	
Hoja:2 de 5			
REPORTE FOTOGRAFICO			




ING. RAMON LEYVA GUTIERREZ


REPRESENTANTE LEGAL.

JUAN MANUEL LOPEZ MENCHACA


DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS.

ING. AMILKAR IMANOL RUBIO OSUNA


RESIDENTE DE SUPERVISION.



MUNICIPIO DE SINALOA
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
ESTIMACION DE OBRA




OBRA: CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN ESCUELA PRIMARIA JUAN ESCUTIA EN LA LOCALIDAD DE CAMPO SEIS, MUNICIPIO DE SINALOA ESTADO DE SINALOA.			 GRUPO REYGH CONTRASTORES
CONTRATO: FAIS-DOP-SIN-2025-014		PERIODO CONTRATO: DEL 16 DE JUNIO AL 30 DE JULIO DE 2025	
IMPORTE CONTRATO: \$ 704,047.18 SIN I.V.A.		IMPORTE ANTICIPO: \$ 121,618.94 CON I.V.A.	
ESTIMACIÓN No.: 1	PERIODO: 16 DE JUNIO AL 1 DE JULIO	FECHA: 01/07/2025	
Hoja:3 de 5			
REPORTE FOTOGRAFICO			




ING. RAMON LEYVA GUTIERREZ


REPRESENTANTE LEGAL.

JUAN MANUEL LOPEZ MENCHACA


DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS.

ING. AMILKAR IMANOL RUBIO OSUNA


RESIDENTE DE SUPERVISION.



MUNICIPIO DE SINALOA
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
ESTIMACION DE OBRA



OBRA: CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN ESCUELA PRIMARIA JUAN ESCUTIA EN LA LOCALIDAD DE CAMPO SEIS, MUNICIPIO DE SINALOA ESTADO DE SINALOA.

CONTRATO: FAIS-DOP-SIN-2025-014

PERIODO CONTRATO: DEL 16 DE JUNIO AL 30 DE JULIO DE 2025

IMPORTE CONTRATO: \$ 704,047.18 SIN I.V.A.

IMPORTE ANTICIPO: \$ 121,618.94 CON I.V.A.

ESTIMACIÓN No.: 1

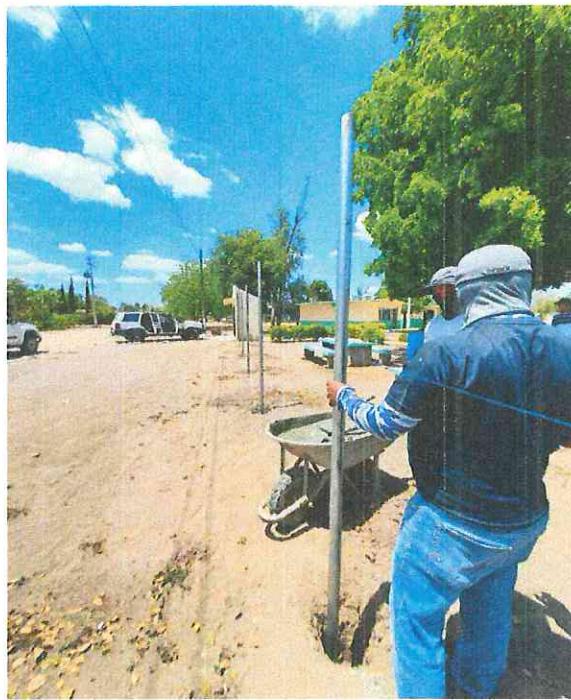
PERIODO: 16 DE JUNIO AL 1 DE JULIO

FECHA:

01/07/2025

Hoja:4 de 5

REPORTE FOTOGRAFICO



ING. RAMON LEYVA GUTIERREZ

REPRESENTANTE LEGAL.

JUAN MANUEL LOPEZ MENCHACA

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS.

ING. AMILKAR IMANOL RUBIO OSUNA

RESIDENTE DE SUPERVISION.
