

NOTA NO.1

09 DE JUNIO DEL 2022

CON ESTA FECHA SE ABRE ESTE LIBRO DE BITACORAS PARA DARLE SEGUIMIENTO A LA OBRA "PAVIMENTACION EN CALLE JACOBO GUTIERREZ ENTRE BENITO JUAREZ Y CALLE LIBERTAD EN EL POBLADO DE SAN FRANCISCO, MUNICIPIO DE MAZATLAN, ESTADO DE SINALOA, LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS S.O.P. EN LA NORMATIVIDAD NOMBRA A LA EMPRESA DESARROLLOS GPAC, S.A. DE C.V. COMO ORGANISMO RESPONSABLE DE LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS DEL CONTRATO NO. OPPU-EST-ADP-REST-VIAL-02060-2022, CON UN IMPORTE DE \$909,180.13 IVA INCLUIDO, Y UN PERIODO DE EJECUCION DEL 09-JUNIO-2022 AL 07 DE AGOSTO-2022. SE REGISTRAN LAS FIRMAS DE LAS PERSONAS ENCARGADAS DEL CONTRATO Y EJECUCION DE LA OBRA.

NOTA NO.2

09 DE JUNIO DEL 2022

CON ESTA FECHA EN COMPAÑIA DEL CONTRATISTA DESARROLLOS GPAC, S.A. DE C.V. SE LE NOTIFICA QUE DEBEA DE PRESENTAR OFICIO DE NOTIFICACION DE INICIO DE ACTIVIDADES, ASI MISMO OFICIO DE ASIGNACION DE RESIDENTE Y/O SUPERINTENDENTE, CON COPIA DE Cedula profesional, ESTOS OFICIOS SEAN DIRIGIDOS AL ING. JOSE CARLOS HERNANDEZ MARTINEZ, DIRECTOR DE SUPERVISION DE LA SECRETARIA S.O.P. DE ACUERDO A LA CLASULA QUINTA DE ESTE CONTRATO.

Nota No. 3

09 de Junio del 2022

Con esta fecha el contratista da inicio a los trabajos contratados iniciando con el trazo para verificación de lo físico contra proyecto.

Nota No. 4



10 de Junio del 2022

Con esta fecha se inician las excavaciones con maquina en terreno seco en material tipo "B" y tipo "C" en zanjas mayores a 1.20 M de profundidad para la reposición de la infraestructura hidráulica y Sanitaria.

Nota No. 5

14 de Junio del 2022



Con esta fecha se da inicio al suministro e instalación de tubería Pvc de 8" para alcantarillado, seguido de la interconexión para conectar al registro domiciliario con tubería de Pvc Sanitario de 6" y construcción de pozo de visita tipo común de 1.25 M de profundidad, aplanado interior pulido y exterior floteado.



Nota No. 6

15 de Junio del 2022



Con esta fecha se da inicio al suministro e instalación de tubería Pvc hidráulico de 3" seguido del inicio de la prueba hidrostática según la Norma Oficial Mexicana NOM-001-CONAGUA-2011.



Nota No. 7

25 de Junio del 2022



Con esta fecha Se da inicio al corte en caja con medios mecánicos en material tipo I o II, incluyendo carga y acarreo en camión al primer kilómetro con producto del corte de caja.

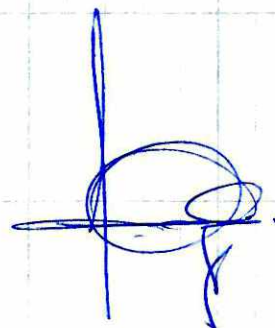

Nota No. 8

26 de Junio del 2022



Con esta fecha Se da inicio a los trabajos de afine y compactación del terreno natural al 90% Proctor, seguido del tendido y compactación en sub-base con material pétreo.

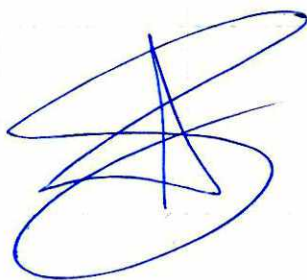

Nota No. 9

29 de Junio del 2022



Con esta fecha se inician los trabajos de construcción de registros de $0.60 \times 0.40 \times 1.00$ M a base de tabique rojo recocido, acabado interior pulido, incluyendo tapa de concreto armada, marco y contra-marco.



Nota No. 10

01 de Julio del 2022



Con esta fecha se inician los trabajos de control de calidad en el afine del terreno natural y en sub-base, incluyendo herramientas, equipo, mano de obra, y todo lo necesario para su correcta ejecución.



Nota No. 11

03 de Julio del 2022



Con esta fecha se da inicio a los trabajos de mezcla, tendido y compactación de Base de Grava-Arena de 15 cms de espesor, compactada al 100% de su peso volumétrico.



Nota No. 12

08 de Julio del 2022





Con esta fecha se da inicio a los trabajos de riego de impregnación con emulsión asfáltica de 1.5 a 1.8 Lts por M^2 .



NOTA NO-13

08 DE JULIO DEL 2022


EL CONTRATISTA PRESENTA ESTIMACION NO-1 (NORMA) UNO, PARA SU REVISION Y/O AUTORIZACION CON UN PERIODO DEL 09/06/22 AL 08/07/22, CON UN IMPORTE DE \$391,105.22 IVA INCLUIDO, Y ESTIMACION NO-2 (DOS) ADICIONAL PARA SU REVISION Y/O AUTORIZACION CON UN PERIODO DEL 09/06/22 AL 08/07/22, CON UN IMPORTE DE \$46,351.07 IVA INCLUIDO.

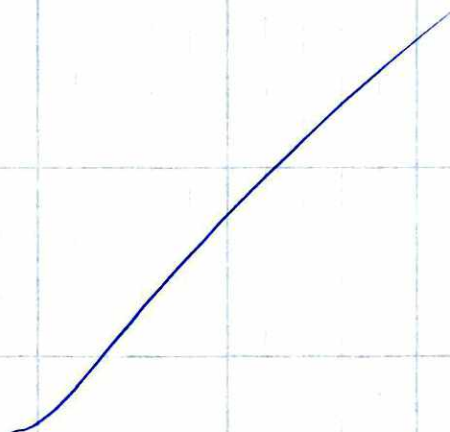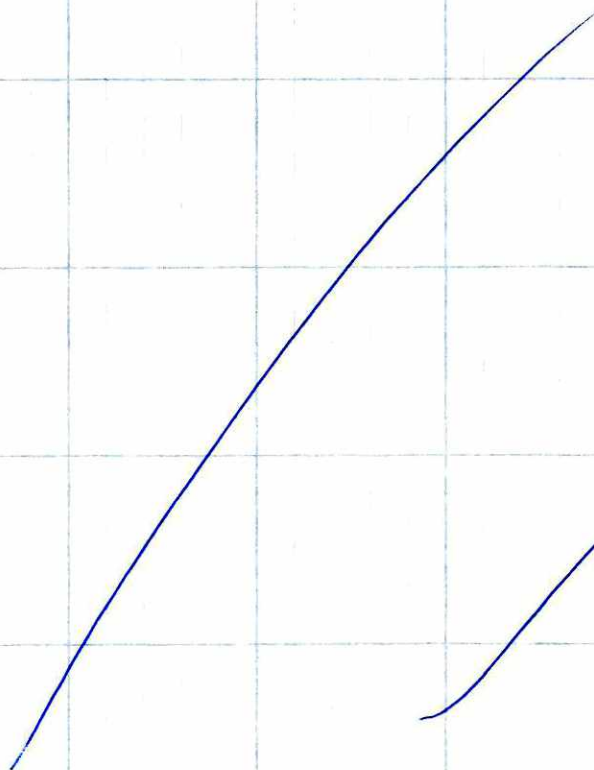

Nota No. 14

11 de Julio del 2022


Con esta fecha se da inicio al suministro de concreto para guarnición tipo "L" de $15 \times 30 \times 60$ cm, con un $f'c = 200 \text{ kg/cm}^2$, incluyendo todo lo necesario para su correcta realización.



Nota No. 15

15 de Julio del 2022


Con esta fecha se da inicio a la colocación de brocal y tapa ciega de fofó de tipo pesado de 158 kg, seguido del conado de losa de pavimento.



Nota No. 16

18 de Junio del 2022



Con esta fecha se da inicio al suministro de concreto para losa de pavimento de concreto premezclado de 15 cms de espesor, con un $f'c = 250 \text{ kg/cm}^2$, incluyendo todo lo necesario para su correcta realización.

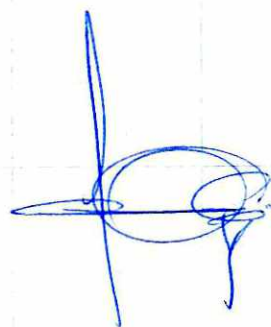

Nota No. 17

22 de Junio del 2022


Con esta fecha se da inicio a la construcción de machuelo de 15 X 20 cm de concreto premezclado de $f'c = 250 \text{ kg/cm}^2$, incluyendo todo lo necesario para su correcta realización.



Nota No. 18

27 de Junio del 2022


Con esta fecha se da inicio a los trabajos de Calafateo en losas, guarniciones y toda junta en el área pavimentada, incluyendo limpieza de la junta, capa de impermeprim asfáltico primario, sellado de junta con sellacreto "P" o similar y todo lo necesario para su terminación.



Nota No. 19

04 de Agosto del 2022



Con esta fecha se inician los trabajos de limpieza final de la obra, de acuerdo a la norma N-LEG-3/07, Cláusula D.4.28, respetando las cláusulas que se refieran a la calidad y recepción de la norma.



NOTA No. 20

07 DE AGOSTO DEL 2022


CON ESTA FECHA EL CONTRATISTA PRESENTA ESTIMACION NO-03 (TRES) NORMAL, CON UN PERIODO DEL 09/07/2022 AL 07/08/2022, CON UN IMPORTE DE \$305,598.15 IVA INCLUIDO, Y ESTIMACION NO-04 (ADICIONAL) CON UN PERIODO DEL 09/07/2022 AL 07/08/2022, CON UN IMPORTE DE \$9,136.18 IVA INCLUIDO, PARA SU REVISIÓN Y/O AUTORIZACIÓN.



Nota No. 21

16 de Junio del 2022


Con esta fecha se inicia la construcción de pozo de visita tipo común, de 2.50 m de profundidad, hermético, prueba hidrostática según la Norma NOM-001-CNA-1995 o vigente, aplanado interior pulido y exterior floteado, incluye: Suministro de materiales y mano de obra.



Nota No. 22

28 de Junio del 2022


Con esta fecha se da inicio con los trabajos de sub-base de cascajo con limo de 8 a 10 cms de espesor, compactada al 100% de su peso volumétrico, de acuerdo a la Norma N-CMT-CAR-4-02-001/16, Clausula B1, incluye: Suministro del agregado.



Nota No. 23

20 de Julio del 2022


Con esta fecha se inician los trabajos de reparación de banqueta de concreto $f'c = 150 \text{ kg/cm}^2$ de $2.50 \times 0.75 \times 0.10 \text{ cm}$ de espesor, incluye: muro dentellon de 20 cm de altura a base de tabique de barrounteado y enjarrado con mortero cemento-arena 1:4, relleno con material producto de excavación, Suministro de materiales, acarreos, mano de obra, herramienta y equipo.



Nota No. 24

25 de Julio del 2022



Con esta fecha se finalizan los trabajos de reparación de banqueta de concreto $f'c = 150 \text{ kg/cm}^2$ de $4.20 \times 1.20 \times 0.10 \text{ cm}$ de espesor, incluye: muro dentellon y 2 escalones de 35 cm de altura a base de tabique de barro,unteados y enjarrados con mortero cemento - arena 1:4.



NOTA NO. 25

07 DE AGOSTO DEL 2022

CON ESTA FECHA EL CONTRATISTA PRESENTA ESTIMACION FINIQUITO PARA SU REVISION Y/O AUTORIZACION ESTIMACION NOS EXTRAORDINARIA FINIQUITO, CON UN PERIODO DEL 07/06/2022 AL 07/08/2022, CON UN IMPORTE DE \$65,080.07 IVA INCLUIDO,

NOTA NO. 25

08 DE AGOSTO DEL 2022

CON ESTA FECHA SE CIERRA ESTE LIBRO DE BITACORAS DONDE SE LE DIO SEGUIMIENTO A LA OBRA "PAVIMENTACION EN CALLE JACOB GUTIERREZ ENTRE BENITO JUAREZ Y CALLE LIBERTAD EN EL POBLADO DE SAN FRANCISCO, MUNICIPIO DE MARATLAN, ESTADO DE SINALOA, LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS S.O.P. EN LA NORMATIVIDAD NOMBRÓ A LA EMPRESA DESARROLLOS BRAC, S.A. DE C.V. COMO ORGANISMO RESPONSABLE DE LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS DEL CONTRATO NO-OPDU-EST-AD3-PE37-VIAL-030CC-2022, CON UN IMPORTE DE \$909,180-13 IVA INCLUIDO Y CON UN PERIODO DE EJECUCION DEL 09-JUNIO-2022 AL 07-AGOSTO-2022

EL FINIQUITO DE OBRA QUEDA ASI

MONTOS DE CONTRATO MAS CONSUMO CLIVA = \$909,180-13

SUMA DE ESTIMACIONES = \$817,270-69

SALDO A CANCELAR = \$91,909-44

SUMAS IGUALES = \$909,180-13

