

8 MARZO 2023


NOTA#1 Con esta fecha se abre la presente bitácora para la obra: construcción de ampliación de puente, Ubicado en la Localidad de Guadalupe Victoria (El Atarón) Municipio de Culiacán, Estado de Sinaloa.

- Contrato No. OPPO-EST-ADJ-PEST-VIAL-0603-2023
- Periodo Ejecucion Fecha Inicio 8 Marzo 2023
Fecha Terminacion 6 Abril 2023
- Monto de contrato: \$ 1,617,488.12 \$/lvs
- Contratista: Construcciones Felmi S.A de C.V
- Representante Legal Contratista: Ing. Felipe Mier Ramos
- Supervisor S.O.P.: Ing. Alejandro Sainz Sanchez

- Con esta fecha se hace la visita a la obra con el contratista, para hacer la entrega de la obra, y dar inicio a los trabajos de construcción de ampliación del puente.



Ing. Alejandro Sainz Sanchez
Supervisor S.O.P

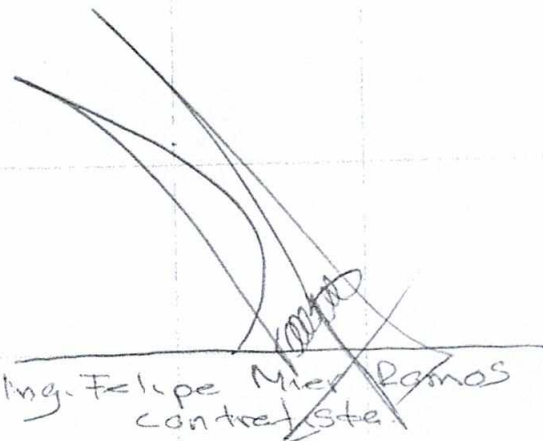


Ing. Felipe Mier Ramos
Contratista

NOTA#2 En supervisión de obra se observa el siguiente avance.

- Se hacen los trabajos de trazo y excavación con máquina.
- Se hacen los trabajos de demolición de concreto retirándose el material de demolición a fuera de la obra.
- Se autoriza realizar un taponamiento con material de préstamo banco, para impedir el paso de agua existente
- Se autoriza realizar los trabajos de estabilización con piedra bola en nivel freático y fangos.
- Se continúan los trabajos de habilitación de acero para los elementos estructurales
- Se continúan los trabajos de estructuras Metálicas



Ing. Alejandro Sainz Sanchez
Supervisor S.O.P

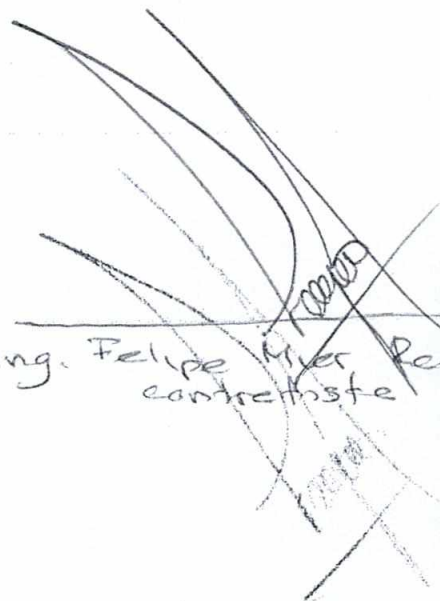

Ing. Felipe Mier Ruelas
Contratista


FECHA 27 Marzo 2023

NOTA #3 En supervisión de obra se muestra el siguiente avance.

- Se terminen los trabajos de Preliminares
- Se colocan apoyo de Neopreno y Junta de calzado de Neopreno
- Se continúan los trabajos de cimbre de paneles.
- Se suministran materiales de banco base y sub-base.
- Se inicien los trabajos de colocación de acero para elementos estructurales
- Se continúen los trabajos de bombeo para desague del agua.



Ing. Alejandro Sanz Sanchez
Supervisor SOP.




Ing. Felipe Mier Ramos
Contratista

NOTA #4

3 Abril 2023

- En supervisión de obra se muestra el siguiente avance
- Se terminan los trabajos de cimbrado y habilitado de acero
- Se vuelan con concreto premezclado $f'c = 250 \text{ kg/cm}^2$ y $f'c = 100 \text{ kg/cm}^2$ elementos estructurales y banquetes

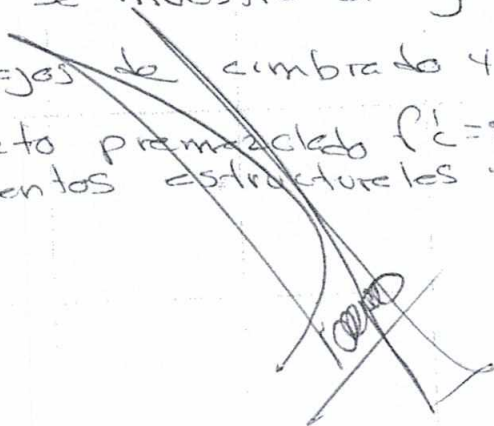

6 April 2023


NOTAS#5 Con este fecha se finalizar los trabajos de construcción ampliacion de puente en la localidad de Guedalup Victoria (El Atrón) Municipio de Coliaco, quedando ejecutados todos los trabajos al 100%.

- Se hace la entrega de la estimacion #1 Final que cobrandose los sig. partidas.


Rejimenes	\$ 81,731.41
Obra Civil	\$ 28,731.39
Cimbra, Estrechos Madre	\$ 57,263.12
Concreto Hidraulico	\$ 304,935.20
Obras Viales	\$ 87,976.56
Aceros Refuerzo para concreto	\$ 410,682.79
Pavimentados	\$ 303,136.86
Estuctura Metalle	\$ 92,671.56
Inst. Hidralica y Sanitario	\$ 13,244.04
Señalizacion Vial	\$ 13,994.58
<hr/>	
3/IVA	\$ 1,394,379.41

- Quedando un saldo de contrato \$ 0.00 pesos

~~Ing. Alejandro Gomez Sanchez~~
~~Supervisor S.O.P.~~



~~Ing. Felipe Mendez~~
~~Contratista S.O.P.~~



- Anote de lo anterior se declare cerrado este Bidecore de obra.
