

CONT-2006E-2023.

NOTA NO. 1 21/JUNIO/2023.

CON ESTA FECHA SE ABRENTA ESTE LIBRO DE BITACORA PARA DAR SEGUIMIENTO A LOS TRABAJOS DEL SIGUIENTE CONTRATO DE OBRA:

OPPU-EST. ADJ-PEST-APDA-2006E-2023

OBJETO DEL CONTRATO:

LA SECRETARIA ENCOMIENDA A LA CONTRATISTA LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE CISTERNAS EN CASA CONA DIF, EN EL MUNICIPIO DE CULIACAN, ESTADO DE SINALOA.

CONTRATISTA: C. ING. LUIS ENRIQUE REDELO GALVEZ

MONTO DE CONTRATO: \$ 321,740.60

PLAZO DE EJECUCION: DEL 21/JUNIO/2023 AL 04 AGOSTO/2023.

LA SECRETARIA ASIGNA AL C. ING. MARIO ENRIQUE ASORGA GALVEZ, MEDIANTE OFICIO NO. SOP-DIR-SUP-1482-A-2023, COMO PRESIDENTE DE OBRA. A CONTINUACION SE REGISTRA SU FIRMA:

LA CONTRATISTA ASIGNA COMO SUPERINTENDENTE DE OBRA AL C. ING. LUIS ENRIQUE REDELO GALVEZ, CON PODER AMPLIO Y SUFICIENTE PARA DIRIGIR LOS TRABAJOS DEL PRESENTE CONTRATO. A CONTINUACION SE REGISTRA SU FIRMA:

NOTA NO. 2 21/JUNIO/2023

LA SECRETARIA PONE A DISPOSICION DEL CONTRATISTA EL NUMERO SOBRE EL CUAL SE LLEVARAN A CABO LOS TRABAJOS RELATIVOS AL PRESENTE CONTRATO, PRESENTE CHAP NO. SOP-DIR-SOP-1462-DE-2023

NOTA NO. 3 21/JUNIO/2023.

NOTIFICA LA CONTRATISTA QUE CON ESTA FECHA DAN INICIO LOS TRABAJOS DEL PRESENTE CONTRATO.


NOTA NO. 4 30/JUNIO/2023.

PARTIDA: CISTERNA DE 10,000-0 LTS.

TRABAJOS EJECUTADOS AL 100% : TRAZO Y NIVELA-
CION, EXCAVACION, RELENOS, ZOPATAS CORRIDAS.


NOTA NO. 5 10/JULIO/2023

PARA ESTA FECHA TENEMOS EFECTUADO LO SIGUIENTE:
MURETE DE CIMENTACION, CASTILLOS, LOSA MADRE;
RETIRO Y COLOCACION DE PUENTE, TAPA METALICA, APLIQUE
DOS.



NOTA NO. 6 31/JULIO/2023.

TENEMOS EFECTUADO HIDRONEUMATICO DE 20 GALONES
AUMENTACION DE AGUA A BOMBA DE 1 1/2" Ø, INTERCO-
NEXIONES. INSTALACIONES ELECTRICAS.

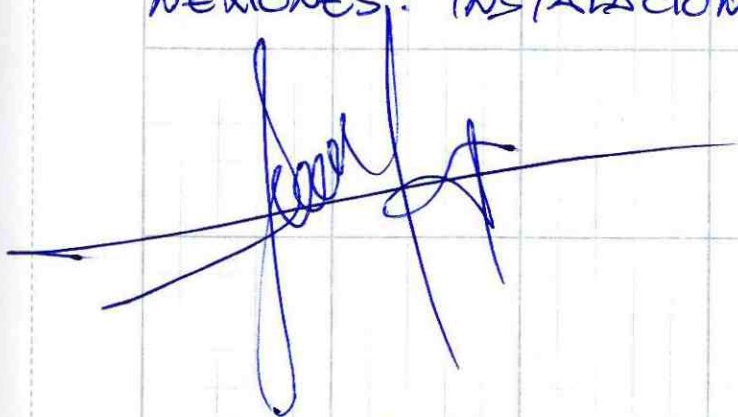

NOTA NO. 7 01/AGOSTO/2023.

PARA ESTA FECHA SE HAN CONCLUIDOS LOS TRABAJOS
COLOCACION DE CISTERNA PLASTICA 10,000.0 LTS.
COLOCACION LINEA PVC HIDRAULICA DE 2" Ø CON
SUS INSTALACIONES COMPLEMENTARIAS.



NOTA NO. 8 07/AGOSTO/2023.

CON ESTA FECHA SE AUTORIZA LA ESTIMACION NUMERO UNO NORMAL FINIQUITO CON UN PERIODO DE EJECUCION DEL 21/JUNIO/2023 AL 01/AGOSTO/2023, LA CUAL PRESENTA EL SIGUIENTE DESGLOSE:

IMPORTE TOTAL	\$ 321,738.66
AMORT. ANTICIPO	\$ 0.00
DEDUCCIONES	\$ 8,320.83
LÍQUIDO A PAGAR	\$ 313,417.83

NOTA NO. 9 07/AGOSTO/2023.

CON ESTA FECHA SE CIERRA LA PRESENTE BITACORA, EN VIRTUD DE HABER CUMPLIDO CON LAS METAS DEL PROYECTO Y DEL CONTRATO.
