



OFICIO No. OPDUyE/450/2025
ASUNTO: SOLICITUD PAGO ESTIMACION
01 NORMAL
Badiraguato, Sin., a 06 de Agosto de 2025


MTRO. GONZALO IRINEO CABALLERO TERRAZAS
TESORERO MUNICIPAL
P R E S E N T E.-

POR MEDIO DE LA PRESENTE, LE SOLICITO EL PAGO POR CONCEPTO DE ESTIMACIÓN 01 NORMAL, DEL IMPORTE DEL CONTRATO, A FAVOR DE LA EMPRESA: CONSTRUCCIONES DORACO, S.A. DE C.V., LA CUAL REALIZA LOS TRABAJOS APROBADOS POR EL SUBCOMITÉ DE BIENESTAR MUNICIPAL, A CONTINUACIÓN, SE DETALLA:

- **NOMBRE DE LA OBRA:** CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO, EN LA CALLE SIN NOMBRE ENTRE BOULEVARD JUAN S MILLÁN Y CALLE SALVADOR ALVARADO, COLONIA CENTRO, MUNICIPIO DE BADIRAGUATO, SINALOA.
- **No. DE CONTRATO:** MBGBR-AD-FAISMUN-009/2025.
- **IMPORTE DEL CONTRATO:** \$186,325.16 (CIENTO OCHENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS VEINTICINCO PESOS 16/100 M.N.).
- **CONCEPTO DEL PAGO:** PAGO DE ESTIMACION 01 NORMAL.
- **IMPORTE A PAGAR:** \$149,099.08 (CIENTO CUARENTA Y NUEVE MIL NOVENTA Y NUEVE PESOS 08/100 M.N)
- **RECURSOS:** FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FAISMUN) EJERCICIO 2025.
- **EMPRESA:** CONSTRUCCIONES DORACO, S.A. DE C.V.
- **R.F.C.:** CDO070612UY1
- **DOMICILIO FISCAL:** CALLE. COLON #375, COLONIA CENTRO, ENTRE CALLEJON 21 DE MARZO Y CALLEJON VALLADO, GUASAVE, SINALOA, C.P. 81000;
- **No. DE FACTURA:** # 297, DE FECHA 06 DE AGOSTO DE 2025.

SE ANEXA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DE SOPORTE, COMO AMPARO DE DICHO PAGO.

AGRADECIENDO DE ANTEMANO LA ATENCIÓN QUE SE SIRVA DAR A LA PRESENTE, ME DESPIDO QUEDANDO A SUS ÓRDENES.



ATENTAMENTE

ING. RUBIEL RINCÓN RAMOS
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS,
DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA

C.C.P. ARCHIVO. DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS,
DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA,
BADIRAGUATO, SINALOA.



MUNICIPIO DE
BADIRAGUATO
TESORERÍA

Alexs
06 AGO 2025
6:00 PM

RECIBIDO

CONSTRUCCIONES DORACO

CDO070612UY1

RÉGIMEN FISCAL: 626 - Régimen Simplificado de Confianza
COLON, 375, Centro, 81000, Guasave, Guasave, Sinaloa, México
Tel. 6673363111

CLIENTE

MUNICIPIO DE BADIRAGUATO
MBA850101214

USO CFDI: I01 - Construcciones.
DOMICILIO FISCAL: 80500

REGIMEN FISCAL: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
S/N, 80500, Badiraguato, Sinaloa, México

Factura 297

FOLIO FISCAL (UUID)

29AD25D1-FA0C-4310-B23F-4FD9BF22A032

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

00001000000711762511

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000709569399

FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN

2025-08-06T17:30:57

RFC PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN

STA0903206B9

FECHA Y HORA DE EMISIÓN DE CFDI

2025-08-06T16:19:14

LUGAR DE EXPEDICIÓN

81000

CONCEPTOS

CONCEPTOS					
Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Objeto Imp.	Importe
1.00	E48 - LOTE	PAGO DE ESTIMACION 01 NORMAL DE LA OBRA: "CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN LA CALLE SIN NOMBRE ENTRE BOULEVARD JUAN S MILLAN Y CALLE SALVADOR ALVARADO, COLONIA CENTRO, MUNICIPIO DE BADIRAGUATO SINALOA. CONTRATO No. MBGBR-AD-FAISMUN-009/2025	\$ 131,946.09	02 - Sí objeto de impuesto.	\$ 131,946.09
		CONTRATADO			
		IMPORTE: \$160,625.14			
		IVA: \$25,700.02			
		TOTAL: \$186,325.16			
		IMPORTE DE LA OBRA EJECUTADA SIN IVA: \$131,946.09			
		MAS IVA 16% : \$21,111.37			
		TOTAL DE LA OBRA EJECUTADA CON IVA : \$153,057.46			
		DEDUCCIONES			
		AMORTIZACION ANTICIPO 35%: \$0.00			
		MAS IVA 16%: \$0.00			
		TOTAL AMORTIZACION ANTICIPO: \$0.00			
		MONTO A FACTURAR DE LA ESTIMACION EN BRUTO: \$131,946.09			
		IVA A FACTURAR (16%): \$21,111.37			
		TOTAL A FACTURAR DE LA ESTIMACION: \$153,057.46			
		RETENCION 3%(S.V.I.F.Y.C.) : \$3,958.38			
		TOTAL DE DEDUCCIONES: \$3,958.38			
		MONTO LIQUIDO A RECIBIR : \$149,099.08			
		Clave Prod. Serv. - 72101500 Servicios de apoyo para la construcción			
		Impuestos:			
		Trasladados:			
		002 IVA Base - 131946.0862 Tasa - 0.160000 Importe - \$ 21,111.37			

IMPORTE CON LETRA

CIENTO CINCUENTA Y TRES MIL CINCUENTA Y SIETE PESOS,
46/100 MXN

SUBTOTAL

\$ 131,946.09

TRASLADO IVA TASA 0.160000

\$ 21,111.37

TOTAL

\$ 153,057.46

TIPO DE COMPROBANTE

I - Ingreso

FORMA DE PAGO

99 - Por definir

MÉTODO DE PAGO

PPD - Pago en parcialidades o diferido

MONEDA

MXN - Peso Mexicano

VERSION

4.0

EXPORTACION

01 - No aplica



SELLO DIGITAL DEL CFDI

zY+ID3I4rqTSEdNdC0/6UM7V0bj+jtUfHKbd1S9g3cfaD5euf7Xj4EuKdJ97/zhB0gSLeSFdhDn1W45fRRB0ihlcD3eBaQJMRuBsqk8GQDXXCREG+wBwWl1B0hofioik
Nj0n/JHQ5c9LK4fWLF3QsNbxmi7nH4Tqt21a2vf+I2sPVbfCfA+H6EgoWWRwSNwuvrkULuCE7AohsJBKcMlejW8H+8U9ingZytnfLZGN2Pihv8P1Yuq6UI8eWsXzUx6RrJ
bTj0Jgk5JFXVA9fwnWKuf1Uhg0HclMM7zCDgDHyWOMcV3mkUZBCuYUIYLH0dH2UM9PWYjuEg==

SELLO DIGITAL DEL SAT

s5o6hXHLGIV9Xn20nFEASOBqWARDf0APg4oRz/hUwJl9eChR1eA3gr7I97Piu0VutVDJnKAG6KMPV1g5IZVpi9ncO30gkbbTLFAaYRw+6hT/fv0EsA+DvuwWylKTHP
mso5tq1b9rqDc6RcGLhgG19Pekq/wA7llak/CEbJlZimFnSbrKJlpX2pU+KNVLY+dlQ5jHzK4td+hbIHdJeggcNbdFPJm9gA4rFk4G2JNnd/CO4PBjeYAjiv18/doB6D4mxHJR
Zm4E5MRFPc4jVcrYQ0YfBas3KqIomsC+Ed1MjCFe+V3r2/dBSYyo35gWNtDWHoC1yfiWx+GGgUQ==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|29AD25D1-FA0C-4310-B23F-4FD9BF22A032|2025-08-06T17:30:57|STA0903206B9|zY+ID3I4rqTSEdNdC0/6UM7V0bj+jtUfHKbd1S9g3cfaD5euf7Xj4EuKdJ97/zhB0gSLeSFdhDn1W45fRRB0ihlcD3eBaQJMRuBsqk8GQDXXCREG+wBwWl1B0hofioikNj0n/JHQ5c9LK4fWLF3QsNbxmi7nH4Tqt21a2vf+I2sPVbfCfA+H6EgoWWRwSNwuvrkULuCE7AohsJBKcMlejW8H+8U9ingZytnfLZGN2Pihv8P1Yuq6UI8eWsXzUx6RrJbTj0Jgk5JFXVA9fwnWKuf1Uhg0HclMM7zCDgDHyWOMcV3mkUZBCuYUIYLH0dH2UM9PWYjuEg==|j00001000000711762511||

Folios Digitales premium® CFDI

Descargue gratis este comprobante

en formato digital .XML ingresando a: foliosdigitales.blikon.com/xmlPara facturar en línea ingresa a: foliosdigitales.blikon.com

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Página 1 de 1

This XML file does not appear to have any style information associated with it. The document tree is shown below.

```
<cfdi:Comprobante xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:cfdi="http://www.sat.gob.mx/cfd/4"
xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/cfd/4 http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/4/cfdv40.xsd" Version="4.0" Folio="297" Fecha="2025-08-
06T16:19:14"
Sello="zY+td3I4rqTSEdNdC0/6UM7V0bj+jt/ufHKbd1S9g3cfaD5euf7Xj4EuKdJ797/zhB0gSLeSfDhDn1W45tRRB10hIhCD3eBaqJMRuBsqk88GQDXXCREG+wBwWI1B0hofIoikNj0n/JHQ5c9LK4
FormaPago="99" NoCertificado="00001000000709569399"
Certificado="MIIGIDCCRAigAwIBAgIUMDAwMDEwMDAwMDA3MDk1NjkzOTkwOQYyKz0IhvcNAQELBQAwggVMTUwMwYDVQQDDCyBQyBERUwglU0VSVk1DSU8gREUGQURNSU51U1RSQUNJT04gVFJJQ1VU
SubTotal="131946.09" Moneda="MXN" Total="153057.46" TipoDeComprobante="I" Exportacion="01" MetodoPago="PPD" LugarExpedicion="81000"
<cfdi:Emisor Rfc="C00070612UY1" Nombre="CONSTRUCCIONES DORACO" RegimenFiscal="626"/>
<cfdi:Receptor Rfc="MBA850101214" Nombre="MUNICIPIO DE BADIRAGUATO" DomicilioFiscalReceptor="80500" RegimenFiscalReceptor="603" UsoCFDI="I01"/>
<cfdi:Conceptos>
  <cfdi:Concepto ClaveProdServ="72101500" Cantidad="1" ClaveUnidad="E48" Unidad="LOTE" Descripcion="PAGO DE ESTIMACION 01 NORMAL DE LA OBRA:
  "CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN LA CALLE SIN NOMBRE ENTRE BOULEVARD JUAN S MILLAN Y CALLE SALVADOR ALVARADO, COLONIA CENTRO, MUNICIPIO DE
  BADIRAGUATO SINALOA. CONTRATO No. MBGBR-AD-FATSMUN-009/2025 CONTRATADO IMPORTE: $160,625.14 IVA: $25,700.02 TOTAL: $186,325.16 IMPORTE DE LA OBRA
  EJECUTADA SIN IVA: $131,946.09 MAS IVA 16% : $21,111.37 TOTAL DE LA OBRA EJECUTADA CON IVA : $153,057.46 DEDUCCIONES AMORTIZACION ANTICIPO 35%: $0.00
  MAS IVA 16%: $0.00 TOTAL AMORTIZACION ANTICIPO: $0.00 MONTO A FACTURAR DE LA ESTIMACION EN BRUTO: $131,946.09 IVA A FACTURAR (16%): $21,111.37 TOTAL
  A FACTURAR DE LA ESTIMACION: $153,057.46 RETENCION 3%( S.V.I.F.Y.C.) : $3,958.38 TOTAL DE DEDUCCIONES: $3,958.38 MONTO LIQUIDO A RECIBIR :
  $149,099.08" ValorUnitario="131946.0862" Importe="131946.0862" ObjetoImp="02">
    <cfdi:Impuestos>
      <cfdi:Traslados>
        <cfdi:Traslado Base="131946.0862" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.160000" Importe="21111.373792"/>
      </cfdi:Traslados>
    </cfdi:Impuestos>
  </cfdi:Concepto>
</cfdi:Conceptos>
<cfdi:Impuestos TotalImpuestosTrasladados="21111.37">
  <cfdi:Traslados>
    <cfdi:Traslado Base="131946.09" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.160000" Importe="21111.37"/>
  </cfdi:Traslados>
</cfdi:Impuestos>
<cfdi:Complemento>
  <tfd:TimbreFiscalDigital xmlns:tfd="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital" Version="1.1" RfcProvCertif="STA090320689" UUID="29AD25D1-FA0C-4310-
  B23F-4FD98F22A032" FechaTimbrado="2025-08-06T17:30:57"
  SelloCFD="zY+td3I4rqTSEdNdC0/6UM7V0bj+jt/ufHKbd1S9g3cfaD5euf7Xj4EuKdJ797/zhB0gSLeSfDhDn1W45tRRB10hIhCD3eBaqJMRuBsqk88GQDXXCREG+wBwWI1B0hofIoikNj0n/JH
  NoCertificadoSAT="00001000000711762511"
  SelloSAT="s5o6/hXHLGIv9Xn20nFEASOBqWArDf0APq4oRz/hUwJt9eChrieA3gr7197Piu0VutVDJnKA66KMPv1g51ZVp19xc030gkbbTLFAaYRw+Ght/fv0EsA+DvuwWyKLTHPms0Siq1b9r
  xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital
  http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/TimbreFiscalDigital/TimbreFiscalDigitalv11.xsd"/>
</cfdi:Complemento>
</cfdi:Comprobante>
```



CONSTRUCCIONES DORACO S.A DE C.V

Dependencia :
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA
Control de Estimaciones

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO, EN LA CALLE SIN NOMBRE ENTRE BOULEVARD JUAN S MILLÁN Y CALLE SALVADOR ALVARADO, COLONIA CENTRO, MUNICIPIO DE BADIRAGUATO, SINALOA		Fecha:		Estimacion:	
		14 de julio de 2025		01 NORMAL	
Periodo de la estimación:	30/06/2025	09/07/2025	Localidad:	No. De contrato:	
Periodo de Ejecución:	30/06/2025	09/07/2025	BADIRAGUATO	MSGBR-AD-FAISMUN-009/2025	
Importe del contrato con I.V.A:		Imp. Contratado sin I.V.A	Anticipo	Importe Anticipo sin I.V.A	% de Avance
\$ 186,325.16		\$ 160,625.14	\$ -	\$ -	82%
					% Avance Total
					82%

Control Del Anticipo	Liquidacion de Estimacion	Control de Estimacion
AMORTIZA ESTA ESTIMACION	Importe de la Estimacion (+) \$ 131,946.09	ESTA ESTIMACION
\$ -	16 % I.V.A (+) \$ 21,111.37	\$ 153,057.46
	Sub- Total A (=) \$ 153,057.46	
	Amortizacion Anticipo 35% \$ -	
AMORTIZACION ANTERIOR	16 % I.V.A (+) \$ -	ACUMULADO ANTERIOR
\$ -	Total (=) \$ -	\$ -
	Importe TOTAL A FACTURAR \$ 131,946.09	
TOTAL AMORTIZADO	16 % I.V.A (+) \$ 21,111.37	TOTAL ACUMULADO.
\$ -	Total (=) \$ 153,057.46	\$ 153,057.46
	3 % SVIFYC: \$ 3,958.38	
ANTICIPO OTORGADO	Total Deducciones (=) \$ 3,958.38	CONTRATADO
\$ -	Importe TOTAL \$ 149,099.08	\$ 186,325.16
	NETO A PAGAR	
SALDO DEL ANTICIPO	\$ 149,099.08	SALDO
\$0.00	Son:	\$ 33,267.70
	(SON CIENTO CUARENTA Y NUEVE MIL NOVENTA Y NUEVE PESOS 08/100 M.N.)	

ELABORO.-

C.CONSTRUCCIONES DORACO S.A DE C.V
REPRESENTANTE LEGAL

REVISO

ING.JOSE RODOLFO CONTRERAS LOPEZ
COSTOS Y PRESUPUESTOS.

AUTORIZO

C. ING. RUBIEL RINCON RAMOS.
DIRECTOR O.P.D.U. Y E.



Fecha: 14 de julio de 2025

CARATULA DE ESTIMACIÓN

CONTRATISTA:	CONSTRUCCIONES DORACO S.A DE C.V		ESTIMACIÓN No:	01 NORMAL
DOMICILIO:	CALLE. COLON #375, COLONIA CENTRO, ENTRE CALLEJON 21 DE MARZO Y CALLEJON VALLADO, GUASAVE, SINALOA, C.P. 81000		PERIODO DE ESTIMACION:	
TELÉFONO:	CEL:		DEL	30-jun-25
6671531178	6678229976		AL	09-jul-25
R.F.C.				
CDO070612UY1			FECHA DE CONTRATO:	
DEPENDENCIA.-			28-jun-25	
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA				
LOCALIDAD:		MUNICIPIO:	PERIODO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO:	
BADIRAGUATO		BADIRAGUATO	INICIO:	30-jun-25
			TERMINACIÓN:	09-jul-25
DESCRIPCIÓN:				
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO, EN LA CALLE SIN NOMBRE ENTRE BOULEVARD JUAN S MILLÁN Y CALLE SALVADOR ALVARADO, COLONIA CENTRO, MUNICIPIO DE BADIRAGUATO, SINALOA				
CONTRATO No:				
MBGBR-AD-FAISMUN-009/2025				
IMPORTE SIN IVA DE LA OBRA	IMPORTE CON IVA DE LA OBRA	35% ANTICIPO DE LA OBRA	IMPORTE TOTAL DE CONTRATO:	
\$160,625.14	\$186,325.16	\$0.00	\$186,325.16	
			BUENO POR:	\$ 149,099.08
RECIBI:				
\$ 149,099.08		(SON CIENTO CUARENTA Y NUEVE MIL NOVENTA Y NUEVE PESOS 08/100 M.N.)		
EN PAGO DE ESTIMACIÓN: 01 NORMAL				
DEDUCCIONES:		CALCULO DE ESTIMACIÓN		
AMORTIZACIÓN ANTICIPO 35%	\$ -	IMPORTE DE LA OBRA EJECUTADA SIN IVA	\$	131,946.99
MAS I.V.A.:	\$ -	MAS I.V.A 16 %	\$	21,111.37
TOTAL AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO:	\$ -	TOTAL DE LA OBRA EJECUTADA CON IVA	\$	153,057.46
3 % SVIFYC:	\$ 3,958.38	MENOS TOTAL DEDUCCIONES:	\$	3,958.38
TOTAL DEDUCCIONES:	\$ 3,958.38	MONTO A FACTURAR MAS IVA	\$	153,057.46
		SALDO A PAGAR:		
		\$ 149,099.08		

ELABORO.-

C. CONSTRUCCIONES DORACO S.A DE C.V.
REPRESENTANTE LEGAL

REVISÓ.-

ING. JOSE RODOLFO CONTRERAS LOPEZ
COSTOS Y PRESUPUESTOS.

AUTORIZO.-

C. ING. RUBIEL RINCON RAMOS.
DIRECTOR DE O.P.D.U. Y E.

ELABORO:-

REVISOR:

AUTORIZO:-
C. ING. RUBIEL RINCON RAMOS
DIRECTOR DE O.P.D.U. Y E.



CONTRATISTA:	CONSTRUCCIONES DORACO S.A DE C.V	DEPENDENCIA:	FECHA	14 de julio de 2025
DOMICILIO:	CALLE. COLON #375, COLONIA CENTRO, ENTRE CALLEJON 21 DE MARZO Y CALLEJON VALLADO,	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA		
R.F.C.	CDO070612UY1			

RESÚMEN DE ESTIMACIÓN

	LOCALIDAD:	BADIRAGUATO	ESTIMACIÓN:	01 NORMAL
DESCRIPCIÓN:	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO, EN LA CALLE SIN NOMBRE ENTRE BOULEVARD JUAN S MILLÁN Y CALLE SALVADOR ALVARADO, COLONIA CENTRO, MUNICIPIO DE BADIRAGUATO, SINALOA			
IMPORTE DE OBRA SIN IVA:	\$	160,625.14		
IMPORTE DE ANTICIPO DE OBRA:	\$	-		
IMPORTE TOTAL DE CONTRATO:	\$	186,325.16		

DESTAJOS		IMPORTE
1	PRELIMINARES	\$ 53,299.25
2	ESTRUCTURA	\$ 72,914.70
3	OTROS	\$ 5,732.14
SUBTOTAL ESTIMACIÓN:		\$ 131,946.09

SUB TOTAL=	\$	131,946.09
I.V.A AL 16 %	\$	21,111.37
TOTAL =	\$	153,057.46

ELABORO:

C. CONSTRUCCIONES DORACO S.A DE C.V
REPRESENTANTE LEGAL

REVISÓ:

ING. JOSE RODOLFO CONTRERAS LOPEZ
COSTOS Y PRESUPUESTOS.

AUTORIZO:

C. ING. RUBIEL RINCON RAMOS.
DIRECTOR DE O.P.D.U. Y E.



DESCGLOSE

FECHA

lunes, 14 de julio de 2025

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS,
DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA

1 de 3

CONTRATISTA:

CONSTRUCCIONES DORACO S.A DE C.V

DEPENDENCIA:

DOMICILIO:

CALLE, COLON #375, COLONIA CENTRO, ENTRE CALLEJON 21 DE MARZO Y CALLEJON VALLADO,
GUASAVE, SINALOA, C.P. 81000

R.F.C.

CDO070612UY1

DESCGLOSE DE CONCEPTOS DE ESTIMACIÓN

LOCALIDAD: BADIRAGUATO ESTIMACIÓN: 01 NORMAL

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO, EN LA CALLE SIN NOMBRE ENTRE BOULEVARD JUAN S MILLÁN Y CALLE SALVADOR ALVARADO, COLONIA CENTRO, MUNICIPIO DE BADIRAGUATO, SINALOA

IMPORTE DE OBRA SIN IVA: \$160,625.14 IMPORTE DE ANTICIPO DE OBRA: \$0.00 IMPORTE TOTAL DE CONTRATO: \$186,325.16

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	SEGUN PROYECTO		HASTA ESTIM	HASTA ESTIM	EXCEDENTE	DE ESTÁ ESTIMACIÓN	IMPORTE
			CANT	P.U.					
GP01	PRELIMINARIAS TRAZO Y NIVELACIÓN DEL TERRENO EXISTENTE, EXCEPTO ROCA FUA, CON EQUIPO MECÁNICO, INCLUYE: CARGA CON MÁQUINA DEL MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN Y ACARREOS FUERA DE LA OBRA, MEDIDO COMPACTO.	M2	102.63	\$ 15.58	\$ 1,598.98	102.63	0.00	0.00	102.63 \$ 1,598.98
GP02	EXCAVACIONES EN CORTES Y ADICIONALES BAJO LA SUB-RASANTE EN CUALQUIER TIPO DE MATERIAL EXISTENTE, EXCEPTO ROCA FUA, CON EQUIPO MECÁNICO, INCLUYE: CARGA CON MÁQUINA DEL MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN Y ACARREOS FUERA DE LA OBRA, MEDIDO COMPACTO.	M3	56.45	\$ 133.09	\$ 7,512.93	56.45	0.00	0.00	56.45 \$ 7,512.93
GP03	COMPACTACION DE TIPO TERRENO NATURAL EN AREA DE DESPLANTE, INCLUYE: ESCARIFICADO E INCORPORACION DE HUMEDAD AL 90%, INCLUYE MANO DE OBRA Y MATERIAL.	M2	102.63	\$ 37.61	\$ 3,859.91	102.63	0.00	0.00	102.63 \$ 3,859.91
GP205	SUB-BASE COMPACTO INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIAL DE SUB-BASE CON CARGA Y ACARREO AL 1ER KM MEDIDO COMPACTO, COMPACTACION AL 100 % PRUEBA AASTHO MOD., PRUEBAS DE LABORATORIO DE CALIDAD DE MATERIALES.	M2	102.63	\$ 157.55	\$ 16,169.36	102.63	0.00	0.00	102.63 \$ 16,169.36
GP25	MATERIAL BASE DE COMPACTADA AL 100 % DE SU PESO VOLUMETRICO, INCLUYE: SUMINISTRO DEL AGREGADO, ACARREO, COMPACTACION, PRUEBA DE LABORATORIO Y TODO LO NECESARIO PARA SU TERMINACION.	M2	102.63	\$ 196.07	\$ 20,122.66	102.63	0.00	0.00	102.63 \$ 20,122.66
GP06	RELLO DE IMPREGNACION CON EMULSION CATIONICA ECH40, A RAZON DE 1.50 A 1.8 LTM2, INCLUYE: ARENEO, APLICACION, ALMACENAMIENTO, CALENTAMIENTO, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	102.63	\$ 39.32	\$ 4,035.41	102.63	0.00	0.00	102.63 \$ 4,035.41
2	ESTRUCTURA								
GP08	GUARNICION TIPO T* DE 15X30X60 DE CONCRETO PREMEZCLADO DE FC= 250 KG/CM2, INCLUYE: CIMBRA Y DESIMBRA, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, MANIOBRAS LOCALES Y TODO LO NECESARIO PARA SU TERMINACION.	ML	15.00	\$ 719.19	\$ 25,171.65	-	0.00	0.00	- \$ -

ELABORADO: *[Firma]*
C. CONSTRUCCIONES DORACO S.A. DE C.V.
REPRESENTANTE LEGAL

REVISADO: *[Firma]*
ING. JOSE ROBERTO CONTRERAS LOPEZ
COSTOS Y PRESUPUESTOS.

AUTORIZADO: *[Firma]*
C. ING. RUBIEL RINCON RANOS
DIRECTOR DE O.P.D.U. Y E.



DESGLOSE

		FECHA		lunes, 14 de julio de 2025	
CONTRATISTA:		CONSTRUCCIONES DORACO S.A. DE C.V.		DEPENDENCIA:	
DOMICILIO:		CALLE: COLON #375, COLONIA CENTRO, ENTRE CALLEJON 21 DE MARZO Y CALLEJON VALLADO, GUASAVE, SINALOA, C.P. 81000		R.F.C. CD0070612UY1	
DESGLOSE DE CONCEPTOS DE ESTIMACIÓN					
DESCRIPCIÓN:		LOCALIDAD:		ESTIMACIÓN:	
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO, EN LA CALLE SIN NOMBRE ENTRE BOULEVARD JUAN S MILLÁN Y CALLE SALVADOR ALVARADO, COLONIA CENTRO, MUNICIPIO DE BADIRAGUATO, SINALOA		BADIRAGUATO		91 NOR-WAL	
IMPORTE DE OBRA SIN IVA:		\$160,625.14		IMPORTE TOTAL DE CONTRATO:	
		\$0.00		\$186,325.16	
IMPORTE DE ANTICIPO DE OBRA:					
SEGUN PROYECTO					
UNIDAD		CANT		P.U.	
ML		3.00		\$ 624.05	
CONCEPTO		TOTAL		HASTA ESTIM	
PATIN DE 15x60 DE CONCRETO PREMEZCLADO DE F'C= 250 KG/CM2, INCLUYE: CIMBRA Y DESIMBRA, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, MANIOBRAS LOCALES Y TODO LO NECESARIO PARA SU TERMINACIÓN.		1,872.15		3.00	
CLAVE		EXCEDENTE		HASTA ESTIM	
GP083		0.00		0.00	
		DE ESTIM		ESTIMACIÓN	
		3.00		3.00	
		EXCEDENTE		IMPORTE	
		0.00		1,872.15	

ELABORADO: *[Firma]* AC 22

C/CONSTRUCCIONES DORACO S.A. DE C.V.
REPRESENTANTE LEGAL

REVISÓ: *[Firma]*

ING. JOSE ROBERTO CONTRERAS LOPEZ
COSTOS Y PRESUPUESTOS

AUTORIZO: *[Firma]*

C. ING. RUBIEL RINCON RAMOS
DIRECTOR DE O.P.D.U. Y E.



DESGLOSE

CONTRATISTA: CONSTRUCCIONES DORACO S.A DE C.V		DEPENDENCIA:		FECHA		lunes, 14 de julio de 2025				
DOMICILIO: CALLIE: COLON #375, COLONIA CENTRO, ENTRE CALLEJON 21 DE MARZO Y CALLEJON VALLADO, GUASAVE, SINALOA, C.P. 81000		R.F.C.		CDO070612UY1		3 de 3				
DESGLOSE DE CONCEPTOS DE ESTIMACIÓN										
DESCRIPCIÓN: CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO, EN LA CALLE SIN NOMBRE ENTRE BOULEVARD JUAN S MILLÁN Y CALLE SALVADOR ALVARADO, COLONIA CENTRO, MUNICIPIO DE BADIRAGUATO, SINALOA		LOCALIDAD: BADIRAGUATO		ESTIMACIÓN: 01 NORMAL						
IMPORTE DE OBRA SIN IVA: \$160,625.14		IMPORTE DE ANTICIPO DE OBRA: \$0.00		IMPORTE TOTAL DE CONTRATO: \$186,325.16						
CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANT	SEGUN PROYECTO P.U.	TOTAL	HASTA ESTIM	HASTA ESTIM	EXCEDENTE	DE ESTA ESTIMACIÓN	IMPORTE
GP103	LOSA DE CONCRETO DE 15 CMS DE ESPESOR CON CONCRETO PREMEZCLADO F'G=300 KG/CM², INCLUYE: MANO DE OBRA, MATERIALES, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	M2	79.83	\$ 639.01	\$ 66,978.17	79.83	79.83	0.00	79.83	\$ 66,978.17
GP133	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONTRA JUNTA DE PVC TIPO C-3 PARA LOSAS DE 15 CM. EN PAVIMENTOS. INCLUYE: TRAZO, ALINEACIÓN, HINCADO Y REMOCIÓN DE TAPA.	ML	40.30	\$ 32.67	\$ 1,316.60	40.30	40.30	0.00	40.30	\$ 1,316.60
GP15	GALAFATEO EN LOSAS DE CONCRETO HIDRÁULICO CON ASFALTEX 505. INCLUYE: UN RIEGO CON EMULTEX T.P. (PRIMER), UN RIEGO DE ASFALTEX 505 Y BARRIDO DE LA SUPERFICIE.	ML	57.00	\$ 33.75	\$ 1,923.75	38.00	38.00	0.00	38.00	\$ 1,282.50
GP16	SUMINISTRO, HABILITADO Y COLOCACIÓN DE ACERO DE REFUERZO LISO EN PASAJUNTAS DE 5/8" DE DIAMETRO. INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	ML	19.00	\$ 77.12	\$ 1,465.28	19.00	19.00	0.00	19.00	\$ 1,465.28
GP11	PINTURA EN GUARNICIÓN DE 20 X 15 CM. CON PINTURA TIPO TRAFICO SCT COLOR AMARILLO O ELANCO. CON USO DE MAQUINA PINTARRAYAS. INCLUYE: PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, MATERIAL, MANO DE OBRA CALIFICADA Y EQUIPO ADECUADO.	ML	15.00	\$ 81.89	\$ 2,866.15	-	0.00	0.00	-	\$ -
3	OTROS									
GBR571	LETRERO INFORMATIVO ALUSIVO A LA OBRA FABRICADO CON PTR VER PLANO. INCLUYE: INFORMACIÓN DE LA OBRA, PATAS DE METAL COLADA CON CONCRETO HECHO EN OBRA DE F'G=150 KG/CM2. MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	1.00	\$ 4,771.52	\$ 4,771.52	1.00	1.00	0.00	1.00	\$ 4,771.52
GP101	LIMPIEZA DE OBRA. INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	M2	102.63	\$ 9.36	\$ 960.62	102.63	102.63	0.00	102.63	\$ 960.62
								SUB-TOTAL \$		131,946.09
								IVA \$		21,111.37
								MONTO TOTAL \$		153,057.46

ELABORADO:

Maria Mercedes
C. CONSTRUCCIONES DORACO S.A. DE C.V.
REPRESENTANTE LEGAL

REVISÓ:

Jose Rodolfo Contreras Lopez
ING. JOSE RODOLFO CONTRERAS LOPEZ
COSTOS PRESUPUESTOS.

REVISÓ:

Rubiel Rincon Rancos
C. ING. RUBIEL RINCON RANCOS
DIRECTOR DE O.P.D.U. Y E.



VOLUMENES GENERADORES

CONTRATISTA:				CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO, EN LA CALLE SIN NOMBRE ENTRE BOULEVARD JUAN S MILLAN Y CALLE SALVADOR ALVARADO, COLONIA CENTRO, MUNICIPIO DE BADIRAGUATO, SINALOA							ESTIMACION	
CONSTRUCCIONES DORACO S.A DE C.V											01 NORMAL	
RFC:		CDO070612UY1										
CLAVE	CONCEPTO			LOCALIZACION		UNIDAD	LARGO	ANCHO	ALTO	PZA	TOTAL	OBSERVACIONES
1	PRELIMINARES			EJE	TRAMO		EN METROS					
GP01	TRAZO Y NIVELACION DEL TERRENO ESTABLECIENDO EJES Y NIVELETAS DE REFERENCIA, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.					M2						
	CADENAMIENTO											
				0+000.00	0+005.00		5.0000	6.05			30.25	
				0+005.00	0+010.00		5.0000	5.70			28.50	
				0+010.00	0+015.00		5.0000	5.34			26.70	
				0+015.00	0+019.00		4.0000	4.99			19.95	
										TOTAL EJECUTADO	105.41	
										ESTA EST	102.63	
GP02	EXCAVACIONES EN CORTES Y ADICIONALES BAJO LA SUBRASANTE EN CUALQUIER TIPO DE MATERIAL EXISTENTE, EXCEPTO ROCA PUA, CON EQUIPO MECANICO, INCLUYE: CARGA CON MAQUINA DEL MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION Y ACARREOS FUERA DE LA OBRA, MEDIDO COMPACTO.					M3						
	CADENAMIENTO						LONG	ANCHO	ESPESOR			
				0+000.00	0+005.00		5.0000	6.05	0.55		16.64	
				0+005.00	0+010.00		5.0000	5.70	0.55		15.88	
				0+010.00	0+015.00		5.0000	5.34	0.55		14.59	
				0+015.00	0+019.00		4.0000	4.99	0.55		10.95	
										TOTAL EJECUTADO	57.99	
										ESTA EST	58.15	
GP05	COMPACTACIÓN DE TERRENO NATURAL EN AREA DE DESPLANTE INCLUYE ESCARIFICADO E INCORPORACIÓN DE HUMEDAD AL 90%, INCLUYE MANO DE OBRA Y MATERIAL.					M2						
	CADENAMIENTO						LONG	ANCHO				
				0+000.00	0+005.00		5.0000	6.05			30.25	
				0+005.00	0+010.00		5.0000	5.70			28.50	
				0+010.00	0+015.00		5.0000	5.34			26.70	
				0+015.00	0+019.00		4.0000	4.99			19.95	
										TOTAL EJECUTADO	105.41	
										ESTA EST	102.63	
GP255	SUB-BASE COMPACTO INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIAL DE SUB-BASE CON CARGA Y ACARREO AL 1ER KM. MEDIDO COMPACTO, COMPACTACIÓN AL 100 % PRUEBA AASTHO MOD., PRUEBAS DE LABORATORIO DE CALIDAD DE MATERIALES.					M2						
	CADENAMIENTO						LONG	ANCHO				
				0+000.00	0+005.00		5.0000	6.05			30.25	
				0+005.00	0+010.00		5.0000	5.70			28.50	
				0+010.00	0+015.00		5.0000	5.34			26.70	
				0+015.00	0+019.00		4.0000	4.99			19.95	
										TOTAL EJECUTADO	105.41	
										ESTA EST	102.63	
GP26	BASE DE COMPACTADA AL 100 % DE SU PESO VOLUMÉTRICO, INCLUYE: SUMINISTRO DEL AGREGADO, ACARREO, COMPACTACIÓN, PRUEBA DE LABORATORIO Y TODO LO NECESARIO PARA SU TERMINACIÓN.					M2						
	CADENAMIENTO						LONG	ANCHO				
				0+000.00	0+005.00		5.0000	6.05			30.25	
				0+005.00	0+010.00		5.0000	5.70			28.50	
				0+010.00	0+015.00		5.0000	5.34			26.70	
				0+015.00	0+019.00		4.0000	4.99			19.95	
										TOTAL EJECUTADO	105.41	
										ESTA EST	102.63	
GP06	REGO DE IMPREGNACIÓN CON EMULSION CATIONICA ECI-80, A RAZÓN DE 1.50 A 1.8 LTM2, INCLUYE: ARENEO, APLICACIÓN, ALMACENAMIENTO, CALENTAMIENTO, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.					M2						
	CADENAMIENTO						LONG	ANCHO				
				0+000.00	0+005.00		5.0000	6.05			30.25	
				0+005.00	0+010.00		5.0000	5.70			28.50	
				0+010.00	0+015.00		5.0000	5.34			26.70	
				0+015.00	0+019.00		4.0000	4.99			19.95	
										TOTAL EJECUTADO	105.41	
										ESTA EST	102.63	

ELABORÓ:

C. CONSTRUCCIONES DORACO S.A. DE C.V.
REPRESENTANTE LEGAL

REVISÓ:

ARQ BRICEIDA GPE NIEBLAS MARTINEZ
SUPERVISORAUTORIZÓ:
ING. RUBIEL RINCON RAMOS
DIRECTOR DE O.P.D.U.Y.E.



VOLUMENES GENERADORES

CONTRATISTA:				CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO, EN LA CALLE SIN NOMBRE ENTRE BOULEVARD JUAN S MILLAN Y CALLE SALVADOR ALVARADO, COLONIA CENTRO, MUNICIPIO DE BADIRAGUATO, SINALOA							ESTIMACION	
CONSTRUCCIONES DORACO S.A DE C.V											01 NORMAL	
RFC:	CDO070612UY1											
CLAVE	CONCEPTO			LOCALIZACION		UNIDAD	LARGO	ANCHO	ALTO	PZA	TOTAL	OBSERVACIONES
3	PAVIMENTACION			EJE	TRAMO		EN METROS					
GP000	PATIN DE 15X90 DE CONCRETO PREMEZCLADO DE FC= 250 KG/CM2, INCLUYE: CIMBRA Y DESIMBRA, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, MANOBRAS LOCALES Y TODO LO NECESARIO PARA SU TERMINACIÓN.					ML						
				CADERNAMENTO			LONG	LADO				
				0+000.00	0+019.00		17.54	DERECHO			17.54	
				0+000.00	0+019.00		17.54	IZQUIERDO			17.54	
										TOTAL EJECUTADO	35.08	
										ESTA EST	3.00	
GP109	LOSA DE CONCRETO DE 15 CMS DE ESPESOR CON CONCRETO PREMEZCLADO FC=300 KG/CM², INCLUYE: MANO DE OBRA, MATERIALES, HERRAMIENTA Y EQUIPO.					M2						
				CADERNAMENTO			LONG	ANCHO				
				0+000.00	0+005.00		5.0000	4.85			24.25	
				0+005.00	0+010.00		5.0000	4.45			22.25	
				0+010.00	0+015.00		5.0000	4.11			20.55	
				0+015.00	0+019.00		4.0000	3.80			15.20	
										TOTAL EJECUTADO	82.25	
										ESTA EST	79.83	
GP133	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONTRA JUNTA DE PVC TIPO C 3 PARA LOSAS DE 15 CM. EN PAVIMENTOS, INCLUYE: TRAZO, ALINEACIÓN, HINCADO Y REMOLIÓN DE TAPA.					ML						
				CADERNAMENTO			LONG	ANCHO		CORTES		
				0+000.00	0+005.00		5.0000	4.85		2.50	14.55	
				0+005.00	0+010.00		5.0000	4.45		2.50	13.35	
				0+010.00	0+015.00		5.0000	4.11		2.50	12.33	
				0+015.00	0+019.00		4.0000	3.80		2.50	9.55	
										TOTAL EJECUTADO	50.11	
										ESTA EST	40.30	
GP13	CALAFATEO EN LOSAS DE CONCRETO HIDRÁULICO CON ASFALTEX 505, INCLUYE: UN RIEGO CON EMULTEX T.P. (PRIMER), UN RIEGO DE ASFALTEX 505 Y BARRIDO DE LA SUPERFICIE.					ML						
				CADERNAMENTO			LONG	LADO				
				0+000.00	0+019.00		19.0000	DERECHO			19.00	
				0+000.00	0+019.00		19.0000	IZQUIERDO			19.00	
										TOTAL EJECUTADO	38.00	
GP15	SUMINISTRO, HABILITADO Y COLOCACIÓN DE ACERO DE REFUERZO LISO EN PASAJUNTAS DE 5/8" DE DIAMETRO, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.											
				CADERNAMENTO			LONG					
				0+000.00	0+019.00		19.0000				19.00	
										TOTAL	19.00	
5	OTROS											
GBR671	LETRERO INFORMATIVO ALUSIVO A LA OBRA FABRICADO CON PTR. VER PLANO INCLUYE: BIFORMACIÓN DE LA OBRA, PATAS DE METAL COLADA CON CONCRETO HECHO EN OBRA DE F'C=150 KG/CM2, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.					PZA						
				CADERNAMENTO				LADO		CANTIDAD		
				0+000.00	0+019.00			DERECHO		1.00		
										TOTAL	1.00	
GP101	LIMPIEZA DE OBRA, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.					M2						
				CADERNAMENTO			LONG					
				0+000.00	0+005.00		5.0000	6.05			30.25	
				0+005.00	0+010.00		5.0000	5.70			28.50	
				0+010.00	0+015.00		5.0000	5.34			26.70	
				0+015.00	0+019.00		4.0000	4.99			19.96	
										TOTAL EJECUTADO	105.41	
										ESTA EST	102.63	

ELABORADO POR: *[Firma]*
C. CONSTRUCCIONES DORACO S.A. DE C.V.
REPRESENTANTE LEGAL

REVISADO: *[Firma]*
ARQ. BRICEIDA GARCÍA MARTÍNEZ
SUPERVISOR

AUTORIZADO: *[Firma]*
ING. FIDEL RAMÓN RAMOS
DIRECTOR DE O.P.D.U.Y.E.

	CONTRATISTA: CONSTRUCCIONES DORACO S.A. DE C.V.		DEPENDENCIA: DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA	
	DOMICILIO: CALLE. COLON #375, COLONIA CENTRO, ENTRE CALLEJON 21 DE MARZO Y CALLEJON VALLADO, GUASAVE, SINALOA, C.P. 81000			
	R.F.C.: CDO079612UY1			
	OBRA: CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO, EN LA CALLE SIN NOMBRE ENTRE BOULEVARD JUAN S MILLÁN Y CALLE SALVADOR ALVARADO, COLONIA CENTRO, MUNICIPIO DE BADIRAGUATO, SINALOA			
CROQUIS ESTIMACION:				
PRELIMINARES				
1				
GP01	TRAZO Y NIVELACION DEL TERRENO ESTABLECIENDO EJES Y NIVELETAS DE REFERENCIA, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.			
GP02	EXCAVACIONES EN CORTES Y ADICIONALES BAJO LA SUB-RASANTE EN CUALQUIER TIPO DE MATERIAL EXISTENTE, EXCEPTO ROCA FIJA, CON			
GP05	COMPACTACIÓN DE TERRENO NATURAL EN AREA DE DESPLANTE, INCLUYE: ESCARIFICADO E INCORPORACIÓN DE HUMEDAD AL 80%, INCLUYE			
GP255	SUB-BASE COMPACTO INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIAL DE SUB-BASE CON CARGA Y ACARREO AL 1ER KM. MEDIDO COMPACTO.			
GP26	MATERIAL BASE DE COMPACTADA AL 100 % DE SU PESO VOLUMÉTRICO, INCLUYE: SUMINISTRO DEL AGREGADO, ACARREO, COMPACTACIÓN.			
GP06	RIEGO DE IMPREGNACIÓN CON EMULSIÓN CATIONICA ECL-60, A RAZÓN DE 1.55 A 1.8 LT/M2. INCLUYE: ARENEO, APLICACIÓN, ALMACENAMIENTO.			



AREA TRABAJADA

ELABORO

C. CONSTRUCCIONES DORACO S.A. DE C.V.
REPRESENTANTE LEGAL


REVISO.-

ARQ. BRUCEIDA GPE NIEBLAS MARTINEZ
SUPERVISOR DE OBRA

AUTORIZO.-

C. ING. RUBIEL RINCON RAMOS.
DIRECTOR DE O.P.D.U. Y E.

	CONTRATISTA: CONSTRUCCIONES DORACO S.A. DE C.V.		DEPENDENCIA: DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA	
	DOMICILIO: CALLE. COLON #375, COLONIA CENTRO, ENTRE CALLEJON 21 DE MARZO Y CALLEJON VALLADO, GUASAVE, SINALOA, C.P. 81000			
	R.F.C.: CDO070612UY1			
	OBRA: CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO, EN LA CALLE SIN NOMBRE ENTRE BOULEVARD JUAN S MILLÁN Y CALLE SALVADOR ALVARADO, COLONIA CENTRO, MUNICIPIO DE BADRAGUATO, SINALOA			
CROQUIS ESTIMACION:				
2		ESTRUCTURA		
GP066	PATIN DE 15x60 DE CONCRETO PREMEZCLADO DE F'C= 250 KG/CM2. INCLUYE: CIMBRA Y DESIMBRA, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA.			
GP109	LOSA DE CONCRETO DE 15 CMS DE ESPESOR CON CONCRETO PREMEZCLADO F'C=300 KG/CM², INCLUYE: MANO DE OBRA, MATERIALES,			
GP133	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONTRA JUNTA DE PVC TIPO C-3 PARA LOSAS DE 15 CM. EN PAVIMENTOS, INCLUYE: TRAZO, ALINEACIÓN,			
GP13	CALAFATEO EN LOSAS DE CONCRETO HIDRÁULICO CON ASFALTEX 505, INCLUYE: UN RIEGO CON EMULTEX T.P. (PRIMER), UN RIEGO DE ASFALTEX			
GP15	SUMINISTRO, HABILITADO Y COLOCACIÓN DE ACERO DE REFUERZO LISO EN FASAJUNTAS DE 60" DE DIAMETRO, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE			

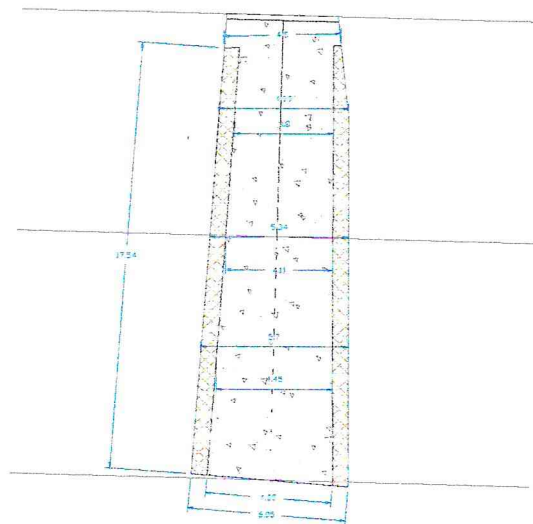

GUARNICIÓN
PATÍN



LOSA

ELABORA:

C. CONSTRUCCIONES DORACO S.A. DE C.V.
REPRESENTANTE LEGAL


REVISÓ:

ARQ. BRICEIDA GPE NIEBLAS MARTINEZ
SUPERVISOR DE OBRA

AUTORIZO:

C. ING. RUBIEL RINCON RAMOS.
DIRECTOR DE O.P.D.U. Y E.

	CONTRATISTA: CONSTRUCCIONES DORACO S.A. DE C.V.		DEPENDENCIA: DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA
	DOMICILIO: CALLE. COLON #375, COLONIA CENTRO, ENTRE CALLEJON 21 DE MARZO Y CALLEJON VALLADO, GUASAVE, SINALOA, C.P. 81000		
	R.F.C.: CDO070612UY1		
	OBRA: CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO, EN LA CALLE SIN NOMBRE ENTRE BOULEVARD JUAN S MILLÁN Y CALLE SALVADOR ALVARADO, COLONIA CENTRO, MUNICIPIO DE BADIRAGUATO, SINALOA		
CROQUIS ESTIMACION:			
3		OTROS	
GBR671	LETRERO INFORMATIVO ALUSIVO A LA OBRA FABRICADO CON PTR VER PLANO, INCLUYE: INFORMACIÓN DE LA OBRA, PATAS DE METAL COLADA		
GP101	LIMPIEZA DE OBRA. INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.		

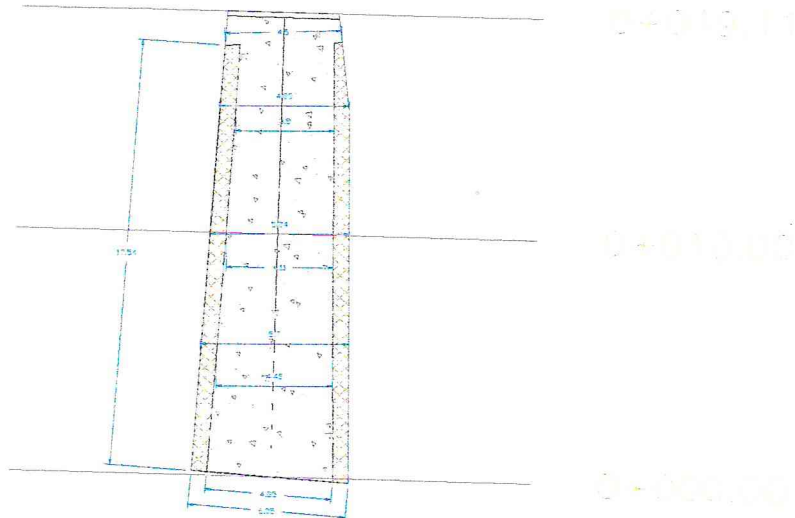

ELABORADO

[Signature]
 C. CONSTRUCCIONES DORACO S.A. DE C.V.
 REPRESENTANTE LEGAL

REVISADO

[Signature]
 ARQ. BRICEIDA GPE NIEBLAS MARTINEZ
 SUPERVISOR DE OBRA

AUTORIZADO

[Signature]
 C. ING. ROBIEL RINCON RAMOS.
 DIRECTOR DE O.P.D.U. Y E.



CONTRATISTA:

CONSTRUCCIONES DORACO S.A DE C.V

DOMICILIO:

CALLE. COLON #375, COLONIA CENTRO, ENTRE CALLEJON 21 DE MARZO Y CALLEJON VALLADO,
GUASAVE, SINALOA, C.P. 81000

R.F.C.

CDO070612UY1

OBRA:

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO, EN LA CALLE SIN NOMBRE ENTRE BOULEVARD JUAN S MILLÁN Y CALLE SALVADOR ALVARADO, COLONIA CENTRO, MUNICIPIO DE BADIRAGUATO, SINALOA

DEPENDENCIA:

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS,
DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA

ARCHIVO FOTOGRAFICO

PRELIMINARES

GP01	TRAZO Y NIVELACIÓN DEL TERRENO ESTABLECIENDO EJES Y NIVELETAS DE REFERENCIA; INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.
GP02	EXCAVACIONES EN CORTES Y ADICIONALES BAJO LA SUB-RASANTE EN CUALQUIER TIPO DE MATERIAL EXISTENTE, EXCEPTO ROCA FIJA, CON EQUIPO
GP05	COMPACTACIÓN DE TERRENO NATURAL EN AREA DE DESPLANTE; INCLUYE: ESCARIFICADO E INCORPORACIÓN DE HUMEDAD AL 90%, INCLUYE MANO DE
GP25	SUB-BASE COMPACTO INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIAL DE SUB-BASE CON CARGA Y ACARREO AL 1ER KM. MEDIDO COMPACTO, COMPACTACIÓN AL
GP25	MATERIAL BASE DE COMPACTADA AL 100 % DE SU PESO VOLUMÉTRICO, INCLUYE: SUMINISTRO DEL AGREGADO, ACARREO, COMPACTACIÓN, PRUEBA DE
GP06	RIEGO DE IMPREGNACIÓN CON EMULSIÓN CATIONICA ECI-60, A RAZÓN DE 1.50 A 1.8 LT/M2, INCLUYE: ARENEO, APLICACIÓN, ALMACENAMIENTO,



ELABORO.-

M. Doraco
C. CONSTRUCCIONES DORACO S.A DE C.V
REPRESENTANTE LEGAL

REVISO.-

Brzd
ARQ. BRICEIDA GPE NIEBLAS MARTINEZ
SUPERVISOR DE OBRA

AUTORIZO.-

R. Rincon Ramos
C.ING. RUBIEL RINCON RAMOS
DIRECTOR DE O.P.D.U. Y E.



CONTRATISTA:

CONSTRUCCIONES DORACO S.A DE C.V

DOMICILIO:

CALLE: COLON #375, COLONIA CENTRO, ENTRE CALLEJON 21 DE MARZO Y CALLEJON VALLADO,
GUASAVE, SINALOA, C.P. 81000

R.F.C.

CDO070612UY1

OBRA:

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO, EN LA CALLE SIN NOMBRE ENTRE BOULEVARD JUAN S MILLÁN Y CALLE SALVADOR ALVARADO, COLONIA CENTRO, MUNICIPIO DE BADIRAGUATO, SINALOA

DEPENDENCIA:

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS,
DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA

ARCHIVO FOTOGRAFICO

ESTRUCTURA

2

GP03	PATIN DE 15X60 DE CONCRETO PREMEZCLADO DE F'C= 250 KG/CM2, INCLUYE: CIMBRA Y DESIMBRA, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA,
GP10	LOSA DE CONCRETO DE 15 CMS DE ESPESOR CON CONCRETO PREMEZCLADO F'C=300 KG/CM", INCLUYE: MANO DE OBRA, MATERIALES, HERRAMIENTA Y
GP13	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONTRA JUNTA DE PVC TIPO C-3 PARA LOSAS DE 15 CM. EN PAVIMENTOS, INCLUYE: TRAZO, ALINEACIÓN, HINCADO Y
GP13	CALAFATEO EN LOSAS DE CONCRETO HIDRÁULICO CON ASFALTEX 505, INCLUYE: UN RIEGO CON EMULTEX T.P. (PRYMER), UN RIEGO DE ASFALTEX 505 Y
GP15	SUMINISTRO, HABILITADO Y COLOCACIÓN DE ACERO DE REFUERZO LISO EN PASAJUNTAS DE 5/8" DE DIAMETRO, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y



ELABORO:-

W. Javier Acosta
C. CONSTRUCCIONES DORACO S.A DE C.V
REPRESENTANTE LEGAL

REVISO. -

Briseida
ARQ. BRICEIDA GPE NIEBLAS MARTINEZ
SUPERVISOR DE OBRA

AUTORIZO:

Rubiel Rincón Ramos
C. ING. RUBIEL RINCÓN RAMOS
DIRECTOR DE O.P.D.U. Y E



Fecha y hora de consulta

12/08/2025 1:46:37 PM

Contrato

00798320

Nombre del Cliente

MUNICIPIO DE BADIRAGUATO

BBVA Net Cash - Pagos Interbancarios

Operación autorizada

Transferencia en proceso de validación y aplicación.

Datos del firmante

Usuario: ADMIN1

Poder: 100%

Datos de la operación

Tipo de operación: Pago Interbancario

Descripción: EST 01 NOR AD009

Importe de la operación: 149,099.08 MXP

Cuenta de retiro: 0124174836

Cuenta de depósito: 030730900045550793

Divisa de la cuenta: MXP

Divisa de la cuenta: MXP

Titular de la cuenta: MUNICIPIO DE BADIRAG UATO

Titular de la cuenta: CONSTRUCCIONES DORACO SA DE CV

Nombre banco destino: BAJIO

Fecha de creación: 12/08/2025

Fecha de aplicación: 12/08/2025

Concepto de pago: EST 01 NOR AD009

Referencia numérica:

Instrumento de seguridad: ASD 6551749382

Hora de captura en el canal: 13:46:34

Datos de confirmación de la transferencia

Folio interbancario: 0000047736

Clave de rastreo: 002601002508120000047736

Folio de firma: 0058071021

Folio único: I401202508121346340058071027

Estado operación

Porcentaje Firmado: 100%

Estado: Operado

Detalle de firmas

Acción	Usuario	Porcentaje aportado	Fecha
CREO	ADMIN1	--- %	12/08/2025
FIRMO	ADMIN1	100 %	12/08/2025

BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México

www.bbvanetcash.mx
