

OP



OFICIO No. OPDUyE/451/2025
ASUNTO: SOLICITUD PAGO ESTIMACION
01 ADICIONAL FINIQUITO
Badiraguato, Sin., a 06 de Agosto de 2025

MTRO. GONZALO IRINEO CABALLERO TERRAZAS
TESORERO MUNICIPAL
P R E S E N T E.-

POR MEDIO DE LA PRESENTE, LE SOLICITO EL PAGO POR CONCEPTO DE ESTIMACIÓN 01 ADICIONAL FINIQUITO, DEL IMPORTE DEL CONTRATO, A FAVOR DE LA EMPRESA: CONSTRUCCIONES DORACO, S.A. DE C.V., LA CUAL REALIZA LOS TRABAJOS APROBADOS POR EL SUBCOMITÉ DE BIENESTAR MUNICIPAL, A CONTINUACIÓN, SE DETALLA:

- **NOMBRE DE LA OBRA:** CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO, EN LA CALLE SIN NOMBRE ENTRE BOULEVARD JUAN S MILLÁN Y CALLE SALVADOR ALVARADO, COLONIA CENTRO, MUNICIPIO DE BADIRAGUATO, SINALOA.
- **No. DE CONTRATO:** MBGBR-AD-FAISMUN-009/2025.
- **IMPORTE DEL CONTRATO:** \$186,325.16 (CIENTO OCHENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS VEINTICINCO PESOS 16/100 M.N.).
- **CONCEPTO DEL PAGO:** PAGO DE ESTIMACION 01 ADICIONAL FINIQUITO.
- **IMPORTE A PAGAR:** \$32,407.33 (TREINTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS SIETE PESOS 33/100 M.N)
- **RECURSOS:** FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FAISMUN) EJERCICIO 2025.
- **EMPRESA:** CONSTRUCCIONES DORACO, S.A. DE C.V.
- **R.F.C.:** CDO070612UY1
- **DOMICILIO FISCAL:** CALLE. COLON #375, COLONIA CENTRO, ENTRE CALLEJON 21 DE MARZO Y CALLEJON VALLADO, GUASAVE, SINALOA, C.P. 81000;
- **No. DE FACTURA:** # 298, DE FECHA 06 DE AGOSTO DE 2025.

SE ANEXA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DE SOPORTE, COMO AMPARO DE DICHO PAGO.

AGRADECIENDO DE ANTEMANO LA ATENCIÓN QUE SE SIRVA DAR A LA PRESENTE, ME DESPIDO QUEDANDO A SUS ÓRDENES.



ATENTAMENTE

C ING. RUBIEL RINCÓN RAMOS
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS,
DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA

C.C.P. ARCHIVO. DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS,
DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA.
BADIRAGUATO, SINALOA.



MUNICIPIO DE
BADIRAGUATO
TESORERÍA

Alexis
06 AGO 2025
6:00 PM

RECIBIDO

CONSTRUCCIONES DORACO

CDO070612UY1

RÉGIMEN FISCAL: 626 - Régimen Simplificado de Confianza
COLON, 375, Centro, 81000, Guasave, Guasave, Sinaloa, México
Tel. 6673363111

CLIENTE

MUNICIPIO DE BADIRAGUATO
MBA850101214

USO CFDI: I01 - Construcciones.
DOMICILIO FISCAL: 80500

RÉGIMEN FISCAL: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
S/N, 80500, Badiraguato, Sinaloa, México

Factura 298

FOLIO FISCAL (UUID)

048B435B-0068-4825-9401-5D00AB326F84

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

00001000000711762511

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000709569399

FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN

2025-08-06T17:34:08

RFC PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN

STA0903206B9

FECHA Y HORA DE EMISIÓN DE CFDI

2025-08-06T16:22:56

LUGAR DE EXPEDICIÓN

81000

CONCEPTOS

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Objeto Imp.	Importe
1.00	E48 - LOTE	PAGO DE ESTIMACION 01 ADICIONAL FINIQUITO DE LA OBRA: "CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN LA CALLE SIN NOMBRE ENTRE BOULEVARD JUAN S MILLAN Y CALLE SALVADOR ALVARADO, COLONIA CENTRO, MUNICIPIO DE BADIRAGUATO SINALOA. CONTRATO No. MBGBR-AD-FAISMUN-009/2025	\$ 28,679.05	02 - Sí objeto de impuesto.	\$ 28,679.05

CONTRATADO
IMPORTE: \$160,625.14
IVA: \$25,700.02
TOTAL: \$186,325.16

IMPORTE DE LA OBRA EJECUTADA SIN IVA: \$28,679.05
MAS IVA 16% : \$4,588.65
TOTAL DE LA OBRA EJECUTADA CON IVA : \$33,267.70

DEDUCCIONES
AMORTIZACION ANTICIPO 35%: \$0.00
MAS IVA 16%: \$0.00
TOTAL AMORTIZACION ANTICIPO: \$0.00

MONTO A FACTURAR DE LA ESTIMACION EN BRUTO: \$28,679.05
IVA A FACTURAR (16%): \$4,588.65
TOTAL A FACTURAR DE LA ESTIMACION: \$33,267.70

RETENCION 3%(S.V.I.F.Y.C.): \$860.37

TOTAL DE DEDUCCIONES: \$860.37

MONTO LIQUIDO A RECIBIR : \$32,407.33

Clave Prod. Serv. - 72101500 Servicios de apoyo para la construcción
Impuestos:

Trasladados:

002 IVA Base - 28679.0517 Tasa - 0.160000 Importe - \$ 4,588.65

IMPORTE CON LETRA

TREINTA Y TRES MIL DOSCIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS,
70/100 MXN

SUBTOTAL

\$ 28,679.05

TRASLADO IVA TASA 0.160000

\$ 4,588.65

TOTAL

\$ 33,267.70

TIPO DE COMPROBANTE

I - Ingreso

FORMA DE PAGO

99 - Por definir

MÉTODO DE PAGO

PPD - Pago en parcialidades o diferido

MONEDA

MXN - Peso Mexicano

VERSION

4.0

EXPORTACION

01 - No aplica

SELLO DIGITAL DEL CFDI

ncXRPu8vbrKFpc2yQqlnAn/JTp91mAgIZRuWVnbwD+y0iCQpVmSd5bE/9cwsNi1mEaEHGDBRxlImjm/p9RO0D/cSjRTJPACpalv6kBeUg8m/h+XVY3paNIWVYOAX2yj0
dJfCRlhJ1tUNtineifgo8svOZ3OMTtjuKaEDm1b7gVHB2jHbFkoCD3V1yFEHbPy241aU4VW91PE8U/r6ScQUWQWvVQF22WcYRGJ5E1elCqblcf5UCeQSGaDPZBEx
nXOLpBSKp2Rtr+B+h8MI8+hok825EGb9m5pylejSxmIFleKzBFQsyEvC7jddrbhY3rOZ7O5d2dJjuthdoutw==

SELLO DIGITAL DEL SAT

V3rd3Fjk11jBaHvBrvDdZMFNCpFCbsVxvBxUfeZATwIMFT+StgEX5CBXqH4925Uss3ya9Lnl9Oq8yZskYciXU3EriHFXzEsjmbiQ4W07EcZ2/HQX8MIWKBQX6TijPUXF
zohh6q9bRYg24tr+JC+DFhUAQGTIYUHT1ZnWLNQmUVCljSjQge9W3/shis3w8zRS/a/yghNDVHwXDF068uK00LmQDweQj3*3FZ2H2WODJVMCv9wO9WuuAg6hN
J2pWfPxx23ZzC28CDUQ7wBpJWtIEYWRsUcTJEzZxngE9QojC2su6ybup6o910nWfTQZKYN7Bkl8Jv8UGZIA==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|048B435B-0068-4825-9401-5D00AB326F84|2025-08-
06T17:34:08|STA0903206B9|ncXRPu8vbrKFpc2yQqlnAn/JTp91mAgIZRuWVnbwD+y0iCQpVmSd5bE/9cwsNi1mEaEHGDBRxlImjm/p9RO0D/cSjRTJPACpalv6kBeUg8
m/h+XVY3paNIWVYOAX2yj0dJfCRlhJ1tUNtineifgo8svOZ3OMTtjuKaEDm1b7gVHB2jHbFkoCD3V1yFEHbPy241aU4VW91PE8U/r6ScQUWQWvVQF22WcYRGJ5E1el
Cqblcf5UCeQSGaDPZBExnXOLpBSKp2Rtr+B+h8MI8+hok825EGb9m5pylejSxmIFleKzBFQsyEvC7jddrbhY3rOZ7O5d2dJjuthdoutw==|00001000000711762511|



Folios Digitales premium® CFDI

Descargue gratis este comprobante

en formato digital .XML ingresando a: foliosdigitales.blikon.com/xmlPara facturar en línea ingresa a: foliosdigitales.blikon.com

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Página 1 de 1

This XML file does not appear to have any style information associated with it. The document tree is shown below.

```
<cfdi:Comprobante xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:cfdi="http://www.sat.gob.mx/cfd/4"
xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/cfd/4 http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/4/cfdv40.xsd" Version="4.0" Folio="298" Fecha="2025-08-
06T16:22:56"
Sello="ncXRPu8vbrKfpc2y0q1nAn/JTp91mAg1ZRuwVnbwD+y0ICQpVm5d5bE/9cwsN11mEaEHGDBRkK1mjM/p9R00D/cSjRTjPACpaIv6kBeUg8m/h+XVY3paN1WVYOAX2yJ0dJIFCR1hJ1tUNTlnei
FormaPago="99" NoCertificado="00001000000709569399"
Certificado="MIIGIDCCBA1gAwIBAgIUMDAwMDAwMDAwMDA3MDk1NjkzOTkwDQY3KoZIHvcNAQELBQAwggGVMTOwMwYDVQQDDCxBQY8ERUwgu0eVSVk1DSU8gREUgQUQURNSUS3U1R5QUJ04gVFJJQ1VU
SubTotal="28679.05" Moneda="MXN" Total="33267.70" TipoDeComprobante="I" Exportacion="01" MetodoPago="PPD" LugarExpedicion="81000">
<cfdi:Emisor Rfc="CD0070612UY1" Nombre="CONSTRUCCIONES DORACO" RegimenFiscal="626"/>
<cfdi:Receptor Rfc="MBA850101214" Nombre="MUNICIPIO DE BADIRAGUATO" DomicilioFiscalReceptor="80500" RegimenFiscalReceptor="603" UsoCFDI="I01"/>
<cfdi:Conceptos>
<cfdi:Concepto ClaveProdServ="72101500" Cantidad="1" ClaveUnidad="E48" Unidad="LOTE" Descripción="PAGO DE ESTIMACION 01 ADICIONAL FINIQUITO DE LA
OBRA: "CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN LA CALLE SIN NOMBRE ENTRE BOULEVARD JUAN S MILLAN Y CALLE SALVADOR ALVARADO, COLONIA CENTRO, MUNICIPIO
DE BADIRAGUATO SINALOA. CONTRATO No. MBGBR-AD-FAISMUN-009/2025 CONTRATADO IMPORTE: $150,625.14 IVA: $25,700.02 TOTAL: $186,325.16 IMPORTE DE LA OBRA
EJECUTADA SIN IVA: $28,679.05 MAS IVA 16% : $4,588.65 TOTAL DE LA OBRA EJECUTADA CON IVA : $33,267.70 DEDUCCIONES AMORTIZACION ANTICIPO 35%: $0.00
MAS IVA 16%: $0.00 TOTAL AMORTIZACION ANTICIPO: $0.00 MONTO A FACTURAR DE LA ESTIMACION EN BRUTO: $28,679.05 IVA A FACTURAR (16%): $4,588.65 TOTAL A
FACTURAR DE LA ESTIMACION: $33,267.70 RETENCION 3%( S.V.I.F.Y.C.) : $860.37 TOTAL DE DEDUCCIONES: $860.37 MONTO LIQUIDO A RECIBIR : $32,407.33"
ValorUnitario="28679.0517" Importe="28679.0517" ObjetoImp="02">
<cfdi:Impuestos>
<cfdi:Traslados>
<cfdi:Traslado Base="28679.0517" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.160000" Importe="4588.648272"/>
</cfdi:Traslados>
</cfdi:Impuestos>
</cfdi:Concepto>
</cfdi:Conceptos>
<cfdi:Impuestos TotalImpuestosTrasladados="4588.65">
<cfdi:Traslados>
<cfdi:Traslado Base="28679.05" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.160000" Importe="4588.65"/>
</cfdi:Traslados>
</cfdi:Impuestos>
<cfdi:Complemento>
<tfd:TimbreFiscalDigital xmlns:tfd="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital" Version="1.1" RfcProvCertif="STA000320689" UUID="0488435B-0068-4825-
9401-5D00A8326F84" FechaTimbrado="2025-08-06T17:34:08"
SelloCFD="ncXRPu8vbrKfpc2y0q1nAn/JTp91mAg1ZRuwVnbwD+y0ICQpVm5d5bE/9cwsN11mEaEHGDBRkK1mjM/p9R00D/cSjRTjPACpaIv6kBeUg8m/h+XVY3paN1WVYOAX2yJ0dJIFCR1hJ1t
NoCertificadoSAT="00001000000711762511"
SelloSAT="V3rd3FjkI1jBaHvBryDdZMFNCpFCbsVxfv8XufeZATwIMFT+StgEX5CBXqh4925Uss3ya9Ln190q8yZskYciXU3EriHFFXzEsjmb1Q4W07EcZ2/HQX8NiWkBBQX6TIjPuxFzohh6q9b
xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital
http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/TimbreFiscalDigital/TimbreFiscalDigitalv11.xsd"/>
</cfdi:Complemento>
</cfdi:Comprobante>
```



CONSTRUCCIONES DORACO S.A DE C.V

Dependencia :
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA
Control de Estimaciones

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRAULICO, EN LA CALLE SIN NOMBRE ENTRE BOULEVARD JUAN S MILLÁN Y CALLE SALVADOR ALVARADO, COLONIA CENTRO, MUNICIPIO DE BADIRAGUATO, SINALOA			Fecha:	Estimacion:	
			14 de julio de 2025		01 ADICIONAL FINIQUITO
Periodo de la estimación:	30/06/2025	09/07/2025	Localidad:	No. De contrato:	
Periodo de Ejecución:	30/06/2025	09/07/2025	BADIRAGUATO	MBGBR-AD-FAISMUN-009/2025	
Importe del contrato con I.V.A:		Imp. Contratado sin I.V.A	Anticipo	Importe Anticipo sin I.V.A	% de Avance
\$ 186,325.16		\$ 160,625.14	\$ -	\$ -	18%
					% Avance Total
					100%

Control Del Anticipo	Liquidacion de Estimacion	Control de Estimacion
AMORTIZA ESTA ESTIMACION	Importe de la Estimacion (+) \$ 28,679.05	ESTA ESTIMACION
\$ -	16 % I.V.A (+) \$ 4,588.65	\$ 33,267.70
	Sub- Total A (=) \$ 33,267.70	
	Amortizacion Anticipo 35% \$ -	
AMORTIZACION ANTERIOR	16 % I.V.A (+) \$ -	ACUMULADO ANTERIOR
\$ -	Total (=) \$ -	\$ 153,057.46
	Importe TOTAL A FACTURAR \$ 28,679.05	
TOTAL AMORTIZADO	16 % I.V.A (+) \$ 4,588.65	TOTAL ACUMULADO.
\$ -	Total (=) \$ 33,267.70	\$ 186,325.16
	3 % SVIFYC: \$ 860.37	
ANTICIPO OTORGADO	Total Deducciones (=) \$ 860.37	CONTRATADO
\$ -	Importe TOTAL \$ 32,407.33	\$ 186,325.16
	NETO A PAGAR	
SALDO DEL ANTICIPO	\$ 32,407.33	SALDO
\$0.00	SON:	\$ -
	(SON TREINTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS SIETE PESOS 33/100 M.N.)	

ELABORO.-

Miguel Melan Acosta
C.CONSTRUCCIONES DORACO S.A DE C.V
REPRESENTANTE LEGAL

REVISO

[Firma]
ING.JOSE RODOLFO CONTRERAS LOPEZ
COSTOS Y PRESUPUESTOS.

AUTORIZO

[Firma]
C. ING. RUBIEL RINCON RAMOS.
DIRECTOR O.P.D.U. Y E.



Fecha: 14 de julio de 2025

CARATULA DE ESTIMACIÓN

CONTRATISTA:	CONSTRUCCIONES DORACO S.A. DE C.V.		ESTIMACIÓN No:	01 ADICIONAL FINIQUITO
DOMICILIO:	CALLE. COLON #375, COLONIA CENTRO, ENTRE CALLEJON 21 DE MARZO Y CALLEJON VALLADO, GUASAVE, SINALOA, C.P. 81000		PERIODO DE ESTIMACION:	
TELÉFONO:	CEL:		DEL	30-jun-25
6671531178	6678229976		AL	09-jul-25
R.F.C.			FECHA DE CONTRATO:	
CDO070612UY1				28-jun-25
DEPENDENCIA.-				

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA

LOCALIDAD:	MUNICIPIO:	PERIODO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO:
BADIRAGUATO	BADIRAGUATO	INICIO: 30-jun-25
		TERMINACIÓN: 09-jul-25

DESCRIPCIÓN:

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO, EN LA CALLE SIN NOMBRE ENTRE BOULEVARD JUAN S MILLÁN Y CALLE SALVADOR ALVARADO, COLONIA CENTRO, MUNICIPIO DE BADIRAGUATO, SINALOA

CONTRATO No:

MBGGR-AD-FAISMUN-009/2025

IMPORTE SIN IVA DE LA OBRA	IMPORTE CON IVA DE LA OBRA	35% ANTICIPO DE LA OBRA	IMPORTE TOTAL DE CONTRATO:
\$160,625.14	\$186,325.16	\$0.00	\$186,325.16

RECIBI: BUENO POR: \$ 32,407.33

\$ 32,407.33 (SON TREINTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS SIETE PESOS 33/100 M.N.)

EN PAGO DE ESTIMACIÓN: 01 ADICIONAL FINIQUITO

DEDUCCIONES:		CALCULO DE ESTIMACIÓN	
AMORTIZACIÓN ANTICIPO 35%	\$ -	IMPORTE DE LA OBRA EJECUTADA SIN IVA	\$ 28,679.05
MAS I.V.A.:	\$ -	MAS I.V.A 16 %	\$ 4,588.65
TOTAL AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO:	\$ -	TOTAL DE LA OBRA EJECUTADA CON IVA	\$ 33,267.70
3 % SVIFYC:	\$ 860.37	MENOS TOTAL DEDUCCIONES:	\$ 860.37
TOTAL DEDUCCIONES:	\$ 860.37	MONTO A FACTURAR MAS IVA	\$ 33,267.70

SALDO A PAGAR: \$ 32,407.33

ELABORO.-

C. CONSTRUCCIONES DORACO S.A. DE C.V.
REPRESENTANTE LEGAL

REVISÓ.-

ING. JOSE RODOLFO CONTRERAS LOPEZ
COSTOS Y PRESUPUESTOS.

AUTORIZO.-

C. ING. RUBIEL RINCON RAMOS.
DIRECTOR DE O.P.D.U. Y E.



CONTRATISTA:	CONSTRUCCIONES DORACO S.A. DE C.V.	DEPENDENCIA:	FECHA: 14 de julio de 2025
DOMICILIO:	CALLE. COLON #375, COLONIA CENTRO, ENTRE CALLEJON 21 DE MARZO Y CALLEJON VALLADO,	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA	
R.F.C.	CDO070612UY1		

RESÚMEN DE ESTIMACIÓN

	LOCALIDAD:	BADIRAGUATO	ESTIMACIÓN:	01 ADICIONAL FINIQUITO
DESCRIPCIÓN:	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO, EN LA CALLE SIN NOMBRE ENTRE BOULEVARD JUAN S MILLÁN Y CALLE SALVADOR ALVARADO, COLONIA CENTRO, MUNICIPIO DE BADIRAGUATO, SINALOA			
IMPORTE DE OBRA SIN IVA:	\$	160,625.14		
IMPORTE DE ANTICIPO DE OBRA:	\$	-		
IMPORTE TOTAL DE CONTRATO:	\$	166,325.16		

DESTAJOS		IMPORTE
1	PRELIMINARES	\$ 1,445.20
2	ESTRUCTURA	\$ 27,404.47
3	OTROS	\$ 26.02
SUBTOTAL ESTIMACIÓN:		\$ 28,875.69
POR CIERRE DE ESTIMACIÓN:		\$ 33,267.70

SUB TOTAL =	\$ 28,679.05
I.V.A AL 16 %	\$ 4,588.65
TOTAL =	\$ 33,267.70

ELABORO.-


Mario Melcor Acero
C. CONSTRUCCIONES DORACO S.A. DE C.V.
REPRESENTANTE LEGAL

REVISÓ.-

[Firma]
ING. JOSE RODOLFO CONTRERAS LOPEZ
COSTOS Y PRESUPUESTOS.

AUTORIZO.-

[Firma]
C. ING. RUBIEL RINCON RAMOS.
DIRECTOR DE O.P.D.U. Y E.



LOCALIDAD:	BADIRAGUATO	ESTIMACIÓN:	01 ADICIONAL ENRIQUITO
------------	-------------	-------------	------------------------

FECHA INICIO CONTRATO:	30-jun-25	FECHA TERMINACION CONTRATO:	09-jul-25	CONTRATO:	MBGBR-AD-F-AISMUN-009/2025	FECHA CONTRATO	28-jun-25
IMPORTE DE OBRA SIN IVA:	\$160,625.14	CLAVE DE CONVENIO ADICIONAL:					
IMPORTE DE ANTICIPO DE OBRA:	\$0.00	PERIODO CONVENIO ADICIONAL:					
IMPORTE TOTAL DE CONTRATO:	\$160,625.16	IMPORTE CONVENIO ADICIONAL:					
					AL		
					IMPORTE TOTAL CONTRATADO:		
						\$156,325.16	

[illegible]

V. Juan W. Escobar
C.CONSTRUCCIONES DORADO S.A DE C.V
REPRESENTANTE LEGAL

ING. JOSE RODOLFO CONTRERAS LOPEZ
COSTO Y PRESUPUESTOS.

AUTORIZO:-

C. ING. RUBIEL RINCON RAMOS
DIRECTOR DE O.P.D.U. Y IE.



DESGLOSE

CONTRATISTA:		CONSTRUCCIONES DORACO S.A DE C.V		DEPENDENCIA:		DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA		FECHA		lunes, 14 de julio de 2025	
DOMICILIO:		CALLE COLON #375, COLONIA CENTRO, ENTRE CALLEJON 21 DE MARZO Y CALLEJON VALLADO, GUASAVE, SINALOA, C.P. 81000				R.F.C.		CDO070612UY1		1 de 3	
DESGLOSE DE CONCEPTOS DE ESTIMACIÓN											
		LOCALIDAD:		BADIRAGUATO		ESTIMACION:		01 ADICIONAL FINIQUITO			
DESCRIPCION		CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO, EN LA CALLE SIN NOMBRE ENTRE BOULEVARD JUAN S MILLÁN Y CALLE SALVADOR ALVARADO, COLONIA CENTRO, MUNICIPIO DE BADIRAGUATO, SINALOA									
IMPORTE DE OERA SIN IVA		\$160,625.14		IMPORTE DE ANTICIPO DE OBRA:		\$0.00		IMPORTE TOTAL DE CONTRATO: \$186,325.16			
CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANT	SE	GUN PROYECTO	HASTA ESTA ESTIM	HASTA ESTIM	EXCEDENTE	DE ESTA ESTIMACIÓN	IMPORTE	
1	PRELIMINARES				TOTAL						
GP01	TRAZO Y NIVELACIÓN DEL TERRENO ESTABLECIENDO EJES Y NIVELETAS DE REFERENCIA, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M2	102.63	\$	15.58 \$	105.41	102.63	0.00	2.78 \$	41.31	
GP02	EXCAVACIONES EN CORTES Y ADICIONALES BAJO LA SUB-RASANTE EN CUALQUIER TIPO DE MATERIAL EXISTENTE, EXCEPTO ROCA FIJA, CON EQUIPO MECÁNICO, INCLUYE: CARGA CON MÁQUINA DEL MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN Y ACARREOS FUERA DE LA OBRA, MEDIDO COMPACTO.	M3	56.45	\$	131.09 \$	57.99	56.45	0.00	1.54 \$	204.96	
GP05	COMPACTACIÓN DE TERRENO NATURAL EN ÁREA DE DESPLANTE, INCLUYE: ESCARIFICADO E INCORPORACIÓN DE HUMEDAD AL 90%, INCLUYE MANO DE OBRA Y MATERIAL.	M2	102.63	\$	37.61 \$	105.41	102.63	0.00	2.78 \$	104.56	
GP255	SUB-BASE COMPACTO INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIAL DE SUB-FASE CON CARGA Y ACARREO AL 1ER KM MEDIDO COMPACTO, COMPACTACIÓN AL 100 % PRUEBA AASTHO MCD., PRUEBAS DE LABORATORIO DE CALIDAD DE MATERIALES.	M2	102.63	\$	157.55 \$	105.41	102.63	0.00	2.78 \$	437.99	
GP25	MATERIAL BASE DE COMPACTADA AL 100 % DE SU PESO VOLUMÉTRICO, INCLUYE: SUMINISTRO DEL AGREGADO, ACARREO, COMPACTACIÓN, PRUEBA DE LABORATORIO Y TODO LO NECESARIO PARA SU TERMINACIÓN.	M2	102.63	\$	196.07 \$	105.41	102.63	0.00	2.78 \$	545.07	
GP06	RIEGO DE IMPREGNACIÓN CON EMULSIÓN CATIONICA ECH-60, A RAZÓN DE 1.50 A 1.8 LTM/2, INCLUYE: ARENEO, APLICACIÓN, ALMACENAMIENTO, CALENTAMIENTO, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	102.63	\$	34.32 \$	105.41	102.63	0.00	2.78 \$	103.31	
2	ESTRUCTURA										
GP08	GUARNICIÓN TIPO "L" DE 15X30X60 DE CONCRETO PREMEZCLADO DE FC= 250 KG/CM2, INCLUYE: CIMBRA Y DESIMBRA, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, MANIOBRAS LOCALES Y TODO LO NECESARIO PARA SU TERMINACIÓN.	ML	35.00	\$	744.19 \$	-	0.00	0.00	- \$	-	

ELABORADO POR: *[Firma]*
C. CONSTRUCCIONES DORACO S.A. DE C.V.
REPRESENTANTE LEGAL

REVISADO POR: *[Firma]*
ING. JOSE RODOLFO CONTRERAS LOPEZ
COSTOS Y PRESUPUESTOS

AUTORIZADO POR: *[Firma]*
C. ING. RUBIEL RINCON RAMOS
DIRECTOR DE O.P.D.U. Y E.



DESGLOSE

CONTRATISTA: CONSTRUCCIONES DORACO S.A DE C.V		DEPENDENCIA:		FECHA: Lunes, 14 de julio de 2025	
DOMICILIO: CALLE COLON #375, COLONIA CENTRO, ENTRE CALLEJON 21 DE MARZO Y CALLEJON VALLADO, GUASAVE, SINALOA, C.P. 81000		R.F.C.: CDO070612UY1		2 de 3	
DESGLOSE DE CONCEPTOS DE ESTIMACION					
LOCALIDAD: BADIRAGUATO		ESTIMACION: 01 ADICIONAL FINIQUITO			
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO, EN LA CALLE SIN NOMBRE ENTRE BOULEVARD JUAN S MILLAN Y CALLE SALVADOR ALVARADO, COLONIA CENTRO, MUNICIPIO DE BADIRAGUATO, SINALOA					
IMPORTE DE OERA SIN IVA \$160,625.14		IMPORTE DE ANTICIPO DE OBRA: \$0.00		IMPORTE TOTAL DE CONTRATO: \$186,325.16	
CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANT	SEGUN PROYECTO P.U.	DE ESTA ESTIMACION
GP088	PATIN DE 15X60 DE CONCRETO PREMEZCLADO DE FC= 250 KG/CM2, INCLUYE: CIMERA Y DESIMBRA, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, MANIOBRAS LOCALES Y TODO LO NECESARIO PARA SU TERMINACION.	NL	3.00 \$	624.05 \$	32.08 \$
				TOTAL 1,872.15	
				HASTA ESTIMA 35.08	
				HASTA ESTIM 3.00	
				EXCEDENTE 0.00	
					IMPORTE 20,013.52

ELABORO: *Miguel Moreno Acosta*
C. CONSTRUCCIONES DORACO S.A DE C.V.
REPRESENTANTE LEGAL

REVISO: *[Signature]*
ING. JOSE RODOLFO CONTRERAS LOPEZ
COSTOS Y PRESUPUESTOS.

AUTORIZO: *[Signature]*
C. ING. RUBIEL RINCON RAMOS
DIRECTOR DE Q.P.D.U. Y E.

ELABORÓ:-
[Firma]
C. CONSTRUCCIONES DORACO S.A. DE C.V.
REPRESENTANTE LEGAL

REVISADO

ING. JOSE RODOLFO CONTRERAS LOPEZ
COSTOS Y PRESUPUESTOS.

AUTORIZO

C. ING. RUBIEL RINCON RAMOS
DIRECTOR DE O.P.U. Y E



VOLUMENES GENERADORES

CONTRATISTA:				CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO, EN LA CALLE SIN NOMBRE ENTRE BOULEVARD JUAN S MILLAN Y CALLE SALVADOR ALVARADO, COLONIA CENTRO, MUNICIPIO DE BADIRAGUATO, SINALOA							ESTIMACION
CONSTRUCCIONES DORACO S.A DE C.V											01 ADICIONAL
RFC: CDO070612UY1											FINQUITO
CLAVE	CONCEPTO	LOCALIZACION		UNIDAD	LARGO	ANCHO	ALTO	PZA	TOTAL	OBSERVACIONES	
1	PRELIMINARES	EJE	TRAMO		EN METROS						
GP01	TRAZO Y NIVELACIÓN DEL TERRENO ESTABLECIENDO EJES Y NIVELETAS DE REFERENCIA, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.			M2							
		CADENAMIENTO									
		0+000.00	0+005.00		5.0000	6.05			30.25		
		0+005.00	0+010.00		5.0000	5.70			28.50		
		0+010.00	0+015.00		5.0000	5.34			26.70		
		0+015.00	0+019.00		4.0000	4.99			19.96		
					-19.0000						
									TOTAL EJECUTADO: 105.41		
									EST ANTERIOR: 192.63		
									ADICIONAL: 2.78		
GP02	EXCAVACIONES EN CORTES Y ADICIONALES BAJO LA SUB-BASANTE EN CUALQUIER TIPO DE MATERIAL EXISTENTE, EXCEPTO ROCA FUA, CON EQUIPO MECANICO, INCLUYE: CARGA CON MAQUINA DEL MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION Y ACARREOS FUERA DE LA OBRA, MEDIDO COMPACTO.			M3							
		CADENAMIENTO			LONG	ANCHO	ESPESOR				
		0+000.00	0+005.00		5.0000	6.05	0.55		16.64		
		0+005.00	0+010.00		5.0000	5.70	0.55		15.06		
		0+010.00	0+015.00		5.0000	5.34	0.55		14.09		
		0+015.00	0+019.00		4.0000	4.99	0.55		10.96		
									TOTAL EJECUTADO: 57.99		
									EST ANTERIOR: 58.45		
									ADICIONAL: 1.54		
GP05	COMPACTACIÓN DE TERRENO NATURAL EN AREA DE DESPLANTE INCLUYE ESCARIFICADO E INCORPORACIÓN DE HUMEDAD AL 90%, INCLUYE MANO DE OBRA Y MATERIAL.			M2							
		CADENAMIENTO			LONG	ANCHO					
		0+000.00	0+005.00		5.0000	6.05			30.25		
		0+005.00	0+010.00		5.0000	5.70			28.50		
		0+010.00	0+015.00		5.0000	5.34			26.70		
		0+015.00	0+019.00		4.0000	4.99			19.96		
									TOTAL EJECUTADO: 105.41		
									EST ANTERIOR: 192.63		
									ADICIONAL: 2.78		
GP105	SUB-BASE COMPACTO INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIAL DE SUB-BASE CON CARGA Y ACARREO AL 1ER KM, MEDIDO COMPACTO, COMPACTACIÓN AL 100 % PRUEBA AASTHO MOD., PRUEBAS DE LABORATORIO DE CALIDAD DE MATERIALES.			M2							
		CADENAMIENTO			LONG	ANCHO					
		0+000.00	0+005.00		5.0000	6.05			30.25		
		0+005.00	0+010.00		5.0000	5.70			28.50		
		0+010.00	0+015.00		5.0000	5.34			26.70		
		0+015.00	0+019.00		4.0000	4.99			19.96		
									TOTAL EJECUTADO: 105.41		
									EST ANTERIOR: 192.63		
									ADICIONAL: 2.78		
GP25	BASE DE COMPACTADA AL 100 % DE SU PESO VOLUMÉTRICO, INCLUYE: SUMINISTRO DEL AGREGADO, ACARREO, COMPACTACIÓN, PRUEBA DE LABORATORIO Y TODO LO NECESARIO PARA SU TERMINACIÓN.			M2							
		CADENAMIENTO			LONG	ANCHO					
		0+000.00	0+005.00		5.0000	6.05			30.25		
		0+005.00	0+010.00		5.0000	5.70			28.50		
		0+010.00	0+015.00		5.0000	5.34			26.70		
		0+015.00	0+019.00		4.0000	4.99			19.96		
									TOTAL EJECUTADO: 105.41		
									EST ANTERIOR: 192.63		
									ADICIONAL: 2.78		
GP06	RIEGO DE IMPREGNACION CON EMULSION CATIONICA ECI-80, A RAZÓN DE 1.50 A 1.8 LTM2, INCLUYE: ARENEO, APLICACIÓN, ALMACENAMIENTO, CALENTAMIENTO, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.			M2							
		CADENAMIENTO			LONG	ANCHO					
		0+000.00	0+005.00		5.0000	6.05			30.25		
		0+005.00	0+010.00		5.0000	5.70			28.50		
		0+010.00	0+015.00		5.0000	5.34			26.70		
		0+015.00	0+019.00		4.0000	4.99			19.96		
									TOTAL EJECUTADO: 105.41		
									EST ANTERIOR: 192.63		
									ADICIONAL: 2.78		

ELABORADO POR: *Miguel Ángel Acosta*
C. CONSTRUCCIONES DORACO S.A. DE C.V.
REPRESENTANTE LEGAL

REVISADO POR: *Rosa*
ARI BRICEIDA GONZALEZ MARTINEZ
SUPERVISOR

AUTORIZADO POR: *[Firma]*
ING. RUBIEL RINCÓN RAMOS
DIRECTOR DE O.P. O.U. Y E.



VOLUMENES GENERADORES

CONTRATISTA:				CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO, EN LA CALLE SIN NOMBRE ENTRE BOULEVARD JUAN S MILLAN Y CALLE SALVADOR ALVARADO, COLONIA CENTRO, MUNICIPIO DE BADIRAGUATO, SINALOA							ESTIMACION
CONSTRUCCIONES DORACO S.A DE C.V											01 ADICIONAL
RFC: CDO070612UY1											FINIQUITO
CLAVE	CONCEPTO	LOCALIZACION		UNIDAD	LARGO	ANCHO	ALTO	PZA	TOTAL	OBSERVACIONES	
3	PAVIMENTACION	EJE	TRAMO		EN METROS						
GP005	PATIN DE 15x60 DE CONCRETO PREMEZCLADO DE FC= 250 KG/CM2, INCLUYE: CIMBRA Y DESIMBRA, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, MANIOBRAS LOCALES Y TODO LO NECESARIO PARA SU TERMINACIÓN.			ML							
		CADENAMIENTO			LONG	LADO					
		0+000.00	0+019.00		17.54	DERECHO			17.54		
		0+000.00	0+019.00		17.54	IZQUIERDO			17.54		
								TOTAL EJECUTADO	35.08		
								EST ANTERIOR	3.00		
								ADICIONAL	32.08		
GP109	LOSA DE CONCRETO DE 15 CMS DE ESPESOR CON CONCRETO PREMEZCLADO FC=300 KG/CM², INCLUYE: MANO DE OBRA, MATERIALES, HERRAMIENTA Y EQUIPO.			M2							
		CADENAMIENTO			LONG	ANCHO					
		0+000.00	0+005.00		5.0000	4.85			24.25		
		0+005.00	0+010.00		5.0000	4.45			22.25		
		0+010.00	0+015.00		5.0000	4.11			20.55		
		0+015.00	0+019.00		4.0000	3.80			15.20		
								TOTAL EJECUTADO	82.25		
								EST ANTERIOR	79.83		
								ADICIONAL	2.42		
GP133	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONTRA JUNTA DE PVC TIPO C 3 PARA LOSAS DE 15 CM. EN PAVIMENTOS, INCLUYE: TRAZO, ALINEACIÓN, HINCADO Y REMOCIÓN DE TAPA.			ML							
		CADENAMIENTO			LONG	ANCHO		CORTES			
		0+000.00	0+005.00		5.0000	4.85		2.50	14.55		
		0+005.00	0+010.00		5.0000	4.45		2.50	13.35		
		0+010.00	0+015.00		5.0000	4.11		2.50	12.25		
		0+015.00	0+019.00		4.0000	3.80		2.50	9.88		
								TOTAL EJECUTADO	50.11		
								EST ANTERIOR	40.30		
								ADICIONAL	9.81		
GP101	LIMPIEZA DE OBRA. INCLUYE: MANO DE OERA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.			M2							
		CADENAMIENTO			LONG	ANCHO					
		0+000.00	0+005.00		5.0000	6.05			30.25		
		0+005.00	0+010.00		5.0000	5.70			28.50		
		0+010.00	0+015.00		5.0000	5.34			26.70		
		0+015.00	0+019.00		4.0000	4.99			19.95		
								TOTAL EJECUTADO	105.41		
								EST ANTERIOR	192.63		
								ADICIONAL	2.78		

ELABORO:

C.CONSTRUCCIONES DORACO S.A DE C.V
REPRESENTANTE LEGAL

REVISO:

ARO BRICIDA GPE NIEBLAS MARTINEZ
SUPERVISOR

AUTORIZO:

ING.ROBIEL RINCON RAMOS
DIRECTOR DE O.P.D.U.Y.E.

	CONTRATISTA: CONSTRUCCIONES DORACO S.A DE C.V		DEPENDENCIA: DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA
	DOMICILIO: CALLE COLON #375, COLONIA CENTRO, ENTRE CALLEJON 21 DE MARZO Y CALLEJON VALLADO, GUASAVE, SINALOA, C.P. 81000		
	R.F.C.: CDO070012UY1		
	OBRA: CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO, EN LA CALLE SIN NOMBRE ENTRE BOULEVARD JUAN S MILLÁN Y CALLE SALVADOR ALVARADO, COLONIA CENTRO, MUNICIPIO DE BADIRAGUATO, SINALOA		
CROQUIS			
CLAVE	CONCEPTO		
1	PRELIMINARES		
GP01	TRAZO Y NIVELACIÓN DEL TERRENO ESTABLECIENDO EJES Y NIVELETAS DE REFERENCIA, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.		
GP02	EXCAVACIONES EN CORTES Y ADICIONALES BAJO LA SUB-RASANTE EN CUALQUIER TIPO DE MATERIAL EXISTENTE, EXCEPTO ROCA FIJA, CON		
GP05	COMPACTACIÓN DE TERRENO NATURAL EN AREA DE DESPLANTE, INCLUYE: ESCARIFICADO E INCORPORACIÓN DE HUMEDAD AL 90%, INCLUYE		
GP255	SUB-BASE COMPACTO INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIAL DE SUB-BASE CON CARGA Y ACARREO AL 1ER KM. MEDIDO COMPACTO.		
GP25	MATERIAL BASE DE COMPACTADA AL 100 % DE SU PESO VOLUMÉTRICO, INCLUYE: SUMINISTRO DEL AGREGADO, ACARREO, COMPACTACIÓN,		
GP06	RIEGO DE IMPREGNACIÓN CON EMULSIÓN CATIONICA ECI-50, A RAZÓN DE 1.50 A 1.8 LT/M2, INCLUYE: ARENEO, APLICACIÓN, ALMACENAMIENTO,		



AREA TRABAJADA

ELABORO-

 C. CONSTRUCCIONES DORACO S.A DE C.V
 REPRESENTANTE LEGAL


REVISO-

 ARQ. BRUCEIDA GPE NIEBLAS MARTINEZ
 SUPERVISOR DE OBRA

AUTORIZO-

 C. ING. RUBIEL RINCON RAMOS.
 DIRECTOR DE O.P.D.U. Y E.

	CONTRATISTA: CONSTRUCCIONES DORACO S.A. DE C.V.		DEPENDENCIA: DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA	
	DOMICILIO: CALLE COLON #375, COLONIA CENTRO, ENTRE CALLEJON 21 DE MARZO Y CALLEJON VALLADO, GUASAVE, SINALOA, C.P. 81000			
	R.F.C.: CDO0670612UY1			
	OBRA: CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO, EN LA CALLE SIN NOMBRE ENTRE BOULEVARD JUAN S MILLÁN Y CALLE SALVADOR ALVARADO, COLONIA CENTRO, MUNICIPIO DE BADIRAGUATO, SINALOA			
CROQUIS				
ESTRUCTURA				
2	PATÍN DE 15X00 DE CONCRETO PREMEZCLADO DE F'CD=250 KG/CM ² . INCLUYE: CAMBRA Y DESCAMBRA, MATERIAL ES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA.			
GP088	LOSA DE CONCRETO DE 15 CMS DE ESPESOR CON CONCRETO PREMEZCLADO F'CD=300 KG/CM ² . INCLUYE: MANO DE OBRA, MATERIALES.			
GP109	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONTRA JUNTA DE PVC TIPO C-3 PARA LOSAS DE 15 CM. EN PAVIMENTOS, INCLUYE: TRAZO, ALINEACION.			
GP133				

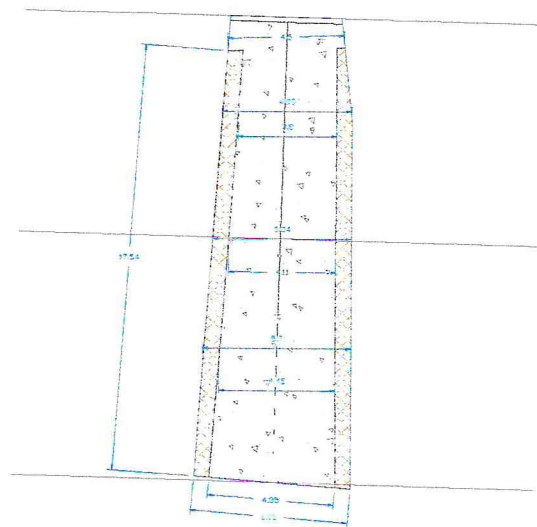

GUARNICIÓN
PATÍN



LOSA

ELABORÓ:

CONSTRUCCIONES DORACO S.A. DE C.V.
REPRESENTANTE LEGAL


REVISÓ:

ARQ. BRICEIDA GPE NIEBLAS MARTINEZ
SUPERVISOR DE OBRA

AUTORIZO:

C. ING. RUBIEL RINCON RAMOS.
DIRECTOR DE O.P.D.U. Y E.

	CONTRATISTA: CONSTRUCCIONES DORACO S.A. DE C.V.		DEPENDENCIA: DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA
	DOMICILIO: CALLE COLON #375, COLONIA CENTRO, ENTRE CALLEJON 21 DE MARZO Y CALLEJON VALLADO, GUASAVE, SINALOA, C.P. 81000		
	R.F.C.: CDO070612UY1		
	OBRA: CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO, EN LA CALLE SIN NOMBRE ENTRE BOULEVARD JUAN S MILLÁN Y CALLE SALVADOR ALVARADO, COLONIA CENTRO, MUNICIPIO DE BADIRAGUATO, SINALOA		
CROQUIS			
3		OTROS	
GP101		LIMPIEZA DE OBRA, INICIO Y FIN DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	

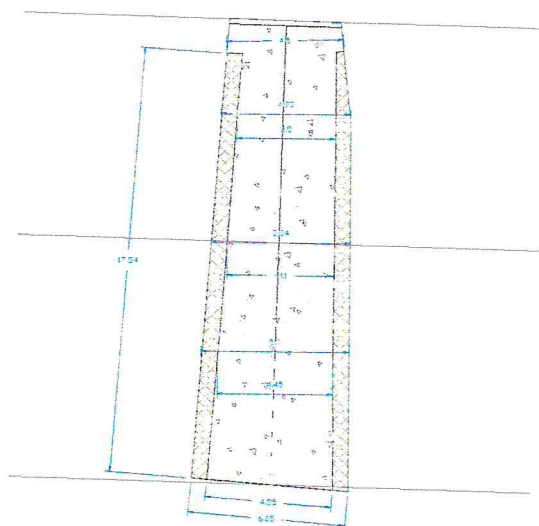

GUARNICIÓN
PATÍN



LOSA

ELABORA

C. CONSTRUCCIONES DORACO S.A. DE C.V.
REPRESENTANTE LEGAL

REVISÓ

ARQ. BRICEIDA GPE NIEBLAS MARTINEZ
SUPERVISOR DE OBRA

AUTORIZO

C. ING. RUBIEL RINCON RAMOS,
DIRECTOR DE O.P.D.U. Y E.



CONTRATISTA:

CONSTRUCCIONES DORACO S.A DE C.V

CALLE: COLON #375, COLONIA CENTRO, ENTRE CALLEJON 21 DE MARZO Y CALLEJON VALLADO,
GUASAVE, SINALOA, C.P. 81000

DOMICILIO:

R.F.C. CDO070612UY1

OBRA:

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO, EN LA CALLE SIN NOMBRE ENTRE BOULEVARD JUAN S MILLÁN Y CALLE SALVADOR ALVARADO, COLONIA
CENTRO, MUNICIPIO DE BADIRAGUATO, SINALOA

DEPENDENCIA:

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS,
DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA

FOTOS DE ESTIMACION:

FOTOS DE ESTIMACION:

CONCEPTO

PRELIMINARES

GP01	TRAZO Y NIVELACIÓN DEL TERRENO ESTABLECIENDO EJES Y NIVELETAS DE REFERENCIA, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.
GP02	EXCAVACIONES EN CORTES Y ADICIONALES BAJO LA SUB-RASANTE EN CUALQUIER TIPO DE MATERIAL EXISTENTE, EXCEPTO ROCA FIJA, CON EQUIPO
GP03	COMPACTACIÓN DE TERRENO NATURAL EN AREA DE DESPLANTE, INCLUYE: ESCARIFICADO E INCORPORACIÓN DE HUMEDAD AL 90%, INCLUYE MANO DE
GP25	SUB-BASE COMPACTO INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIAL DE SUB-BASE CON CARGA Y ACARREO AL 1ER KM. MEDIDO COMPACTO, COMPACTACIÓN AL
GP25	MATERIAL BASE DE COMPACTADA AL 100 % DE SU PESO VOLUMÉTRICO, INCLUYE: SUMINISTRO DEL AGREGADO, ACARREO, COMPACTACIÓN, PRUEBA DE
GP06	RIEGO DE IMPREGNACIÓN CON EMULSIÓN CATIONICA ECI-60, A RAZÓN DE 1.50 A 1.8 LT/M2, INCLUYE: ARENEO, APLICACIÓN, ALMACENAMIENTO.



ELABORO.-

[Signature]
C. CONSTRUCCIONES DORACO S.A DE C.V
REPRESENTANTE LEGAL

REVISO.-

[Signature]
ARQ. BRICEIDA GPE NIEBLAS MARTINEZ
SUPERVISOR DE OBRA

AUTORIZO.-

[Signature]
C.ING. RUBIEL RINCON RAMOS
DIRECTOR DE O.P.D.U. Y E

FOTOS



CONTRATISTA:

CONSTRUCCIONES DORACO S.A DE C.V

DOMICILIO:

CALLE. COLON #375, COLONIA CENTRO, ENTRE CALLEJON 21 DE MARZO Y CALLEJON VALLADO,
GUASAVE, SINALOA, C.P. 81000

R.F.C.

CDO070612UY1

OBRA:

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO, EN LA CALLE SIN NOMBRE ENTRE BOULEVARD JIJAN S MILLÁN Y CALLE SALVADOR ALVARADO, COLONIA
CENTRO, MUNICIPIO DE BADIRAGUATO, SINALOA

DEPENDENCIA:

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS,
DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA

FOTOS DE ESTIMACION:

FOTOS DE ESTIMACION:

2

CONCEPTO

ESTRUCTURA

GP08	PATIN DE 15X60 DE CONCRETO PREMEZCLADO DE F'C= 250 KG/CM2, INCLUYE: CIMBRA Y DESIMBRA, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA,
GP10	LOSA DE CONCRETO DE 15 CMS DE ESPESOR CON CONCRETO PREMEZCLADO F'C=300 KG/CM", INCLUYE: MANO DE OBRA, MATERIALES, HERRAMIENTA Y
GP13	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONTRA JUNTA DE PVC TIPO C-3 PARA LOSAS DE 15 CM. EN PAVIMENTOS, INCLUYE: TRAZO, ALINEACIÓN, HINCADO Y



ELABORO.-

[Signature]

C. CONSTRUCCIONES DORACO S.A DE C.V
REPRESENTANTE LEGAL

REVISO.-

[Signature]

ARQ. BRICEIDA GPE NIEBLAS MARTINEZ
SUPERVISOR DE OBRA

AUTORIZO.-

[Signature]

C.ING. RUBIEL RINCON RAMOS
DIRECTOR DE O.P.D.U. Y E.



Fecha y hora de consulta12/08/2025 1:49:32 PM

Contrato00798320

Nombre del ClienteMUNICIPIO DE BADIRAGUATO

BBVA Net Cash - Pagos Interbancarios

Operación autorizada

Transferencia en proceso de validación y aplicación.

Datos del firmante

Usuario: ADMIN1

Poder: 100%

Datos de la operación

Tipo de operación: Pago Interbancario

Descripción: EST 01 AD FIN AD009

Importe de la operación: 32,407.33 MXP

Cuenta de retiro: 0124174836

Cuenta de depósito: 030730900045550793

Divisa de la cuenta: MXP

Divisa de la cuenta: MXP

Titular de la cuenta: MUNICIPIO DE BADIRAG UATO

Titular de la cuenta: CONSTRUCCIONES DORACO SA DE CV

Nombre banco destino: BAJIO

Fecha de creación: 12/08/2025

Fecha de aplicación: 12/08/2025

Concepto de pago: EST 01 AD FIN AD009

Referencia numérica:

Instrumento de seguridad: ASD 6551749382

Hora de captura en el canal: 13:49:29

Datos de confirmación de la transferencia

Folio interbancario: 0000048418

Clave de rastreo: 002601002508120000048418

Folio de firma: 0058071037

Folio único: I401202508121349290058071043

Estado operación

Porcentaje Firmado: 100%

Estado: Operado

Detalle de firmas

Acción	Usuario	Porcentaje aportado	Fecha
CREO	ADMIN1	--- %	12/08/2025
FIRMO	ADMIN1	100 %	12/08/2025
