

<div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;"> <div style="text-align: center;"> MUNICIPIO DE SINALOA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS ESTIMACION DE OBRA </div> </div>												
OBRA: CONSTRUCCION DE PARQUE PUBLICO EN LA LOCALIDAD DE LA GUAMUCHILERA, MUNICIPIO DE SINALOA ESTADO DE SINALOA.												
CONTRATO: FAIS-DOP-SIN-2025-002					IMPORTE: \$ 1,118,864.19 SIN I.V.A.			<div style="display: flex; align-items: center;"> <div> CONSTRUCTORA DAGARQ S.A. DE C.V. <small>BLVD. MIGUEL LEYRON No. 118 COL. SURDAL, GUAYMA, SIN. MEXICO. C.P. 81020 TELCEL (897) 121-08-07</small> </div> </div>				
ESTIMACIÓN No.: 1 (UNO)					PERIODO CONTRATO: DEL 03 DE JUNIO AL 17 DE JULIO DE 2025							
FECHA: 20 DE JUNIO DEL 2025					CALCULO: ARQ. MARTIN ALBERTO DAGNINO MEZA							
GENERADORES DE OBRA												
CLAVE	DESCRIPCIÓN	LOCALIZACION			LARGO	ANCHO	ALTO	PZA	AREA	RESULTADOS		OBSERVACIONES
		UNIDAD	TRAMO	EJE						PARCIAL	TOTAL	
I	PRELIMINARES											
1.1	LIMPIEZA, TRAZO Y NIVELACION DEL TERRENO, INCLUYE: MATERIALES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA NECESARIA	M2							458.4	458.40		
										TOTAL	458.40	
1.2	RELLENO DE MATERIAL DE CERRO PRODUCTO DE BANCO, INCLUYE: CARGA Y ACARREO, HOMOGENIZADO, TENDIDO, INCORPORACION DE HUMEDAD, COMPACTADO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO.	M3							73.13	73.13		
										TOTAL	73.13	

CONFORME

ARQ. MARTIN ALBERTO DAGNINO MEZA
 REPRESENTANTE LEGAL

CONFORME

JUAN MANUEL LOPEZ MENCHACA
 DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

CONFORME

ING. JOSE ALONSO VELIZ BELTRAN
 SUPERVISOR DE OBRA

<div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;"> <div style="text-align: center;"> MUNICIPIO DE SINALOA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS ESTIMACION DE OBRA </div> </div>												
OBRA: CONSTRUCCION DE PARQUE PUBLICO EN LA LOCALIDAD DE LA GUAMUCHILERA, MUNICIPIO DE SINALOA ESTADO DE SINALOA.						<div style="display: flex; align-items: center;"> <div> CONSTRUCTORA DAGARQ S.A. DE C.V. <small>BLVD. MIGUEL LEYBON No. 118 COL. ELDAL, GUABAVE, SIN. MEXICO. C.P. 81000 TEL: 01 (667) 121-88-87</small> </div> </div>						
CONTRATO: FAIS-DOP-SIN-2025-002			IMPORTE: \$ 1,118,864.19 SIN I.V.A.									
ESTIMACIÓN No.: 1 (UNO)			PERIODO CONTRATO: DEL 03 DE JUNIO AL 17 DE JULIO DE 2025									
FECHA: 20 DE JUNIO DEL 2025			CALCULO: ARQ. MARTIN ALBERTO DAGNINO MEZA									
GENERADORES DE OBRA												
CLAVE	DESCRIPCIÓN	LOCALIZACION			LARGO	ANCHO	ALTO	PZA	AREA	RESULTADOS		OBSERVACIONES
		UNIDAD	TRAMO	EJE						PARCIAL	TOTAL	
1.3	CORTE Y ACARREO EN AREA DE TERRENO INESTABLE CON EQUIPO MECANICO CON 30% DE ABUNDAMIENTO, INCLUYE: HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA, CARGA Y ACARREO EN CAMION DE VOLTEO A PRIMER KILOMETRO.	M3							112.2	112.20		
										TOTAL	112.20	
II ALBAÑILERIA												
2.1	CONSTRUCCIÓN DE ANDADORES DE CONCRETO ACABADO ESTAMPADO . CONCRETO ECHO EN OBRA DE 10CM DE ESPESOR INCLUYE: DESMOLDANTE, SELLADOR, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2							37.5	37.50		
										TOTAL	37.50	

CONFORME

ARQ. MARTIN ALBERTO DAGNINO MEZA

REPRESENTANTE LEGAL

CONFORME

JUAN MANUEL LOPEZ MENCHACA

DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

CONFORME

ING. JOSE ALONSO VELIZ BELTRAN

SUPERVISOR DE OBRA

 MUNICIPIO DE SINALOA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS ESTIMACION DE OBRA			
OBRA: CONSTRUCCION DE PARQUE PUBLICO EN LA LOCALIDAD DE LA GUAMUCHILERA, MUNICIPIO DE SINALOA ESTADO DE SINALOA.			
CONTRATO: FAIS-DOP-SIN-2025-002		IMPORTE: \$ 1,118,864.19 SIN I.V.A.	
ESTIMACIÓN No.: 1 (UNO)		PERIODO CONTRATO: DEL 03 DE JUNIO AL 17 DE JULIO DE 2025	
FECHA: 20 DE JUNIO DEL 2025		CALCULO: ARQ. MARTIN ALBERTO DAGNINO MEZA	

GENERADORES DE OBRA												
CLAVE	DESCRIPCIÓN	LOCALIZACION			LARGO	ANCHO	ALTO	PZA	AREA	RESULTADOS		OBSERVACIONES
		UNIDAD	TRAMO	EJE						PARCIAL	TOTAL	
2.2	DENTELLON DE CONCRETO DE 15 X 40 CMS ARMADO CON 4 VARILLAS DE 3/8" Y ESTRIBOS DE ALAMBRON @25CMS, CON CONCRETO HECHO EN OBRA INCLUYE MATERIALES Y MANO DE OBRA NECESARIA	ML			77.60					77.60		
										TOTAL	77.60	
2.3	DENTELLON DE CONCRETO DE 15 X 30 CMS ARMADO CON 4 VARILLAS DE 3/8" Y ESTRIBOS DE ALAMBRON @25CMS, CON CONCRETO HECHO EN OBRA, INCLUYE MATERIALES Y MANO DE OBRA NECESARIA	ML			70.92					70.92		
										TOTAL	70.92	

CONFORME

ARQ. MARTIN ALBERTO DAGNINO MEZA

REPRESENTANTE LEGAL

CONFORME

JUAN MANUEL LOPEZ MENCHACA

DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

CONFORME

ING. JOSE ALONSO VELIZ BELTRAN

SUPERVISOR DE OBRA

 MUNICIPIO DE SINALOA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS ESTIMACION DE OBRA			
OBRA: CONSTRUCCION DE PARQUE PUBLICO EN LA LOCALIDAD DE LA GUAMUCHILERA, MUNICIPIO DE SINALOA ESTADO DE SINALOA.			
CONTRATO: FAIS-DOP-SIN-2025-002		IMPORTE: \$ 1,118,864.19 SIN I.V.A.	
ESTIMACIÓN No.: 1 (UNO)		PERIODO CONTRATO: DEL 03 DE JUNIO AL 17 DE JULIO DE 2025	
FECHA: 20 DE JUNIO DEL 2025		CALCULO: ARQ. MARTIN ALBERTO DAGNINO MEZA	

GENERADORES DE OBRA												
CLAVE	DESCRIPCIÓN	LOCALIZACION			LARGO	ANCHO	ALTO	PZA	AREA	RESULTADOS		OBSERVACIONES
		UNIDAD	TRAMO	EJE						PARCIAL	TOTAL	
2.4	FIRME DE CONCRETO DE 10 CMS DE ESPESOR A BASE DE CONCRETO HECHO EN OBRA ACABADO FLOTEADO, INCLUYE MATERIALES Y MANO DE OBRA NECESARIA	M2							241.54	241.54		
										TOTAL	241.54	
2.5	PLANTILLA DE CONCRETO SIMPLE HECHO EN OBRA DE 5 CMS DE ESPESOR, INCLUYE; MATERIALES, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA NECESARIA, CONCRETO ECHO EN OBRA.	M2							29.62	29.62		
										TOTAL	29.62	

CONFORME

ARQ. MARTIN ALBERTO DAGNINO MEZA

REPRESENTANTE LEGAL

CONFORME

JUAN MANUEL LOPEZ MENCHACA

DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

CONFORME

ING. JOSE ALONSO VELIZ BELTRAN

SUPERVISOR DE OBRA



**MUNICIPIO DE SINALOA
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
ESTIMACION DE OBRA**



OBRA:	CONSTRUCCION DE PARQUE PUBLICO EN LA LOCALIDAD DE LA GUAMUCHILERA, MUNICIPIO DE SINALOA ESTADO DE SINALOA.		
CONTRATO: FAIS-DOP-SIN-2025-002	IMPORTE \$ 1,118,864.19 SIN I.V.A.	PERIODO DEL 03 DE JUNIO AL 17 DE JULIO DE 2025	CONSTRUCTORA DABARQ S.A. DE C.V. <small>ESTADO REGISTRADO EN EL REGISTRO DE EMPRESAS DE SINALOA</small>
ESTIMACIÓN No.: 1 (UNO)	PERIODO: DEL 03 DE JUNIO AL 19 DE JUNIO DEL 2025	FECHA: 20/JUNIO/2025	

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	SEGÚN PROYECTO	HASTA ESTA ESTIMACIÓN	HASTA LA ESTIMACIÓN ANTERIOR	EXCEDENTE	DE ESTA ESTIMACIÓN	P.U.	IMPORTE
I	PRELIMINARES								
1.1	LIMPIEZA, TRAZO Y NIVELACION DEL TERRENO, INCLUYE; MATERIALES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA NECESARIA	M2	458.40	458.40	0.00	0.00	458.40	16.13	7,393.99
1.2	RELLENO DE MATERIAL DE CERRO PRODUCTO DE BANCO, INCLUYE: CARGA Y ACARREO, HOMOGENIZADO, TENDIDO, INCORPORACION DE HUMEDAD, COMPACTADO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO.	M3	73.13	73.13	0.00	0.00	73.13	692.49	50,641.79

CONFORME

ARQ. MARTIN ALBERTO DAGNINO MEZA

REPRESENTANTE LEGAL

CONFORME

JUAN MANUEL LOPEZ MENCHACA

DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

CONFORME

ING. JOSE ALONSO VELIZ BELTRAN

SUPERVISOR DE OBRA

MUNICIPIO DE SINALOA
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
ESTIMACION DE OBRA



OBRA:	CONSTRUCCION DE PARQUE PUBLICO EN LA LOCALIDAD DE LA GUAMUCHILERA, MUNICIPIO DE SINALOA ESTADO DE SINALOA.					<div> CONSTRUCTORA DAGARQ S.A. DE C.V. <small>AV. AVILA CAMERO NO. 17000, CUALIMA, SINALOA, S.C. DE C.V. REG. EST. 1997, FOLIO 12, 120007</small></div>					
CONTRATO: FAIS-DOP-SIN-2025-002		IMPORTE \$ 1,118,864.19 SIN I.V.A.		PERIODO DEL 03 DE JUNIO AL 17 DE JULIO DE 2025						CONTRATO:	
ESTIMACIÓN No.: 1 (UNO)		PERIODO: DEL 03 DE JUNIO AL 19 DE JUNIO DEL 2025			FECHA: 20/JUNIO/2025						

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	SEGÚN PROYECTO	HASTA ESTA ESTIMACIÓN	HASTA LA ESTIMACIÓN ANTERIOR	EXCEDENTE	DE ESTA ESTIMACIÓN	P.U.	IMPORTE
1.3	CORTE Y ACARREO EN AREA DE TERRENO INESTABLE CON EQUIPO MECANICO CON 30% DE ABUNDAMIENTO, INCLUYE: HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA, CARGA Y ACARREO EN CAMION DE VOLTEO A PRIMER KILOMETRO.	M3	112.20	112.20	0.00	0.00	112.20	81.44	9,137.57
TOTAL PRELIMINARES									67,173.35
II	ALBAÑILERIA								
2.1	CONSTRUCCIÓN DE ANDADORES DE CONCRETO ACABADO ESTAMPADO . CONCRETO ECHO EN OBRA DE 10CM DE ESPESOR INCLUYE: DESMOLDANTE, SELLADOR, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	37.50	37.50	0.00	0.00	37.50	1,092.72	40,977.00

CONFORME

ARQ. MARTIN ALBERTO DAGNINO MEZA

REPRESENTANTE LEGAL

CONFORME

JUAN MANUEL LOPEZ MENCHACA

DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

CONFORME

ING. JOSE ALONSO VELIZ BELTRAN

SUPERVISOR DE OBRA

MUNICIPIO DE SINALOA
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
ESTIMACION DE OBRA



OBRA:	CONSTRUCCION DE PARQUE PUBLICO EN LA LOCALIDAD DE LA GUAMUCHILERA, MUNICIPIO DE SINALOA ESTADO DE SINALOA.		
CONTRATO: FAIS-DOP-SIN-2025-002	IMPORTE \$ 1,118,864.19 SIN I.V.A.	PERIODO DEL 03 DE JUNIO AL 17 DE JULIO DE 2025	
ESTIMACIÓN No.: 1 (UNO)	PERIODO: DEL 03 DE JUNIO AL 19 DE JUNIO DEL 2025	FECHA: 20/JUNIO/2025	

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	SEGÚN PROYECTO	HASTA ESTA ESTIMACIÓN	HASTA LA ESTIMACIÓN ANTERIOR	EXCEDENTE	DE ESTA ESTIMACIÓN	P.U.	IMPORTE
2.2	DENTELLON DE CONCRETO DE 15 X 40 CMS ARMADO CON 4 VARILLAS DE 3/8" Y ESTRIBOS DE ALAMBRON @25CMS, CON CONCRETO HECHO EN OBRA INCLUYE MATERIALES Y MANO DE OBRA NECESARIA	ML	77.60	77.60	0.00	0.00	77.60	527.83	40,959.61
2.3	DENTELLON DE CONCRETO DE 15 X 30 CMS ARMADO CON 4 VARILLAS DE 3/8" Y ESTRIBOS DE ALAMBRON @25CMS, CON CONCRETO HECHO EN OBRA, INCLUYE MATERIALES Y MANO DE OBRA NECESARIA	ML	70.92	70.92	0.00	0.00	70.92	421.47	29,890.65
2.4	FIRME DE CONCRETO DE 10 CMS DE ESPESOR A BASE DE CONCRETO HECHO EN OBRA ACABADO FLOTEADO, INCLUYE MATERIALES Y MANO DE OBRA NECESARIA	M2	241.54	241.54	0.00	0.00	241.54	633.72	153,068.73

CONFORME

CONFORME

CONFORME

ARQ. MARTIN ALBERTO DAGNINO MEZA

JUAN MANUEL LOPEZ MENCHACA

ING. JOSE ALONSO VELIZ BELTRAN

REPRESENTANTE LEGAL

DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

SUPERVISOR DE OBRA



CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	SEGÚN PROYECTO	HASTA ESTA ESTIMACIÓN	HASTA LA ESTIMACIÓN ANTERIOR	EXCEDENTE	DE ESTA ESTIMACIÓN	P.U.	IMPORTE
2.5	PLANTILLA DE CONCRETO SIMPLE HECHO EN OBRA DE 5 CMS DE ESPESOR, INCLUYE; MATERIALES, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA NECESARIA, CONCRETO ECHO EN OBRA.	M2	29.62	29.62	0.00	0.00	29.62	504.12	14,932.03
								TOTAL ALBAÑILERIA	279,828.02
III	MOBILIARIO URBANO								
3.1	SUMINISTRO DE BOTE DE BASURA TMB SENCILLO GIRATORIO, RECUBRIMIENTO DE PINTURA EN POLVO ELECTROSTATICA Y ACCESORIOS EN PLASTICO ROTOMOLDEADO, INCLUYE; SUMINISTRO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA NECESARIA PARA SU COLOCACION.	PZA	2.00	2.00	0.00	0.00	2.00	6,162.26	12,324.52

CONFORME

REPRESENTANTE LEGAL

CONFORME

DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

~~CONFORMS~~

SUPERVISOR DE OBRA

MUNICIPIO DE SINALOA
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
ESTIMACION DE OBRA



OBRA:	CONSTRUCCION DE PARQUE PUBLICO EN LA LOCALIDAD DE LA GUAMUCHILERA, MUNICIPIO DE SINALOA ESTADO DE SINALOA.										<div> CONSTRUCTORA DAGARQ S.A. DE C.V. <small>AV. MIGUEL ALBAREZ NO. 1189, ZONA INDUSTRIAL, SAN MIGUEL, SINALOA, S.N.C. 48500</small></div>		
CONTRATO: FAIS-DOP-SIN-2025-002			IMPORTE \$ 1,118,864.19 SIN I.V.A.				PERIODO DEL 03 DE JUNIO AL 17 DE JULIO DE 2025			CONTRATO:			
ESTIMACIÓN No.: 1 (UNO)			PERIODO: DEL 03 DE JUNIO AL 19 DE JUNIO DEL 2025					FECHA: 20/JUNIO/2025					

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	SEGÚN PROYECTO	HASTA ESTA ESTIMACIÓN	HASTA LA ESTIMACIÓN ANTERIOR	EXCEDENTE	DE ESTA ESTIMACIÓN	P.U.	IMPORTE
3.2	SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPO DE GIMNASIO AL AIRE LIBRE, INCLUYE; SUMINISTRO DE EQUIPO, HERRAMIENTA MENOR Y MANO DE OBRA NECESARIA PARA SU INSTALACION, (INCLUYE ACARREO PUESTO EN OBRA).	LOTE	1.00	1.00	0.00	0.00	1.00	150,036.58	150,036.58
3.3	SUMINISTRO E INSTALACION DE BANCA MODELO ATENAS DE TUBO DE 1 1/2"CON DESCANZA BRAZOS ROLADO Y RESPALDO PRE-TRATAMIENTO DE FOSFATO DE ZINC Y RECUBRIMIENTO DE PINTURA EN POLVO ELECTROESTATICA, INCLUYE: SUMINISTRO, COLOCACION, ACARREO PUESTO EN OBRA, HERRAMIENTA MENOR Y MANO DE OBRA NECESARIA.	PZA	2.00	2.00	0.00	0.00	2.00	20,163.02	40,326.04
3.4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE JUEGOS INFANTILES, INCLUYE; SUMINISTRO E INSTALACION DE ELLOS MISMOS.	LOTE	1.00	1.00	0.00	0.00	1.00	137,602.31	137,602.31

CONFORME

ARQ. MARTIN ALBERTO DAGNINO MEZA

REPRESENTANTE LEGAL

CONFORME

JUAN MANUEL LOPEZ MENCHACA

DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

CONFORME

ING. JOSE ALONSO VELIZ BELTRAN

SUPERVISOR DE OBRA



**MUNICIPIO DE SINALOA
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
ESTIMACION DE OBRA**



OBRA:	CONSTRUCCION DE PARQUE PUBLICO EN LA LOCALIDAD DE LA GUAMUCHILERA, MUNICIPIO DE SINALOA ESTADO DE SINALOA.		
CONTRATO: FAIS-DOP-SIN-2025-002	IMPORTE \$ 1,118,864.19 SIN I.V.A.	PERIODO DEL 03 DE JUNIO AL 17 DE JULIO DE 2025	
ESTIMACIÓN No.: 1 (UNO)	PERIODO: DEL 03 DE JUNIO AL 19 DE JUNIO DEL 2025	FECHA: 20/JUNIO/2025	

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	SEGÚN PROYECTO	HASTA ESTA ESTIMACIÓN	HASTA LA ESTIMACIÓN ANTERIOR	EXCEDENTE	DE ESTA ESTIMACIÓN	P.U.	IMPORTE
								TOTAL MOBILIARIO URBANO	340,289.45
								IMPORTE SIN I.V.A.	687,290.82
								IVA (16%)	109,966.53
								Total:	797,257.35

CONFORME

ARQ. MARTIN ALBERTO DAGNINO MEZA
REPRESENTANTE LEGAL

CONFORME

JUAN MANUEL LOPEZ MENCHACA
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

CONFORME

ING. JOSE ALONSO VELIZ BELTRAN
SUPERVISOR DE OBRA



MUNICIPIO DE SINALOA
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
ESTIMACION DE OBRA



OBRA: CONSTRUCCION DE PARQUE PUBLICO EN LA LOCALIDAD DE LA GUAMUCHILERA, MUNICIPIO DE SINALOA ESTADO DE SINALOA.			DAGIARQ CONSTRUCTORA DAGIARQ S.A. DE C.V. <small>AV. MIGUEL LEON DE LA PAZ 119 DEL SUR, GUAMUCHILERA, SINALOA, S.P. DE C.V.</small>
CONTRATO: FAIS-DOP-SIN-2025-002	IMPORTE: \$ 1,118,864.19 SIN I.V.A.	PERIODO CONTRATO: DEL 03 DE JUNIO AL 17 DE JULIO DE 2025	
ESTIMACIÓN No.: 1 (UNO)	PERIODO: DEL 03 DE JUNIO AL 19 DE JUNIO DEL 2025	FECHA: 20 DE JUNIO DEL 2025	HOJA: 1 DE 1

RESUMEN DE ESTIMACIÓN

PRELIMINARES	\$67,173.35
ALBAÑILERIA	\$279,828.02
MOBILIARIO URBANO	\$340,289.45

SUB-TOTAL DE OBRA:	\$687,290.82
I.V.A. (16%):	\$109,966.53
SUB-TOTAL DE ESTIMACION:	\$797,257.35

DEDUCCIONES:	
Amortización 35.00%	\$279,040.07
INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y CONTROL DE LOS TRABAJOS: 3%	\$20,618.72
Suma de deducciones	\$299,658.79

Neto a pagar de esta estimacion: **\$497,598.56**

(Son: CUATROCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS 56/100 M.N.)

CONFORME

ARQ. MARTIN ALBERTO DAGNINO MEZA
REPRESENTANTE LEGAL

CONFORME

JUAN MANUEL LOPEZ MENCHACA
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

CONFORME

ING. JOSE ALONSO VELIZ BELTRAN
SUPERVISOR DE OBRA



MUNICIPIO DE SINALOA
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
ESTIMACION DE OBRA



OBRA: CONSTRUCCION DE PARQUE PUBLICO EN LA LOCALIDAD DE LA GUAMUCHILERA, MUNICIPIO DE SINALOA ESTADO DE SINALOA.			 CONSTRUCTORA DAGARQ S.A. DE C.V. <small>ESTRUCTURAS, OBRAS DE ACERQUE, OBRAS DE SANEAMIENTO, OBRAS DE DRENAJE, OBRAS DE VIALIDAD, OBRAS DE OBRAS DE ACERQUE, OBRAS DE SANEAMIENTO, OBRAS DE DRENAJE, OBRAS DE VIALIDAD</small>
CONTRATO: FAIS-DOP-SIN-2025-002	IMPORTE: \$ 1,118,864.19 SIN I.V.A.	PERIODO CONTRATO: DEL 03 DE JUNIO AL 17 DE JULIO DE 2025	
ESTIMACIÓN No.: 1 (UNO)	PERIODO: DEL 03 DE JUNIO AL 19 DE JUNIO DEL 2025	FECHA: 20 DE JUNIO DEL 2025	HOJA: 1 DE 1

RESUMEN GENERAL DE ESTIMACIÓN

CONSTRUCCION DE PARQUE PUBLICO EN LA LOCALIDAD DE LA GUAMUCHILERA, MUNICIPIO DE SINALOA ESTADO DE SINALOA. **\$687,290.83**

SUB-TOTAL DE OBRA: \$687,290.83
I.V.A. (16%): \$109,966.53
SUB-TOTAL DE ESTIMACION: **\$797,257.36**

DEDUCCIONES:
Amortización 35.00% \$279,040.08
INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y CONTROL DE LOS TRABAJOS: 3% \$20,618.72

Suma de deducciones **\$299,658.80**

Neto a pagar de esta estimacion: **\$497,598.56**

(Son: CUATROCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS 56/100 M.N.)

CONFORME

ARQ. MARTIN ALBERTO DAGNINO MEZA

REPRESENTANTE LEGAL

CONFORME

JUAN MANUEL LOPEZ MENCHACA

DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

CONFORME

ING. JOSE ALONSO VELIZ BELTRAN

SUPERVISOR DE OBRA



MUNICIPIO DE SINALOA
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
ESTIMACION DE OBRA



CONSTRUCCION DE PARQUE PUBLICO EN LA LOCALIDAD DE LA GUAMUCHILERA, MUNICIPIO DE SINALOA ESTADO DE OBRA: SINALOA.				<div><div><div>DAGARQ</div><div>INSTRUMENTOS Y CONSTRUCCIONES</div></div><div>CONSTRUCTORA DAGARQ S.A. DE C.V. BLVD. MIGUEL LEON N. 112 DEL EJIDAL GUAYAVE, SIN. MEXICO, C.P. 81000 TELCEL (887) 151-88-97</div></div>			
CONTRATO: FAIS-DOP-SIN-2025-002		PERIODO CONTRATO: DEL 03 DE JUNIO AL 17 DE JULIO DE 2025					
IMPORTE CONTRATO:		\$1,297,882.46	CON I.V.A.	IMPORTE ANTICIPO:		\$454,258.86	CON I.V.A.
ESTIMACIÓN No.: 1 (UNO)		PERIODO: DEL 03 DE JUNIO AL 19 DE JUNIO DEL 2025			FECHA: 20 DE JUNIO DEL 2025		HOJA: 1 DE 1

ESTADO DE CUENTA									
ESTIMACION	PERIODO	IMPORTE DE ESTIMACION	INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y CONTROL: 3 %				AMORTIZACION DE ANTICIPO (35%)	TOTAL DE DEDUCCIONES	LIQUIDO A PAGAR
ESTIMACION 1(UNO)	DEL 03 DE JUNIO AL 19 DE JUNIO DEL 2025	\$797,257.36	\$20,618.72				\$279,040.08	\$299,658.80	\$497,598.56
TOTALES		\$797,257.36	\$20,618.72				\$279,040.08	\$299,658.80	\$497,598.56
SALDO DEL CONTRATO:		\$500,625.10	SALDO POR AMORTIZAR DEL ANTICIPO				\$175,218.78		

CONFORME

ARQ. MARTIN ALBERTO DAGNINO MEZA

REPRESENTANTE LEGAL

CONFORME

JUAN MANUEL LOPEZ MENCHACA

DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

CONFORME

ING. JOSE ALONSO VELIZ BELTRAN

SUPERVISOR DE OBRA



MUNICIPIO DE SINALOA
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
ESTIMACION DE OBRA

OBRA: CONSTRUCCION DE PARQUE PUBLICO EN LA LOCALIDAD DE LA GUAMUCHILERA, MUNICIPIO DE SINALOA ESTADO DE SINALOA.			DAGARO CONSTRUCTORA DAGARO S.A. DE C.V. <small>ESTABLECIDA EN 1997 EN EL ESTADO DE SINALOA, MEXICO. CAPITAL SOCIAL: \$ 10,000,000.00</small>
CONTRATO: FAIS-DOP-SIN-2025-002	PERIODO CONTRATO: DEL 03 DE JUNIO AL 17 DE JULIO DE 2025		
IMPORTE CONTRATO: \$1,297,882.46	C/IVA	IMPORTE ANTICIPO: \$ 454,258.86 CON I.V.A.	
ESTIMACIÓN No.: 1 (UNO)	PERIODO: DEL 03 DE JUNIO AL 19 DE JUNIO DEL 2025	FECHA: 20 DE JUNIO DEL 2025	Hoja:1 de 5
REPORTE FOTOGRAFICO			



CONFORME

ARQ. MARTIN ALBERTO DAGNINO MEZA
REPRESENTANTE LEGAL

CONFORME

JUAN MANUEL LOPEZ MENCHACA
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

CONFORME

ING. JOSE ALONSO VELIZ BELTRAN
SUPERVISOR DE OBRA



MUNICIPIO DE SINALOA
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
ESTIMACION DE OBRA

OBRA: CONSTRUCCION DE PARQUE PUBLICO EN LA LOCALIDAD DE LA GUAMUCHILERA, MUNICIPIO DE SINALOA ESTADO DE SINALOA.			<div> CONSTRUCTORA DAGARO S.A. DE C.V. <small>ESTRUCTURAS DE CONCRETO Y ACERO</small></div>
CONTRATO: FAIS-DOP-SIN-2025-002	PERIODO CONTRATO: DEL 03 DE JUNIO AL 17 DE JULIO DE 2025		
IMPORTE CONTRATO: \$1,297,882.46	C/IVA	IMPORTE ANTICIPO: \$ 454,258.86 CON I.V.A.	
ESTIMACIÓN No.: 1 (UNO)	PERIODO: DEL 03 DE JUNIO AL 19 DE JUNIO DEL 2025	FECHA: 20 DE JUNIO DEL 2025	
Hoja:3 de 5			
REPORTE FOTOGRAFICO			



CONFORME

ARQ. MARTIN ALBERTO DAGNINO MEZA
REPRESENTANTE LEGAL

CONFORME

JUAN MANUEL LOPEZ MENCHACA
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

CONFORME

ING. JOSE ALONSO VELAZQUEZ
SUPERVISOR DE OBRA



MUNICIPIO DE SINALOA
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
ESTIMACION DE OBRA

OBRA: CONSTRUCCION DE PARQUE PUBLICO EN LA LOCALIDAD DE LA GUAMUCHILERA, MUNICIPIO DE SINALOA ESTADO DE SINALOA.			<div> CONSTRUCTORA DAGARQ S.A. DE C.V. <small>CONSTRUCCION DE OBRAS DE INFRASURSTRUCTURA Y OBRAS DE ACERQUE</small></div>
CONTRATO: FAIS-DOP-SIN-2025-002	PERIODO CONTRATO: DEL 03 DE JUNIO AL 17 DE JULIO DE 2025		
IMPORTE CONTRATO:	\$1,297,882.46	C/IVA IMPORTE ANTICIPO: \$ 454,258.86 CON I.V.A.	
ESTIMACIÓN No.: 1 (UNO)	PERIODO: DEL 03 DE JUNIO AL 19 DE JUNIO DEL 2025	FECHA: 20 DE JUNIO DEL 2025	
Hoja:4 de 5			
REPORTE FOTOGRAFICO			



CONFORME

ARQ. MARTIN ALBERTO DAGNINO MEZA
REPRESENTANTE LEGAL

CONFORME

JUAN MANUEL LOPEZ MENCHACA
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

CONFORME

ING. JOSE ALONSO VELIZ BELTRAN
SUPERVISOR DE OBRA



MUNICIPIO DE SINALOA
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
ESTIMACION DE OBRA

OBRA: CONSTRUCCION DE PARQUE PUBLICO EN LA LOCALIDAD DE LA GUAMUCHILERA, MUNICIPIO DE SINALOA ESTADO DE SINALOA.

CONTRATO: FAIS-DOP-SIN-2025-002

PERIODO CONTRATO: DEL 03 DE JUNIO AL 17 DE JULIO DE 2025

IMPORTE CONTRATO: \$1,297,882.46

C/IVA

IMPORTE ANTICIPO: \$ 454,258.86 CON I.V.A.

ESTIMACIÓN No.: 1 (UNO)


PERIODO: DEL 03 DE JUNIO AL 19 DE JUNIO DEL 2025

FECHA: 20 DE JUNIO DEL 2025

DAGARQ CONSTRUCTORA DAGARQ S.A. DE C.V.
AV. MIGUEL LEON DE LA 112 DEL EJIDO SINALOA, SAN MIGUEL DE SINALOA, SINALOA, SINALOA

Hoja:5 de 5

REPORTE FOTOGRAFICO

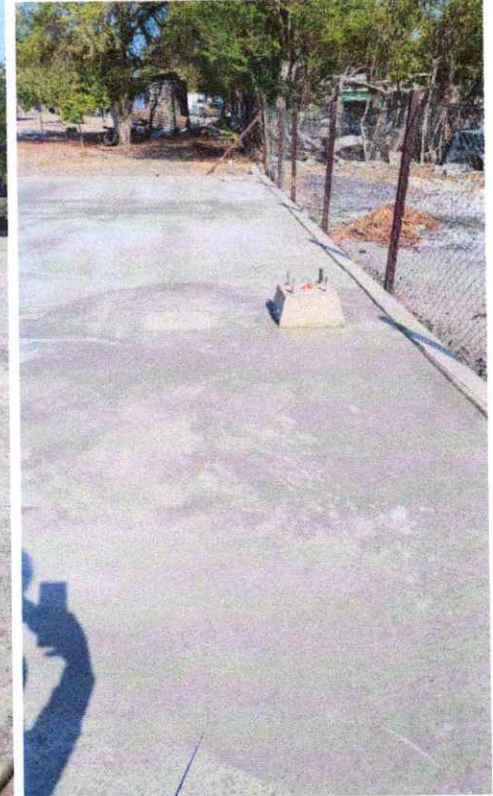

CONFORME

ARQ. MARTIN ALBERTO DAGNINO MEZA

REPRESENTANTE LEGAL

CONFORME

JUAN MANUEL LOPEZ MENCHACA

DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

CONFORME

ING. JOSE ALONSO VELIZ BELTRAN

SUPERVISOR DE OBRA
