



Badiraguato

GENERANDO BUENOS RESULTADOS



OFICIO No. OPDUyE/068/2025

ASUNTO: SOLICITUD PAGO ESTIMACIÓN 01 NORMAL

Badiraguato, Sin., a 23 de Enero de 2025

MTRO. GONZALO IRINEO CABALLERO TERRAZAS

TESORERO MUNICIPAL

P R E S E N T E.-

POR MEDIO DE LA PRESENTE, LE SOLICITO EL PAGO POR: **CONCEPTO DE PAGO ESTIMACIÓN 01 NORMAL**, DEL IMPORTE DEL CONTRATO, A FAVOR DE LA EMPRESA: **MANUEL URIARTE BELTRAN**, LA CUAL REALIZA LOS TRABAJOS APROBADOS POR EL CABILDO MUNICIPAL, CON EL ACTA DE CABILDO NÚMERO: **04 (CUATRO) CON FECHA DE 26 DE DICIEMBRE DE 2024**, A CONTINUACIÓN, SE DETALLA:

- **NOMBRE DE LA OBRA:** CONSTRUCCIÓN DE BAÑOS PÚBLICOS UBICADOS A UN COSTADO DE TECHUMBRE EN LA COMUNIDAD DE CIÉNEGA DE LOS LARA, SINDICATURA DE CIÉNEGA DE LOS LARA, EN EL MUNICIPIO DE BADIRAGUATO, SINALOA.
- **No. DE CONTRATO:** MBGBR-AD-GC-001/2025
- **IMPORTE DEL CONTRATO:** \$558,450.83 (QUINIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTAS PESOS 83/100 M.N)
- **CONCEPTO DEL PAGO:** PAGO DE ESTIMACIÓN 01 NORMAL
- **IMPORTE A PAGAR:** \$201,007.54 (DOSCIENTOS UN MIL SIETE PESOS 54/100 M.N)
- **RECURSOS:** FONDO DEL GASTO CORRIENTE MUNICIPAL, EJERCICIO 2025
- **EMPRESA:** MANUEL URIARTE BELTRAN
- **R.F.C.** UIBM811007HY3
- **DOMICILIO FISCAL:** CALLE ANDRIO 4993, FRACCIONAMIENTO VILLA DEL CEDRO ENTRE BOULEVARD BILOGÍA Y CIRCUITO SALERNO, C.P. 80058
- **No. DE FACTURA:** # A-1181, DE FECHA 19 DE ENERO DE 2025

SE ANEXA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DE SOPORTE, COMO AMPARO DE DICHO PAGO.

AGRADECIENDO DE ANTEMANO LA ATENCIÓN QUE SE SIRVA DAR A LA PRESENTE, ME DESPIDO QUEDANDO A SUS ÓRDENES.



DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS,
DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA,
BADIRAGUATO, SINALOA.

ATENTAMENTE

C. ING. RUBIEL RINCÓN RAMOS
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS,
DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA

C.C.P. ARCHIVO.

TESORERÍA
MUNICIPAL DE
BADIRAGUATO

1:11 PM
23 ENE 2025
Yadany
RECIBIDO

Comprobante Fiscal Digital por Internet

Folio Interno: **A 1181**Folio Fiscal: **CC6990DA-C481-4993-BB00-47059C0D624F**

CSD del Emisor

00001000000518359851

Fecha de Emisión

2025-01-19T21:54:02

Tipo de comprobante

I-Ingreso

CSD del SAT

00001000000709182898

Fecha de Certificación

2025-01-19T22:54:25

Expedido en

80058

Datos del Emisor

MANUEL URIARTE BELTRAN

UIBM811007HY3

Régimen Fiscal: 612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

Datos del Receptor

MUNICIPIO DE BADIRAGUATO

MBA850101214

Domicilio Fiscal: 80500

Régimen Fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

Uso CFDI: G03-Gastos en general.

Código	Clave Prod/ Servicio	Cantidad	Unidad SAT	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Objeto Impuesto	Impuesto	Importe
ESTIM01BANC72101500 - Servicios IENEG	de ap	1	E48 - Unidad de servicio	Servicio	PAGO DE ESTIMACION 01 NORMAL DE LA OBRA CONSTRUCCIÓN DE BAÑOS PÚBLICOS UBICADOS A UN COSTADO DE TECHUMBRE EN LA COMUNIDAD DE LA CIÉNEGA DE LOS LARA, SINDICATURA DE CIÉNEGA DE LOS LARA, EN EL MUNICIPIO DE BADIRAGUATO, SINALOA. MBGBR-AD-GC-001/2025 MONTO DEL CONTRATO NETO : \$ 558,450.83 MONTO BRUTO GENERADO POR LOS TRABAJOS EN LA PRESENTE ESTIMACION : \$ 277,634.72 IVA DE LOS TRABAJOS GENERADOS: \$44,421.56 MONTO TOTAL DE LOS TRABAJOS GENERADOS INC IVA: \$ 322,056.28 MONTO BRUTO AMORTIZACION ANTICIPO : \$ 97,172.15 IVA AMORTIZACION ANTICIPO: \$ 15,547.55 MONTO NETO AMORTIZACION ANTICIPO: \$ 112,719.70 MONTO BRUTO A FACTURAR: \$ 180,462.57 IVA A FACTURAR: \$ 28,874.01 TOTAL A FACTURAR DE LA ESTIMACION: \$ 209,336.58 MENOS 3% DE SERVICIOS DE VERIFICACION	\$ 180,462.57	\$ 0.00	02 - Sí objeto de impuesto.	002-IVA 0.160000 \$28874.0 11200	\$ 180,462.57

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Comprobante Fiscal Digital por Internet

CSD del Emisor

00001000000518359851

CSD del SAT

00001000000709182898

Folio Interno: **A 1181**

Fecha de Emisión

2025-01-19T21:54:02

Fecha de Certificación

2025-01-19T22:54:25

Folio Fiscal: **CC6990DA-C481-4993-BB00-47059C0D824F**

Tipo de comprobante

I-Ingreso

Expedido en

80058

Datos del Emisor

MANUEL URIARTE BELTRAN

UIBM811007HY3

Régimen Fiscal: 612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

Datos del Receptor

MUNICIPIO DE BADIRAGUATO

MBA850101214

Domicilio Fiscal: 80500

Régimen Fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

Uso CFDI: G03-Gastos en general.

INSPECCION,
FISCALIZACION, Y
CONTROL (S.V.I.F.Y
C.) \$ 8,329.04 TOTAL
DEDUCCIONES: \$
121,048.75 MONTO
LIQUIDO A RECIBIR:
\$ 201,007.54 (SON
DOSCIENTOS UN
MIL SIETE PESOS
54/100 M.N.)

Total con letra: Doseientos nueve mil trescientos treinta y seis pesos 58/100 MXN
Crédito

Subtotal	\$ 180,462.57
Total Descuentos	-
Total Impuestos Traslados	\$28,874.01
Total Impuestos Retenidos	-
Total	\$ 209,336.58

Forma de Pago 99-Por definir

Moneda

MXN-Peso Mexicano

Método de Pago PPD-Pago en parcialidades o diferido

Tipo de Cambio

Cadena Original del Timbre



||1.1|CC6990DA-C481-4993-BB00-47059C0D824F|2025-01-19T22:54:25|MAS0810247C0|ID1J3FvQL6m5+oYsaVKq4icrIHJC
+zNvRSuAYveBN0gfWngNjW0bRXfCez1pIN0pAnVIFRDI9tfdsMwcG5RZu0fohaGQqBiSvYy34Fd4s53t6Wf78isXoUAFUhgfd4jzJedtd
1yMpfbhWhhvS10CnngCkLtQDg
+F8ujmeKTxQZy57T44MJ5VSlY3yHyGDHLAVQ9LSSVxjSVEH7sLs50POldCSSJpxd1mZDUFshXL6CidHv881HHP3l6uZu18l3+6Bc65
6yGUcj646QWvBZDYriUsazT1KqAgTfhjoKdUPRP+dLJfpjHgCjuGD3xbr2mN183MunfZ4Yy3oKUvEYLbw==|00001000000709182898||

Sello Digital del Emisor

ID1J3FvQL6m5+oYsaVKq4icrIHJC
+zNvRSuAYveBN0gfWngNjW0bRXfCez1pIN0pAnVIFRDI9tfdsMwcG5RZu0fohaGQqBiSvYy34Fd4s53t6Wf78isXoUAFUhgfd4jzJedtd
1yMpfbhWhhvS10CnngCkLtQDg
+F8ujmeKTxQZy57T44MJ5VSlY3yHyGDHLAVQ9LSSVxjSVEH7sLs50POldCSSJpxd1mZDUFshXL6CidHv881HHP3l6uZu18l3+6Bc65
6yGUcj646QWvBZDYriUsazT1KqAgTfhjoKdUPRP+dLJfpjHgCjuGD3xbr2mN183MunfZ4Yy3oKUvEYLbw==

Sello Digital del SAT

DBiPzVLUfjmJHNIcLQplr/5FfrjFFrkhaER8od66A+0u6OGOWAbf/6YwJtfgpkm+HthLYHWoMV8/laBsRkfrRkgW8RBIJdr0tiDM
+glSCOYoLEF0yM+zveISh47hHUTELDz0HGm3AXBUN8wVpLsLHexhn6Y
+lAeFh/6OsPhPVU4JvONV8VvW/7FX7YIVNrSyudcYa5XoBsfBA
+KXuAdhY02Siq4DBewakat1J0eyRWX6nGPvs9CrWQsr3HebKi9tfr40l9RbMmRu6NqdzJlZ7kjhDElobmda3O3K0Xm0Px13We7aJVi
JzACj9SwUUa10O5JJTBKNa6miY/WkP2ng==

Este documento es una representación impresa de un CFDI

This XML file does not appear to have any style information associated with it. The document tree is shown below.

```
<cfdi:Comprobante xmlns:cfdi="http://www.sat.gob.mx/cfd/4" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/cfd/4 http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/4/cfdv40.xsd" Version="4.0" Serie="A" Folio="1181"
Fecha="2025-01-19T21:54:02"
Sello="1D133FvQL6m5+oYsaVKq4icrIHJC+zNvRSuAYveBN0gfwngNjW0bRXfCez1p1N0pAnV1FRD19tfdSMvcG5RZu0fohaGQqB1SvYy34Fd4s53t6Wf78isXoUAFUhgfd4jzJedtd1yMpfbh
FormaPago="99" NoCertificado="00001000000518359851"
Certificado="MIIF6zCCA9OgAwIBAgIUMDAwMDEwMDAwMDA1MTgzNTk4NTEwDQYJKoZIhvcNAQELBQAwggGEMSAwHgYDVQQDBdBBVRPUK1EQUQgQ0VSVE1GSUNBRE9SQTEuMCwGA1UECgwlU0V
CondicionesDePago="Crédito" SubTotal="180462.57" Moneda="MXN" Total="209336.58" TipoDeComprobante="I" Exportacion="01" MetodoPago="PPD"
LugarExpedicion="80058">
  <cfdi:Emisor Rfc="UIBM811007HY3" Nombre="MANUEL URIARTE BELTRAN" RegimenFiscal="612"/>
  <cfdi:Receptor Rfc="MBA850101214" Nombre="MUNICIPIO DE BADIRAGUATO" DomicilioFiscalReceptor="80500" RegimenFiscalReceptor="603" UsoCFDI="G03"/>
  <cfdi:Conceptos>
    <cfdi:Concepto ClaveProdServ="72101500" NoIdentificacion="ESTIM01BANCINENEG" Cantidad="1" ClaveUnidad="E48" Unidad="Servicio" Descripcion="PAGO
DE ESTIMACION 01 NORMAL DE LA OBRA CONSTRUCCIÓN DE BAÑOS PÚBLICOS UBICADOS A UN COSTADO DE TECHUMBRE EN LA COMUNIDAD DE LA CIÉNEGA DE LOS LARA,
SINDICATURA DE CIÉNEGA DE LOS LARA, EN EL MUNICIPIO DE BADIRAGUATO, SINALOA. MBGBR-AD-GC-001/2025 MONTO DEL CONTRATO NETO : $ 558,450.83 MONTO
BRUTO GENERADO POR LOS TRABAJOS EN LA PRESENTE ESTIMACION : $ 277,634.72 IVA DE LOS TRABAJOS GENERADOS: $44,421.56 MONTO TOTAL DE LOS TRABAJOS
GENERADOS INC IVA: $ 322,056.28 MONTO BRUTO AMORTIZACION ANTICIPO : $ 97,172.16 IVA AMORTIZACION ANTICIPO: $ 15,547.55 MONTO NETO AMORTIZACION
ANTICIPO: $ 112,719.70 MONTO BRUTO A FACTURAR: $ 180,462.57 IVA A FACTURAR: $ 28,874.01 TOTAL A FACTURAR DE LA ESTIMACION: $ 209,336.58 MENOS 3%
DE SERVICIOS DE VERIFICACION INSPECCION, FISCALIZACION, Y CONTROL ( S.V.I.F.Y.C.) $ 8,329.04 TOTAL DEDUCCIONES: $ 121,048.75 MONTO LIQUIDO A
RECIBIR: $ 201,007.54 (SON DOSCIENTOS UN MIL SIETE PESOS 54/100 M.N.) " ValorUnitario="180462.570000" Importe="180462.570000" ObjetoImp="02">
      <cfdi:Impuestos>
        <cfdi:Traslados>
          <cfdi:Traslado Base="180462.570000" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.160000" Importe="28874.011200"/>
        </cfdi:Traslados>
      </cfdi:Impuestos>
    </cfdi:Concepto>
  </cfdi:Conceptos>
  <cfdi:Impuestos TotalImpuestosTrasladados="28874.01">
    <cfdi:Traslados>
      <cfdi:Traslado Base="180462.57" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.160000" Importe="28874.01"/>
    </cfdi:Traslados>
  </cfdi:Impuestos>
  <cfdi:Complemento>
    <tfd:TimbreFiscalDigital xmlns:tfd="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital
http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/TimbreFiscalDigital/TimbreFiscalDigitalv11.xsd" Version="1.1" UUID="CC6990DA-C481-4993-BB00-
47059C0D824F" FechaTimbrado="2025-01-19T22:54:25" RfcProvCertif="MAS0810247C0"
SelloCFD="1D133FvQL6m5+oYsaVKq4icrIHJC+zNvRSuAYveBN0gfwngNjW0bRXfCez1p1N0pAnV1FRD19tfdSMvcG5RZu0fohaGQqB1SvYy34Fd4s53t6Wf78isXoUAFUhgfd4jzJedtd1
NoCertificadoSAT="00001000000709182898"
SelloSAT="DB1PzVLufjmJHN1CLQp1r/SFfRjFFrkhaER8od66A+0u6OGOWAbf/6YwJtfpqkcm+HthLYHwMV8/laBsRkfnRkgW8RB1jdr0tiDM+gISCOYoLEf0yM+zvaIsh47hHUTELDz0Hk
</cfdi:Complemento>
</cfdi:Comprobante>
```



Dependencia: Ayuntamiento de Badiraguato
Control de Estimaciones

MANUEL URIARTE BELTRAN.

CONSTRUCCIÓN DE BAÑOS PÚBLICOS UBICADOS A UN COSTADO DE TECHUMBRE EN LA COMUNIDAD DE CIÉNEGA DE LOS LARA, SINDICATURA DE CIÉNEGA DE LOS LARA, EN EL MUNICIPIO DE BADIRAGUATO, SINALOA.			Fecha:	Estimación:				
			15 de enero de 2025	01 NORMAL				
Periodo de la estimación:	03/01/2025	15/01/2025	Localidad:	No. De contrato:				
Periodo de Ejecución:	03/01/2025	06/02/2025	CIENEGA DE LOS LARA	MBGBR-AD-GC-001/2025				
Importe del contrato con I.V.A:		Imp. Contratado sin I.V.A	Anticipo	Importe Anticipo sin I.V.A	% de Avance			
\$	558,450.83	\$	481,423.13	\$	195,457.79	\$	168,498.09	58%
								% Avance Total
								58%

Control Del Anticipo	Liquidacion de Estimacion	Control de Estimacion
AMORTIZA ESTA ESTIMACION	Importe de la Estimacion (+) \$ 277,634.72	ESTA ESTIMACION
\$ 112,719.70	16 % I.V.A (+) \$ 44,421.56	\$ 322,056.28
	Sub- Total A (=) \$ 322,056.28	
	Amortizacion Anticipo \$ 97,172.15	
AMORTIZACION ANTERIOR	16 % I.V.A (+) \$ 15,547.55	ACUMULADO ANTERIOR
\$ -	Total (=) \$ 112,719.70	\$ -
	Importe TOTAL \$ 180,462.57	
TOTAL AMORTIZADO	16 % I.V.A (+) \$ 28,874.01	TOTAL ACUMULADO.
\$ 112,719.70	Total (=) \$ 209,336.58	\$ 322,056.28
	3 % SVIFYC: \$ 8,329.04	
ANTICIPO OTORGADO	Total Deducciones (=) \$ 121,048.74	CONTRATADO
\$ 195,457.79	Importe TOTAL \$ 201,007.54	\$ 558,450.83
	NETO A PAGAR	
SALDO DEL ANTICIPO	\$ 201,007.54	SALDO
\$82,738.09	Son:	\$ 236,394.55
	(SON DOSCIENTOS UN MIL SIETE PESOS 54/100 M.N.)	

ELABORO:-

C. MANUEL URIARTE BELTRAN
REPRESENTANTE LEGAL

REVISO

ING. JOSE RODOLFO CONTRERAS LÓPEZ
COSTOS Y PRESUPUESTOS

AUTORIZO

ING. RUBIEL RINCON RAMOS
DIRECTOR DE D. O. P. D. U. Y. E.



Fecha: 15 de enero de 2025

CARATULA DE ESTIMACIÓN

CONTRATISTA: MANUEL URIARTE BELTRAN.		ESTIMACIÓN No: 01 NORMAL	
DOMICILIO: Calle Andrio 4993, Fraccionamiento Villas del Cedro Entre Boulevard Bologna y Circuito Salerno C.P.80058		PERIODO DE ESTIMACION:	
TELÉFONO:	CEL:	DEL:	03-ene-25
66 72 96 48 27	66 72 96 48 27	AL:	15-ene-25
R.F.C.		FECHA DE CONTRATO:	
UIBM811007HY3		02-ene-25	
DEPENDENCIA:			
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA, AYUNTAMIENTO DE BADIRAGUATO.			
LOCALIDAD:		MUNICIPIO:	PERIODO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO:
CIENEGA DE LOS LARA		BADIRAGUATO	INICIO: 03-ene-25
			TERMINACIÓN: 06-feb-25
DESCRIPCIÓN:			
CONSTRUCCIÓN DE BAÑOS PÚBLICOS UBICADOS A UN COSTADO DE TECHUMBRE EN LA COMUNIDAD DE CIENEGA DE LOS LARA, SINDICATURA DE CIENEGA DE LOS LARA, EN EL MUNICIPIO DE BADIRAGUATO, SINALOA.			
CONTRATO No:			
MBGBR-AD-GC-001/2025			
IMPORTE SIN IVA DE LA OBRA	IMPORTE CON IVA DE LA OBRA	35% ANTICIPO DE LA OBRA	IMPORTE TOTAL DE CONTRATO:
\$481,423.13	\$558,450.83	\$195,457.79	\$558,450.83
			BUENO POR: \$ 201,007.54
RECIBI DEL H. AYUNTAMIENTO DE BADIRAGUATO:			
\$ 201,007.54		(SON DOSCIENTOS UN MIL SIETE PESOS 54/100 M.N.)	
EN PAGO DE ESTIMACIÓN:		01 NORMAL	
DEDUCCIONES:		CALCULO DE ESTIMACIÓN	
AMORTIZACIÓN ANTICIPO 35%	\$ 97,172.15	IMPORTE DE LA OBRA EJECUTADA SIN IVA	\$ 277,634.72
MAS I.V.A.:	\$ 15,547.55	MAS I.V.A 16 %	\$ 44,421.56
TOTAL AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO:	\$ 112,719.70	TOTAL DE LA OBRA EJECUTADA CON IVA	\$ 322,056.28
3 % SVIFYC:	\$ 8,329.04	MENOS TOTAL DEDUCCIONES:	\$ 121,048.74
TOTAL DEDUCCIONES:	\$ 121,048.74	TOTAL A FACTURAR MAS IVA	\$ 209,336.58
		SALDO A PAGAR:	\$ 201,007.54

ELABORO.

C. MANUEL URIARTE BELTRAN
REPRESENTANTE LEGAL

REVISÓ.

ING. JOSE RODOLFO CONTRERAS LÓPEZ
COSTOS Y PRESUPUESTOS

AUTORIZO.

ING. RUBIEL RINCON RAMOS
DIRECTOR D. O. P. D. U. Y E.

ELABORO.-

REVISO-

AUTORIZO.-

C. MANUEL URIARTE BELTRAN
REPRESENTANTE LEGAL

ING. JOSE RODOLFO CONTRERAS LÓPEZ
COSTOS Y PRESUPUESTOS

ING. RUBIEL RINCON RAMOS
DIRECTOR DE O.P.D.U.Y.E.



FECHA 15 de enero de 2025

CONTRATISTA:	MANUEL URIARTE BELTRAN.	DEPENDENCIA:	AYUNTAMIENTO DE BADIRAGUATO
DOMICILIO:	Calle Andrio 4993, Fraccionamiento Villas del Cedro Entre Boulevard Bologna y Cjrcoito		
R.F.C.	UIBM811007HY3		

RESÚMEN DE ESTIMACIÓN

LOCALIDAD:	CIENEGA DE LOS LARA	ESTIMACIÓN:	01 NORMAL
DESCRIPCIÓN:	CONSTRUCCIÓN DE BAÑOS PÚBLICOS UBICADOS A UN COSTADO DE TECHUMBRE EN LA COMUNIDAD DE CIÉNEGA DE LOS LARA, SINDICATURA DE CIÉNEGA DE LOS LARA, EN EL MUNICIPIO DE BADIRAGUATO, SINALOA.		

IMPORTE DE OBRA SIN IVA:	\$ 481,423.13
IMPORTE DE ANTICIPO DE OBRA:	\$ 195,457.79
IMPORTE TOTAL DE CONTRATO:	\$ 558,450.83

DESTAJOS		IMPORTE
SALA DE CABILDO		
101	PRELIMINARES	\$ 643.20
2	CIMENTACION	\$ 62,518.41
3	ALBAÑILERIA	\$ 164,847.10
4	AZOTEAS	\$ 15,209.29
5	PUERTAS Y VENTANAS	\$ -
6	ACABADOS	\$ 2,420.00
7	INSTALACIONES HIDROSANITARIAS	\$ 10,707.25
8	INSTALACIONES ELÉCTRICAS	\$ 21,289.47
SUBTOTAL ESTIMACIÓN:		\$ 277,634.72

SUB TOTAL=	\$ 277,634.72
I.V.A AL 16 %	\$ 44,421.56
TOTAL =	\$ 322,056.28

ELABORO.-

C. MANUEL URIARTE BELTRAN.
REPRESENTANTE LEGAL

REVISÓ.-

ING. JOSE RODOLFO CONTRERAS LÓPEZ
COSTOS Y PRESUPUESTOS

AUTORIZO.-

ING. RUBIEL RINCON RAMOS
DIRECTOR D. O. P. D. U. Y. E.



DESGLOSE

FECHA 15/01/2025

CONTRATISTA: MANUEL URIARTE BELTRAN.

DEPENDENCIA:

AYUNTAMIENTO DE BADIRAGUATO

DOMICILIO: Calle Andrio 4993, Fraccionamiento Villas del Cedro Entre Boulevard Bolognia y Circuito Salerno C.P.80058

R.F.C.

UIBM811007HY3

DESGLOSE DE CONCEPTOS DE ESTIMACION

DESCRIPCIÓN: CONSTRUCCIÓN DE BAÑOS PUBLICOS UBICADOS A UN COSTADO DE TECHUMBRE EN LA COMUNIDAD DE CIENEGA DE LOS LARA, SINDICATURA DE CIENEGA DE LOS LARA, EN EL MUNICIPIO DE BADIRAGUATO, SINALOA.

LOCALIDAD:

CIENEGA DE LOS LARA

ESTIMACIÓN:

01 NORMAL

IMPORTE DE OBRA SIN IVA: \$481,423.13

IMPORTE DE ANTICIPO DE OBRA: \$195,457.79

IMPORTE TOTAL DE CONTRATO:

\$556,450.83

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	SEGUN PROYECTO			VOLUMEN TOTAL ESTIMADO	HASTA ESTIM ANTERIOR	EXCEDENTE	DE ESTA ESTIMACIÓN	IMPORTE
			CANT	P.U.	TOTAL					
101	PRELIMINARES									
GP001	TRAZO Y NIVELACIÓN DEL TERRENO ESTABLECIENDO EJES Y NIVELETAS DE REFERENCIA, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M2	37.33	\$ 17.23	\$ 643.20	37.33	0.00	0.00	37.33	\$ 643.20
2	CIMENTACION									
GP2403	EXCAVACIÓN POR MEDIOS MANUALES DE 0 A -2.00 M, EN MATERIAL TIPO B, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA	M3	9.33	\$ 364.07	\$ 3,396.77	9.33	0.00	56.49	9.33	\$ 3,396.77
GP26	RELLENO COMPACTADO AL 95% CON BAILARINA EN CAPAS DE 20 CMS DE ESPESOR CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN, INCLUYE: AGUA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU TERMINACIÓN.	M3	9.33	\$ 246.64	\$ 2,301.15	9.33	0.00	56.49	9.33	\$ 2,301.15
GP033	AFINE DE FONDOS Y TALUDES DE LAS EXCAVACIONES HECHAS INCLUYE: MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA,	M2	6.15	\$ 26.00	\$ 159.90	6.15	0.00	31.18	6.15	\$ 159.90
GP64	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE HULE NEGRO CALIBRE 600, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA TERMINACIÓN	M2	37.33	\$ 36.64	\$ 1,367.77	37.33	0.00	0.00	37.33	\$ 1,367.77
GP644	LOSA DE CIMENTACIÓN DE 10 CM DE ESPESOR CON CONCRETO F'c= DE 200 KG/CM HECHO EN OBRA, ARMADO CON VARILLA DE 3/8" @ 30 CMS EN AMBOS SENTIDOS, INCLUYE: CIMBRA, MANO DE OBRA, MATERIALES,EQUIPO Y HERRAMIENTAS.	M2	37.33	\$ 1,481.19	\$ 55,292.82	37.33	0.00	0.00	37.33	\$ 55,292.82
3	ALBAÑILERIA									
GP335	CASTILLO Y O DALA DE 15X20 CM ARMADO CON ARMEX Y REFORZADO CON 2 VARILLAS DE 3/8", ACABADO APARENTE, CONCRETO HECHO EN OBRA CON UN F'c=200 KG/CM2, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTAS.	ML	34.20	\$ 460.02	\$ 15,732.68	34.20	0.00	17.80	34.20	\$ 15,732.68
GP5033	FABRICACIÓN Y COLOCACIÓN DE CADENA DE CERRAMIENTO DE 15x20 cm, ARMADA CON ARMEX CON CONCRETO F'c=250 KG/CM2, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA	ML	33.50	\$ 470.77	\$ 15,770.80	28.45	0.00	0.00	28.45	\$ 13,393.41
GP505	MURO DE TABICON, DE 0 A 3MTS DE ALTURA INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M2	54.90	\$ 695.56	\$ 38,186.24	54.90	0.00	38.01	54.90	\$ 38,186.24
GP237	LOSA DE 10 CM DE ESPESOR CON CONCRETO F'c= DE 200 KG/CM HECHO EN OBRA, ARMADO CON VARILLA DE 3/8" @ 20 CMS EN AMBOS SENTIDOS, INCLUYE: CIMBRA, MANO DE OBRA, MATERIALES,EQUIPO Y HERRAMIENTAS.	M2	39.91	\$ 1,108.31	\$ 44,232.65	39.91	0.00	0.00	39.91	\$ 44,232.65
GP509	BARRA DE 60 CMS DE ANCHO Y DE 10 CMS DE ESPESOR ACABADO PULIDO REFORZADO CON MALLA LAC 6-6/10-10, CONCRETO HECHO EN OBRA CON F'c=200 KG/CM2 AGREGADO DE 3/4", INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	ML	3.65	\$ 671.88	\$ 2,452.35	3.65	0.00	0.00	3.65	\$ 2,452.36
GP510	APLANADO FINO CON MORTERO CEMENTO ARENA, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	M2	147.48	\$ 286.24	\$ 42,214.68	147.48	0.00	8.02	147.48	\$ 42,214.68
*TEMP1	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE VIGA IPR, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	1.00	\$ 8,635.08	\$ 8,635.08	1.00	0.00	0.00	1.00	\$ 8,635.08
4	AZOTEAS									
GP828	IMPERMEABILIZACION A BASE DE DOS CAPAS DE IMPERMEABILIZANTE ACRILICO ELASTOMERICO 7 AÑOS MOD. SETTIMO MCA, IMPAC O SIMILAR CON MALLA DE REFUERZO, INCLUYE: LIMPIEZA DE LA SUPERFICIE, SELLADO Y RESANE DE GRIETAS A BASE DE CEMENTO PLASTICO, FIBRA DE REFUERZO Y DOS CAPAS DE IMPERMEABILIZANTE.	M2	37.33	\$ 156.96	\$ 5,859.32	0.00	0.00	0.00	0.00	\$ -
GP829	PRETEL DE 40 CMS A BASE DE BLOCK 20x20x40 CMS, APARENTE ASENTADO CON MEZCLA MORTERO-ARENA 1:3 INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA DE 0.00 A 3.00 MTS. DE ALTURA.	ML	26.30	\$ 406.96	\$ 10,703.05	26.30	0.00	0.30	26.30	\$ 10,703.05
GP830	CHAFLÁN CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3 EN AZOTEA DE SECCIÓN 15 X 15 CM, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	ML	26.30	\$ 171.34	\$ 4,506.24	26.30	0.00	5.30	26.30	\$ 4,506.24
5	PUERTAS Y VENTANAS									
GP252	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PUERTA LAMINADA DE 0.90 MTS X 2.10 MTS, INCLUYE: MARCO, CHAPA, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	2.00	\$ 4,952.93	\$ 9,905.86	0.00	0.00	0.00	0.00	\$ -
GP225	SUMINISTRO Y COLOCACION DE VENTANA DE ALUMINIO DE 2" NATURAL Y CRISTAL DE 6MM, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, INSTALACIÓN HERRAMIENTA Y EQUIPO.	M2	2.20	\$ 2,742.31	\$ 6,033.08	0.00	0.00	0.00	0.00	\$ -

ELABORO

C. MANUEL URIARTE BELTRAN
REPRESENTANTE LEGALING. JOSE RODOLFO CONTRERAS LÓPEZ
COSTOS Y PRESUPUESTOSAUTORIZO
ING. RUBIEL RINCON RAMOS
DIRECTOR DE O.P.D.U.Y.E.



DESGLOSE

FECHA: 15/01/2025

CONTRATISTA: MANUEL URIARTE BELTRAN.

DEPENDENCIA:

AYUNTAMIENTO DE BADIRAGUATO

DOMICILIO: Calle Andro 4993, Fraccionamiento Villas del Cedro Entre Boulevard Bologna y Circuito Salerno C.P.80058

R.F.C.:

UIBM811007HY3

DESGLOSE DE CONCEPTOS DE ESTIMACION

DESCRIPCION: CONSTRUCCION DE BAÑOS PUBLICOS UBICADOS A UN COSTADO DE TECHUMBRE EN LA COMUNIDAD DE CIENEGA DE LOS LARA, SINDICATURA DE CIENEGA DE LOS LARA, EN EL MUNICIPIO DE BADIRAGUATO, SINALOA.

IMPORTE DE OBRA SIN IVA: \$481,423.13 IMPORTE DE ANTICIPO DE OBRA: \$195,457.79 IMPORTE TOTAL DE CONTRATO: \$558,450.83

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	SEGUN PROYECTO			VOLUMEN TOTAL ESTIMADO	HASTA ESTIM ANTERIOR	EXCEDENTE	DE ESTA ESTIMACION	IMPORTE
			CANT	P.U.	TOTAL					
6	ACABADOS									
GP357	APLICACION DE REDIMIX EN PLAFON, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	M2	29.09	\$ 83.19	\$ 2,420.00	29.09	0.00	5.12	29.09	\$ 2,420.00
GP155	PINTURA VINILICA EN MUROS Y PLAFONES, MARCA BEREL (BERELINTE) O SIMILAR, INCLUYE: PREPARACION DE LA SUPERFICIE, APLICACION DE SELLADOR, DOS MANOS DE PINTURA, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	M2	63.90	\$ 82.39	\$ 5,264.72	0.00	0.00	0.00	0.00	\$ -
GPB10	SUMINISTRO Y COLOCACION DE JUNQUILLO DE ALUMINIO EN MURO INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, RECORTES, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO	ML	7.00	\$ 256.01	\$ 1,792.07	0.00	0.00	0.00	0.00	\$ -
GPB20	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MAMPARAS PARA BAÑOS DE CANCELERIA INCLUYE: CHAPA, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	3.00	\$ 8,987.64	\$ 26,962.92	0.00	0.00	0.00	0.00	\$ -
GPB21	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MAMPARAS PARA MINGITORIOS DE BAÑOS DE CANCELERIA INCLUYE: CHAPA, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	2.00	\$ 3,377.29	\$ 8,754.58	0.00	0.00	0.00	0.00	\$ -
GPB01	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PISO RAINFOREST GRAY DE 20X60 CMS ASENTADO CON ADHESIVO PARA PISO PORCELANICO CON EMBOQUILLADOR INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, RECORTES, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	33.29	\$ 722.29	\$ 24,045.03	0.00	0.00	0.00	0.00	\$ -
GPB02	SUMINISTRO Y COLOCACION DE AZULEJO LUCENTIA NERO SUPREMO DE 40X60 CMS ASENTADO CON ADHESIVO PARA PISO PORCELANICO CON EMBOQUILLADOR INCLUYE:	M2	22.80	\$ 682.57	\$ 15,562.60	0.00	0.00	0.00	0.00	\$ -
GPB03	SUMINISTRO Y COLOCACION DE AZULEJO LUCENTIA CALACATTA SUPREMO DE 40X60 CMS ASENTADO CON ADHESIVO PARA PISO PORCELANICO CON EMBOQUILLADOR	M2	63.68	\$ 682.57	\$ 43,466.06	0.00	0.00	0.00	0.00	\$ -
GPB04	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PLAFON ARREBOL NOCE SUPREMO DE 20X80 CMS ASENTADO CON ADHESIVO PARA PISO PORCELANICO CON EMBOQUILLADOR INCLUYE:	M2	5.08	\$ 669.31	\$ 4,069.40	0.00	0.00	0.00	0.00	\$ -
GPB25	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ESPEJO DE 1.5X0.80 CMS INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	2.00	\$ 5,675.06	\$ 11,350.12	0.00	0.00	0.00	0.00	\$ -
7	INSTALACIONES HIDROSANITARIAS									
GP238	SALIDA SANITARIA PARA WC CON TUBERIA DE 4" SANITARIA HASTA REGISTRO SANITARIO, INCLUYE: CODOS, COPLES, MATERIALES, MANO DE OBRA, INSTALACION	SAL	3.00	\$ 660.16	\$ 1,980.48	3.00	0.00	0.00	3.00	\$ 1,980.48
GP240	SALIDA SANITARIA PARA LAVABO CON TUBERIA DE 2" SANITARIA HASTA REGISTRO SANITARIO, INCLUYE: CODOS, COPLES, MATERIALES, MANO DE OBRA, INSTALACION	SAL	4.00	\$ 623.53	\$ 2,494.12	4.00	0.00	0.00	4.00	\$ 2,494.12
GP241	TUBO VENTIL CON TUBERIA DE 2" SANITARIA, INCLUYE: CODOS, COPLES, MATERIALES, MANO DE OBRA, INSTALACION HERRAMIENTA Y EQUIPO.	SAL	3.00	\$ 319.91	\$ 959.73	3.00	0.00	0.00	3.00	\$ 959.73
GP245	ALIMENTACION HIDRAULICA PARA MUEBLE SANITARIO CON TUBERIA DE CPVC AZUL DE 1/2" DESDE RAMALES, INCLUYE: TUBERIA, COPLES, CODOS, ADAPTADOR MACHO CON INSERTO DE METAL, LLAVE DE CONTROL, MATERIALES, MANO DE OBRA, INSTALACION HERRAMIENTA Y EQUIPO.	SAL	9.00	\$ 585.88	\$ 5,272.92	9.00	0.00	0.00	9.00	\$ 5,272.92
GP248	SUMINISTRO Y COLOCACION DE WC, INCLUYE: WC, MANGUERA, ASIENTO, CUELLO DE CERA, MATERIALES, MANO DE OBRA, INSTALACION, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	3.00	\$ 2,631.03	\$ 7,893.09	0.00	0.00	0.00	0.00	\$ -
GP249	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LAVABO DE EMPOTRAR, INCLUYE: LAVABO, MANGUERA, MEZCLADORA DE 4", CESPOL, CONTRA DE PUSH, MATERIALES, MANO DE OBRA, INSTALACION, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	4.00	\$ 2,922.04	\$ 11,688.16	0.00	0.00	0.00	0.00	\$ -
GPB35	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MINGITORIO INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, INSTALACION, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	2.00	\$ 4,733.73	\$ 9,467.46	0.00	0.00	0.00	0.00	\$ -
GP250	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ROTOPLAS DE 1100 LTS, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	1.00	\$ 5,193.47	\$ 5,193.47	0.00	0.00	0.00	0.00	\$ -
8	INSTALACIONES ELECTRICAS									
GPBEL01	SALIDA PARA DE ALUMBRADO CON POLIFLEX DE 1/2", CABLE CAL.12, INCLUYE: ROSETA Y FOCO, MATERIALES, CABLEADO, DESPERDICIOS, PRUEBAS, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU	SAL	12.00	\$ 988.50	\$ 11,862.00	12.00	0.00	0.00	12.00	\$ 11,862.00
GPB88	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LAMPARAS DE SOBREPONER EN PLAFON, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	12.00	\$ 508.59	\$ 6,103.08	0.00	0.00	0.00	0.00	\$ -
GP340	SALIDA PARA APAGADOR CON POLIFLEX DE 1/2", CABLE CAL.12, INCLUYE: MATERIALES, CABLEADO, DESPERDICIOS, PRUEBAS, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO	SAL	3.00	\$ 947.85	\$ 2,843.85	3.00	0.00	0.00	3.00	\$ 2,843.85
GP225	SALIDA ELECTRICA PARA CONTACTO A BASE DE POLIDUCTO DE 13 MM., CON UN DESARROLLO DE 10 M, CON CABLE THW CAL. 12 Y 14 DESNUDO, LINEA ECONOMICA, CON	SAL	4.00	\$ 1,078.18	\$ 4,312.72	4.00	0.00	0.00	4.00	\$ 4,312.72
GP178	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CENTRO DE CARGA Q8, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	1.00	\$ 1,795.17	\$ 1,795.17	1.00	0.00	0.00	1.00	\$ 1,795.17
GP180	SUMINISTRO Y COLOCACION DE INTERRUPTOR DE 1X20 SQUARD, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	1.00	\$ 475.73	\$ 475.73	1.00	0.00	0.00	1.00	\$ 475.73
SUB-TOTAL										\$ 277,634.72
IVA										\$ 44,421.56
MONTO TOTAL										\$ 322,056.28

ELABORO

C. MANUEL URIARTE BELTRAN
REPRESENTANTE LEGAL

REVISO

ING. JOSE RODOLFO CONTRERAS LOPEZ
COSTOS Y PRESUPUESTOS

AUTORIZO

ING. RUBEN ANTON RAMOS
DIRECTOR DE O. P. D. U. Y. E.

									
CONTRATISTA:					FECHA: miércoles, 15 de enero de 2025				
MANUEL URIARTE BELTRAN.					DEPENDENCIA: DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA, AYUNTAMIENTO DE BADIRAGUATO.				
CONTRATISTA:					MANUEL URIARTE BELTRAN.				
R.F.C.					UIBM811007HY3				
OBRA:					CONSTRUCCIÓN DE BAÑOS PÚBLICOS UBICADOS A UN COSTADO DE TECHUMBRE EN LA COMUNIDAD DE CIÉNEGA DE LOS LARA, SINDICATURA DE CIÉNEGA DE LOS LARA, EN EL MUNICIPIO DE BADIRAGUATO, SINALOA.				
ESTIMACION					01 NORMAL				
GENERADORES DE ESTIMACION									
CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANT	LARGO	ANCHO	ESPESOR	ACUMULADO		OBSERVACIONES
							PARCIAL	TOTAL	
101	PRELIMINARES								
GP001	TRAZO Y NIVELACIÓN DEL TERRENO ESTABLECIENDO EJES Y NIVELITAS DE REFERENCIA. INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M2		FRENTE	LATERAL	TOTAL		37.33	VER EN CROQUIS
				6.85	5.45	37.33		37.33	TOTAL
2	CIMENTACION								
GP2403	EXCAVACIÓN POR MEDIOS MANUALES DE 0 A -2.00 M. EN MATERIAL TIPO B, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA	M3		FRENTE	LATERAL	ESPESOR	TOTAL	65.82	TOTAL
				7.85	6.45	1.30	65.82	56.49	ADICIONAL
							9.33	EST. ESTIMACION	
GP26	RELLENO COMPACTADO AL 95% CON BALARINA EN CAPAS DE 20 CMS DE ESPESOR CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN, INCLUYE: AGUA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU TERMINACIÓN.	M3		FRENTE	LATERAL	ESPESOR	TOTAL	65.82	TOTAL
				7.85	6.45	1.30	65.82	56.49	ADICIONAL
							9.33	EST. ESTIMACION	
GP033	AFINE DE FONDOS Y TALUDES DE LAS EXCAVACIONES HECHAS INCLUYE: MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M2		FRENTE	LATERAL		TOTAL	37.33	TOTAL
				6.85	5.45		37.33	31.18	ADICIONAL
							6.15	EST. ESTIMACION	
GP64	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE HULE NEGRO CALIBRE 600. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA TERMINACIÓN	M2		FRENTE	LATERAL	TOTAL		37.33	TOTAL
				50.00	0.75	37.33		-	ADICIONAL
							37.33	EST. ESTIMACION	
GP64	LOSA DE CIMENTACIÓN DE 10 CM DE ESPESOR CON CONCRETO F'c= DE 200 KG/CM HECHO EN OBRA, ARMADO CON VARILLA DE 3/8" @ 30 CMS EN AMBOS SENTIDOS. INCLUYE: CIMENTA, MANO DE OBRA, MATERIALES, EQUIPO Y HERRAMIENTAS.	M2		FRENTE	LATERAL	TOTAL		37.33	VER EN CROQUIS
				6.85	5.45	-	37.33	37.33	TOTAL

ELABORÓ

ARQ. MANUEL URIARTE BELTRAN
REPRESENTANTE LEGAL

SUPERVISOR

ARQ. BRICEIDA GUADALUPE NIEBLAS MARTINEZ
SUPERVISOR

AUTORIZO

ING. RUBEN RINCÓN RAMOS
DIRECTOR DE OPUDE

										
CONTRATISTA:					FECHA: miércoles, 15 de enero de 2025					
MANUEL URIARTE BELTRAN.					DEPENDENCIA: DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA, AYUNTAMIENTO DE BADIRAGUATO.					
CONTRATISTA:					MANUEL URIARTE BELTRAN.					
R.F.C.					UIBM811087HY3					
OBRA:					CONSTRUCCIÓN DE BAÑOS PÚBLICOS UBICADOS A UN COSTADO DE TECHUMBRE EN LA COMUNIDAD DE CIÉNEGA DE LOS LARA, SINDICATURA DE CIÉNEGA DE LOS LARA, EN EL MUNICIPIO DE BADIRAGUATO, SINALOA.					
ESTIMACION					01 NORMAL					
GENERADORES DE ESTIMACION										
3	ALBAÑILERIA									
GP336	CASTILLO Y/O DALA DE 15X20 CM ARMADO CON ARMEX Y REFORZADO CON 2 VARILLAS DE 3/8", ACABADO APARENTE, CONCRETO HECHO EN OBRA CON UN F' C=200 KG/CM2. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTAS.	ML	ALTURA	PZS	TOTAL		52.00	TOTAL		
			4.00	13.00	52.00		17.80	ADICIONAL		
								34.20	EST. ESTIMACION	
GP5033	FABRICACIÓN Y COLOCACIÓN DE CADENA DE CERRAMIENTO DE 15x20 cm, ARMADA CON ARMEX CON CONCRETO F' C=250 KG/CM2. INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA	ML	INTERMEDIOS	FRENTE	LATERALES	POSTERIOR	TOTAL	28.45	VER EN CROQUIS	
			3.85	6.85	10.90	6.85	28.45	28.45	TOTAL	
GP505	MURO DE TABICON, DE 0 A 3MTS DE ALTURA INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M2	BASE TINACO	FRENTE	LATERALES	POSTERIOR	MURO DIVISORIOS		VER EN CROQUIS	
			9.66	11.20	21.80	27.4	23.85	93.91	TOTAL	
								TOTAL	39.01	ADICIONAL
								93.91	54.90	ESTA ESTIMACION
GP237	LOSA DE 10 CM DE ESPESOR CON CONCRETO F' C= DE 200 KG/CM HECHO EN OBRA, ARMADO CON VARILLA DE 3/8" @ 20 CMS EN AMBOS SENTIDOS. INCLUYE: CIMBRA, MANO DE OBRA, MATERIALES, EQUIPO Y HERRAMIENTAS.	M2	FRENTE	LATERAL	M2 DE AREA DE ACCESO	TOTAL	39.91	VER EN CROQUIS		
			8.85	5.45	2.58	39.91	39.91	TOTAL		
GP509	BARRA DE 60 CMS DE ANCHO Y DE 10 CMS DE ESPESOR ACABADO PULIDO REFORZADO CON MALLA LAC 8-8/10-10, CONCRETO HECHO EN OBRA CON F' C=200 KG/CM2 AGREGADO DE 3/4". INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	ML	BAÑOS H	BAÑOS M		TOTAL	3.65	VER EN CROQUIS		
			2.05	1.60		3.65	3.65	TOTAL		
GP510	APLANADO FINO CON MORTERO CEMENTO ARENA. INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	M2	TINACOS	FACHADA PRINCIPAL	FACHADA POSTERIOR	LATERALES	PRETIL PARTE INTERIOR	155.50	TOTAL	
			22.71	11.20	27.4	43.6	13.26	8.02	ADICIONAL	
			PLAFON					37.33	TOTAL	155.50
*TEMP1	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE VIGA IPR. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	EN FACHADA PRINCIPAL				1.00	VER EN CROQUIS		
			1.00				1.00	TOTAL		

ELABORO

ARQ. MANUEL URIARTE BELTRAN
REPRESENTANTE LEGAL

SUPERVISOR

ARQ. BRICEIDA GUADALUPE NIEBLAS MARTINEZ
SUPERVISOR

AUTORIZO

ING. RUBEN RINCÓN RAMOS
DIRECTOR DE OPUVE

									
CONTRATISTA: MANUEL URIARTE BELTRAN.					FECHA: miércoles, 15 de enero de 2025 DEPENDENCIA: DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA, AYUNTAMIENTO DE BADIRAGUATO.				
CONTRATISTA: MANUEL URIARTE BELTRAN.									
R.F.C.: UIBM611087HY3									
OBRA: CONSTRUCCIÓN DE BAÑOS PÚBLICOS UBICADOS A UN COSTADO DE TECHUMBRE EN LA COMUNIDAD DE CIÉNEGA DE LOS LARA, SINDICATURA DE CIÉNEGA DE LOS LARA, EN EL MUNICIPIO DE BADIRAGUATO, SINALOA.									
ESTIMACION: 01 NORMAL									
GENERADORES DE ESTIMACION									
4 AZOTEAS									
GP829	PRETEL DE 40 CMS A BASE DE BLOCK 20x20x40 CMS, APARENTE ASENTADO CON MEZCLA MORTERO-ARENA 1:3 INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA DE 0.00 A 3.00 MTS. DE ALTURA.	ML	TINACOS	FRENTE Y POSTERIOR	LATERALES	LATERALES CHICOS	TOTAL	26.80	TOTAL
								0.30	ADICIONAL
			13.70	10.90	2.00	26.60	26.30	EST. ESTIMACION	
ML	CHAFALÁN CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3 EN AZOTEA DE SECCIÓN 15 X 15 CM. INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	ML	TINACOS	FRENTE Y POSTERIOR	LATERALES	LATERALES CHICOS	TOTAL	31.60	TOTAL
								5.30	ADICIONAL
			5.00	13.70	10.90	2.00	31.60	26.30	EST. ESTIMACION
6 ACABADOS									
GP357	APLICACIÓN DE REDIMIX EN PLAFON. INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	M2		FRENTE	LATERAL	AREA PLAFON	AREA DE BOLDADO	34.21	TOTAL
				5.99	5.28	31.63	2.58	5.12	ADICIONAL
						TOTAL	34.21	29.09	EST. ESTIMACION
7 INSTALACIONES HIDROSANITARIAS									
GP238	SALIDA SANITARIA PARA WC CON TUBERÍA DE 4" SANITARIA HASTA REGISTRO SANITARIO. INCLUYE: CODOS, COPLES, MATERIALES, MANO DE OBRA, INSTALACIÓN HERRAMIENTA Y EQUIPO.	SAL		BAÑOS H	BAÑOS M	TOTAL		3.00	VER EN CROQUIS
				1.00	2.00	3.00		3.00	TOTAL
GP240	SALIDA SANITARIA PARA LAVABO CON TUBERÍA DE 2" SANITARIA HASTA REGISTRO SANITARIO. INCLUYE: CODOS, COPLES, MATERIALES, MANO DE OBRA, INSTALACIÓN HERRAMIENTA Y EQUIPO.	SAL		BAÑOS H	BAÑOS M	TOTAL		4.00	VER EN CROQUIS
				2.00	2.00	4.00		4.00	TOTAL
GP241	TUBO VENTILA CON TUBERÍA DE 2" SANITARIA. INCLUYE: CODOS, COPLES, MATERIALES, MANO DE OBRA, INSTALACIÓN HERRAMIENTA Y EQUIPO.	SAL		BAÑOS H	BAÑOS M	TOTAL		3.00	VER EN CROQUIS
				1.00	2.00	3.00		3.00	TOTAL
GP246	ALIMENTACIÓN HIDRÁULICA PARA MUEBLE SANITARIO CON TUBERÍA DE CPVC AZUL DE 1/2" DESDE RAMALES. INCLUYE: TUBERÍA, COPLES, CODOS, ADAPTADOR MACHO CON INSERTO DE METAL, LLAVE DE CONTROL. MATERIALES, MANO DE OBRA, INSTALACIÓN HERRAMIENTA Y EQUIPO.	SAL		BAÑOS H	BAÑOS M	TOTAL		9.00	VER EN CROQUIS
				5.00	4.00	9.00		9.00	TOTAL

ELABORO

ARQ. MANUEL URIARTE BELTRAN
REPRESENTANTE LEGAL

SUPERVISOR

ARQ. BRICEIDA GUADALUPE NIEBLAS MARTINEZ
SUPERVISOR

AUTORIZO

ING. RUBEL RINCÓN RAMOS
DIRECTOR DE OPDUVE

									
CONTRATISTA:					FECHA: miércoles, 15 de enero de 2025				
MANUEL URIARTE BELTRAN.					DEPENDENCIA: DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA, AYUNTAMIENTO DE BADIRAGUATO.				
CONTRATISTA:					MANUEL URIARTE BELTRAN.				
R.F.C.					UIBM811007HY3				
OBRA:					CONSTRUCCIÓN DE BAÑOS PÚBLICOS UBICADOS A UN COSTADO DE TECHUMBRE EN LA COMUNIDAD DE CIÉNEGA DE LOS LARA, SINDICATURA DE CIÉNEGA DE LOS LARA, EN EL MUNICIPIO DE BADIRAGUATO, SINALOA.				
ESTIMACIÓN					01 NORMAL				
GENERADORES DE ESTIMACION									
8	INSTALACIONES ELÉCTRICAS								
GPBEL01	SALIDA PARA DE ALUMBRADO CON POLIFLEX DE 1/2", CABLE CAL.12, INCLUYE: ROSETA Y FOCO, MATERIALES, CABLEADO, DESPERDICIOS, PRUEBAS, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN Y FUNCIONAMIENTO.	SAL		BAÑOS H	BAÑOS M	TOTAL		12.00	VER EN CROQUIS
				6.00	6.00	12.00		12.00	TOTAL
GP340	SALIDA PARA APAGADOR CON POLIFLEX DE 1/2", CABLE CAL.12, INCLUYE: MATERIALES, CABLEADO, DESPERDICIOS, PRUEBAS, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN Y FUNCIONAMIENTO.	PZA		BAÑOS H	BAÑOS M	ACCESO	TOTAL	3.00	VER EN CROQUIS
				1.00	1.00	1.00	3.00	3.00	TOTAL
GP226	SALIDA ELÉCTRICA PARA CONTACTO A BASE DE POLIDUCTO DE 13 MM., CON UN DESARROLLO DE 10 M., CON CABLE THW CAL. 12 Y 14 DESNUDO, LÍNEA ECONÓMICA, CON UNA CAJA CUADRADA GALVANIZADA DE 13 Y UNA CAJA CHALUPA GALVANIZADA, INCLUYE: UN CODQ, CONTACTO Y PLACA.	SAL				TOTAL		4.00	VER EN CROQUIS
						4.00		4.00	TOTAL
GP178	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CENTRO DE CARGA Q8, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA				TOTAL		1.00	VER EN CROQUIS
						1.00		1.00	TOTAL
GP180	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE INTERRUPTOR DE 1X20 SQUARD, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA				TOTAL		1.00	VER EN CROQUIS
						1.00		1.00	TOTAL

ELABORO

ARQ. MANUEL URIARTE BELTRAN
REPRESENTANTE LEGAL

SUPERVISOR

ARQ. BRICEIDA GUADALUPE NIEBLAS MARTINEZ
SUPERVISOR

AUTORIZO

ING. RUBÉN RAMÓN RAMOS
DIRECTOR DE OPUYE



CONTRATISTA:

FECHA:

miércoles, 15 de enero de 2025

DEPENDENCIA:

MANUEL URIARTE BELTRAN.

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA,
AYUNTAMIENTO DE BADIRAGUATO.

DOMICILIO:

Calle Andrio 4993, Fraccionamiento Villas del Cedro Entre Boulevard Bologna y Circuito
Salerno C.P.80058

R.F.C.


UIBM811007HY3

OBRA:

CONSTRUCCIÓN DE BAÑOS PÚBLICOS UBICADOS A UN COSTADO DE TECHUMBRE EN LA COMUNIDAD DE CIÉNEGA DE LOS LARA,
SINDICATURA DE CIÉNEGA DE LOS LARA, EN EL MUNICIPIO DE BADIRAGUATO, SINALOA.

CROQUIS ESTIMACION:

CLAVE	CONCEPTO
PRELIMINARES	
GP001	TRAZO Y NIVELACIÓN DEL TERRENO ESTABLECIENDO EJES Y NIVELETAS DE REFERENCIA, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.
2	CIMENTACION
GP2403	EXCAVACIÓN POR MEDIOS MANUALES DE 0 A -2.00 M, EN MATERIAL TIPO B, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA
GP26	RELLENO COMPACTADO AL 95% CON BAILARINA EN CAPAS DE 20 CMS DE ESPESOR CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN, INCLUYE: AGUA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU TERMINACIÓN.
GP033	AFINE DE FONDOS Y TALUDES DE LAS EXCAVACIONES HECHAS INCLUYE: MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.
GP64	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE HULE NEGRO CALIBRE 600, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO
GP644	LOSA DE CIMENTACIÓN DE 10 CM DE ESPESOR CON CONCRETO F'c= DE 200 KG/CM HECHO EN OBRA, ARMADO CON VARILLA DE 3/8" @ 30 CMS EN

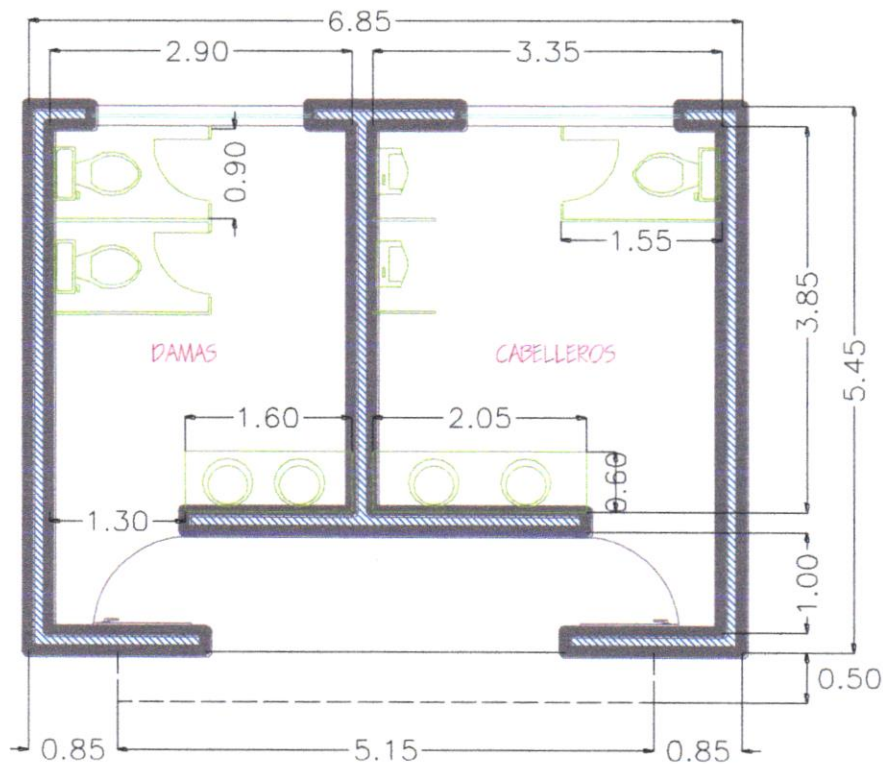

PLANTA ARQUITECTÓNICA

ELABORÓ:

C. MANUEL URIARTE BELTRAN
REPRESENTANTE LEGAL

REVISÓ:


ARQ. BRICEIDA GUADALUPE NIEBLAS MARTINEZ
SUPERVISOR

AUTORIZÓ:

ING. RUBIEL RINCON RAMOS
DIRECTOR O. P. D. U. Y. E.

	
FECHA: miércoles, 15 de enero de 2025	
CONTRATISTA:	DEPENDENCIA:
MANUEL URIARTE BELTRAN.	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA, AYUNTAMIENTO DE BADIRAGUATO.
DOMICILIO:	Calle Andrio 4993, Fraccionamiento Villas del Cedro Entre Boulevard Bolognia y Circuito Salerno C.P.80058
R.F.C.	UIBM811007HY3
OBRA:	CONSTRUCCIÓN DE BAÑOS PÚBLICOS UBICADOS A UN COSTADO DE TECHUMBRE EN LA COMUNIDAD DE CIÉNEGA DE LOS LARA, SINDICATURA DE CIÉNEGA DE LOS LARA, EN EL MUNICIPIO DE BADIRAGUATO, SINALOA.
CROQUIS ESTIMACION:	

3	ALBAÑILERIA
GP336	CASTILLO Y/O DALA DE 15X20 CM ARMADO CON ARMEX Y REFORZADO CON 2 VARILLAS DE 3/8", ACABADO APARENTE, CONCRETO HECHO EN OBRA CON
GP5033	FABRICACIÓN Y COLOCACIÓN DE CADENA DE CERRAMIENTO DE 15x20 cm, ARMADA CON ARMEX CON CONCRETO F'C=250 KG/CM2, INCLUYE: MATERIA
GP505	MUO DE TABICON DE 9 A 3MTS DE ALTURA INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.
GP237	LOSA DE 10 CM DE ESPESOR CON CONCRETO F'C= DE 200 KG/CM HECHO EN OBRA, ARMADO CON VARILLA DE 3/8" @ 20 CMS EN AMBOS SENTIDOS, IN
GP509	BARRA DE 60 CMS DE ANCHO Y DE 10 CMS DE ESPESOR ACABADO PULIDO REFORZADO CON MALLA LAC 6-6/10-10, CONCRETO HECHO EN OBRA CON F
GP510	APLANADO FINO CON MORTERO CEMENTO ARENA, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.
*TEMP1	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE VIGA IPR, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.

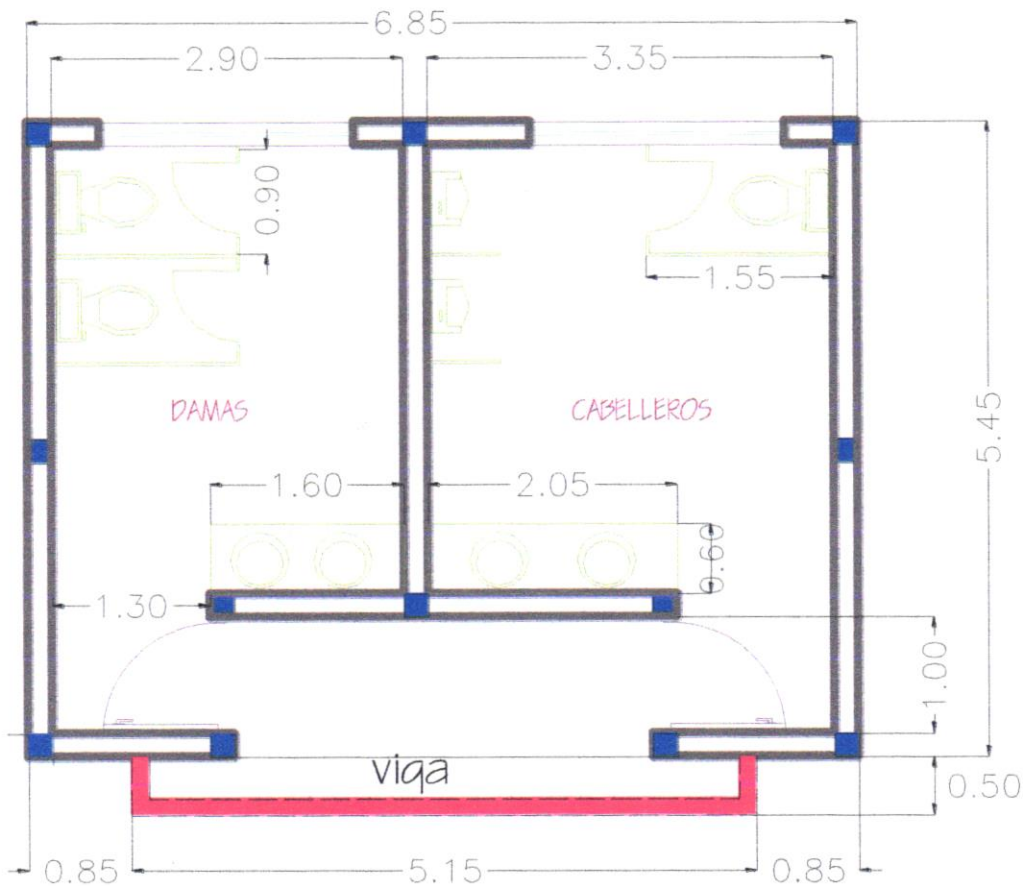

ELABORADO:-

C. MANUEL URIARTE BELTRAN
REPRESENTANTE LEGAL

REVISADO:-


ARQ. BRICEIDA GUADALUPE NIEBLAS MARTINEZ
SUPERVISOR

AUTORIZADO:-

ING. RUBEN RINCON RAMOS
DIRECTOR O. P. D. U. Y. E.

	
CONTRATISTA: MANUEL URIARTE BELTRAN.	
DEPENDENCIA: DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA, AYUNTAMIENTO DE BADIRAGUATO.	
FECHA: miércoles, 15 de enero de 2025	
DOMICILIO: Calle Andrio 4993, Fraccionamiento Villas del Cedro Entre Boulevard Bologna y Circuito	R.F.C.: UIBM811007HY3
OBRA: CONSTRUCCIÓN DE BAÑOS PÚBLICOS UBICADOS A UN COSTADO DE TECHUMBRE EN LA COMUNIDAD DE CIÉNEGA DE LOS LARA, SINDICATURA DE CIÉNEGA DE LOS LARA, EN EL MUNICIPIO DE BADIRAGUATO, SINALOA.	
CROQUIS ESTIMACION:	

4	AZÓTEAS
GP829	PRETEL DE 40 CMS A BASE DE BLOCK 20x20x40 CMS, APARENTE ASENTADO CON MEZCLA MORTERO-ARENA 1:3 INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA
GP830	CHAFLAN CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3 EN AZÓTEA DE SECCIÓN 15 X 15 CM. INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.
6	ACABADOS
GP357	APLICACIÓN DE REDIMIX EN PLAFÓN, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.

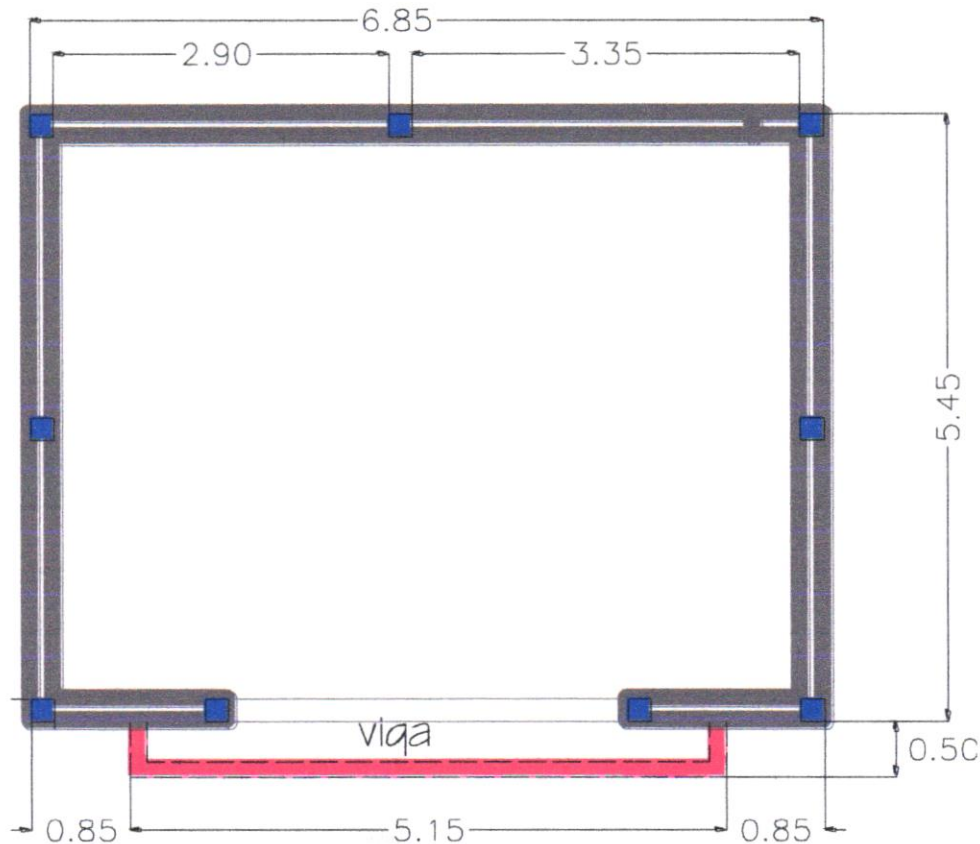

ELABORO.-

C. MANUEL URIARTE BELTRAN
REPRESENTANTE LEGAL

REVISÓ.-


ARQ. BRICEIDA GUADALUPE NIEBLAS MARTINEZ
SUPERVISOR

AUTORIZO.-

ING. RUBEL RINCON RAMOS
DIRECTOR O. P. D. U. Y E.

	
CONTRATISTA: MANUEL URIARTE BELTRAN.	
DEPENDENCIA: DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA, AYUNTAMIENTO DE BADIRAGUATO.	
DOMICILIO: Calle Andrio 4993, Fraccionamiento Villas del Cedro Entre Boulevard Bologna y Circuito Salerno C.P.80058	
R.F.C. OBRA:	CONSTRUCCIÓN DE BAÑOS PÚBLICOS UBICADOS A UN COSTADO DE TECHUMBRE EN LA COMUNIDAD DE CIÉNEGA DE LOS LARA, SINDICATURA DE CIÉNEGA DE LOS LARA, EN EL MUNICIPIO DE BADIRAGUATO, SINALOA.
CROQUIS ESTIMACION:	

7	INSTALACIONES HIDROSANITARIAS
GP238	SALIDA SANITARIA PARA WC CON TUBERIA DE 4" SANITARIA HASTA REGISTRO SANITARIO, INCLUYE: CODOS, CÓPLES, MATERIALES, MANO DE OBRA, IN
GP240	SALIDA SANITARIA PARA LAVABO CON TUBERIA DE 2" SANITARIA HASTA REGISTRO SANITARIO, INCLUYE: CODOS, CÓPLES, MATERIALES, MANO DE OBR
GP241	TUBO VENTILA CON TUBERIA DE 2" SANITARIA, INCLUYE: CODOS, CÓPLES, MATERIALES, MANO DE OBRA, INSTALACION HERRAMIENTA Y EQUIPO.
GP246	ALIMENTACION HIDRAULICA PARA MUEBLE SANITARIO CON TUBERIA DE CPVC AZUL DE 1/2" DESDE RAMALES, INCLUYE: TUBERIA, CÓPLES, CODOS, AL

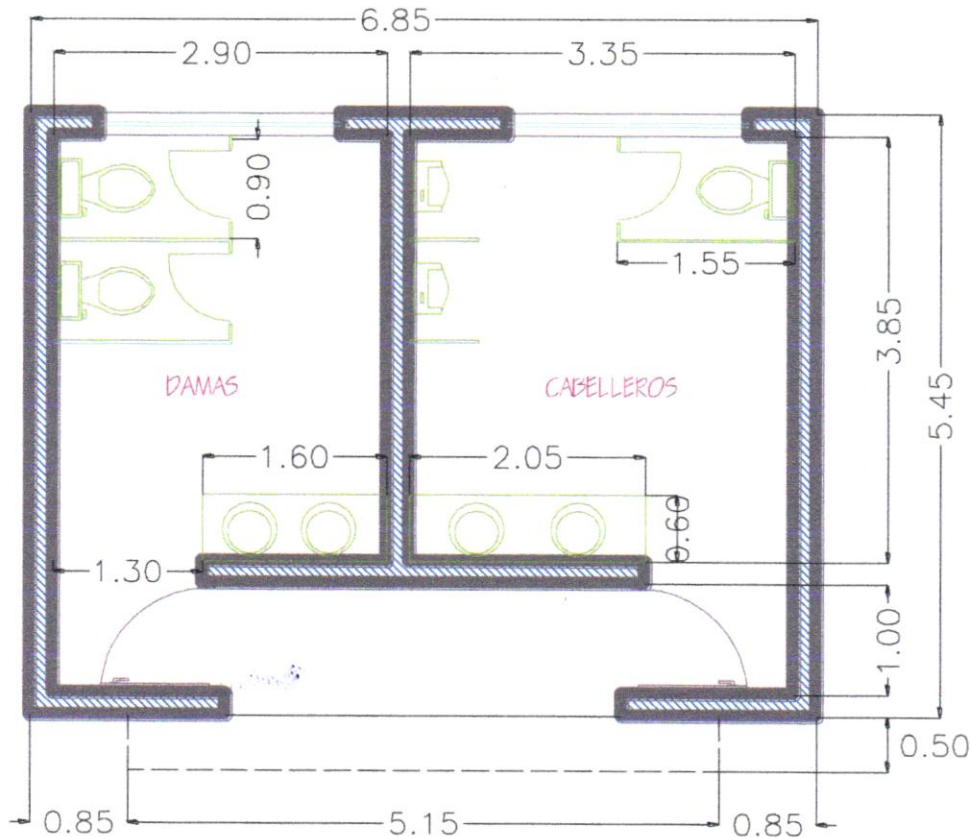

PLANTA ARQUITECTÓNICA

ELABORO.-

C. MANUEL URIARTE BELTRAN
REPRESENTANTE LEGAL

REVISOR.-


ARQ. BRICEIDA GUADALUPE NIEBLAS MARTINEZ
SUPERVISOR

AUTORIZO.-

ING. RUBEN RINCON RAMOS
DIRECTOR O. P., D. U. Y E.

	
CONTRATISTA: MANUEL URIARTE BELTRAN.	
DEPENDENCIA: DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA, AYUNTAMIENTO DE BADIRAGUATO.	
DOMICILIO: Calle Andrio 4993, Fraccionamiento Villas del Cedro Entre Boulevard Bologna y Circuito Salerno C.P.80058	
R.F.C. OBRA:	OBRA: CONSTRUCCIÓN DE BAÑOS PÚBLICOS UBICADOS A UN COSTADO DE TECHUMBRE EN LA COMUNIDAD DE CIÉNEGA DE LOS LARA, SINDICATURA DE CIÉNEGA DE LOS LARA, EN EL MUNICIPIO DE BADIRAGUATO, SINALOA.
CROQUIS ESTIMACION:	

8	INSTALACIONES ELÉCTRICAS
GPBEL01	SALIDA PARA DE ALUMBRADO CON POLIFLEX DE 1/2", CABLE CAL 12, INCLUYE: ROSETA Y FOCO, MATERIALES, CABLEADO, DESPERDICIOS, PRUEBAS,
GP340	SALIDA PARA APAGADOR CON POLIFLEX DE 1/2", CABLE CAL 12, INCLUYE: MATERIALES, CABLEADO, DESPERDICIOS, PRUEBAS, MANO DE OBRA, EQUIPO,
GP226	SALIDA ELÉCTRICA PARA CONTACTO A BASE DE POLIDUCTO DE 13 MM., CON UN DESARROLLO DE 10 M. CON CABLE THW CAL. 12 Y 14 DESNUDO, LINE
GP176	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CENTRO DE CARGA Q8, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.
GP180	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE INTERRUPTOR DE 1X20 SQUARD, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.

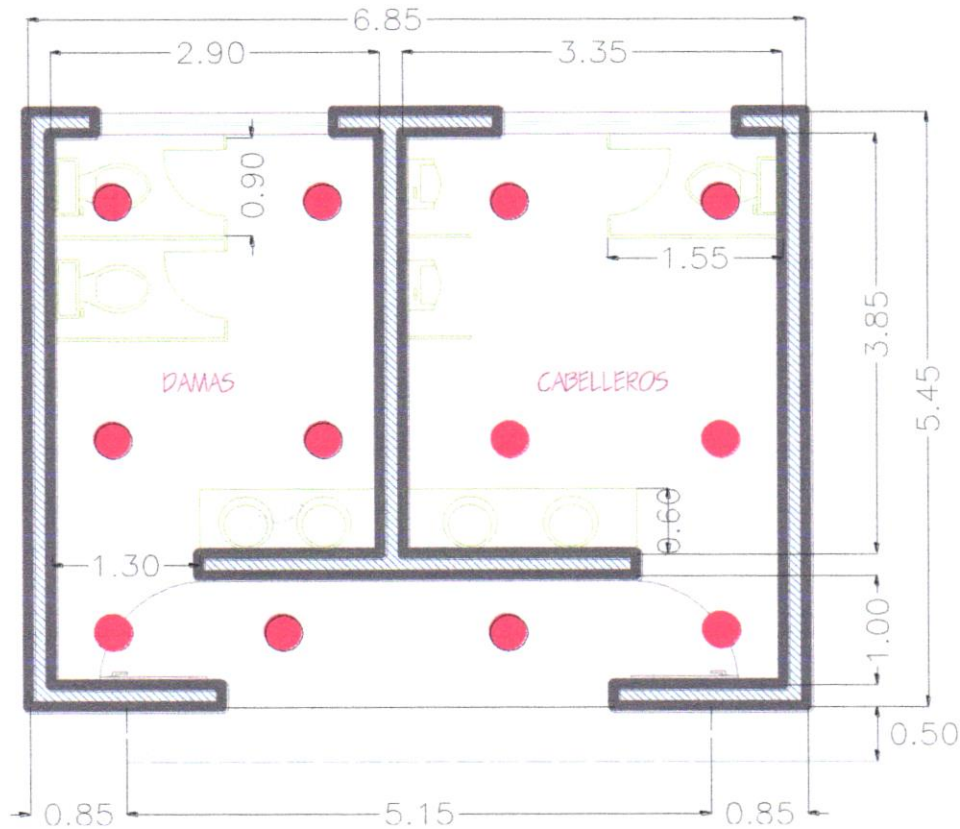

PLANTA ARQUITECTÓNICA

ELABORO.

C. MANUEL URIARTE BELTRAN
REPRESENTANTE LEGAL

REVISÓ.

ARQ. BRICEIDA GUADALUPE NIEBLAS MARTINEZ
SUPERVISOR

APROBÓ.

ING. RUBIEL RINCON RAMOS
DIRECTOR O. P. D. U. Y E.

MANUEL URIARTE BELTRAN.



OBRA:	CONSTRUCCIÓN DE BAÑOS PÚBLICOS UBICADOS A UN COSTADO DE TECHUMBRE EN LA COMUNIDAD DE CIÉNEGA DE LOS LARA, SINDICATURA DE CIÉNEGA DE LOS LARA, EN EL MUNICIPIO DE BADIRAGUATO, SINALOA.
ESTIMACIÓN:	01 NORMAL


REPORTE FOTOGRAFICO DE ESTIMACION

PRELIMINARES

TRAZO Y NIVELACIÓN DEL TERRENO ESTABLECIENDO EJES Y NIVELETAS DE REFERENCIA, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.

CIMENTACION

GP001	2
GP2403	EXCAVACIÓN POR MEDIOS MANUALES DE 0 A -2.00 M, EN MATERIAL TIPO B, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA
GP26	RELLENO COMPACTADO AL 95% CON BAILARINA EN CAPAS DE 20 CMS DE ESPESOR CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN, INCLUYE: AGUA, MANO DE OBRA,
GP033	AFINE DE FONDOS Y TALUDES DE LAS EXCAVACIONES HECHAS INCLUYE: MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.
GP64	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE HULE NEGRO CALIBRE 600, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU
GP644	LOSA DE CIMENTACIÓN DE 10 CM DE ESPESOR CON CONCRETO F' C= DE 200 KG/CM HECHO EN OBRA, ARMADO CON VARILLA DE 3/8" @ 30 CMS EN AMBOS

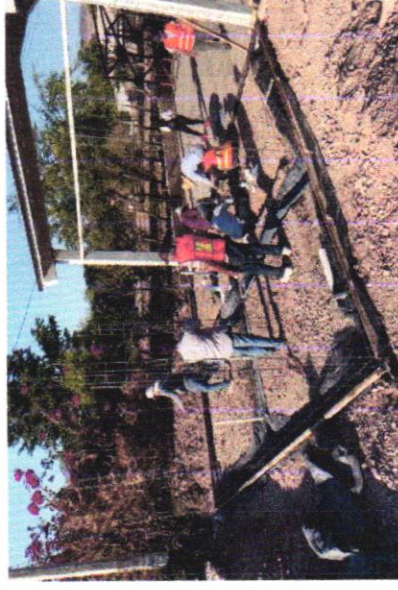

ELABORO.-


C. MANUEL URIARTE BELTRAN
REPRESENTANTE LEGAL

REVISO.-


ARQ. BRICEIDA GUADALUPE NIEBLAS MARTINEZ
SUPERVISOR

AUTORIZO.-




ING. RUBIEL RINCON RAMOS
DIRECTOR DE O.P.D.U. Y E.

MANUEL URIARTE BELTRAN.



OBRA:	CONSTRUCCIÓN DE BAÑOS PÚBLICOS UBICADOS A UN COSTADO DE TECHUMBRE EN LA COMUNIDAD DE CIÉNEGA DE LOS LARA, SINDICATURA DE CIÉNEGA DE LOS LARA, EN EL MUNICIPIO DE BADIRAGUATO, SINALOA.
ESTIMACION:	01 NORMAL

REPORTE FOTOGRAFICO DE ESTIMACION	
3	ALBAÑILERIA
GP336	CASTILLO Y/O DALA DE 15X20 CM ARMADO CON ARMEX Y REFORZADO CON 2 VARILLAS DE 3/8" , ACABADO APARENTE, CONCRETO HECHO EN OBRA CON UN F'C=200
GP5033	FABRICACIÓN Y COLOCACIÓN DE CADENA DE CERRAMIENTO DE 15x20 cm, ARMADA CON ARMEX CON CONCRETO F'C=250 KG/CM2, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE MURO DE TABICON, DE 0 A 3MTS DE ALTURA INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.
GP505	LOSA DE 10 CM DE ESPESOR CON CONCRETO F'C= DE 200 KG/CM HECHO EN OBRA, ARMADO CON VARILLA DE 3/8" @ 20 CMS EN AMBOS SENTIDOS, INCLUYE:
GP237	BARRA DE 60 CMS DE ANCHO Y DE 10 CMS DE ESPESOR ACABADO PULIDO REFORZADO CON MALLA LAC 6-6/10-10, CONCRETO HECHO EN OBRA CON F'C=200
GP509	APLANADO FINO CON MORTERO CEMENTO ARENA, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.
GP510	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE VIGA IPR, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.
*TEMP1	

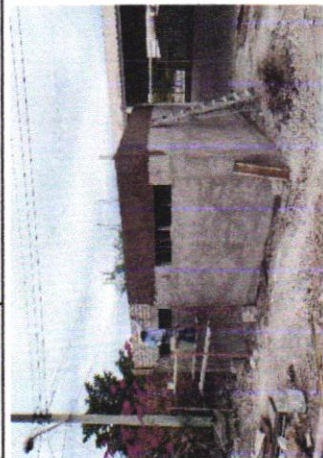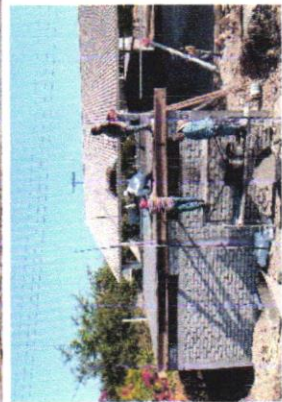

ELABORO.-

[Signature]

C. MANUEL URIARTE BELTRAN
REPRESENTANTE LEGAL

REVISO.-

[Signature]

ARQ.BRICEIDA GUADALUPE NIEBLAS MARTINEZ
SUPERVISOR

AUTORIZO.-

[Signature]

ING. RUBIEL RINCON RAMOS
DIRECTOR DE O.P.D.U. Y E.



MANUEL URIARTE BELTRAN.



OBRA:	CONSTRUCCIÓN DE BAÑOS PÚBLICOS UBICADOS A UN COSTADO DE TECHUMBRE EN LA COMUNIDAD DE CIÉNEGA DE LOS LARA, SINDICATURA DE CIÉNEGA DE LOS LARA, EN EL MUNICIPIO DE BADIRAGUATO, SINALOA.
ESTIMACION:	01 NORMAL

REPORTE FOTOGRAFICO DE ESTIMACION

AZOTEA	
4	
GP829	PRETIL DE 40 CMS A BASE DE BLOCK 20x20x40 CMS, APARENTE ASENTADO CON MEZCLA MORTERO-ARENA 1:3 INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y
GP830	CHAFLÁN CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3 EN AZOTEA DE SECCIÓN 15 X 15 CM. INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.
6	ACABADOS
GP357	APLICACIÓN DE REDIMIX EN PLAFON, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.

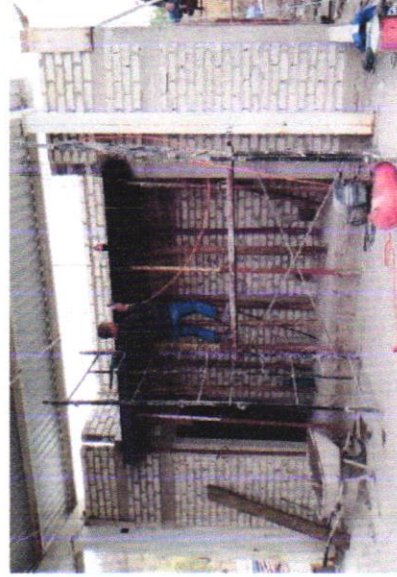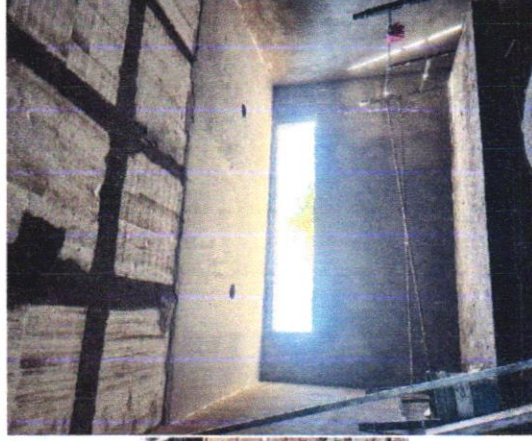

ELABORO.-

C. MANUEL URIARTE BELTRAN
REPRESENTANTE LEGAL

REVISO.-

ARQ. BRICEIDA GUADALUPE NIEBLAS MARTINEZ
SUPERVISOR

AUTORIZO.-

ING. RUBIEL RINCON RAMOS
DIRECTOR DE O.P.D.U. Y E.

MANUEL URIARTE BELTRAN.





OBRA:	CONSTRUCCIÓN DE BAÑOS PÚBLICOS UBICADOS A UN COSTADO DE TECHUMBRE EN LA COMUNIDAD DE CIÉNEGA DE LOS LARA, SINDICATURA DE CIÉNEGA DE LOS LARA, EN EL MUNICIPIO DE BADIRAGUATO, SINALOA.
ESTIMACION:	01 NORMAL

REPORTE FOTOGRAFICO DE ESTIMACION

INSTALACIONES HIDROSANITARIAS

7	
GP238	SALIDA SANITARIA PARA WC CON TUBERÍA DE 4" SANITARIA HASTA REGISTRO SANITARIO, INCLUYE: CODOS, COPLES, MATERIALES, MANO DE OBRA, INSTALACIÓN
GP240	SALIDA SANITARIA PARA LAVABO CON TUBERÍA DE 2" SANITARIA HASTA REGISTRO SANITARIO, INCLUYE: CODOS, COPLES, MATERIALES, MANO DE OBRA,
GP241	TUBO VENTILA CON TUBERÍA DE 2" SANITARIA, INCLUYE: CODOS, COPLES, MATERIALES, MANO DE OBRA, INSTALACIÓN HERRAMIENTA Y EQUIPO.
GP246	ALIMENTACIÓN HIDRÁULICA PARA MUEBLE SANITARIO CON TUBERÍA DE CPVC AZUL DE 1/2" DESDE RAMALES, INCLUYE: TUBERÍA, COPLES, CODOS, ADAPTADOR

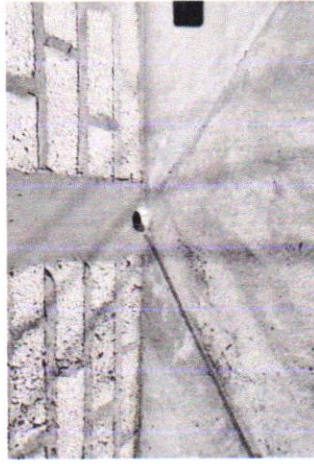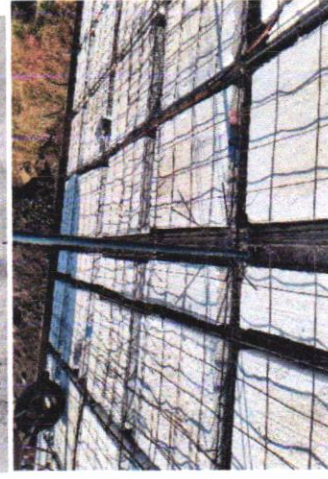

ELABORO.-

C. MANUEL URIARTE BELTRAN
REPRESENTANTE LEGAL

AUTORIZO.-

ING. RUBIEL RINCON RAMOS
DIRECTOR DE O.P.D.U. Y E.

ARQ. BRICEIDA GUADALUPE NIEBLAS MARTINEZ
SUPERVISOR

MANUEL URIARTE BELTRAN.



OBRA:	CONSTRUCCIÓN DE BAÑOS PÚBLICOS UBICADOS A UN COSTADO DE TECHUMBRE EN LA COMUNIDAD DE CIÉNEGA DE LOS LARA, SINDICATURA DE CIÉNEGA DE LOS LARA, EN EL MUNICIPIO DE BADIRAGUATO, SINALOA.
ESTIMACION:	01 NORMAL

REPORTE FOTOGRAFICO DE ESTIMACION

INSTALACIONES ELÉCTRICAS	
8	
GPBEL01	SALIDA PARA DE ALUMBRADO CON POLIFLEX DE 1/2", CABLE CAL.12; INCLUYE: ROSETA Y FOCO, MATERIALES, CABLEADO, DESPERDICIOS, PRUEBAS, MANO DE OBRA,
GP340	SALIDA PARA APAGADOR CON POLIFLEX DE 1/2", CABLE CAL.12; INCLUYE: MATERIALES, CABLEADO, DESPERDICIOS, PRUEBAS, MANO DE OBRA, EQUIPO,
GP226	SALIDA ELÉCTRICA PARA CONTACTO A BASE DE POLIDUCTO DE 13 MM., CON UN DESARROLLO DE 10 M, CON CABLE THW CAL. 12 Y 14 DESNUDO, LÍNEA ECONÓMICA,
GP178	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CENTRO DE CARGA Q8, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.
GP180	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE INTERRUPTOR DE 1X20 SQUARD, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.



ELABORO.-

C. MANUEL URIARTE BELTRAN
REPRESENTANTE LEGAL

REVISO.-

ARQ. BRICEIDA GUADALUPE NIEBLAS MARTINEZ
SUPERVISOR

AUTORIZO.-

ING. RUBIEL RINCON RAMOS
DIRECTOR DE O.P.D.U. Y E.



Fecha y hora de consulta25/01/2025 8:28:30 PM

Contrato00798320

Nombre del ClienteMUNICIPIO DE BADIRAGUATO

BBVA Net Cash - Pagos Interbancarios

Operación autorizada

Transferencia en proceso de validación y aplicación.

Datos del firmante

Usuario:ADMIN1

Poder:100%

Datos de la operación

Tipo de operación: Pago Interbancario

Descripción:EST NOR 01 AD001

Importe de la operación:201,007.54 MXP

Cuenta de retiro:0117899181

Cuenta de depósito:072730002039434985

Divisa de la cuenta: MXP

Divisa de la cuenta: MXP

Titular de la cuenta: MUNICIPIO DE BADIRAG UATO

Titular de la cuenta: MANUEL URIARTE BELTRAN

Nombre banco destino: BANORTE

Fecha valor: 27/01/2025

Fecha de creación: 25/01/2025

Fecha de aplicación: 25/01/2025

Concepto de pago: EST NOR 01 AD001 2025

Referencia numérica:

Instrumento de seguridad: ASD 6551749382

Hora de captura en el canal: 20:28:28

Datos de confirmación de la transferencia

Folio interbancario: 0000334577

Clave de rastreo: 002601002501270000334577

Folio de firma: 0038425083

Folio único: I401202501252028280038425089

Estado operación

Porcentaje Firmado: 100%

Estado: Operado

Detalle de firmas

Acción	Usuario	Porcentaje aportado	Fecha
CREO	ADMIN1	— %	25/01/2025
FIRMO	ADMIN1	100 %	25/01/2025
