





Badiraguato

GENERANDO BUENOS RESULTADOS

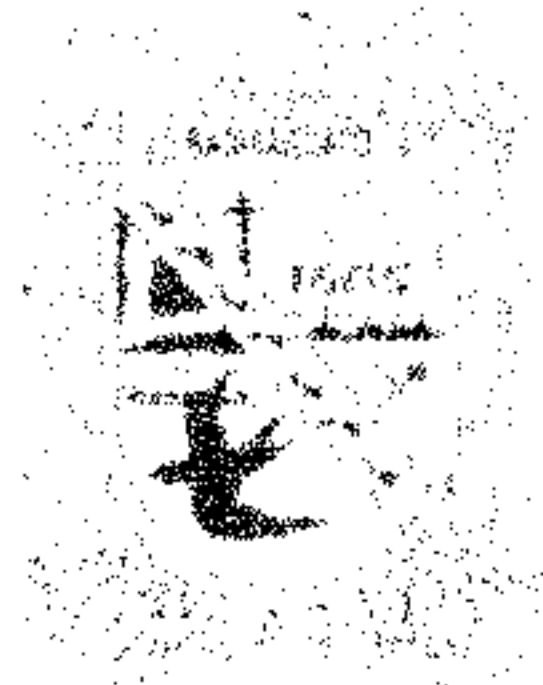

OFICIO No. OPDUyE/085/2025

ASUNTO: SOLICITUD PAGO ESTIMACIÓN 02 NORMAL

Badiraguato, Sin., a 14 de Febrero de 2025

MTRO. GONZALO IRINEO CABALLERO TERRAZAS

TESORERO MUNICIPAL


PRESENTE.-

POR MEDIO DE LA PRESENTE, LE SOLICITO EL PAGO POR: **CONCEPTO DE PAGO ESTIMACIÓN 02 NORMAL**, DEL IMPORTE DEL CONTRATO, A FAVOR DE LA EMPRESA: **MANUEL URIARTE BELTRAN**, LA CUAL REALIZA LOS TRABAJOS APROBADOS POR EL CABILDO MUNICIPAL, CON EL ACTA DE CABILDO NÚMERO: **04 (CUATRO) CON FECHA DE 26 DE DICIEMBRE DE 2024**, A CONTINUACIÓN, SE DETALLA:

- **NOMBRE DE LA OBRA:** CONSTRUCCIÓN DE BAÑOS PÚBLICOS UBICADOS A UN COSTADO DE TECHUMBRE EN LA COMUNIDAD DE CIÉNEGA DE LOS LARA, SINDICATURA DE CIÉNEGA DE LOS LARA, EN EL MUNICIPIO DE BADIRAGUATO, SINALOA.
- **No. DE CONTRATO:** MBGBR-AD-GC-001/2025
- **IMPORTE DEL CONTRATO:** \$558,450.83 (QUINIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTAS PESOS 83/100 M.N)
- **CONCEPTO DEL PAGO:** PAGO DE ESTIMACIÓN 02 NORMAL
- **IMPORTE A PAGAR:** \$144,524.12 (DOSCIENTOS UN MIL SIETE PESOS 54/100 M.N)
- **RECURSOS:** FONDO DEL GASTO CORRIENTE MUNICIPAL, EJERCICIO 2025
- **EMPRESA:** MANUEL URIARTE BELTRAN
- **R.F.C.** UIBM811007HY3
- **DOMICILIO FISCAL:** CALLE ANDRIO 4993, FRACCIONAMIENTO VILLA DEL CEDRO ENTRE BOULEVARD BILOGÍA Y CIRCUITO SALERNO, C.P. 80058
- **No. DE FACTURA:** # C-286, DE FECHA 13 DE FEBRERO DE 2025

SE ANEXA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DE SOPORTE, COMO AMPARO DE DICHO PAGO.

AGRADECIENDO DE ANTEMANO LA ATENCIÓN QUE SE SIRVA DAR A LA PRESENTE, ME DESPIDO QUEDANDO A SUS ÓRDENES.

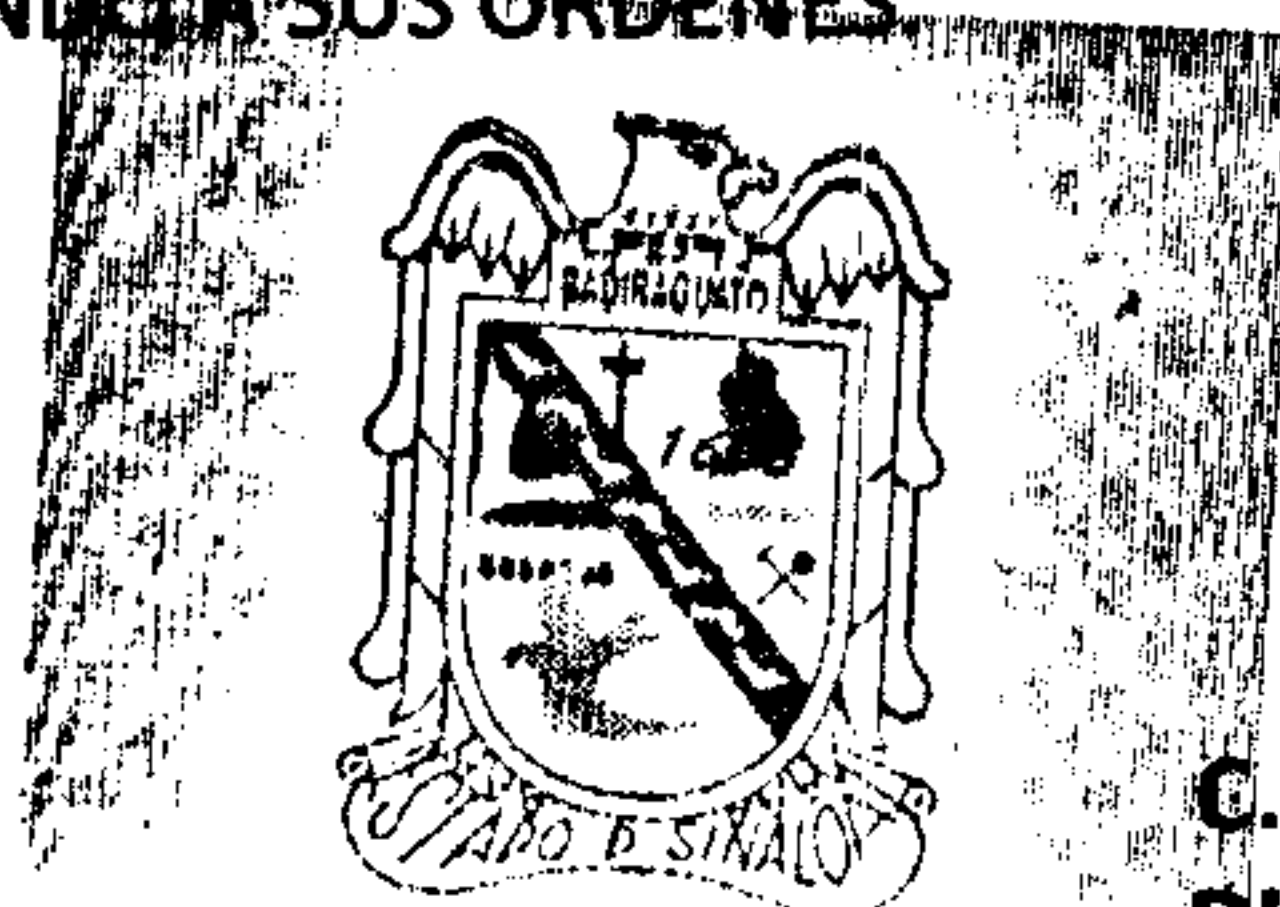

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA,
BADIRAGUATO, SINALOA.

ATENTAMENTE

C. ING. RUBIEL RINCÓN RAMOS
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS,
DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA



**MUNICIPIO DE
BADIRAGUATO
TESORERÍA**

14 FEB 2025


RECIBIDO

2:47 PM

Alexis

C.C.P. ARCHIVO.



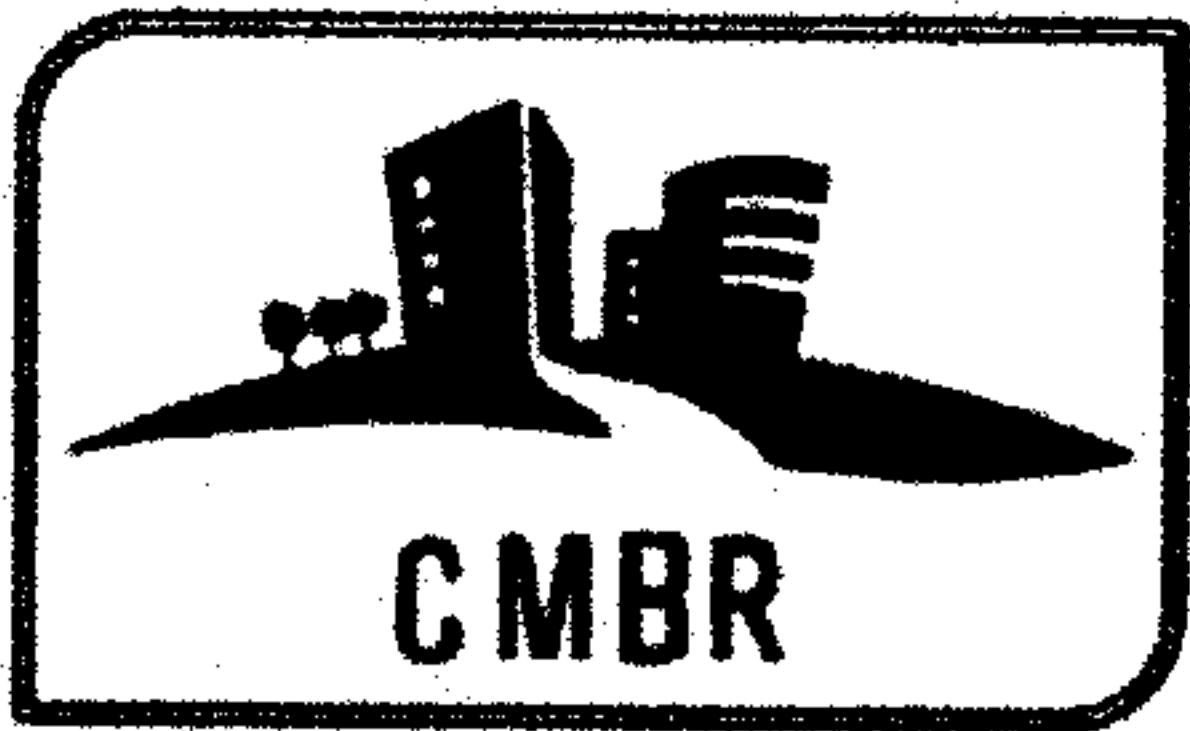

MANUEL URIARTE BELTRAN

RFC: UIBM811007HY3

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Lugar de Expedición: 80058

Régimen Fiscal: 612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

Forma de pago

Método de pago

Moneda:

Exportación:

99 - Por definir

PPD - Pago en parcialidades o diferido

MXN - Peso Mexicano

01 - No aplica

Folio

Fecha

Tipo de cambio:

C - 286

13/2/2025 10:28:29

Datos del cliente

Cliente: MUNICIPIO DE BADIRAGUATO

R.F.C.: MBA850101214

Domicilio fiscal: Gabriel Leyva Solano No. , Badiraguato, C.P. 80500, , Sinaloa, México

Uso CFDI: G03 - Gastos en general.

Régimen fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

Cantidad	Unidad	Clave Unidad SAT	Clave Producto/Servicio	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Descuentos	Impuestos	Importe
				PAGO DE ESTIMACION 02 NORMAL DE LA OBRA CONSTRUCCIÓN DE BAÑOS PÚBLICOS UBICADOS A UN COSTADO DE TECHUMBRE EN LA COMUNIDAD DE CIÉNEGA DE LOS LARA, SINDICATURA DE CIÉNEGA DE LOS LARA, EN EL MUNICIPIO DE BADIRAGUATO, SINALOA. MBGBR-AD-GC-001/2025 MONTO DEL CONTRATO NETO : \$ 558,450.83 MONTO BRUTO GENERADO POR LOS TRABAJOS EN LA PRESENTE ESTIMACION : \$ 199,618.95 IVA DE LOS TRABAJOS GENERADOS: \$ 31,939.03 MONTO TOTAL DE LOS TRABAJOS GENERADOS INC IVA: \$ 231,557.98 MONTO BRUTO AMORTIZACION ANTICIPO : \$ 69,866.63 IVA AMORTIZACION ANTICIPO : \$ 11,178.66 MONTO NETO AMORTIZACION ANTICIPO: \$ 81,045.29 MONTO BRUTO A FACTURAR: \$ 129,752.32 IVA A FACTURAR: \$ 20,760.37 TOTAL A FACTURAR DE LA ESTIMACION :\$ 150,512.69 MENOS 3% DE SERVICIOS DE VERIFICACION INSPECCION, FISCALIZACION, Y CONTROL (				
1.00	SERVICIO	E48 - Unidad de servicio	72101500 - Servicios de apoyo para la construcción		129,752.32	0.00	002 - IVA - 20,760.37	129,752.32

S.V.I.F.Y.C.) \$
5,988.57 TOTAL
DEDUCCIONES :\$
87,033.86
MONTO LIQUIDO
A RECIBIR: \$
144,524.12
(SON CIENTO
CUARENTA Y
CUATRO MIL
QUINIENTOS
VEINTICUATRO
PESOS 12/100
M.N.)

Importe con letra		
CIENTO CINCUENTA MIL QUINIENTOS DOCE PESOS 69/100 M.N.	Subtotal	129,752.32
	IVA	20,760.37
	Total	150,512.69

CFDI Relacionados:	
Tipo Relación	CFDI Relacionados



Serie del Certificado del emisor	00001000000518359851
Folio fiscal	2BF87814-F82A-4005-80DC-6D6E27B2EDAF
No. de Serie del Certificado del SAT	00001000000709182898
Fecha y hora de certificación	Febrero 13 2025 - 11:28:30

Este documento es una representación impresa de un CFDI


Sello Digital del CFDI	
TsQdNKKI/rER1KaBKVB9koOGdrcFsUN9zJaWA9allzQU4SQJbywbEK/V+JwYqJKN7NSROhmyRz9tYtbFXN11LFz90JfmzyZZ+WBcwtJ/ei7P55bpSOxDWEQzuW+s4Yw51RZqZ45ACkzrtfO9pV1ZxjsrvXvkLeFZQ+hwX587LztDgdgUMpWnX/hfIP549IWEFk3KYPyCvU2+GdoLZeiTYy/Rh3IQ8qSLM2L8FAcnDa4hDAYCw1/7+KQF+S9pu4vnoyrHmVvf4UDPLFa7vJmciSmoHWdTJBHZXDywrDnW3nQwgpmfWLKvtKDQt4n23LzqRrmCQD7cviWKHztuhUgVQ==	

Sello del SAT	
eaybPbLTVL1HtJB8TQ8uFR5h3R3ptuSOySe4kB944G0Z4mt980Nc9kIP/7w1v2/wNB3N+9yd218CyuK+8wwJqA6gRaUilCgqsZC/TOF9gucu9twdzJAjXPY0OvwstrCCbYmkmDNv/ldPnLQ0uc6ULawN+zjOqLqLLObWbWpD0Q5XE0FktXlr24EoGQHvYqzB8lxw2FvVkfPpkuWCwokfPyUky216iv8SW4MNFxNr95vPMqxKLeGT0VK4psVVI9F0jp6N4f8ONZwiQretYeWjtLVRkiHlpTD9NmckEC0/GuH1RJR4dSBY408II5VSHKDATVKJB0I2U5n7dbPAxP5gUA==	

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT	
1.1 2BF87814-F82A-4005-80DC-6D6E27B2EDAF 2025-02-13T11:28:30 MAS0810247C0 TsQdNKKI/rER1KaBKVB9koOGdrcFsUN9zJaWA9allzQU4SQJbywbEK/V+JwYqJKN7NSROhmyRz9tYtbFXN11LFz90JfmzyZZ+WBcwtJ/ei7P55bpSOxDWEQzuW+s4Yw51RZqZ45ACkzrtfO9pV1ZxjsrvXvkLeFZQ+hwX587LztDgdgUMpWnX/hfIP549IWEFk3KYPyCvU2+GdoLZeiTYy/Rh3IQ8qSLM2L8FAcnDa4hDAYCw1/7+KQF+S9pu4vnoyrHmVvf4UDPLFa7vJmciSmoHWdTJBHZXDywrDnW3nQwgpmfWLKvtKDQt4n23LzqRrmCQD7cviWKHztuhUgVQ== 00001000000709182898	

This XML file does not appear to have any style information associated with it. The document tree is shown below.

```
<cfdi:Comprobante xmlns:cfdi="http://www.sat.gob.mx/cfd/4" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/cfd/4 http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/4/cfdv40.xsd" Version="4.0" Serie="C" Folio="286" Fecha="2025-02-13T10:28:29" Sello="TsQdNKKI/rER1kABKV89koOGdr-cFsUN9zJAwA9a1lLZQU45QiBywbEK/V+JwYqJKN7NSR0hmYRz9tYtbFXNJ1LF-z90JfmzyZZ+W8cwtJ/ei7P55bpSOxDWEQzuH+s4YW51RZqZ45ACKzrtfO9pV1ZXjSrVXvKLeFZQ+hWXS87LZTdgdgUMpWnX/hf1PS49IWEEK3K FormaPago="99" NoCertificado="00001000000518359851" Certificado="MIIF6CCA90GAWIBAGITUMDAWDEMDADA1MTgzNTk4NTEwdQY3KOZIhvCNAQELBQAwwGGEMSAWHgYDVQQDBD8VVRRPUKLEQUQgO0VSVElGSUNBRE9SQTEuMCMwGA1UECgwIU0VSVK1DSU8gREUGCURNSUSJU1RSQUJNT04gVFJJQUVUVjJ0JT04eMBGGA1SubTotal="129752.32" Moneda="MXN" Total="150512.69" TipoDeComprobante="I" Exportacion="01" MetodoPago="PPD" LugarExpedicion="80058"><cfdi:Emisor RegimenFiscal="612" Rfc="UIBM811007HY3" Nombre="MANUEL URIARTE BELTRAN"/><cfdi:Receptor Rfc="MBA850101214" Nombre="MUNICIPIO DE BADIRAGUATO" DomicilioFiscalReceptor="80500" RegimenFiscalReceptor="603" UsoCFDI="G03"/><cfdi:Conceptos><cfdi:Concepto ClaveProdServ="72101500" ClaveUnidad="E48" Cantidad="1.00" Unidad="SERVICIO" NoIdentificacion="501" Descripcion="PAGO DE ESTIMACION 02 NORMAL" ValorUnitario="129752.32" Importe="129752.32" ObjetoImp="02"><cfdi:Impuestos><cfdi:Traslados><cfdi:Traslado Base="129752.32" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaCuota="0.160000" Importe="20760.37"/></cfdi:Traslados></cfdi:Impuestos></cfdi:Conceptos><cfdi:Impuestos TotalImpuestosTrasladados="20760.37"><cfdi:Traslados><cfdi:Traslado Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaCuota="0.160000" Importe="20760.37" Base="129752.32"/></cfdi:Traslados></cfdi:Impuestos></cfdi:Complemento><cfdi:TimbreFiscalDigital xmlns:tfd="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/TimbreFiscalDigital/v11.xsd" Version="1.1" UUID="2BF87814-F82A-4005-80DC-6D6E27B2EDAF" FechaTimbrado="2025-02-13T11:28:30" RfcProvCertif="MAS0810247C0" SelloOCFD="TsQdNKKI/rER1kABKV89koOGdr-cFsUN9zJAwA9a1lLZQU45QiBywbEK/V+JwYqJKN7NSR0hmYRz9tYtbFXNJ1LF-z90JfmzyZZ+W8cwtJ/ei7P55bpSOxDWEQzuH+s4YW51RZqZ45ACKzrtfO9pV1ZXjSrVXvKLeFZQ+hWXS87LZTdgdgUMpWnX/hf1PS49I" NoCertificadoSAT="00001000000709182898" SelloOSAT="eaybPblTVL1HTJB8TQ8UF8R5hR3R3ptuoY5e4kKB944G0Z4mt980nc9KIP/7w1v12/WNB3N+9yd21BCyUK+8mwJqA6GRaUILCGqsZC/TOPf9gucu9twdzJAjXPYo0vwstrCCbYmkmdNV/lDPnLQ8uc6ULaWN+zjOqlQL0bmWbWPdQSXE0FKtXJR24EqGQHvyC</cfdi:Complemento>
```

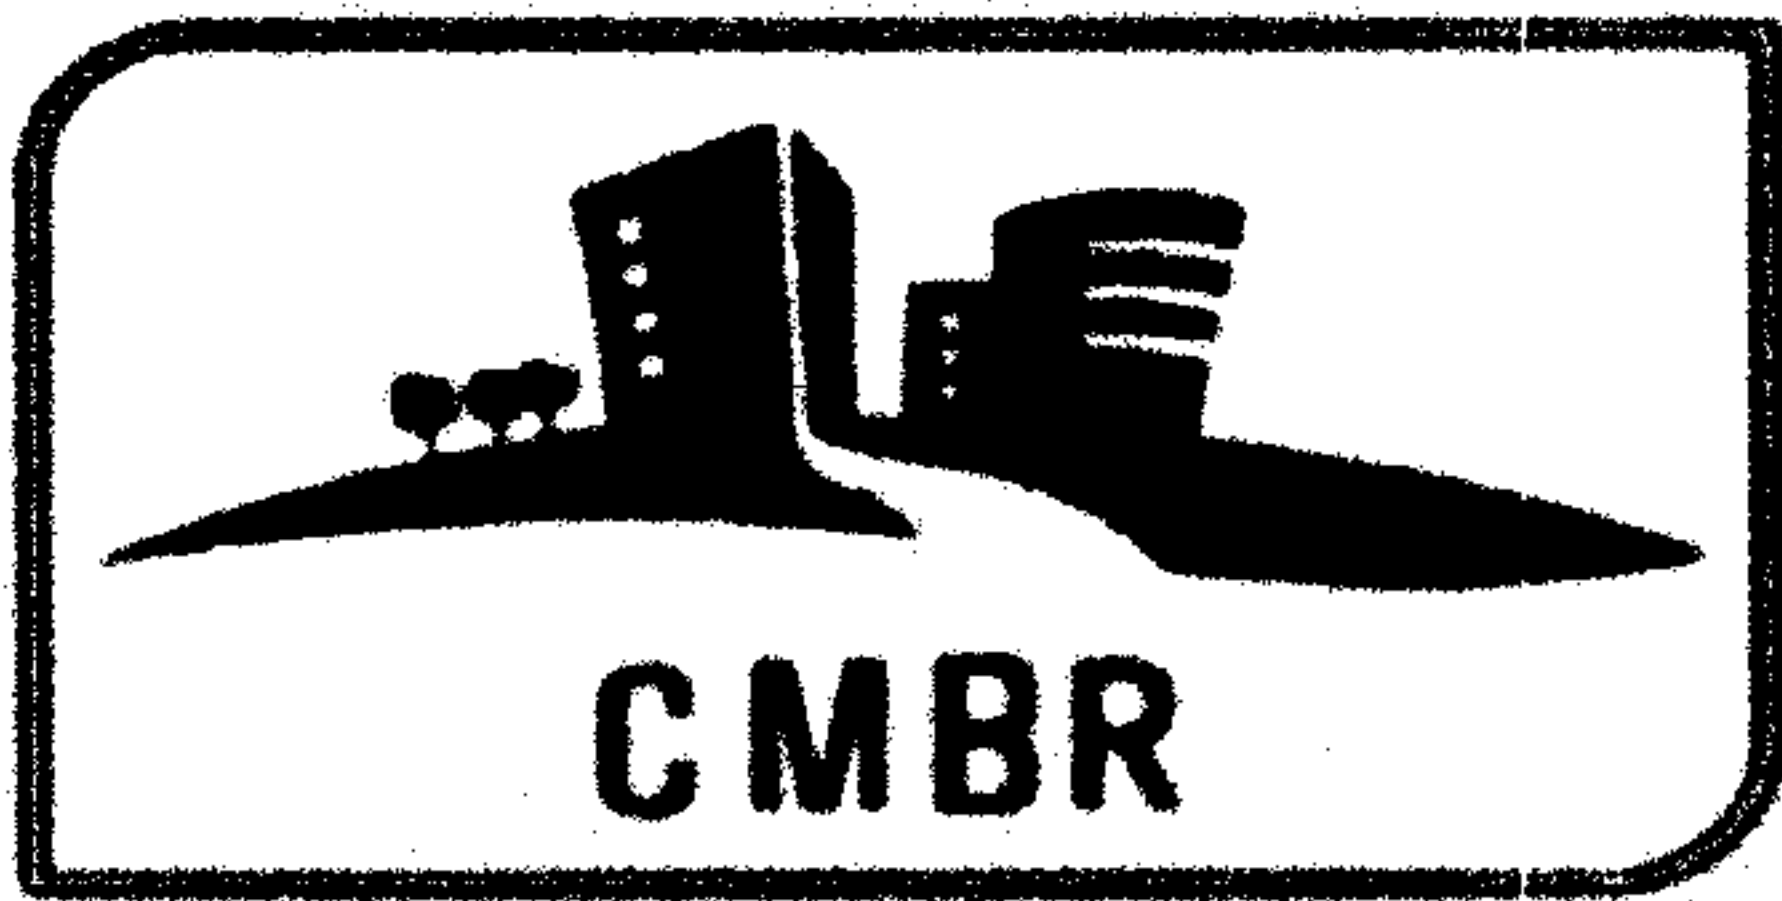

Dependencia : Ayuntamiento de Badiraguato
Control de Estimaciones

MANUEL URIARTE BELTRAN.

CONSTRUCCIÓN DE BAÑOS PÚBLICOS UBICADOS A UN COSTADO DE TECHUMBRE EN LA COMUNIDAD DE CIENEGA DE LOS LARA, SINDICATURA DE CIENEGA DE LOS LARA, EN EL MUNICIPIO DE BADIRAGUATO, SINALOA.			Fecha:		Estimacion:			
			6 de febrero de 2025		02 NORMAL			
Periodo de la estimacion:		03/01/2025	06/02/2025	Localidad:		No. De contrato:		
Periodo de Ejecución:		03/01/2025	06/02/2025	CIENEGA DE LOS LARA		MBGBR-AD-GC-001/2025		
Importe del contrato con I.V.A:		Imp. Contratado sin I.V.A		Anticipo		Importe Anticipo sin I.V.A		% de Avance
\$ 558,450.83		\$ 481,423.13		\$ 195,457.79		\$ 168,498.09		41%
								% Avance Total
								99%

Control Del Anticipo	Liquidacion de Estimacion		Control de Estimacion
AMORTIZA ESTA ESTIMACION	Importe de la Estimacion (+)	\$ 199,618.95	ESTA ESTIMACION
\$ 81,045.29	16 % I.V.A (+)	\$ 31,939.03	\$ 231,557.98
	Sub- Total A (=)	\$ 231,557.98	
	Amortizacion Anticipo	\$ 69,866.63	
AMORTIZACION ANTERIOR	16 % I.V.A (+)	\$ 11,178.68	ACUMULADO ANTERIOR
\$ 112,719.70	Total (=)	\$ 81,045.29	\$ 322,056.28
	Importe TOTAL	\$ 129,752.32	
TOTAL AMORTIZADO	16 % I.V.A (+)	\$ 20,760.37	TOTAL ACUMULADO.
\$ 193,764.99	Total (=)	\$ 150,512.69	\$ 553,614.26
	3 % SVIFYC:	\$ 5,988.57	
ANTICIPO OTORGADO	Total Deducciones (=)	\$ 87,033.86	CONTRATADO
\$ 195,457.79	Importe TOTAL	\$ 144,524.12	\$ 558,450.83
	NETO A PAGAR		
SALDO DEL ANTICIPO	\$ 144,524.12		SALDO
\$1,692.80	Sea:		\$ 4,836.57
	(SON CIENTO CUARENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS VENTICUATRO PESOS 12/100 M.N.)		

ELABORO.-


C. MANUEL URIARTE BELTRAN
REPRESENTANTE LEGAL

REVISO

ING. JOSE RODOLFO CONTRERAS LÓPEZ
COSTOS Y PRESUPUESTOS

AUTORIZO

ING. RUBIEL RINCON RAMOS
DIRECTOR DE D. O. P. D. U. Y E.

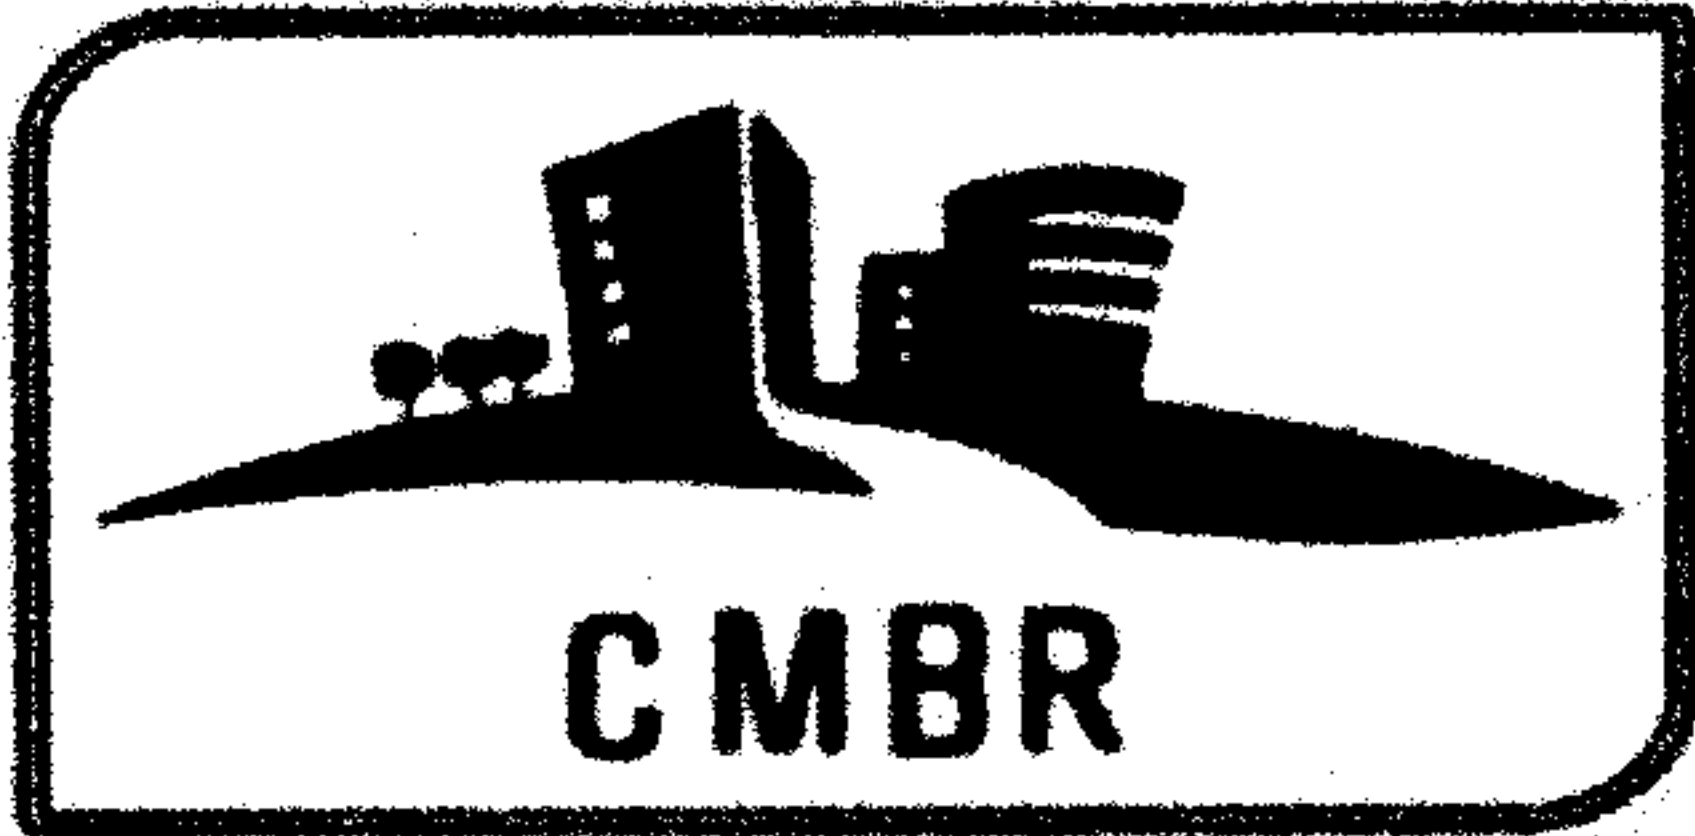

Fecha: 6 de febrero de 2025

CARATULA DE ESTIMACIÓN				
CONTRATISTA:	MANUEL URIARTE BELTRAN.		ESTIMACIÓN No:	02 NORMAL
DOMICILIO:	Calle Andrio 4993, Fraccionamiento Villas del Cedro Entre Boulevard Bologna y Circuito Salerno C.P.80058		PERIODO DE ESTIMACION:	
TELÉFONO:	CEL:		DEL	16-ene-25
66 72 96 48 27	66 72 96 48 27		AL	06-feb-25
R.F.C.			FECHA DE CONTRATO:	
UIBM811007HY3			02-ene-25	
DEPENDENCIA:-	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA, AYUNTAMIENTO DE BADIRAGUATO.			
LOCALIDAD:		MUNICIPIO:	PERIODO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO:	
CIENEGA DE LOS LARA		BADIRAGUATO	INICIO:	03-ene-25
			TERMINACIÓN:	06-feb-25
DESCRIPCIÓN:				
CONSTRUCCIÓN DE BAÑOS PÚBLICOS UBICADOS A UN COSTADO DE TECHUMBRE EN LA COMUNIDAD DE CIENEGA DE LOS LARA, SINDICATURA DE CIENEGA DE LOS LARA, EN EL MUNICIPIO DE BADIRAGUATO, SINALOA.				
CONTRATO No:				
MBGBR-AD-GC-001/2025				
IMPORTE SIN IVA DE LA OBRA	IMPORTE CON IVA DE LA OBRA	35% ANTICIPO DE LA OBRA	IMPORTE TOTAL DE CONTRATO:	
\$481,423.13	\$558,450.83	\$195,457.79	\$558,450.83	
			BUENO POR:	\$ 144,524.12
RECIBI DEL H. AYUNTAMIENTO DE BADIRAGUATO:				
\$ 144,524.12	(SON CIENTO CUARENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS VEINTICUATRO PESOS 12/100 M.N.)			
EN PAGO DE ESTIMACIÓN: 02 NORMAL				
DEDUCCIONES:		CALCULO DE ESTIMACIÓN		
AMORTIZACIÓN ANTICIPO 35%	\$ 69,866.83	IMPORTE DE LA OBRA EJECUTADA SIN IVA	\$ 199,618.95	
MAS I.V.A.:	\$ 11,178.66	MAS I.V.A 16 %	\$ 31,939.03	
TOTAL AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO:	\$ 81,045.29	TOTAL DE LA OBRA EJECUTADA CON IVA	\$ 231,557.98	
3 % SVIFYC:	\$ 5,988.57	MENOS TOTAL DEDUCCIONES:	\$ 87,033.86	
TOTAL DEDUCCIONES:	\$ 87,033.86	TOTAL A FACTURAR MAS IVA	\$ 150,512.69	
		SALDO A PAGAR:		
		\$ 144,524.12		

ELABORO:-


C. MANUEL URIARTE BELTRAN
REPRESENTANTE LEGAL

REVISO:-

ING. JOSE RODOLFO CONTRERAS LÓPEZ
COSTOS Y PRESUPUESTOS

AUTORIZO:-


ING. RUBIEL RINCON RAMOS
DIRECTOR D. O. P. D. U. Y E.

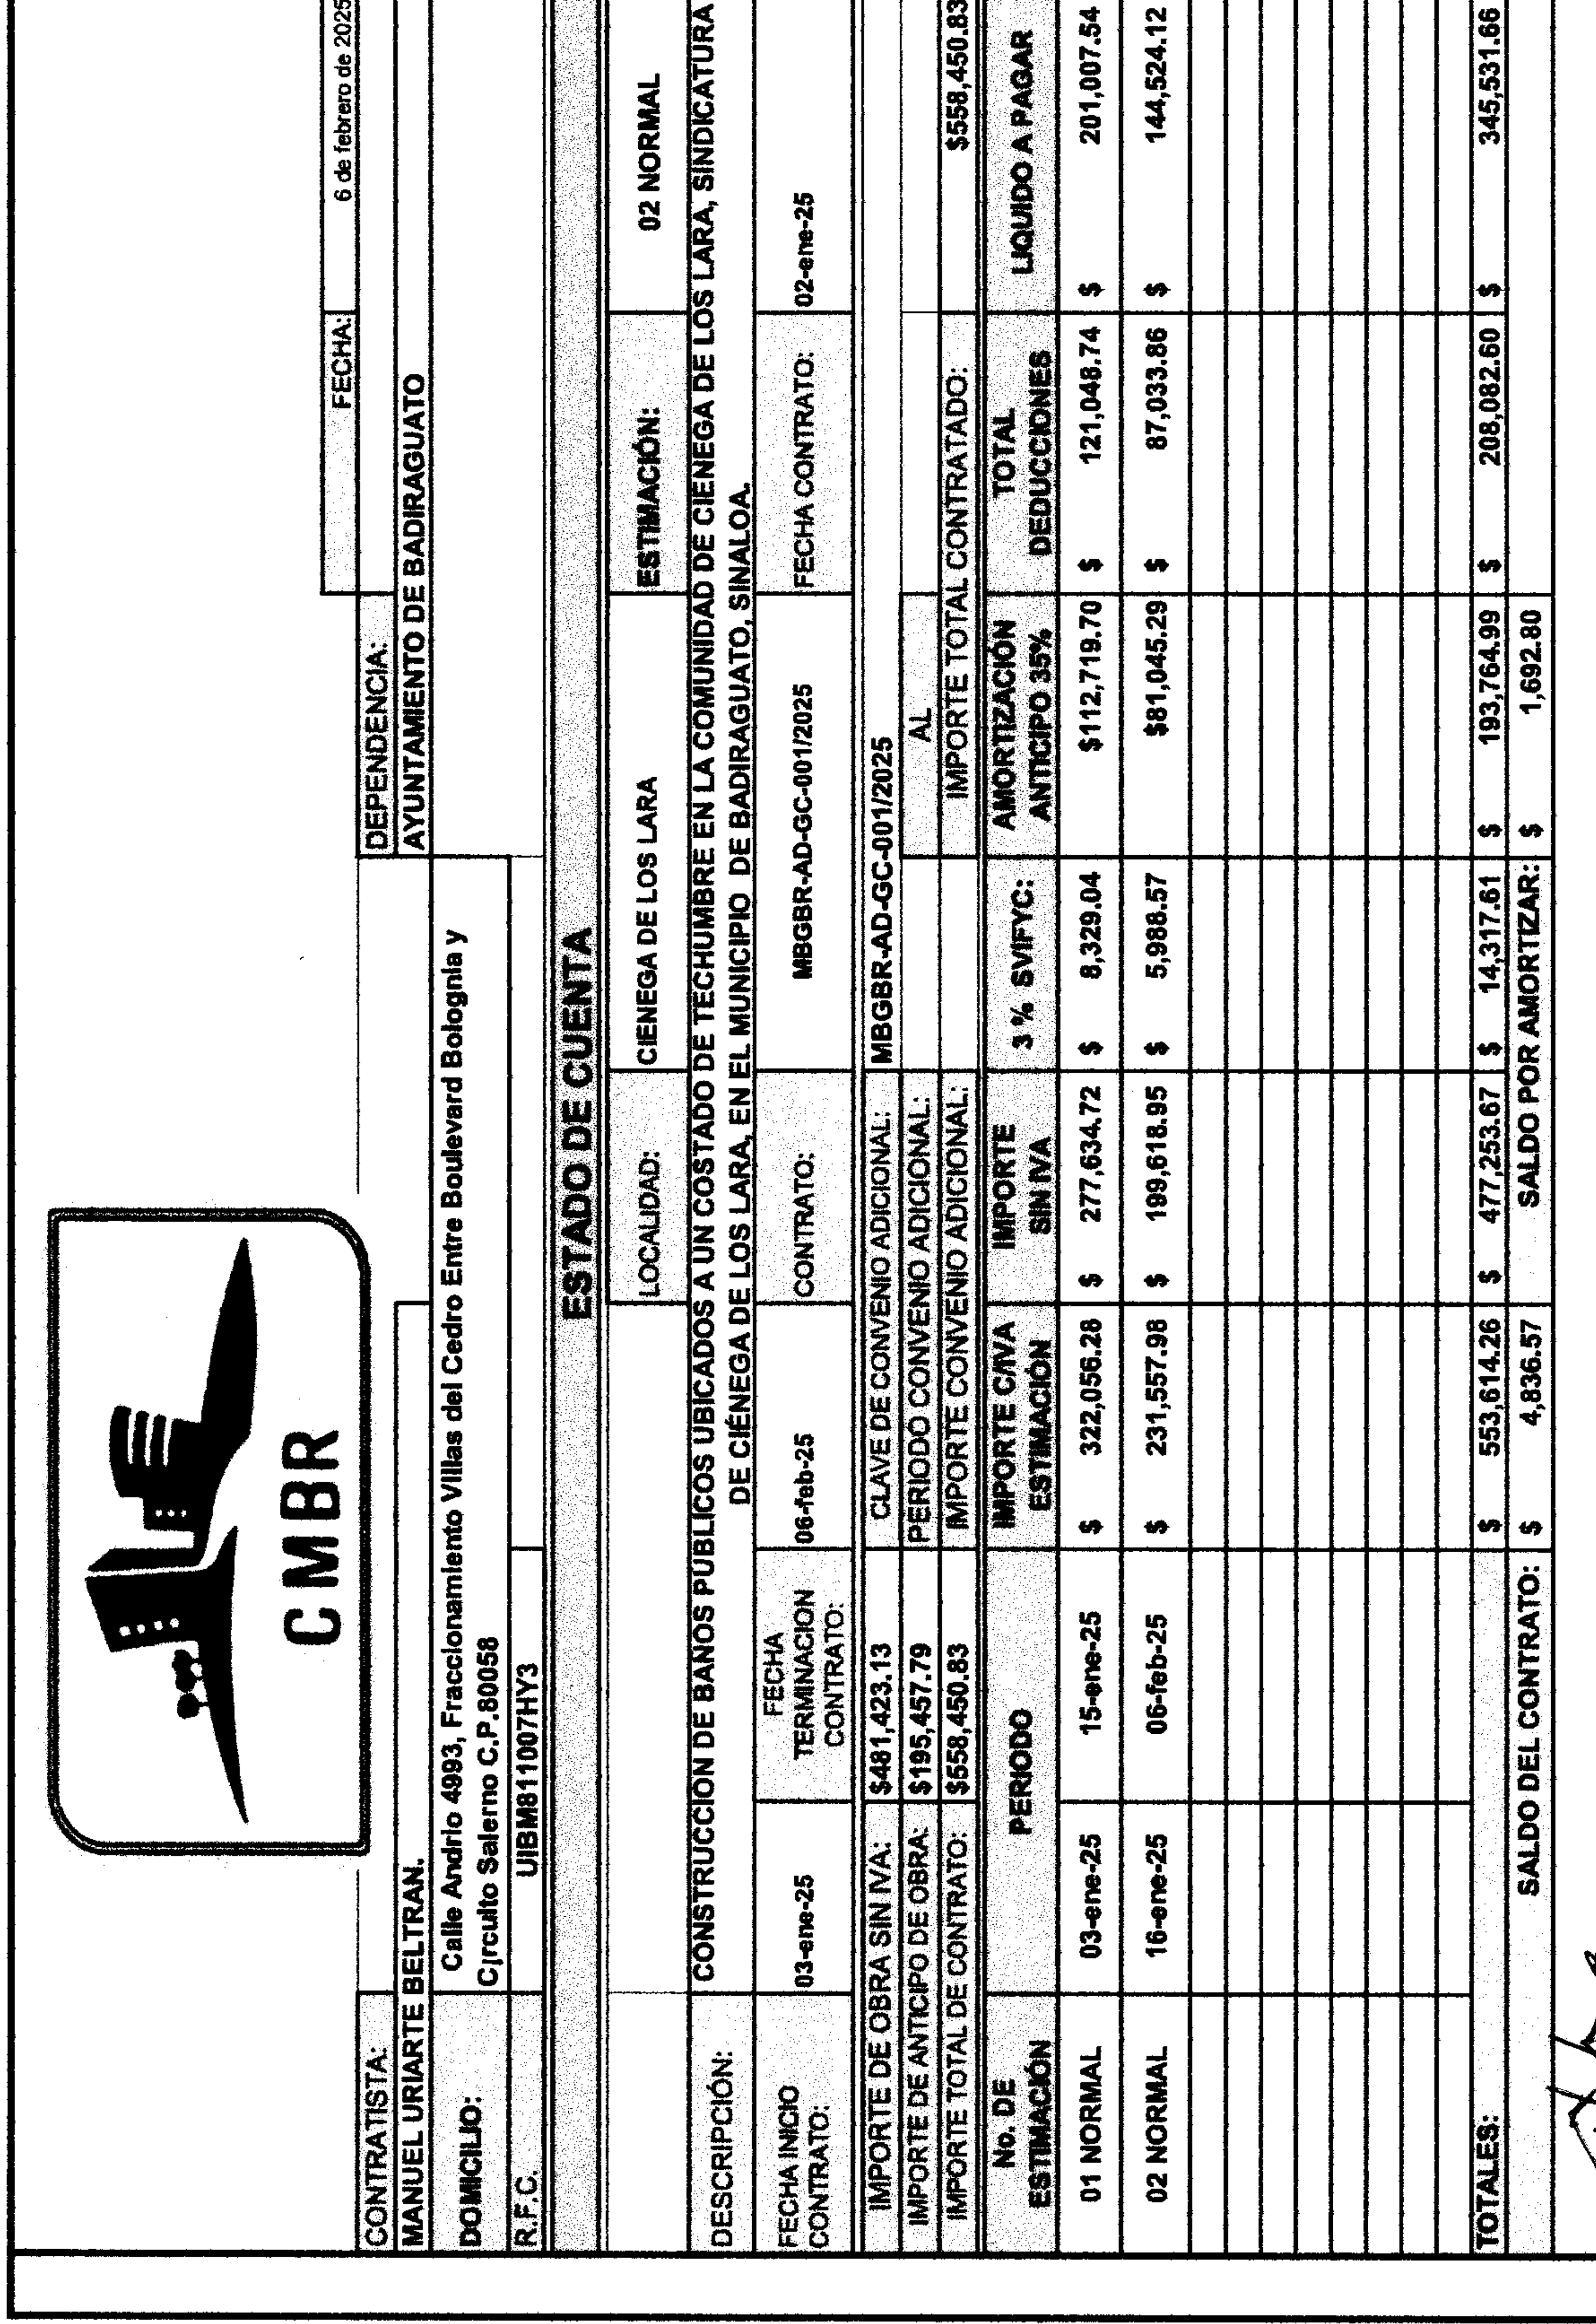

AUTORIZO:-

ING. JOSE RODOLFO CONTRERAS LÓPEZ
COSTOS Y PRESUPUESTOS

~~ING. RUBIEL RINCON RAMOS~~
~~DIRECTOR DE O.P.D.U.Y.E.~~

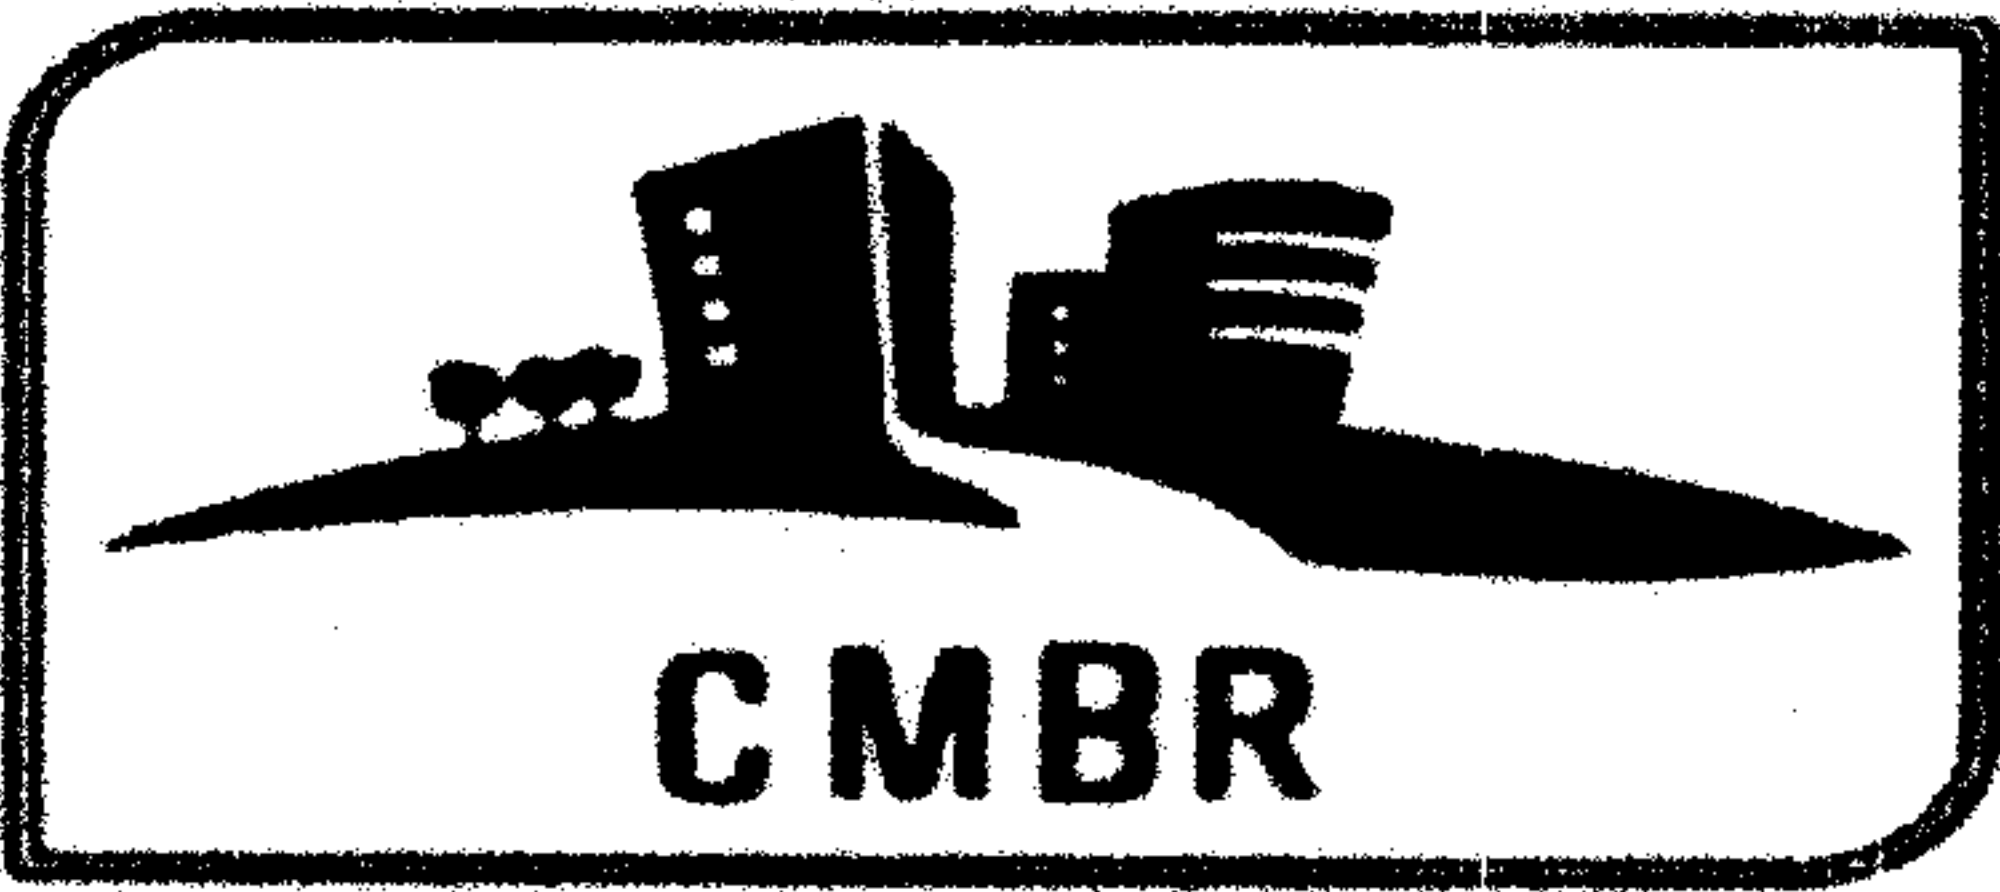

CONTRATISTA:		DEPENDENCIA:	
MANUEL URIARTE BELTRAN.		AYUNTAMIENTO DE BADIRAGUATO	
DOMICILIO:	Calle Andrio 4993, Fraccionamiento Villas del Cedro Entre Boulevard Bologna y Circuito		
R.F.C.	UIBM811007HY3		

FECHA: 6 de febrero de 2025

RESÚMEN DE ESTIMACIÓN					
		LOCALIDAD:	CIENEGA DE LOS LARA	ESTIMACIÓN:	02 NORMAL
DESCRIPCIÓN:	CONSTRUCCIÓN DE BAÑOS PÚBLICOS UBICADOS A UN COSTADO DE TECHUMBRE EN LA COMUNIDAD DE CIENEGA DE LOS LARA, SINDICATURA DE CIENEGA DE LOS LARA, EN EL MUNICIPIO DE BADIRAGUATO, SINALOA.				

IMPORTE DE OBRA SIN IVA:	\$ 481,423.13
IMPORTE DE ANTICIPO DE OBRA:	\$ 195,457.79
IMPORTE TOTAL DE CONTRATO:	\$ 558,450.83

DETAJE		IMPORTE
SALA DE CABILDO		
101	PRELIMINARES	\$ -
2	CIMENTACION	\$ -
3	ALBAÑILERIA	\$ -
4	AZOTEAS	\$ 5,859.32
5	PUERTAS Y VENTANAS	\$ 15,938.94
6	ACABADOS	\$ 137,475.43
7	INSTALACIONES HIDROSANITARIAS	\$ 34,242.18
8	INSTALACIONES ELÉCTRICAS	\$ 6,103.08
SUBTOTAL ESTIMACIÓN:		\$ 199,618.95

SUB TOTAL=	\$ 199,618.95
I.V.A AL 16 %	\$ 31,939.03
TOTAL =	\$ 231,557.98

ELABORO.-

C. MANUEL URIARTE BELTRAN.
REPRESENTANTE LEGAL

REVISO.-

ING. JOSE RODOLFO CONTRERAS LÓPEZ
COSTOS Y PRESUPUESTOS

AUTORIZO.-

ING. RUBEL RINCÓN RAMOS
DIRECTOR D. O. P. D. U. Y E.



DESGLOSE

CONTRATISTA:		MANUEL URIARTE BELTRAN.		DEPENDENCIA:		AYUNTAMIENTO DE BADIRAGUATO		FECHA:		06/02/2025	
DOMICILIO:		Calle Andrio 4993, Fraccionamiento Villas del Cedro Entre Boulevard Bologna y Circuito Salerno C.P.80058				R.F.C.:		UIBM811007HY3			
DESGLOSE DE CONCEPTOS DE ESTIMACION											
DESCRIPCION:		CONSTRUCCION DE BAÑOS PUBLICOS UBICADOS A UN COSTADO DE TECHUMBRE EN LA COMUNIDAD DE CIENEGA DE LOS LARA, SINDICATURA DE CIENEGA DE LOS LARA, EN EL MUNICIPIO DE BADIRAGUATO, SINALOA.				LOCALIDAD:		CIENEGA DE LOS LARA		ESTIMACION: 02 NORMAL	
IMPORTE DE OBRA SIN IVA:		\$481,423.13		IMPORTE DE ANTICIPO DE OBRA:		\$195,457.79		IMPORTE TOTAL DE CONTRATO:		\$558,450.83	
CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANT	P.U.	TOTAL	VOLUMEN TOTAL ESTIMADO	HASTA ESTIM ANTERIOR	EXCEDENTE	DE ESTA ESTIMACION	IMPORTE	
101	PRELIMINARES										
GP001	TRAZO Y NIVELACION DEL TERRENO ESTABLECIENDO EJES Y NIVELETAS DE REFERENCIA, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M2	37.33	\$ 17.23	\$ 643.20	37.33	37.33	0.00	0.00	\$ -	
2	CIMENTACION										
GP2403	EXCAVACION POR MEDIOS MANUALES DE 0 A -2.00 M, EN MATERIAL TIPO B, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA	M3	9.33	\$ 364.07	\$ 3,396.77	9.33	9.33	56.49	0.00	\$ -	
GP26	RELLENO COMPACTADO AL 95% CON BALARINA EN CAPAS DE 20 CMS DE ESPESOR CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION, INCLUYE: AGUA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU TERMINACION.	M3	9.33	\$ 246.64	\$ 2,301.15	9.33	9.33	56.49	0.00	\$ -	
GP033	AFINE DE FONDOS Y TALUDES DE LAS EXCAVACIONES HECHAS INCLUYE: MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M2	6.15	\$ 26.00	\$ 159.90	6.15	6.15	31.18	0.00	\$ -	
GP64	SUMINISTRO Y COLOCACION DE HULE NEGRO CALBRE 600, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA TERMINACION	M2	37.33	\$ 36.64	\$ 1,367.77	37.33	37.33	0.00	0.00	\$ -	
GP644	LOSA DE CIMENTACION DE 10 CM DE ESPESOR CON CONCRETO F'C= DE 200 KG/CM HECHO EN OBRA, ARMADO CON VARILLA DE 3/8" @ 30 CMS EN AMBOS SENTIDOS, INCLUYE: CIMBRA, MANO DE OBRA, MATERIALES, EQUIPO Y HERRAMIENTAS.	M2	37.33	\$ 1,481.19	\$ 55,292.82	37.33	37.33	0.00	0.00	\$ -	
3	ALBAÑILERIA										
GP336	CASTILLO Y/O DALA DE 15X20 CM ARMADO CON ARMEX Y REFORZADO CON 2 VARILLAS DE 3/8", ACABADO APARENTE, CONCRETO HECHO EN OBRA CON UN F'C=200 KG/CM2, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTAS.	ML	34.20	\$ 460.02	\$ 15,732.68	34.20	34.20	17.80	0.00	\$ -	
GP5033	FABRICACION Y COLOCACION DE CADENA DE CERRAMIENTO DE 15x20 cm, ARMADA CON ARMEX CON CONCRETO F'C=250 KG/CM2, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA	ML	33.50	\$ 470.77	\$ 15,770.80	28.45	28.45	0.00	0.00	\$ -	
GP505	MURO DE TABICON, DE 0 A 3MTS DE ALTURA INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M2	54.90	\$ 695.56	\$ 38,186.24	54.90	54.90	0.00	0.00	\$ -	
GP237	LOSA DE 10 CM DE ESPESOR CON CONCRETO F'C= DE 200 KG/CM HECHO EN OBRA, ARMADO CON VARILLA DE 3/8" @ 20 CMS EN AMBOS SENTIDOS, INCLUYE: CIMBRA, MANO DE OBRA, MATERIALES, EQUIPO Y HERRAMIENTAS.	M2	39.91	\$ 1,108.31	\$ 44,232.65	39.91	39.91	0.00	0.00	\$ -	
GP509	BARRA DE 60 CMS DE ANCHO Y DE 10 CMS DE ESPESOR ACABADO PULIDO REFORZADO CON MALLA LAC 6-6/10-10, CONCRETO HECHO EN OBRA CON F'C=200 KG/CM2 AGREGADO DE 3/4", INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	ML	3.65	\$ 671.88	\$ 2,452.36	3.65	3.65	0.00	0.00	\$ -	
GP510	APLANADO FINO CON MORTERO CEMENTO ARENA, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	M2	147.48	\$ 286.24	\$ 42,214.68	147.48	147.48	0.00	0.00	\$ -	
*TEMP1	SUMINISTRO Y COLOCACION DE VIGA IPR, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	1.00	\$ 8,635.08	\$ 8,635.08	1.00	1.00	0.00	0.00	\$ -	
4	AZOTEA										
GP828	IMPERMEABILIZACION A BASE DE DOS CAPAS DE IMPERMEABILIZANTE ACRILICO ELASTOMERICO 7 AÑOS MOD. SETTIMO MCA, IMPAC O SIMILAR CON MALLA DE REFUERZO, INCLUYE: LIMPIEZA DE LA SUPERFICIE, SELLADO Y RESANE DE GREYAS A BASE DE CEMENTO PLASTICO, FIBRA DE REFUERZO Y DOS CAPAS DE IMPERMEABILIZANTE.	M2	37.33	\$ 156.96	\$ 5,859.32	37.33	0.00	0.00	37.33	\$ 5,859.32	
GP829	PRETEL DE 40 CMS A BASE DE BLOCK 20x20x40 CMS, APARENTE ASENTADO CON MEZCLA MORTERO-ARENA 1:3 INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA DE 0.00 A 3.00 MTS. DE ALTURA.	ML	26.30	\$ 406.96	\$ 10,703.05	26.30	26.30	0.00	0.00	\$ -	
GP830	CHAPLAN CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3 EN AZOTEA DE SECCION 15 X 15 CM. INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	ML	26.30	\$ 171.34	\$ 4,506.24	26.30	26.30	0.00	0.00	\$ -	

ELABORO

C. MANUEL URIARTE BELTRAN
REPRESENTANTE LEGALING. JOSE RODOLFO CONTRERAS LÓPEZ
COSTOS Y PRESUPUESTOSING. ROBERTO RIVERO RAMOS
DIRECTOR DE O. P. D. U. Y E.



DESGLASE

FECHA: 06/02/2025

CONTRATISTA: MANUEL URIARTE BELTRAN.

DEPENDENCIA:

AYUNTAMIENTO DE BADIRAGUATO

DOMICILIO: Calle Andrio 4993, Fraccionamiento Villas del Cedro Entre Boulevard Bologna y Circuito Salerno C.P.80058

R.F.C.

UIBM811007HY3

DESGLASE DE CONCEPTOS DE ESTIMACIÓN

LOCALIDAD:

CIENEGA DE LOS LARA

ESTIMACIÓN:

02 NORMAL

DESCRIPCIÓN: CONSTRUCCIÓN DE BAÑOS PÚBLICOS UBICADOS A UN COSTADO DE TECHUMBRE EN LA COMUNIDAD DE CIENEGA DE LOS LARA, SINDICATURA DE CIENEGA DE LOS LARA, EN EL MUNICIPIO DE BADIRAGUATO, SINALOA.

IMPORTE DE OBRA SIN IVA: \$481,423.13

IMPORTE DE ANTICIPO DE OBRA: \$195,457.79

IMPORTE TOTAL DE CONTRATO:

\$558,450.83

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	SEGUN PROYECTO			VOLUMEN TOTAL ESTIMADO	HASTA ESTIM ANTERIOR	EXCEDENTE	DE ESTA ESTIMACIÓN	IMPORTE
			CANT	P.U.	TOTAL					
5	PUERTAS Y VENTANAS									
GP252	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PUERTA LAMINADA DE 0.90 MTS X 2.10 MTS, INCLUYE: MARCO, CHAPA, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	2.00	\$ 4,852.93	\$ 9,905.86	2.00	0.00	0.00	2.00	\$ 9,905.86
GP225	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE VENTANA DE ALUMINIO DE 2" NATURAL Y CRISTAL DE 6MM, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, INSTALACIÓN HERRAMIENTA Y EQUIPO.	M2	2.20	\$ 2,742.31	\$ 6,033.08	2.20	0.00	0.00	2.20	\$ 6,033.08
6	ACABADOS									
GP357	APLICACIÓN DE REDIMIX EN PLAFON, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	M2	29.09	\$ 83.19	\$ 2,420.09	29.09	29.09	0.00	0.00	\$ -
GP158	PINTURA VINÍLICA EN MUROS Y PLAFONES, MARCA BEREL (BERELINTE) O SIMILAR, INCLUYE: PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, APLICACIÓN DE SELLADOR, DOS MANOS DE PINTURA, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	M2	63.90	\$ 82.39	\$ 5,264.72	63.90	0.00	0.00	63.90	\$ 5,264.72
GPB10	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE JUNQUILLO DE ALUMINIO EN MURO INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, RECORTES, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO	ML	7.00	\$ 256.01	\$ 1,792.07	0.00	0.00	0.00	0.00	\$ -
GPB20	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MAMPARAS PARA BAÑOS DE CANCELERIA INCLUYE: CHAPA, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	3.00	\$ 8,987.64	\$ 26,962.92	3.00	0.00	0.00	3.00	\$ 26,962.92
GPB21	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MAMPARAS PARA MINGITORIOS DE BAÑOS DE CANCELERIA INCLUYE: CHAPA, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	2.00	\$ 3,377.29	\$ 6,754.58	2.00	0.00	0.00	2.00	\$ 6,754.58
GPB01	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PISO RAINFOREST GRAY DE 20X60 CMS ASENTADO CON ADHESIVO PARA PISO PORCELANICO CON EMBOQUILLADOR INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, RECORTES, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	33.29	\$ 722.29	\$ 24,045.03	33.29	0.00	0.00	33.29	\$ 24,045.03
GPB02	SUMINISTRO Y COLOCACION DE AZULEJO LUCENTIA NERO SUPREMO DE 40X60 CMS ASENTADO CON ADHESIVO PARA PISO PORCELANICO CON EMBOQUILLADOR INCLUYE:	M2	22.80	\$ 682.57	\$ 15,562.60	22.80	0.00	6.70	22.80	\$ 15,562.60
GPB03	SUMINISTRO Y COLOCACION DE AZULEJO LUCENTIA CALACATTA SUPREMO DE 40X60 CMS ASENTADO CON ADHESIVO PARA PISO PORCELANICO CON EMBOQUILLADOR	M2	63.68	\$ 682.57	\$ 43,466.06	63.68	0.00	0.00	63.68	\$ 43,466.06
GPB04	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PLAFON ARREBOL NOCE SUPREMO DE 20X60 CMS ASENTADO CON ADHESIVO PARA PISO PORCELANICO CON EMBOQUILLADOR INCLUYE:	M2	3.08	\$ 669.31	\$ 4,069.40	6.08	0.00	0.00	6.08	\$ 4,069.40
GPB26	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ESPEJO DE 1,5X0.80 CMS INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	2.00	\$ 5,675.06	\$ 11,350.12	2.00	0.00	0.00	2.00	\$ 11,350.12
7	INSTALACIONES HIDROSANITARIAS									
GP238	SALIDA SANITARIA PARA WC CON TUBERÍA DE 4" SANITARIA HASTA REGISTRO SANITARIO, INCLUYE: CODOS, COPLES, MATERIALES, MANO DE OBRA, INSTALACIÓN	SAL	3.00	\$ 660.16	\$ 1,980.48	3.00	3.00	0.00	0.00	\$ -
GP240	SALIDA SANITARIA PARA LAVABO CON TUBERÍA DE 2" SANITARIA HASTA REGISTRO SANITARIO, INCLUYE: CODOS, COPLES, MATERIALES, MANO DE OBRA, INSTALACIÓN	SAL	4.00	\$ 623.53	\$ 2,494.12	4.00	4.00	0.00	0.00	\$ -
GP241	TUBO VENTILA CON TUBERÍA DE 2" SANITARIA, INCLUYE: CODOS, COPLES, MATERIALES, MANO DE OBRA, INSTALACIÓN HERRAMIENTA Y EQUIPO.	SAL	3.00	\$ 319.91	\$ 959.73	3.00	3.00	0.00	0.00	\$ -
GP246	ALIMENTACIÓN HIDRÁULICA PARA MUEBLE SANITARIO CON TUBERÍA DE CPVC AZUL DE 1/2" DESDE RAMALES, INCLUYE: TUBERÍA, COPLES, CODOS, ADAPTADOR MACHO CON INSERTO DE METAL, LLAVE DE CONTROL, MATERIALES, MANO DE OBRA, INSTALACIÓN HERRAMIENTA Y EQUIPO.	SAL	9.00	\$ 585.88	\$ 5,272.92	9.00	9.00	0.00	0.00	\$ -
GP248	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE WC, INCLUYE: WC, MANGUERA, ASIENTO, CUELLO DE CERA, MATERIALES, MANO DE OBRA, INSTALACIÓN, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	3.00	\$ 2,631.03	\$ 7,893.09	3.00	0.00	0.00	3.00	\$ 7,893.09
GP249	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LAVABO DE EMPOTRAR, INCLUYE: LAVABO, MANGUERA, MEZCLADORA DE 4", CESPOL, CONTRA DE PUSH, MATERIALES, MANO DE OBRA, INSTALACIÓN, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	4.00	\$ 2,922.04	\$ 11,688.16	4.00	0.00	0.00	4.00	\$ 11,688.16
GPB35	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MINGITORIO INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, INSTALACIÓN, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	2.00	\$ 4,733.73	\$ 9,467.46	2.00	0.00	0.00	2.00	\$ 9,467.46
GP250	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ROTOPLAS DE 1100 LTS, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	1.00	\$ 5,193.47	\$ 5,193.47	1.00	0.00	0.00	1.00	\$ 5,193.47

ELABORO

C. MANUEL URIARTE BELTRAN
REPRESENTANTE LEGALING. JOSE RODOLFO CONTRERAS LÓPEZ
COSTOS Y PRESUPUESTOSAUTORIZA
ING. LUIS RINCÓN RAMOS
DIRECTOR DE O.P.D.U.Y.E.



DESGLOSE

FECHA: 06/02/2025

CONTRATISTA: MANUEL URIARTE BELTRAN.

DEPENDENCIA:

AYUNTAMIENTO DE BADIRAGUATO

DOMICILIO: Calle Andrio 4993, Fraccionamiento Villas del Cedro Entre Boulevard Bologna y Circuito Salerno C.P.80058

R.F.C.

UBM811907HY3

DESGLOSE DE CONCEPTOS DE ESTIMACIÓN

DESCRIPCIÓN:

CONSTRUCCIÓN DE BAÑOS PÚBLICOS UBICADOS A UN COSTADO DE TECHUMBRE EN LA COMUNIDAD DE CIENEGA DE LOS LARA, SINDICATURA DE CIENEGA DE LOS LARA, EN EL MUNICIPIO DE BADIRAGUATO, SINALOA.

LOCALIDAD:

CIENEGA DE LOS LARA

ESTIMACIÓN:

02 NORMAL

IMPORTE DE OBRA SIN IVA: \$481,423.13

IMPORTE DE ANTICIPO DE OBRA:

\$195,457.79

IMPORTE TOTAL DE CONTRATO:

\$558,450.83

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	SEGUN PROYECTO			VOLUMEN TOTAL ESTIMADO	HASTA ESTIM ANTERIOR	EXCEDENTE	DE ESTA ESTIMACIÓN	IMPORTE
			CANT	P.U.	TOTAL					
8	INSTALACIONES ELÉCTRICAS									
GPBEL01	SALIDA PARA DE ALUMBRADO CON POLIFLEX DE 1/2", CABLE CAL.12; INCLUYE: ROSETA Y FOCO, MATERIALES, CABLEADO, DESPERDICIOS, PRUEBAS, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU	SAL	12.00	\$ 988.50	\$ 11,862.00	12.00	12.00	0.00	0.00	\$ -
GP888	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LAMPARAS DE SOBREPONER EN PLAFON, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	12.00	\$ 508.59	\$ 6,103.08	12.00	0.00	0.00	12.00	\$ 6,103.08
GP340	SALIDA PARA APAGADOR CON POLIFLEX DE 1/2", CABLE CAL.12; INCLUYE: MATERIALES, CABLEADO, DESPERDICIOS, PRUEBAS, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO	SAL	3.00	\$ 847.85	\$ 2,543.85	3.00	3.00	0.00	0.00	\$ -
GP226	SALIDA ELÉCTRICA PARA CONTACTO A BASE DE POLIDUCTO DE 13 MM., CON UN DESARROLLO DE 10 M, CON CABLE THW CAL. 12 Y 14 DESNUDO, LÍNEA ECONÓMICA, CON	SAL	4.00	\$ 1,078.18	\$ 4,312.72	4.00	4.00	0.00	0.00	\$ -
GP178	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CENTRO DE CARGA Q8, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	1.00	\$ 1,795.17	\$ 1,795.17	1.00	1.00	0.00	0.00	\$ -
GP180	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE INTERRUPTOR DE 1X20 SQUARD, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	1.00	\$ 475.73	\$ 475.73	1.00	1.00	0.00	0.00	\$ -
								SUB-TOTAL		\$ 199,618.95
								IVA		\$ 31,939.03
								MONTO TOTAL		\$ 231,557.98

ELABORO

C. MANUEL URIARTE BELTRAN
REPRESENTANTE LEGAL

ING. JOSE RODOLFO CONTRERAS LÓPEZ
COSTOS Y PRESUPUESTOS

ING. RUBÉN RINCÓN RAMOS
DIRECTOR DE O.P.D.U.Y.E.



CONTRATISTA:
MANUEL URIARTE BELTRAN.

FECHA DEPENDENCIA:
Jueves, 6 de febrero de 2025
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA, AYUNTAMIENTO DE BADRAGUATO.

CONTRATISTA:
MANUEL URIARTE BELTRAN.

R.F.C.:
URBM611007HY3

OBRA:
CONSTRUCCIÓN DE BAÑOS PÚBLICOS UBICADOS A UN COSTADO DE TECHUMBRE EN LA COMUNIDAD DE CIÉNEGA DE LOS LARA, SINDICATURA DE CIÉNEGA DE LOS LARA, EN EL MUNICIPIO DE BADRAGUATO, SINALOA.

ESTIMACION
02 NORMAL

GENERADORES DE ESTIMACION


CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANT	LARGO	ANCHO	ESPESOR	ACUMULADO		OBSERVACIONES
							PARCIAL	TOTAL	
4	AZOTEA								
GP826	IMPERMEABILIZACION A BASE DE DOS CAPAS DE IMPERMEABILIZANTE ACRILICO ELASTOMERICO 7 AÑOS MOD. SETTIMO MCA, IMPAC O SIMILAR CON MALLA DE REFUERZO, INCLUYE: LIMPIEZA DE LA SUPERFICIE, SELLADO Y RESANE DE GRIETAS A BASE DE CEMENTO PLASTICO, FIBRA DE REFUERZO Y DOS CAPAS DE IMPERMEABILIZANTE.	M2		FRENTE	LATERAL	TOTAL		37.33	VER EN CROQUIS
				6.85	5.45	37.33			
							37.33	TOTAL	
5	ACABADOS								
GP252	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PUERTA LAMINADA DE 0.90 MTS X 2.10 MTS, INCLUYE: MARCO, CHAPA, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA		BAÑOS H	BAÑOS M		TOTAL	2.00	TOTAL
				1.00	1.00		2.00	0.00	ADICIONAL
							2.00	EST. ESTIMACION	
GP225	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE VENTANA DE ALUMINIO DE 2" NATURAL Y CRISTAL DE 6MM, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, INSTALACIÓN HERRAMIENTA Y EQUIPO.	M2		VENTANA BAÑOS H	VENTANA BAÑOS M	TOTAL		2.20	TOTAL
				1.10	1.10	2.20		-	ADICIONAL
							2.20	EST. ESTIMACION	
6	ACABADOS								
GP156	PINTURA VINÍLICA EN MUROS Y PLAFONES, MARCA BEREL (BERELINTE) O SIMILAR, INCLUYE: PREPARACION DE LA SUPERFICIE, APLICACIÓN DE SELLADOR, DOS MANOS DE PINTURA, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	M2		FACHADA PRINCIPAL	FACHADA POSTERIOR	LATERALES	PRETIL PARTE INTERIOR	63.90	TOTAL
				11.20	18.5	34.2			ADICIONAL
						TOTAL	63.90	63.90	EST. ESTIMACION
GP820	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MAMPARAS PARA BAÑOS DE CANCELERIA INCLUYE: CHAPA, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA		BAÑOS H	BAÑOS M		TOTAL	3.00	VER EN CROQUIS
				1.00	2.00		3.00	3.00	TOTAL
							2.00	TOTAL	
GP821	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MAMPARAS PARA MINGITORIOS DE BAÑOS DE CANCELERIA INCLUYE: CHAPA, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA		BAÑOS H	BAÑOS M	TOTAL		2.00	TOTAL
				1.00	1.00	2.00		-	ADICIONAL
							2.00	EST. ESTIMACION	
GP801	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PISO RAINFOREST GRAY DE 20X60 CMS ASENTADO CON ADHESIVO PARA PISO PORCELANICO CON EMBOQUILLADOR INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, RECORTES, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2					TOTAL	33.29	VER EN CROQUIS
							33.29		
							33.29	EST. ESTIMACION	
GP801	SUMINISTRO Y COLOCACION DE AZULEJO LUCENTIA NERO SUPREMO DE 40X60 CMS ASENTADO CON ADHESIVO PARA PISO PORCELANICO CON EMBOQUILLADOR INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, RECORTES, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2		BAÑOS H	BAÑOS M	ACCESO	TOTAL		VER EN CROQUIS
				6.30	5.49	17.71	29.50	29.50	TOTAL
							6.70	ADICIONAL	

ELABORO

ARQ. MANUEL URIARTE BELTRAN
REPRESENTANTE LEGAL

ARQ. BRICEIDA GUADALUPE NEBLAS MARTINEZ
SUPERVISOR

ING. RUBEN RINCON RAMOS
DIRECTOR DE OPUYE

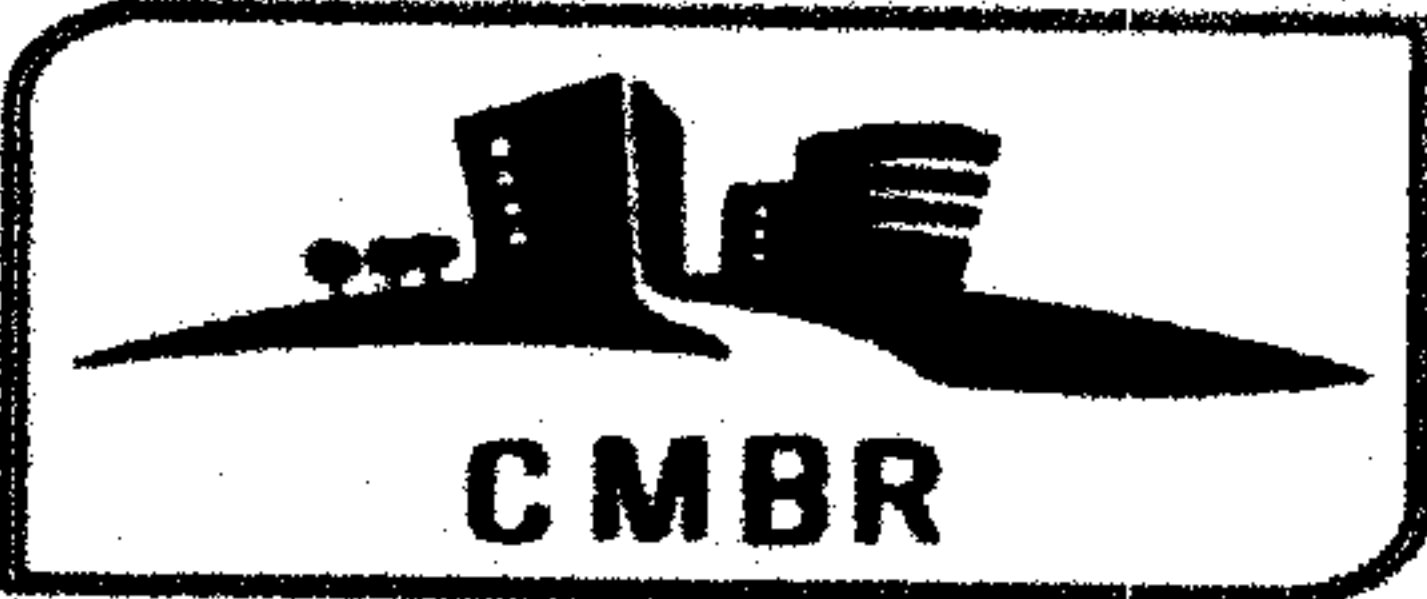

CONTRATISTA:

MANUEL URIARTE BELTRAN.

FECHA

DEPENDENCIA:

jueves, 6 de febrero de 2025

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA, AYUNTAMIENTO DE BADRAGUATO.

CONTRATISTA:

MANUEL URIARTE BELTRAN.

R.F.C.

UIBM811007HY3

OBRA:

CONSTRUCCIÓN DE BAÑOS PÚBLICOS UBICADOS A UN COSTADO DE TECHUMBRE EN LA COMUNIDAD DE CIENEGA DE LOS LARA, SINDICATURA DE CIENEGA DE LOS LARA, EN EL MUNICIPIO DE BADRAGUATO, SINALOA.

ESTIMACION

02 NORMAL

GENERADORES DE ESTIMACION

								22.80	EST. ESTIMACION
GPB03	SUMINISTRO Y COLOCACION DE AZULEJO LUCENTIA CALACATTA SUPREMO DE 40X60 CMS ASENTADO CON ADHESIVO PARA PISO PORCELANICO CON EMBOQUILLADOR INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, RECORTES, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2		BAÑOS H	BAÑOS M		TOTAL	63.68	TOTAL
				42.16	21.52		63.68	-	ADICIONAL
								63.68	EST. ESTIMACION
GPB04	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PLAFON ARREBOL NOCE SUPREMO DE 20X60 CMS ASENTADO CON ADHESIVO PARA PISO PORCELANICO CON EMBOQUILLADOR INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, RECORTES, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA		LARGO	ANCHO	TOTAL		6.08	VER EN CROQUIS
				5.15	1.18	6.08		6.08	TOTAL
GPB26	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ESPEJO DE 1.5X0.60 CMS INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA		BAÑOS H	BAÑOS M	TOTAL		2.00	TOTAL
				1.00	1.00	2.00		2.00	EST. ESTIMACION

ELABORO


ARQ. MANUEL URIARTE BELTRAN
REPRESENTANTE LEGAL

SUPERVISOR

ARQ. BRICEIDA GUADALUPE NIEBLAS MARTINEZ
SUPERVISOR

AUTORIZO

ING. RUBEN RINCON RAMOS
DIRECTOR DE OPUYE

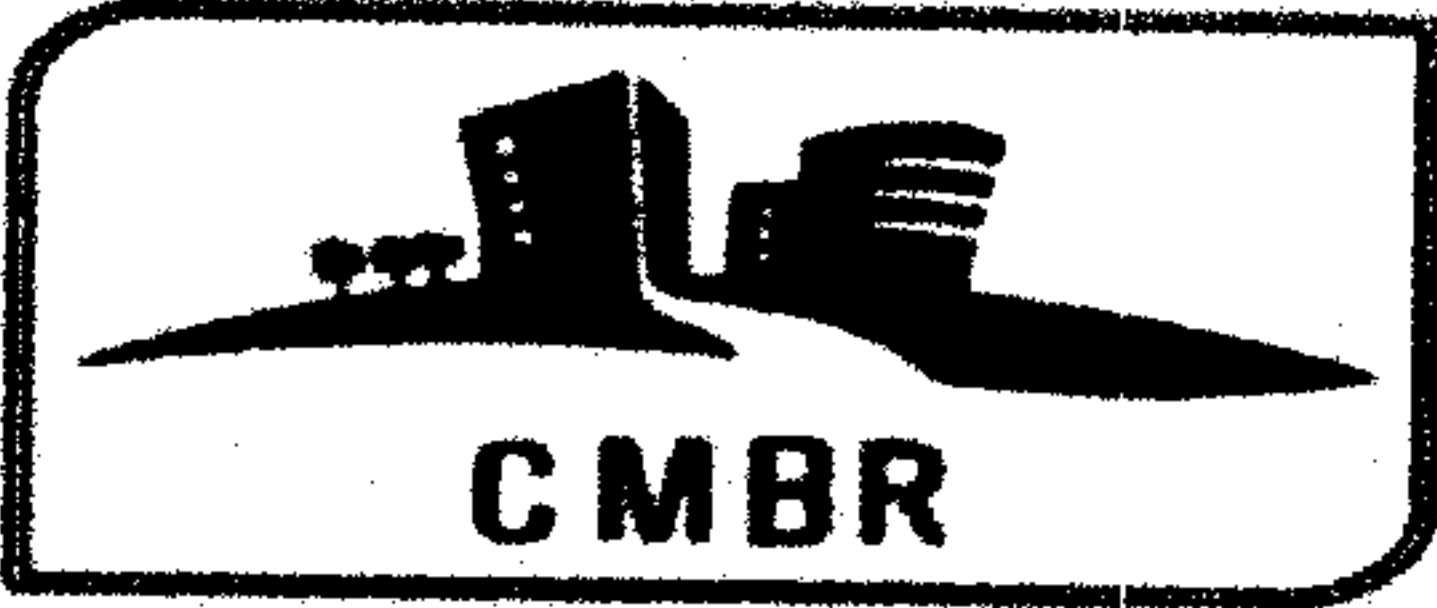

CONTRATISTA:

MANUEL URIARTE BELTRAN.

FECHA:

lunes, 6 de febrero de 2025

DEPENDENCIA:

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA, AYUNTAMIENTO DE BADRAGUATO.

CONTRATISTA:

MANUEL URIARTE BELTRAN.

R.F.C.

UIBM811007HY3

OBRA:

CONSTRUCCIÓN DE BAÑOS PÚBLICOS UBICADOS A UN COSTADO DE TECHUMBRE EN LA COMUNIDAD DE CIÉNEGA DE LOS LARA, SINDICATURA DE CIÉNEGA DE LOS LARA, EN EL MUNICIPIO DE BADRAGUATO, SINALOA.

ESTIMACIÓN

02 NORMAL

GENERADORES DE ESTIMACIÓN

7

INSTALACIONES HIDROSANITARIAS

GP248	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE W.C., INCLUYE: W.C, MANGUERA, ASIENTO, CUELLO DE CERA, MATERIALES, MANO DE OBRA, INSTALACIÓN, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA		BAÑOS H	BAÑOS M	TOTAL		3.00	TOTAL
				1.00	2.00	3.00		3.00	EST. ESTIMACIÓN
GP249	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LAVABO DE EMPOTRAR, INCLUYE: LAVABO, MANGUERA, MEZCLADORA DE 4", CESPOL, CONTRA DE PUSH, MATERIALES, MANO DE OBRA, INSTALACIÓN, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA		BAÑOS H	BAÑOS M		TOTAL	4.00	TOTAL
				2.00	2.00		4.00	4.00	EST. ESTIMACIÓN
GP835	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MINGITORIO INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, INSTALACIÓN, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA		BAÑOS H	TOTAL			2.00	TOTAL
				2.00	2.00			2.00	EST. ESTIMACIÓN
GP250	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ROTOPLAS DE 1100 LTS, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA			SOBRE AZOTEA	TOTAL		1.00	VER EN CROQUIS
						1.00		1.00	TOTAL

8

INSTALACIONES ELÉCTRICAS

GP888	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LAMPARAS DE SOBREPONER EN PLAFON, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA		BAÑOS H	BAÑOS M	TOTAL		12.00	VER EN CROQUIS
				6.00	6.00	12.00		12.00	TOTAL

ELABORO


ARQ. MANUEL URIARTE BELTRAN
REPRESENTANTE LEGAL

SUPERVISOR

ARQ. BRICEIDA GUADALUPE NEBLAS MARTINEZ
SUPERVISOR

AUTORIZO

ING. RUBEN RINCÓN RAMOS
DIRECTOR DE OPUYE

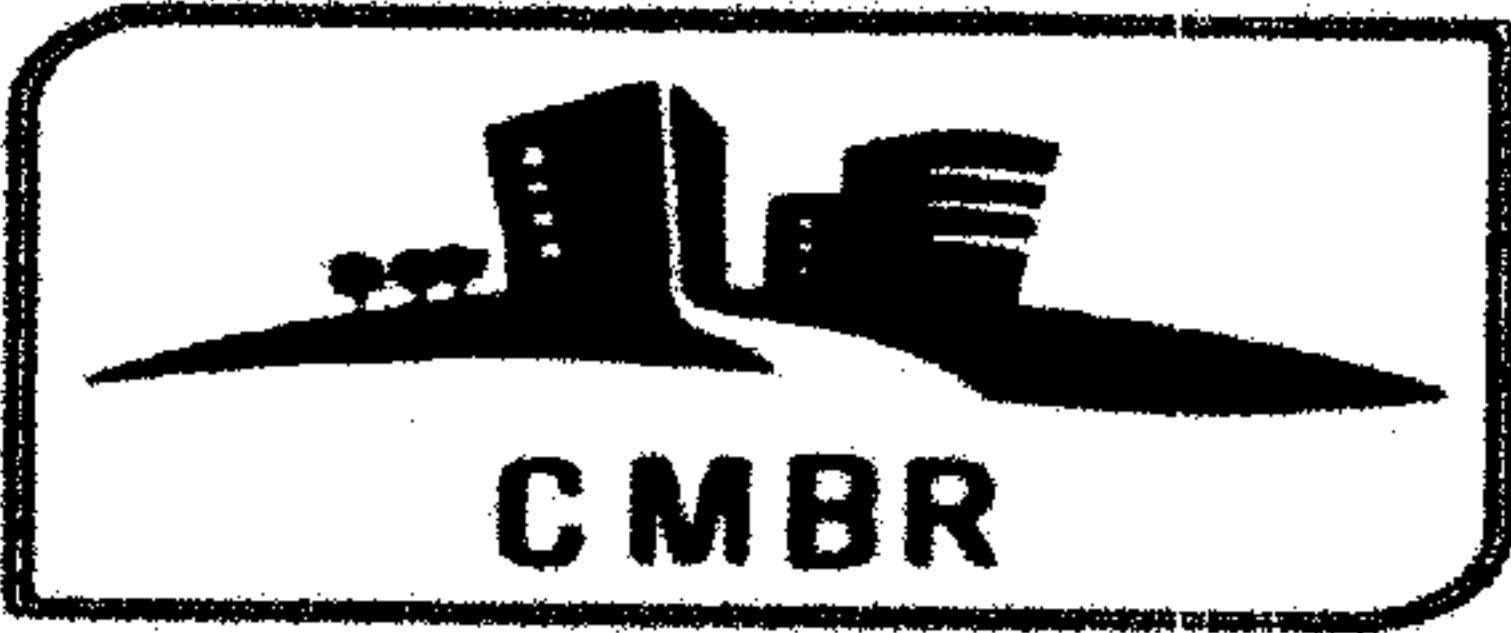

CONTRATISTA:
MANUEL URIARTE BELTRAN.

FECHA:
Jueves, 8 de febrero de 2025

DEPENDENCIA:
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA,
AYUNTAMIENTO DE BADIRAGUATO.


DOMICILIO:
Calle Andrio 4993, Fraccionamiento Villas del Cedro Entre Boulevard Bolognia y Circuito
Salerno C.P.80058

R.F.C.
UIBM811007HY3

OBRA:
CONSTRUCCIÓN DE BAÑOS PÚBLICOS UBICADOS A UN COSTADO DE TECHUMBRE EN LA COMUNIDAD DE CIÉNEGA DE LOS LARA,
SINDICATURA DE CIÉNEGA DE LOS LARA, EN EL MUNICIPIO DE BADIRAGUATO, SINALOA.

CROQUIS ESTIMACION:

CLAVE	CONCEPTO
AZOTEAS	
GP228	IMPERMEABILIZACION A BASE DE DOS CAPAS DE IMPERMEABILIZANTE ACRILICO ELASTOMERICO 7 AÑOS MOD. SETTIMO MCA. IMPAC O SIMILAR CON MALLA DE REFUERZO, INCLUYE: LIMPIEZA DE LA SUPERFICIE, SELLADO Y RESANE DE GRIETAS A BASE DE CEMENTO PLASTICO, FIBRA DE REFUERZO Y
5	PUERTAS Y VENTANAS
GP252	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PUERTA LAMINADA DE 0.90 MTS X 2.10 MTS, INCLUYE: MARCO, CHAPA, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO
GP225	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE VENTANA DE ALUMINIO DE 2º NATURAL Y CRISTAL DE 6MM, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, INSTALACIÓN HERRAMIENTA Y EQUIPO.

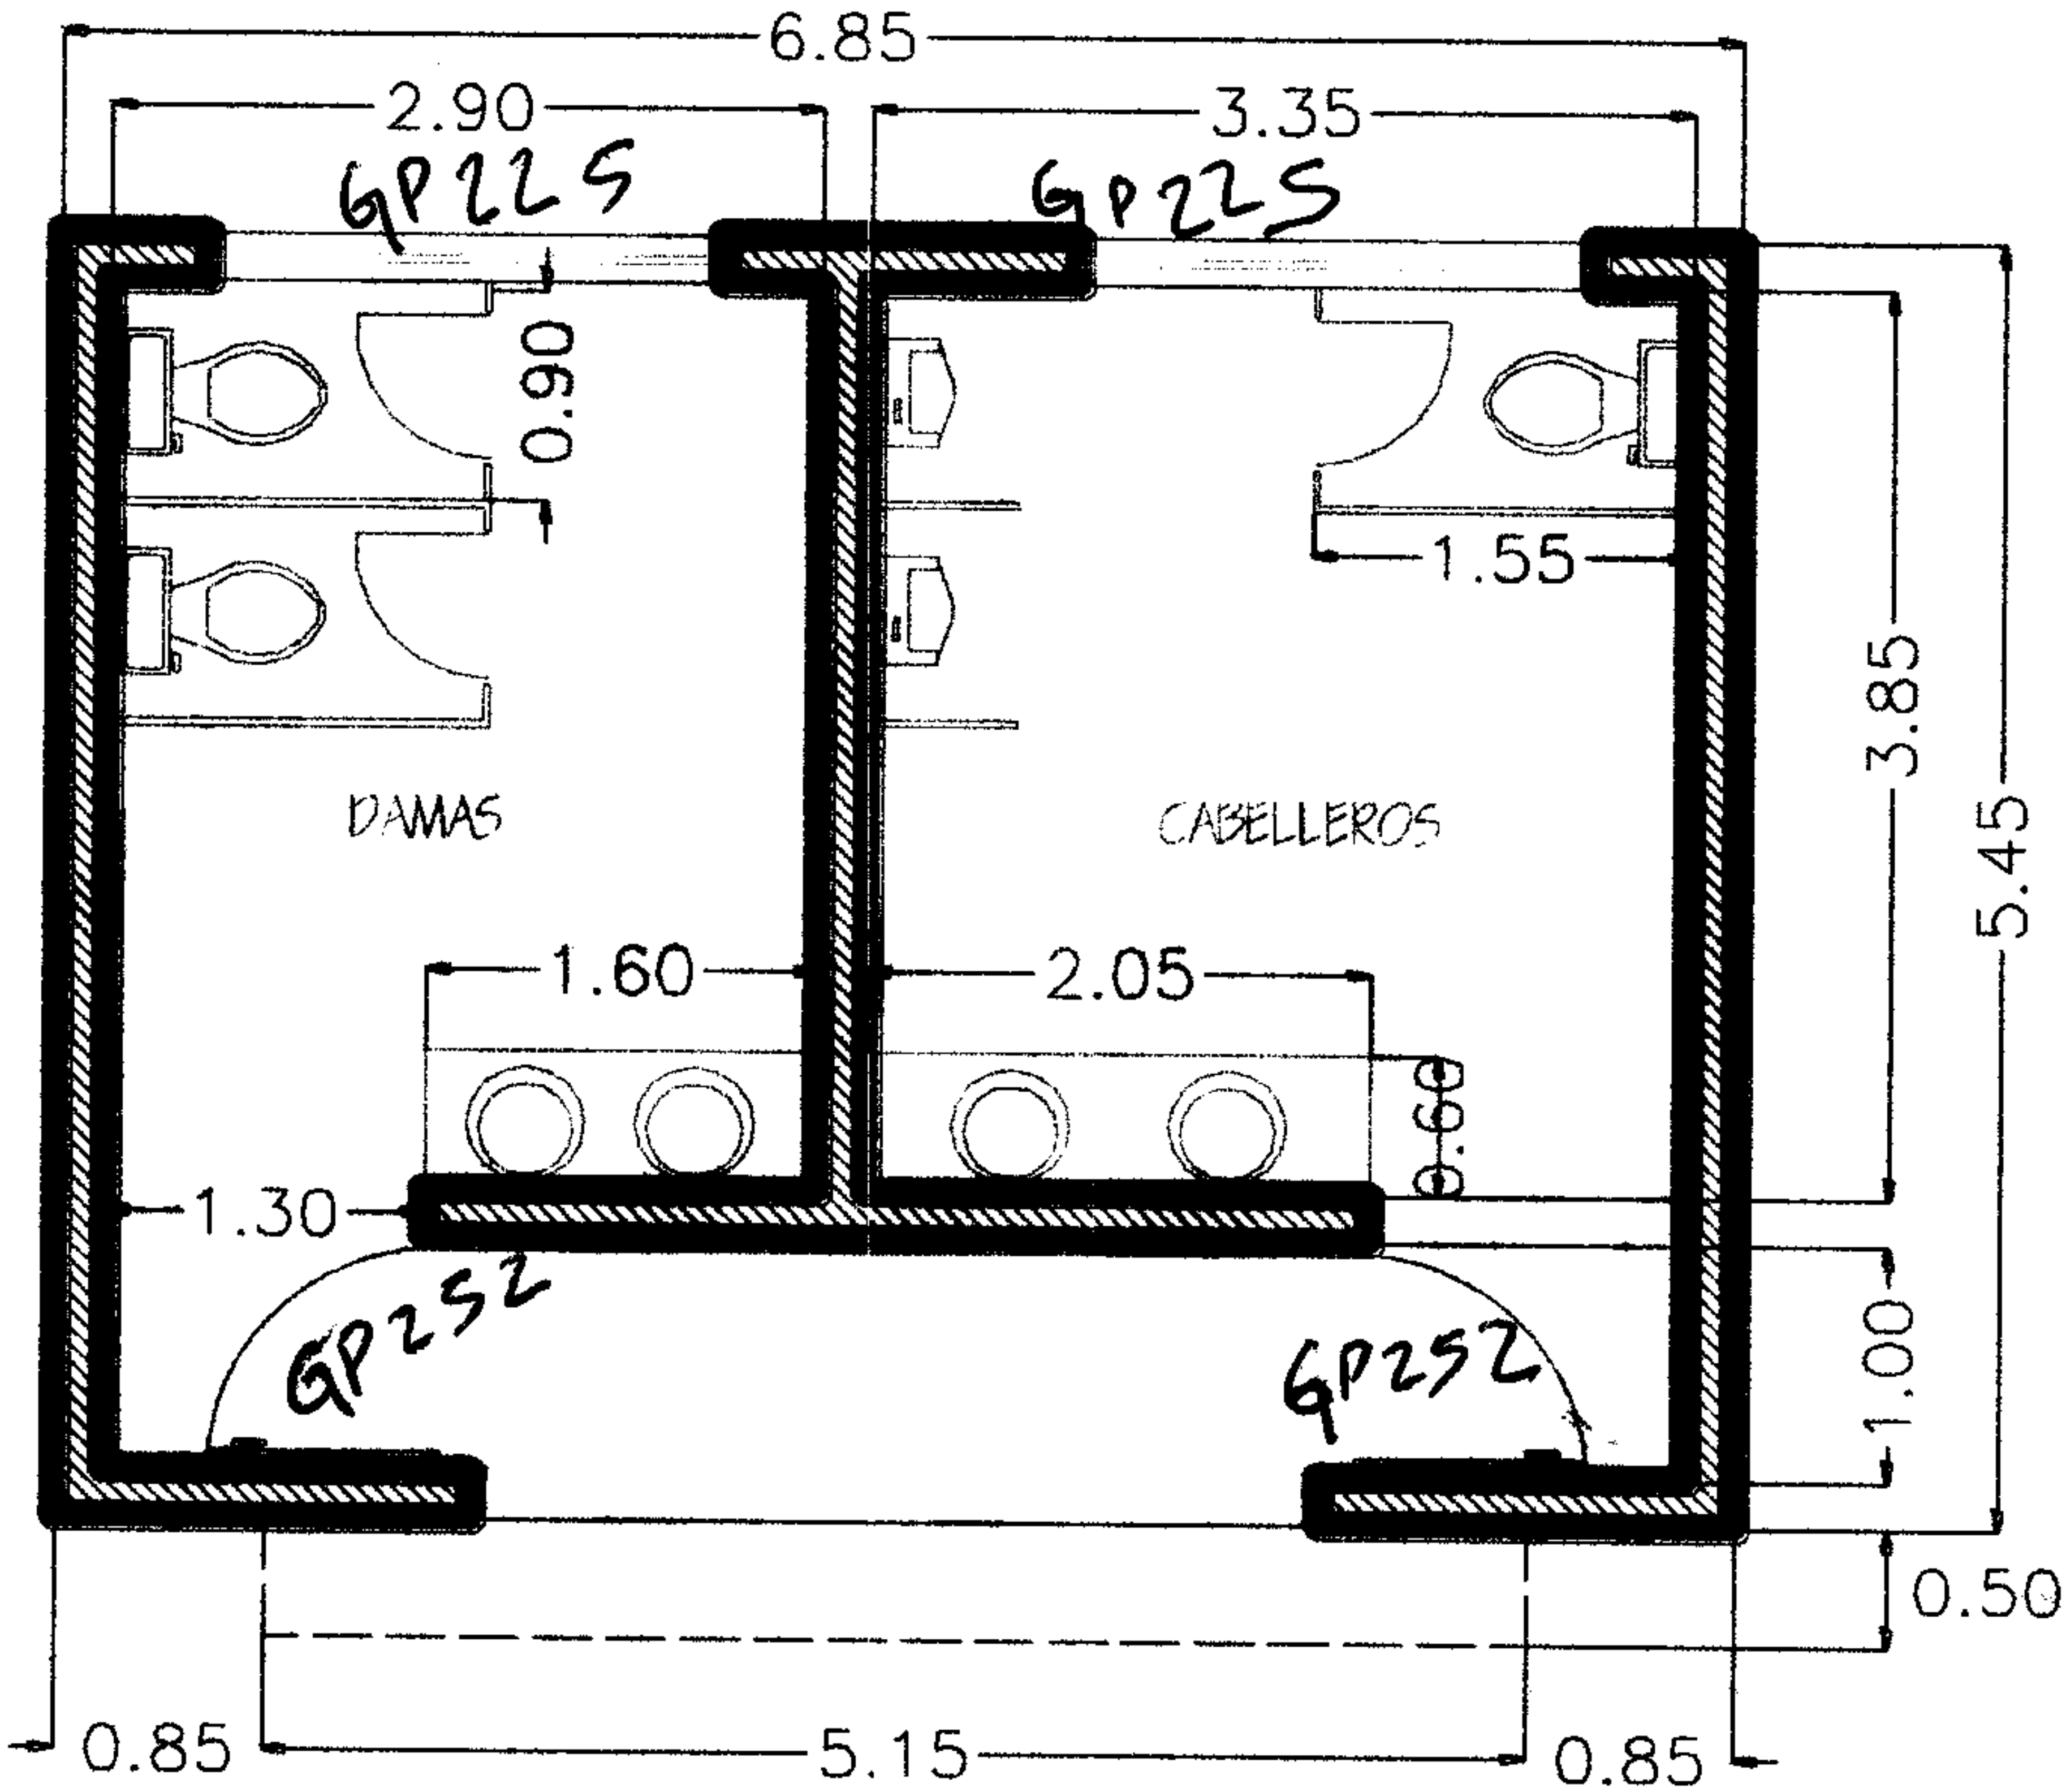

PLANTA ARQUITECTÓNICA

ELABORÓ:


C. MANUEL URIARTE BELTRAN
REPRESENTANTE LEGAL

REVISÓ:-

ARQ. BRICEIDA GUADALUPE NIEBLAS MARTINEZ
SUPERVISOR

AUTORIZÓ:

ING. RUBIEL RINCON RAMOS
DIRECTOR O. P. D. U. Y E.

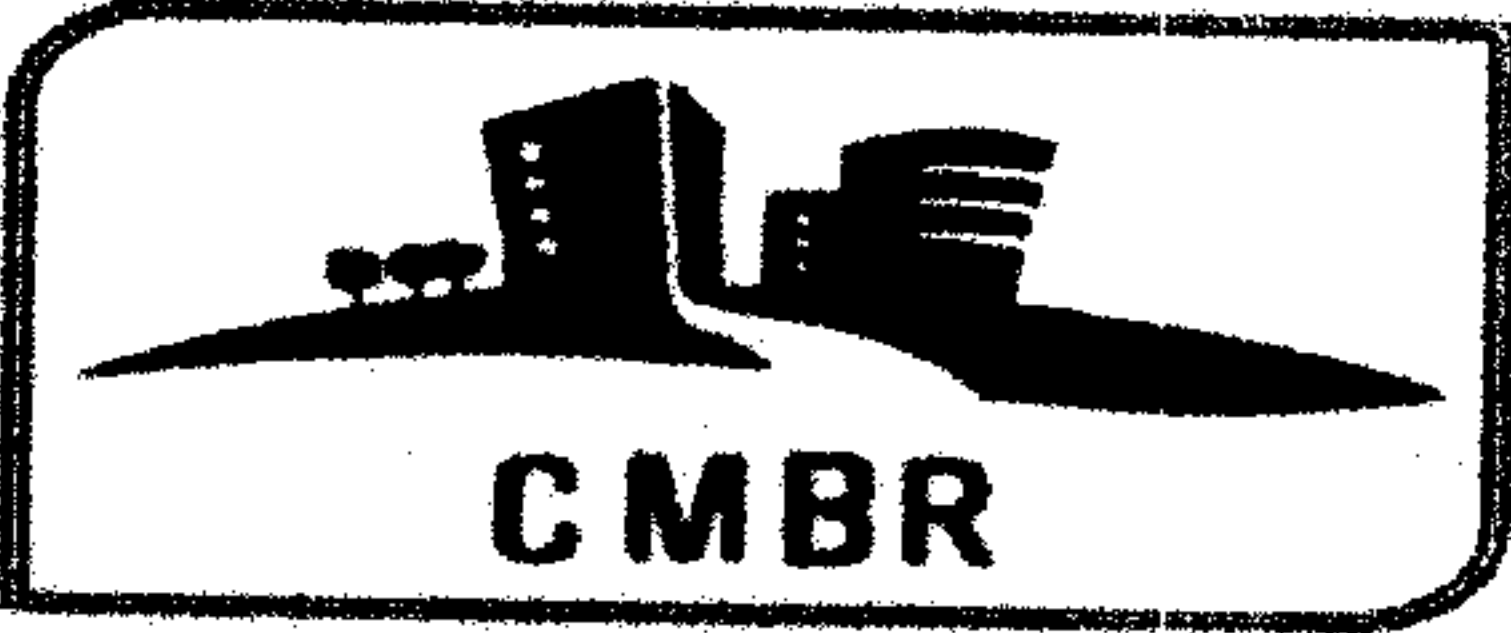

CONTRATISTA:

MANUEL URIARTE BELTRAN.

DOMICILIO:

Calle Andrio 4993, Fraccionamiento Villas del Cedro Entre Boulevard Bologna y Circuito Salermo C.P.80058

R.F.C. OBRAS:

UIBM811007HY3

CONSTRUCCIÓN DE BAÑOS PÚBLICOS UBICADOS A UN COSTADO DE TECHUMBRE EN LA COMUNIDAD DE CIÉNEGA DE LOS LARA, SINDICATURA DE CIÉNEGA DE LOS LARA, EN EL MUNICIPIO DE BADIRAGUATO, SINALOA.

FECHA:


jueves, 6 de febrero de 2025

DEPENDENCIA:

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA, AYUNTAMIENTO DE BADIRAGUATO.

CROQUIS ESTIMACION:

6	ACABADOS
GP156	PINTURA VINÍLICA EN MUROS Y PLAFONES, MARCA BEREL (BERELINTE) O SIMILAR, INCLUYE: PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, APLICACIÓN DE SELLADOR Y PINTURA.
GP820	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MAMPARAS PARA BAÑOS DE CANCELERIA INCLUYE: CHAPA, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.
GP821	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MAMPARAS PARA MINGITORIOS DE BAÑOS DE CANCELERIA INCLUYE: CHAPA, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.
GP801	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PISO RAINFOREST GRAY DE 20X60 CMS ASENTADO CON ADHESIVO PARA PISO PORCELANICO CON EMBOQUILLADOR.
GP802	SUMINISTRO Y COLOCACION DE AZULEJO LUCENTIA NERO SUPREMO DE 40X60 CMS ASENTADO CON ADHESIVO PARA PISO PORCELANICO CON EMBOQUILLADOR.
GP803	SUMINISTRO Y COLOCACION DE AZULEJO LUCENTIA CALACATTA SUPREMO DE 40X60 CMS ASENTADO CON ADHESIVO PARA PISO PORCELANICO CON EMBOQUILLADOR.
GP804	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PLAFON ARREBOL NOCE SUPREMO DE 20X60 CMS ASENTADO CON ADHESIVO PARA PISO PORCELANICO CON EMBOQUILLADOR.
GP826	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ESPEJO DE 1.5X0.60 CMS INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.

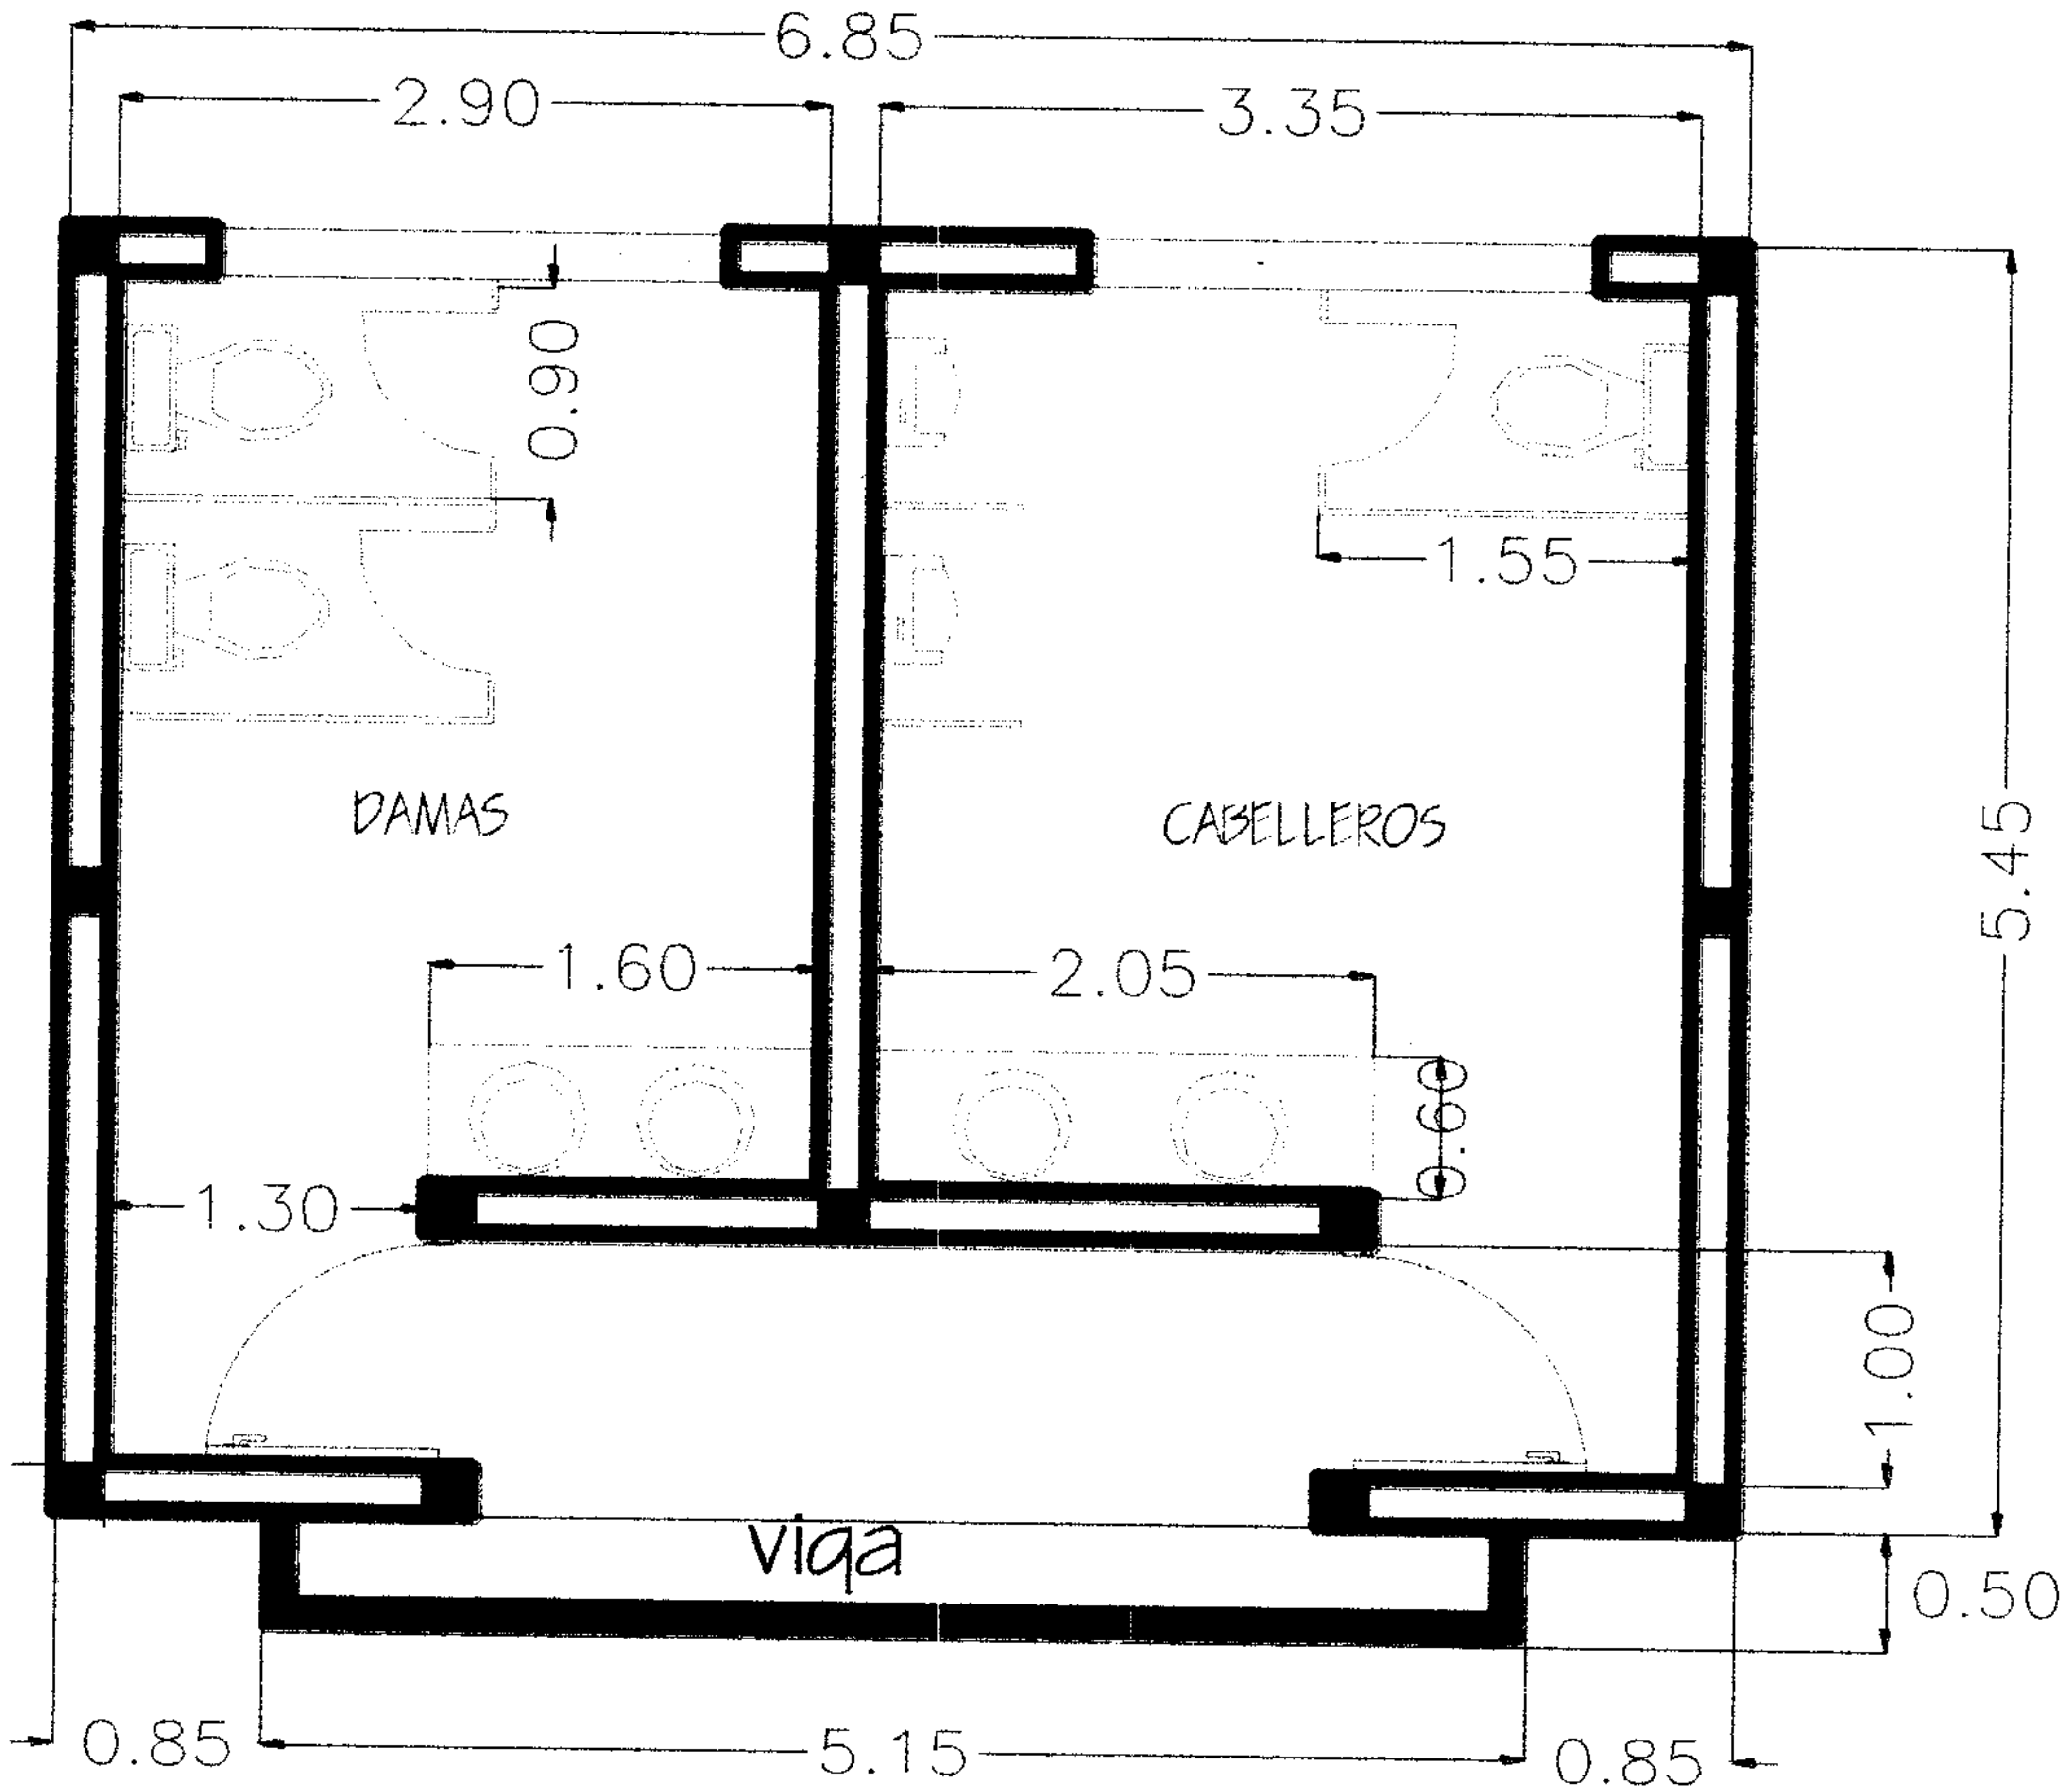

ELABORÓ:
C. MANUEL URIARTE BELTRAN
REPRESENTANTE LEGAL

REVISÓ:
ARQ. BRICEIDA GUADALUPE NIEBLAS MARTINEZ
SUPERVISOR

AUTORIZÓ:
ING. RUBEN RAMON RAMOS
DIRECTOR O.P.D.U. Y E.



CONTRATISTA:

MANUEL URIARTE BELTRAN.

FECHA:

Jueves, 5 de febrero de 2025

DEPENDENCIA:

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA,
AYUNTAMIENTO DE BADIRAGUATO.

DOMICILIO:

Calle Andrio 4893, Fraccionamiento Villas del Cedro Entre Boulevard Bolognia y Circuito
Salerno C.P.80058

R.F.C.:


UIBM811807HY3

OBRA:

CONSTRUCCIÓN DE BAÑOS PÚBLICOS UBICADOS A UN COSTADO DE TECHUMBRE EN LA COMUNIDAD DE CIÉNEGA DE LOS LARA,
SINDICATURA DE CIÉNEGA DE LOS LARA, EN EL MUNICIPIO DE BADIRAGUATO, SINALOA.

CROQUIS ESTIMACION:

7	INSTALACIONES HIDROSANITARIAS
GP248	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE WC , INCLUYE: WC, MANGUERA, ASIENTO, CUELLO DE CERA, MATERIALES, MANO DE OBRA, INSTALACIÓN, HERRAMIENTA Y EQUIPO.
GP249	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LAVABO DE EMPOTRAR, INCLUYE: LAVABO, MANGUERA, MEZCLADORA DE 4", CESPOL, CONTRA DE PUSH, MATERIALES, MANO DE OBRA, INSTALACIÓN, HERRAMIENTA Y EQUIPO.
GP835	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MINGITORIO INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, INSTALACIÓN, HERRAMIENTA Y EQUIPO.
GP250	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ROTOPLAS DE 1100 LTS, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.

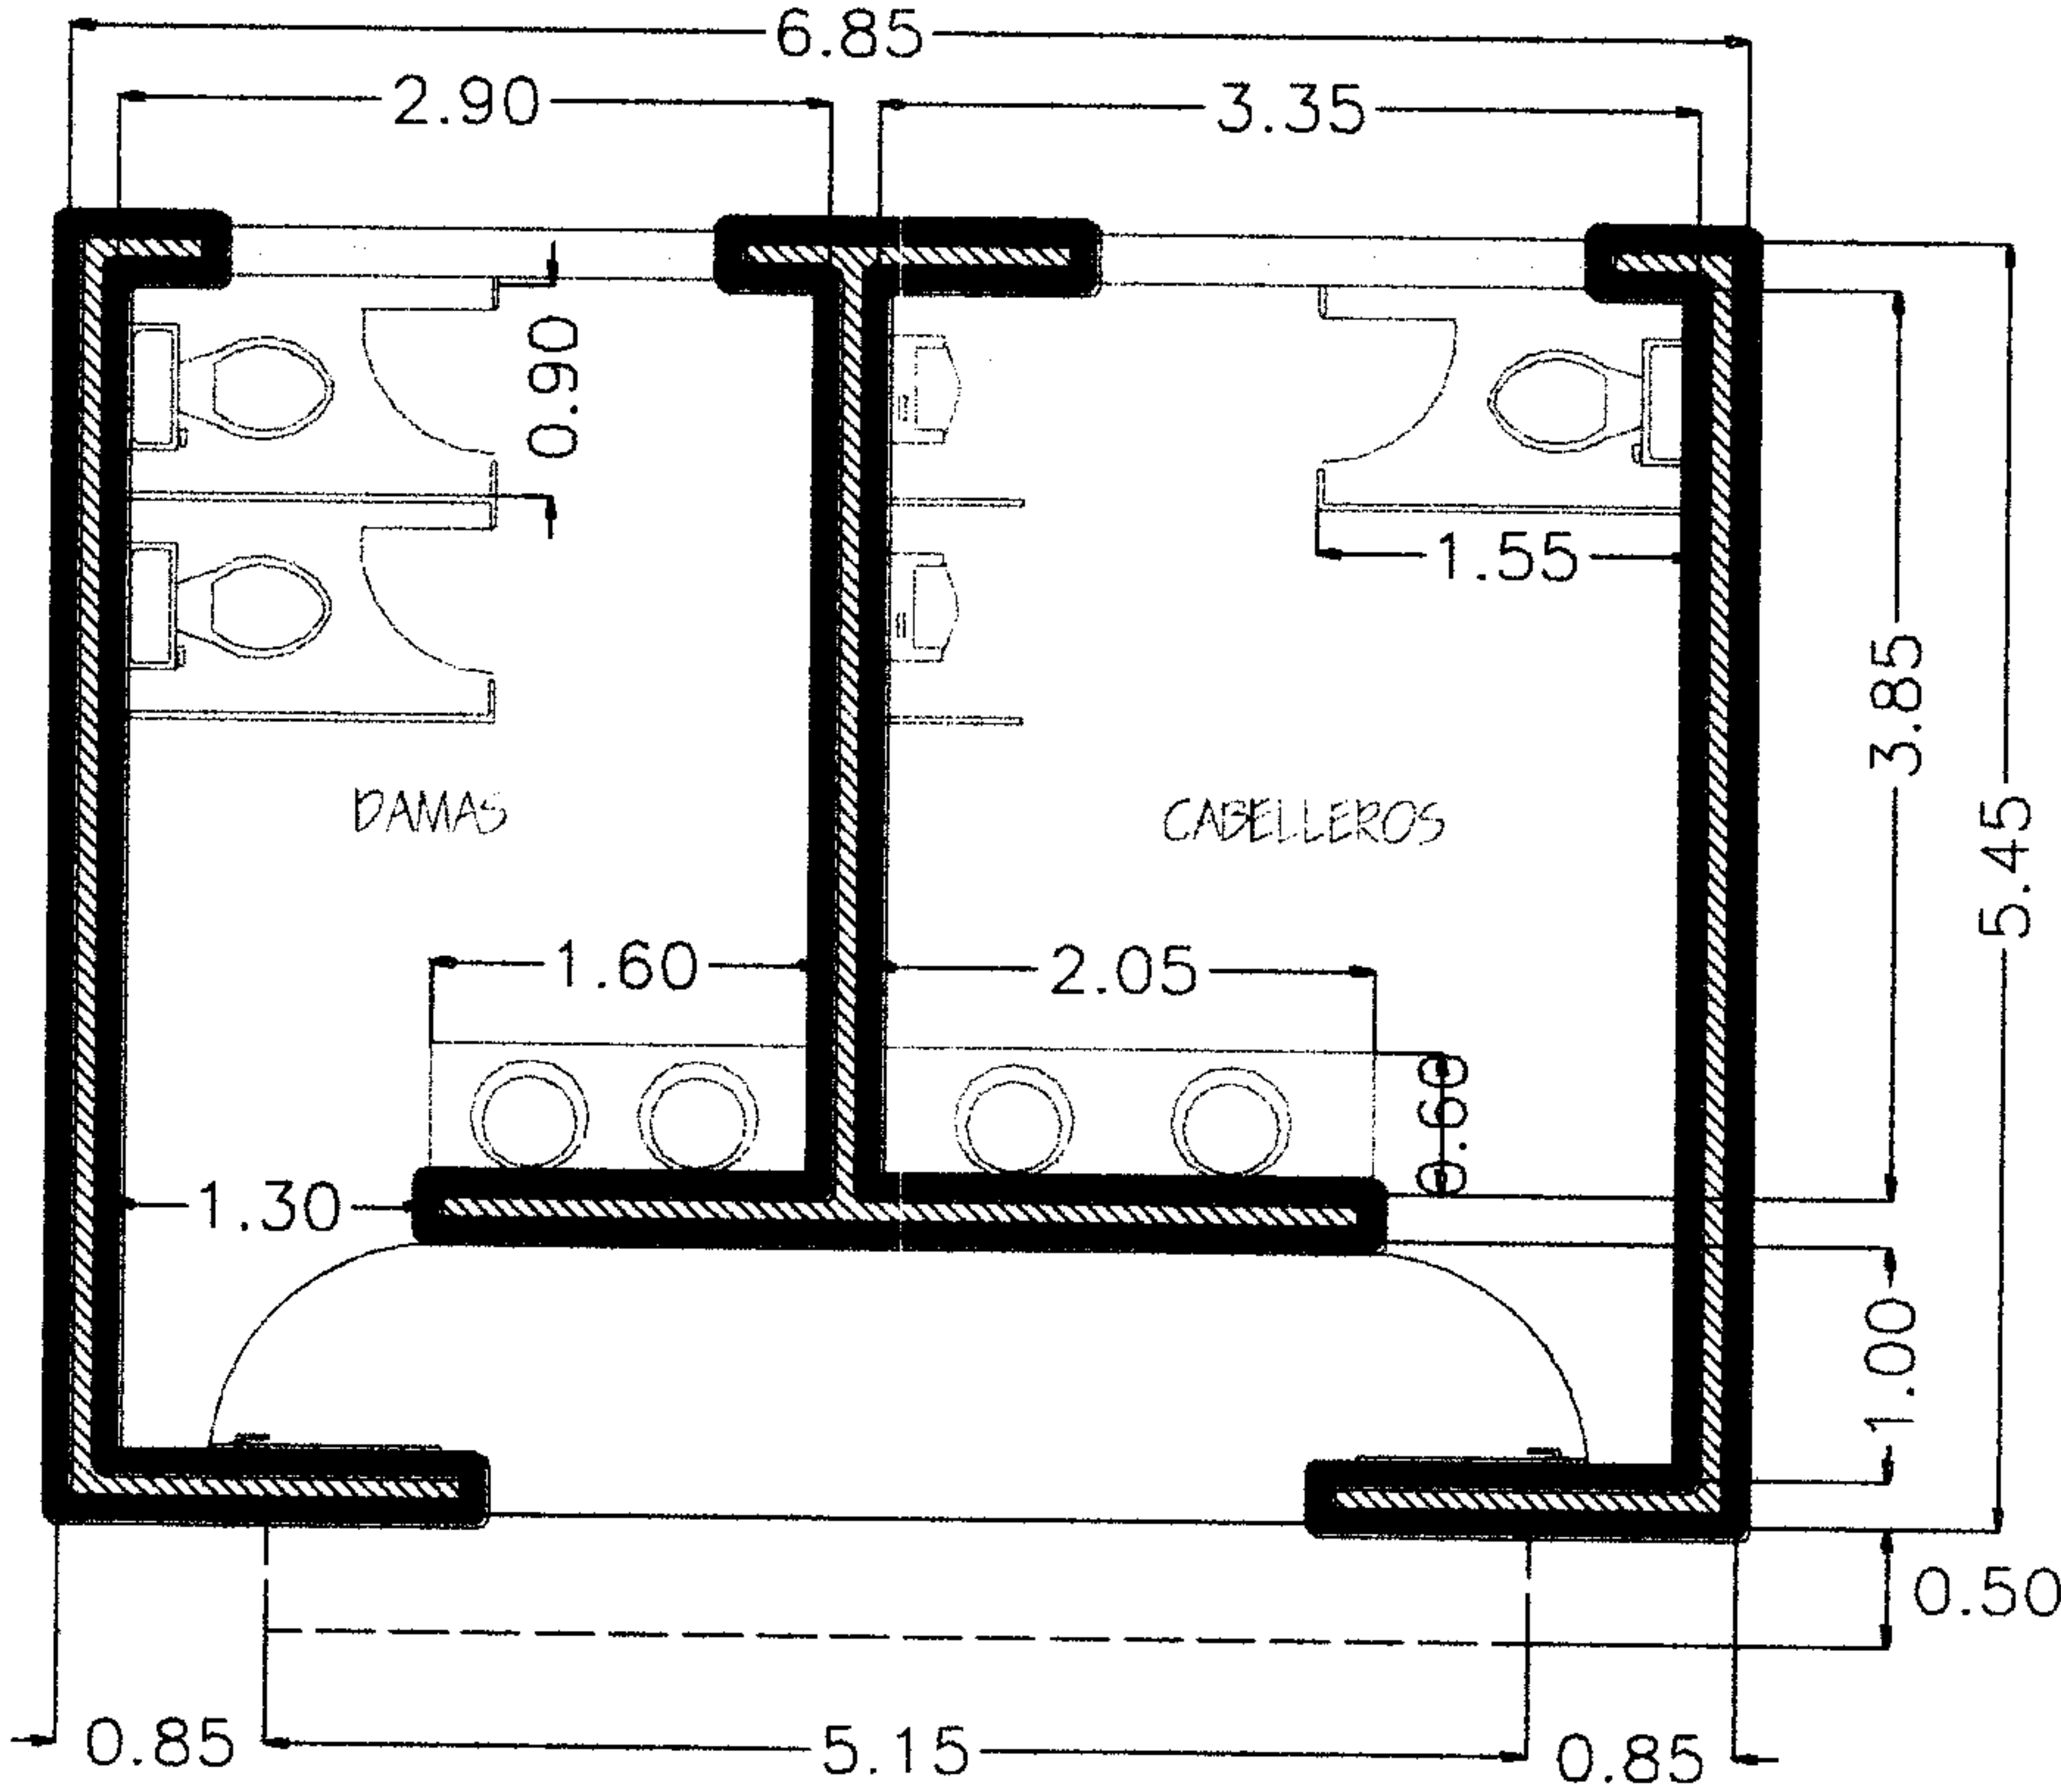


PLANTA ARQUITECTÓNICA

ELABORADO:
C. MANUEL URIARTE BELTRAN
REPRESENTANTE LEGAL

REVISÓ:-
ARQ. BRICEIDA GUADALUPE NIEBLAS MARTINEZ
SUPERVISOR

AUTORIZADO:-
ING. RUBÉN RINCON RAMOS
DIRECTOR G.P.D. U. Y. E.

 CMBR	
CONTRATISTA: MANUEL URIARTE BELTRAN.	
FECHA: Jueves, 8 de febrero de 2025	
DEPENDENCIA: DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA, AYUNTAMIENTO DE BADIRAGUATO.	
DOMICILIO:	Calle Andrio 4993, Fraccionamiento Villas del Cedro Entre Boulevard Bologna y Circuito
R.F.C.:	URBM811007HY3
OBRA:	CONSTRUCCIÓN DE BAÑOS PÚBLICOS UBICADOS A UN COSTADO DE TECHUMBRE EN LA COMUNIDAD DE CIÉNEGA DE LOS LARA, SINDICATURA DE CIÉNEGA DE LOS LARA, EN EL MUNICIPIO DE BADIRAGUATO, SINALOA.
CROQUIS ESTIMACION:	
8	INSTALACIONES ELÉCTRICAS
GP888	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LAMPARAS DE SOBREPONER EN PLAFON, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO N

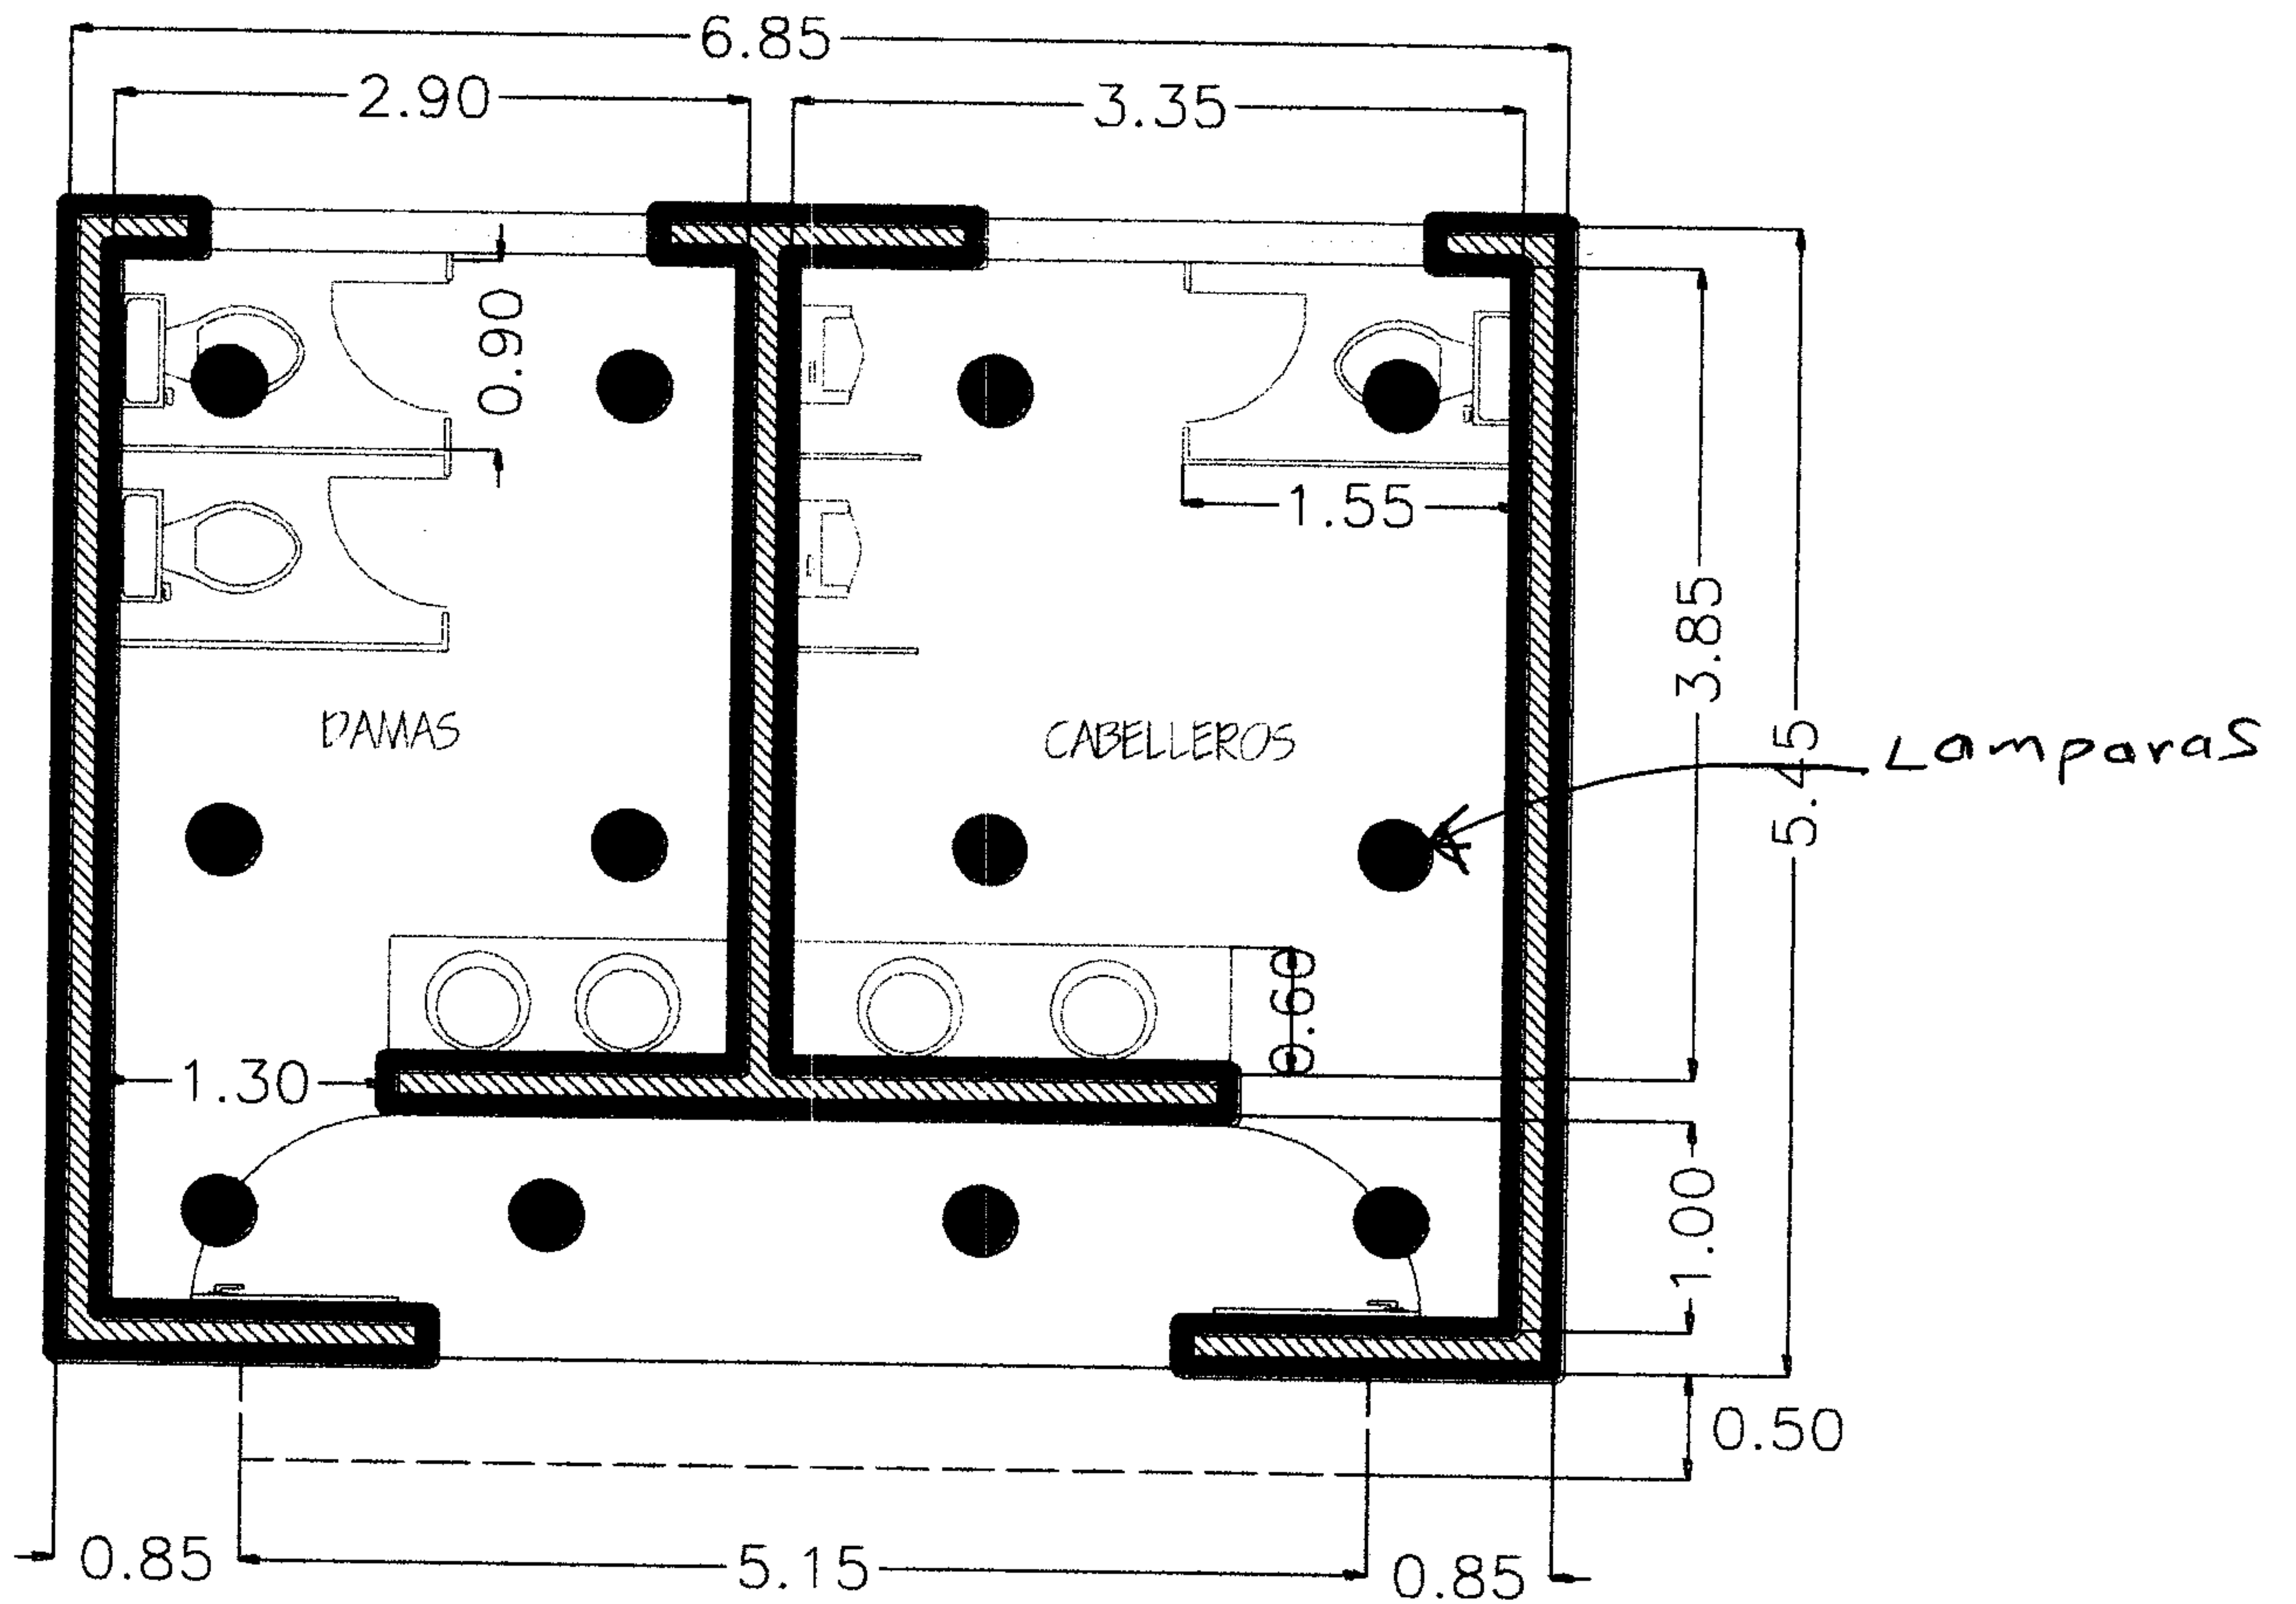

PLANTA ARQUITECTÓNICA

ELABORADO:

C. MANUEL URIARTE BELTRAN
REPRESENTANTE LEGAL

REVISADO:

ARQ. BRICEIDA GUADALUPE NIEBLAS MARTINEZ
SUPERVISOR

AUTORIZADO:

ING. RUBEN RINCON RAMOS
DIRECTOR O. P. D. U. Y. E.

MANUEL URIARTE BELTRAN.




OBRA:	CONSTRUCCIÓN DE BAÑOS PÚBLICOS UBICADOS A UN COSTADO DE TECHUMBRE EN LA COMUNIDAD DE CIÉNEGA DE LOS LARA, SINDICATURA DE CIÉNEGA DE LOS LARA, EN EL MUNICIPIO DE BADIRAGUATO, SINALOA.
ESTIMACION:	02 NORMAL


REPORTE FOTOGRAFICO DE ESTIMACION

AZOTEAS

GP828	IMPERMEABILIZACION A BASE DE DOS CAPAS DE IMPERMEABILIZANTE ACRILICO ELASTOMERICO 7 AÑOS MOD. SETTIMO MCA. IMPAC O SIMILAR CON MALLA DE REFUERZO, INCLUYE: LIMPIEZA DE LA SUPERFICIE, SELLADO Y RESANE DE GRIETAS A BASE DE CEMENTO PLASTICO, FIBRA DE REFUERZO Y DOS CAPAS DE
5	PUERTAS Y VENTANAS
GP252	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PUERTA LAMINADA DE 0.90 MTS X 2.10 MTS, INCLUYE: MARCO, CHAPA, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.
GP225	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE VENTANA DE ALUMINIO DE 2" NATURAL Y CRISTAL DE 6MM, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, INSTALACIÓN HERRAMIENTA

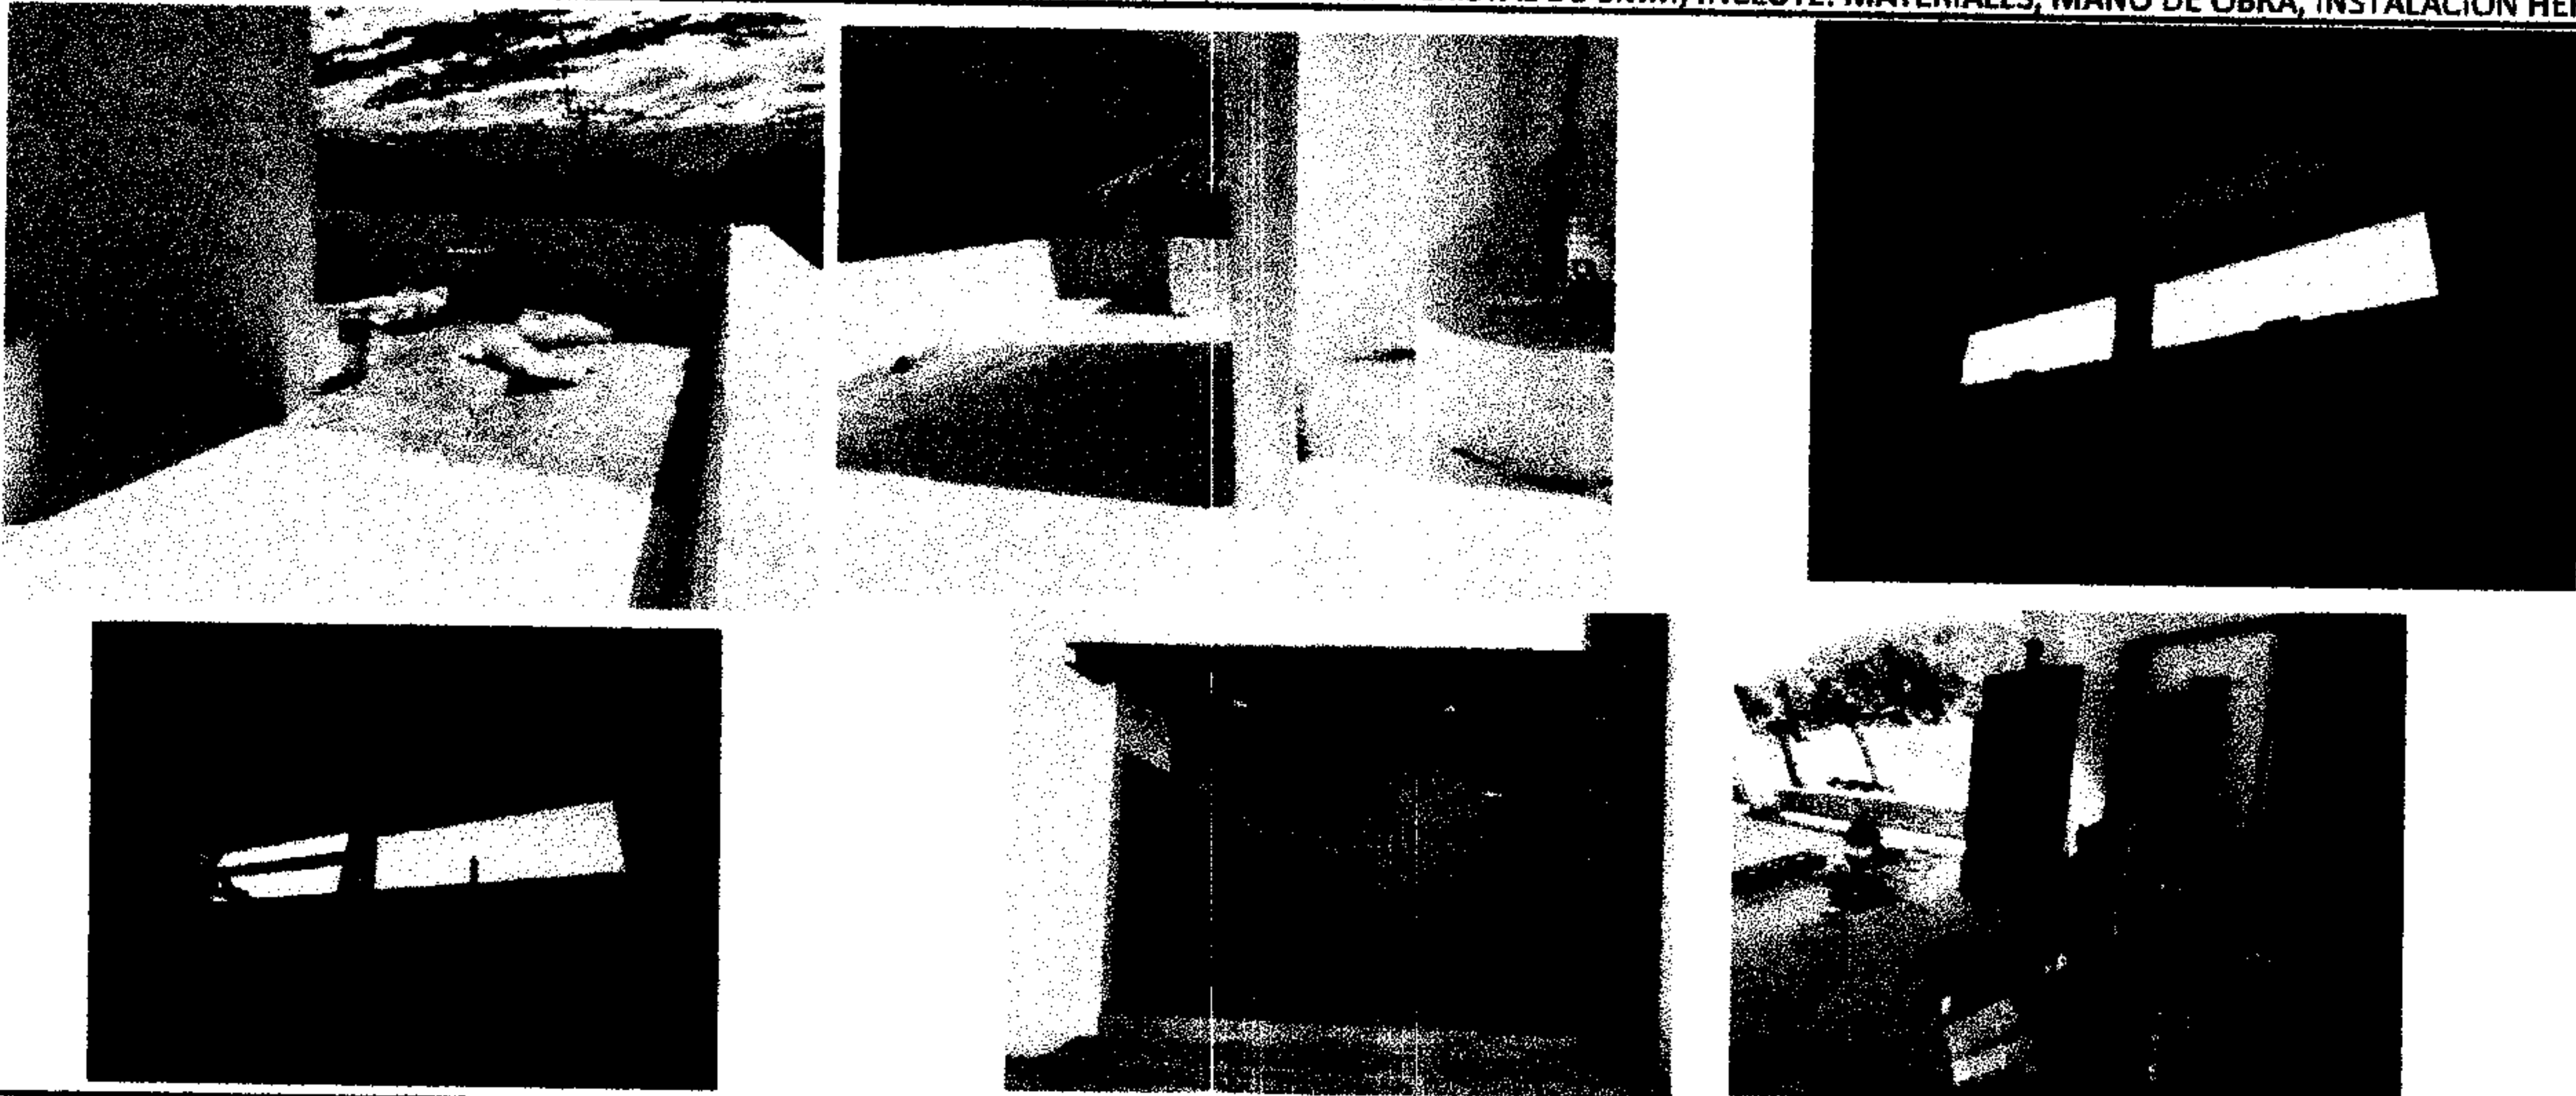

6	ACABADOS
GP156	PINTURA VINÍLICA EN MUROS Y PLAFONES, MARCA BEREL (BERELINTE) O SIMILAR, INCLUYE: PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, APLICACIÓN DE SELLADOR, DOS
GP820	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MAMPARAS PARA BAÑOS DE CANCELERIA INCLUYE: CHAPA, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.
GP821	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MAMPARAS PARA MINGITORIOS DE BAÑOS DE CANCELERIA INCLUYE: CHAPA, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y
GPB01	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PISO RAINFOREST GRAY DE 20X60 CMS ASENTADO CON ADHESIVO PARA PISO PORCELANICO CON EMBOQUILLADOR INCLUYE:
GPB02	SUMINISTRO Y COLOCACION DE AZULEJO LUCENTIA NERO SUPREMO DE 40X60 CMS ASENTADO CON ADHESIVO PARA PISO PORCELANICO CON EMBOQUILLADOR
GPB03	SUMINISTRO Y COLOCACION DE AZULEJO LUCENTIA CALACATTA SUPREMO DE 40X60 CMS ASENTADO CON ADHESIVO PARA PISO PORCELANICO CON

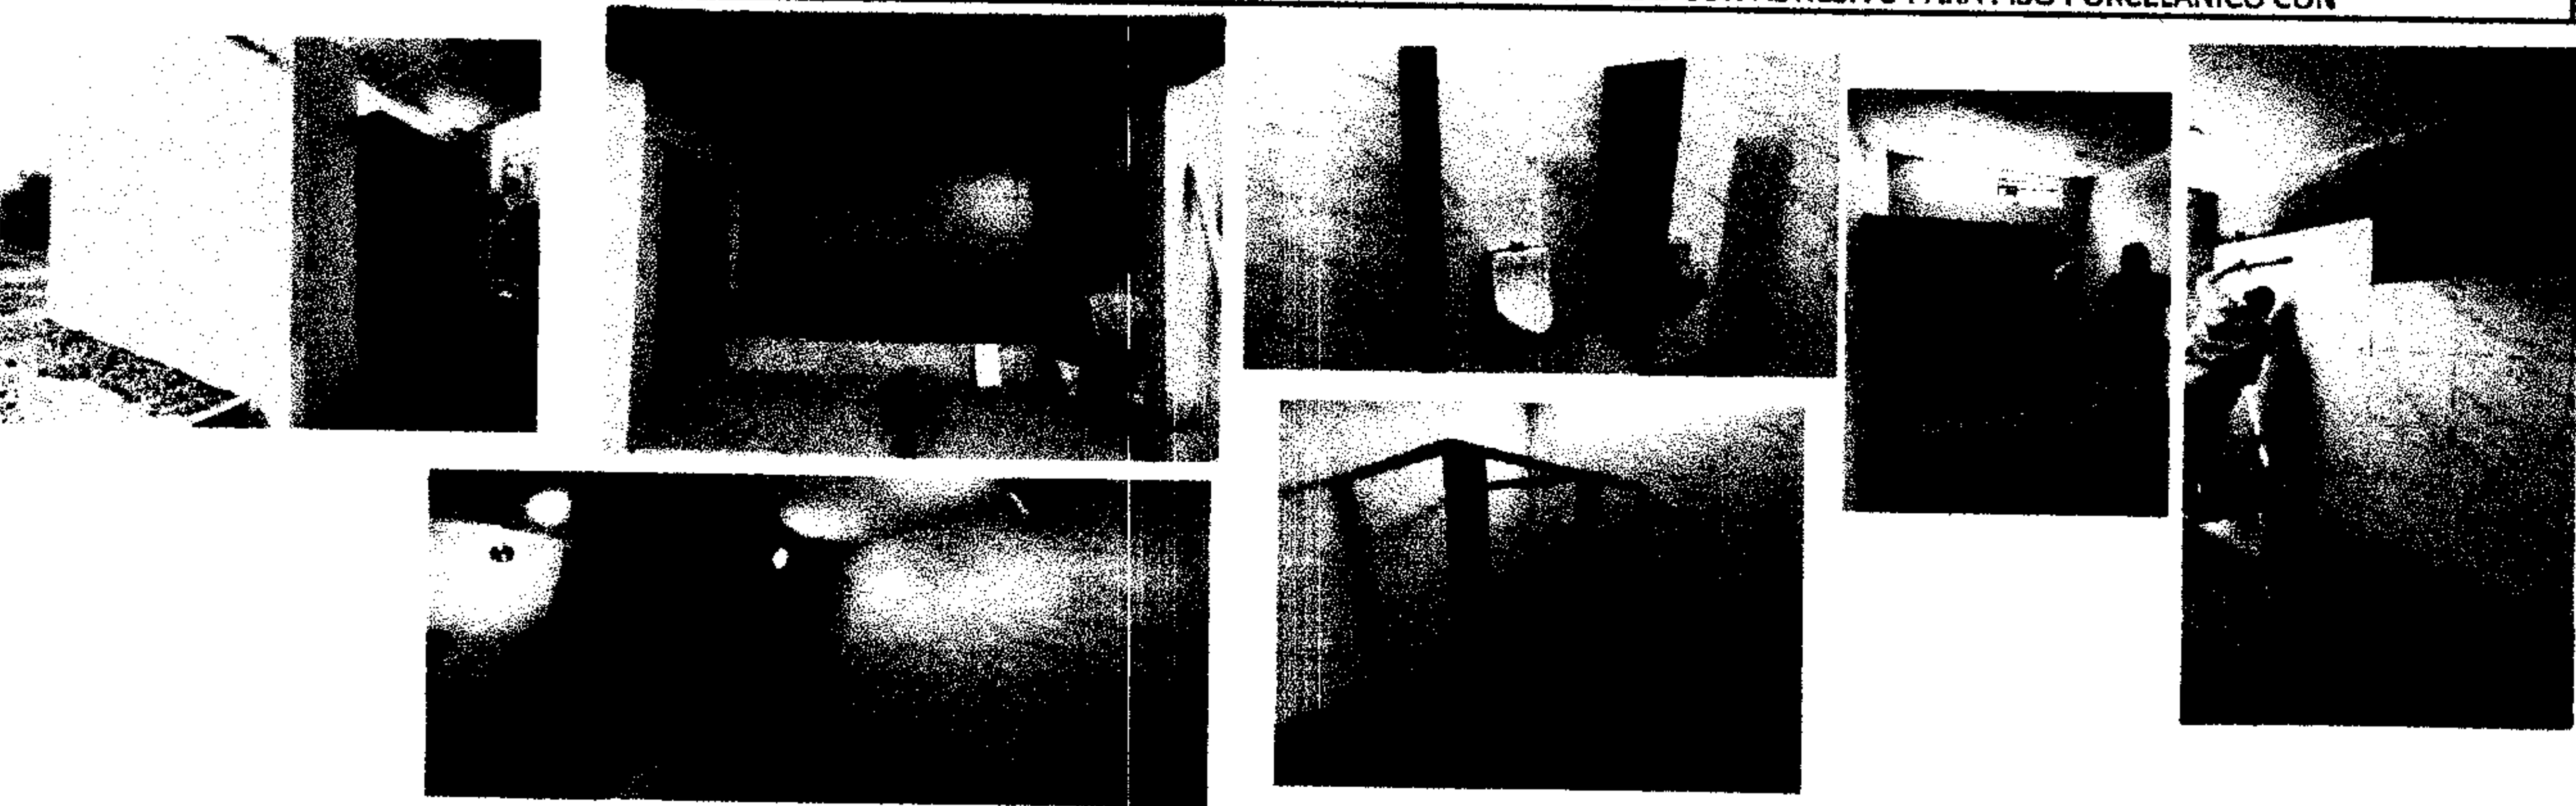

ELABORO.-

C. MANUEL URIARTE BELTRAN
REPRESENTANTE LEGAL

REVISO.-

Brso
ARQ.BRICEIDA GUADALUPE NIEBLAS MARTINEZ
SUPERVISOR

AUTORIZO.-

ING. RUBIEL RINCON RAMOS
DIRECTOR DE O.P.D.U. Y E.




MANUEL URIARTE BELTRAN.




OBRA:	CONSTRUCCIÓN DE BAÑOS PÚBLICOS UBICADOS A UN COSTADO DE TECHUMBRE EN LA COMUNIDAD DE CIÉNEGA DE LOS LARA, SINDICATURA DE CIÉNEGA DE LOS LARA, EN EL MUNICIPIO DE BADIRAGUATO, SINALOA.
ESTIMACION:	02 NORMAL

REPORTE FOTOGRAFICO DE ESTIMACION

7	INSTALACIONES HIDROSANITARIAS
GP248	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE WC , INCLUYE: WC, MANGUERA, ASIENTO, CUELLO DE CERA, MATERIALES, MANO DE OBRA, INSTALACIÓN, HERRAMIENTA Y
GP249	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LAVABO DE EMPOTRAR, INCLUYE: LAVABO, MANGUERA, MEZCLADORA DE 4", CESPOL, CONTRA DE PUSH, MATERIALES, MANO DE
GP835	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MINGITORIO INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, INSTALACIÓN, HERRAMIENTA Y EQUIPO.
GP250	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ROTOPLAS DE 1100 LTS, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.

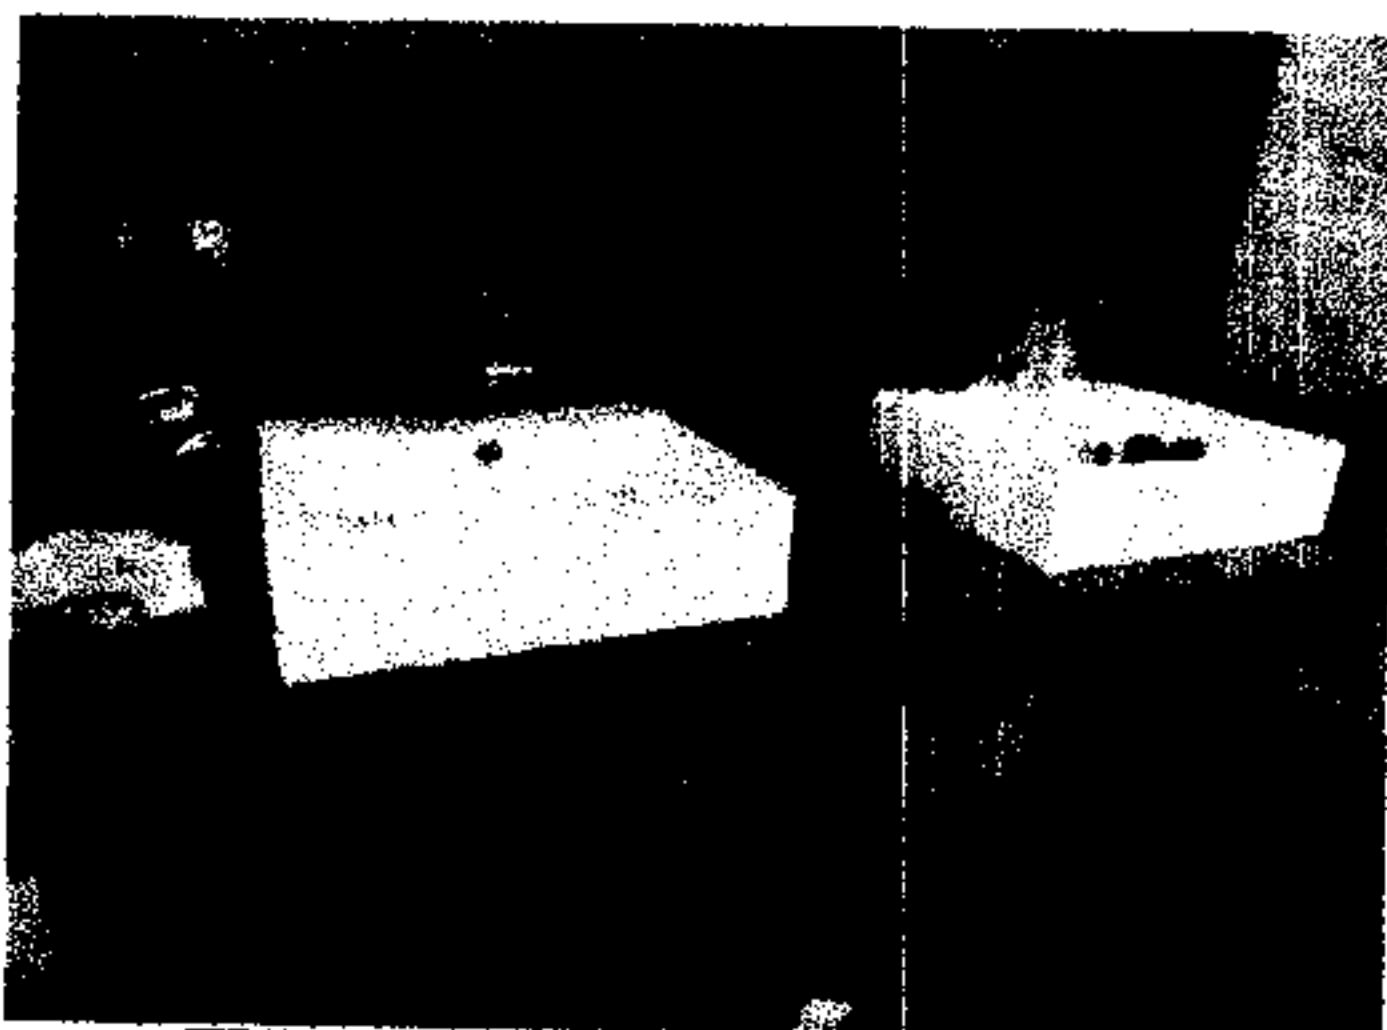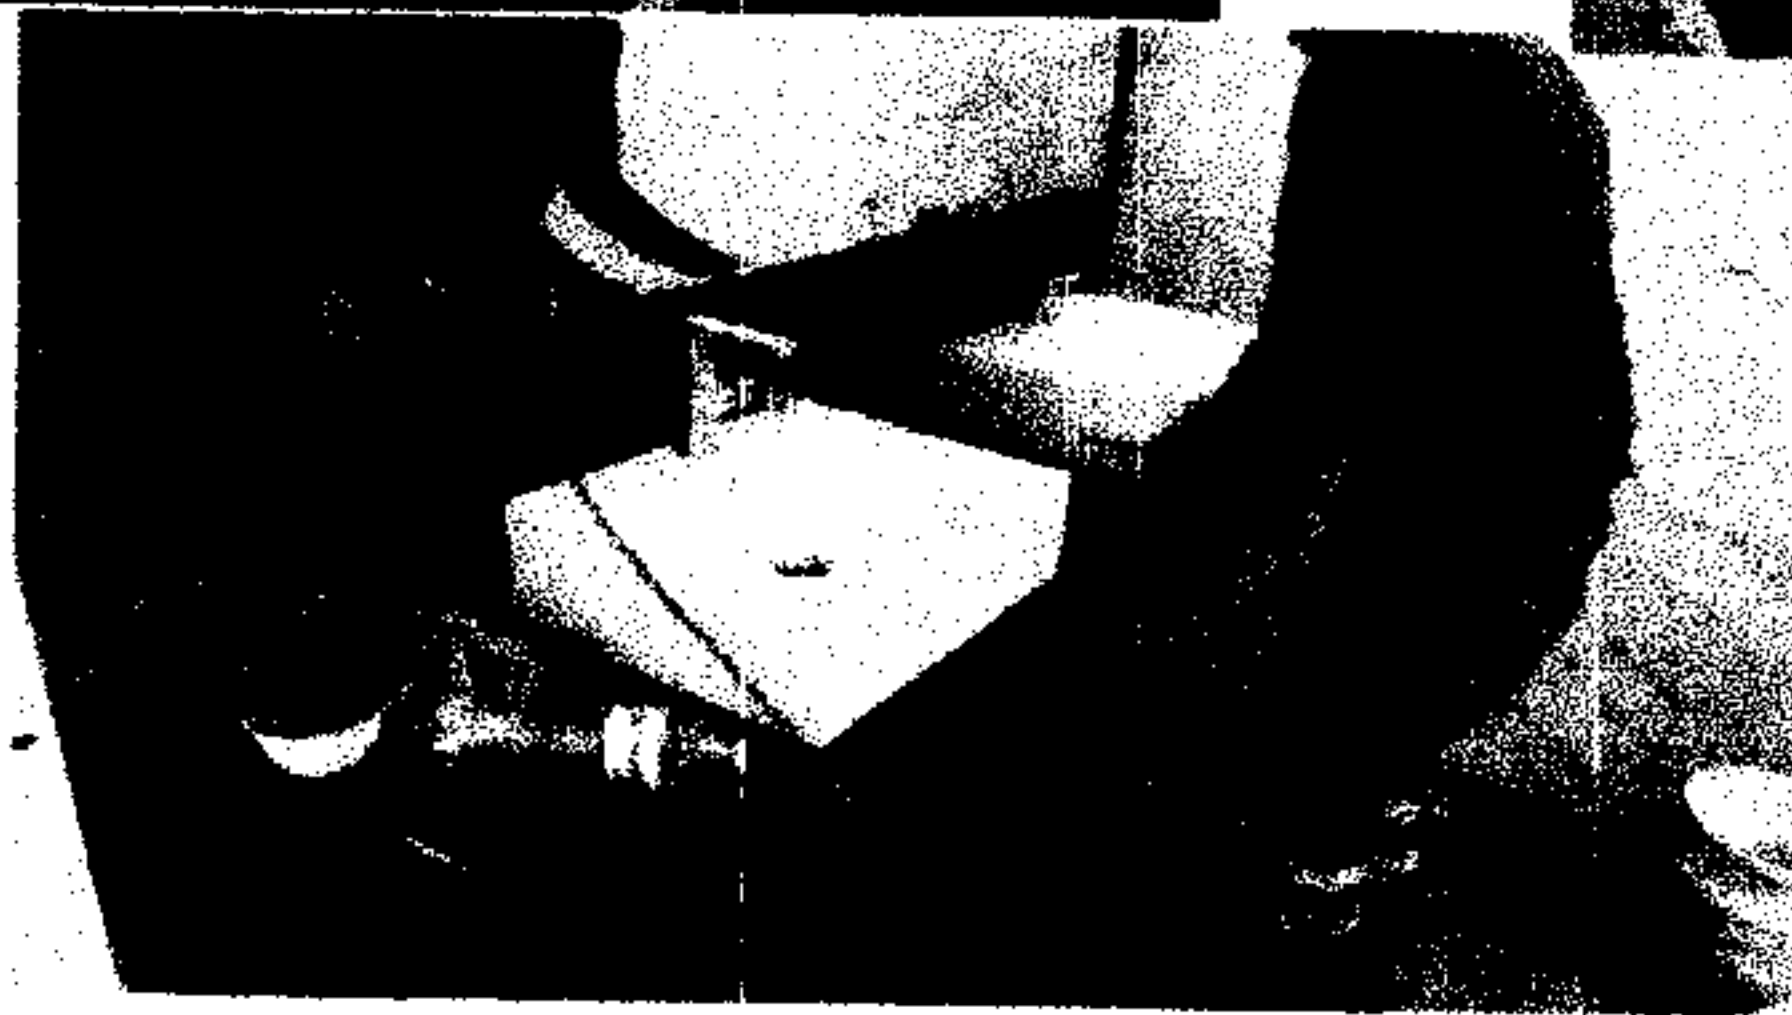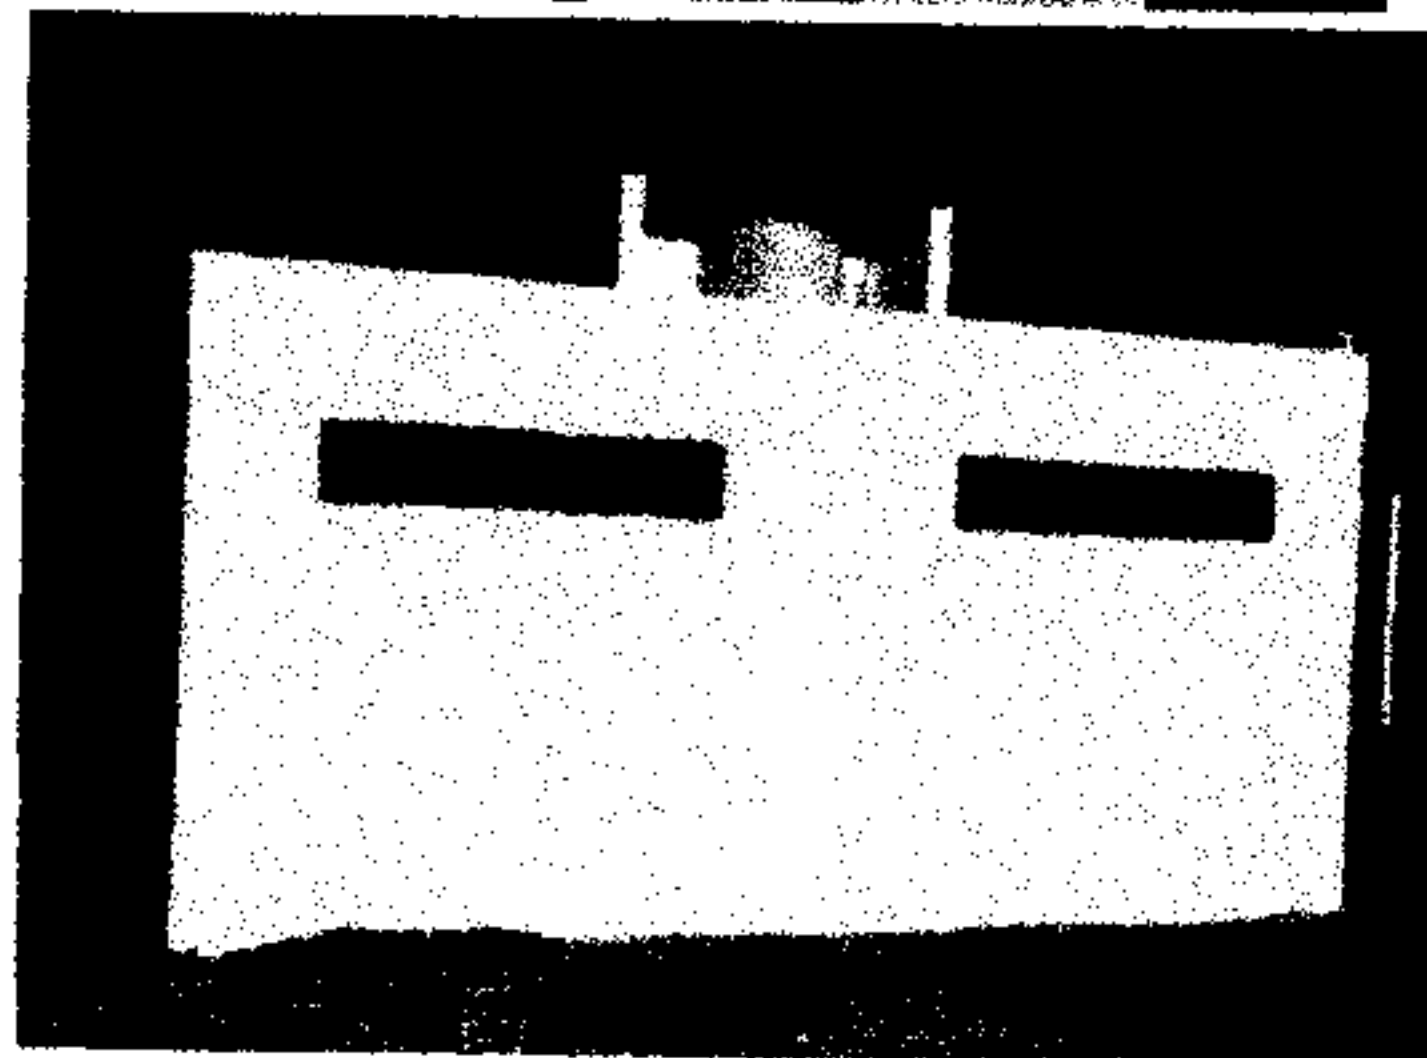

8	INSTALACIONES ELÉCTRICAS
GP888	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LAMPARAS DE SOBREPONER EN PLAFON, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO

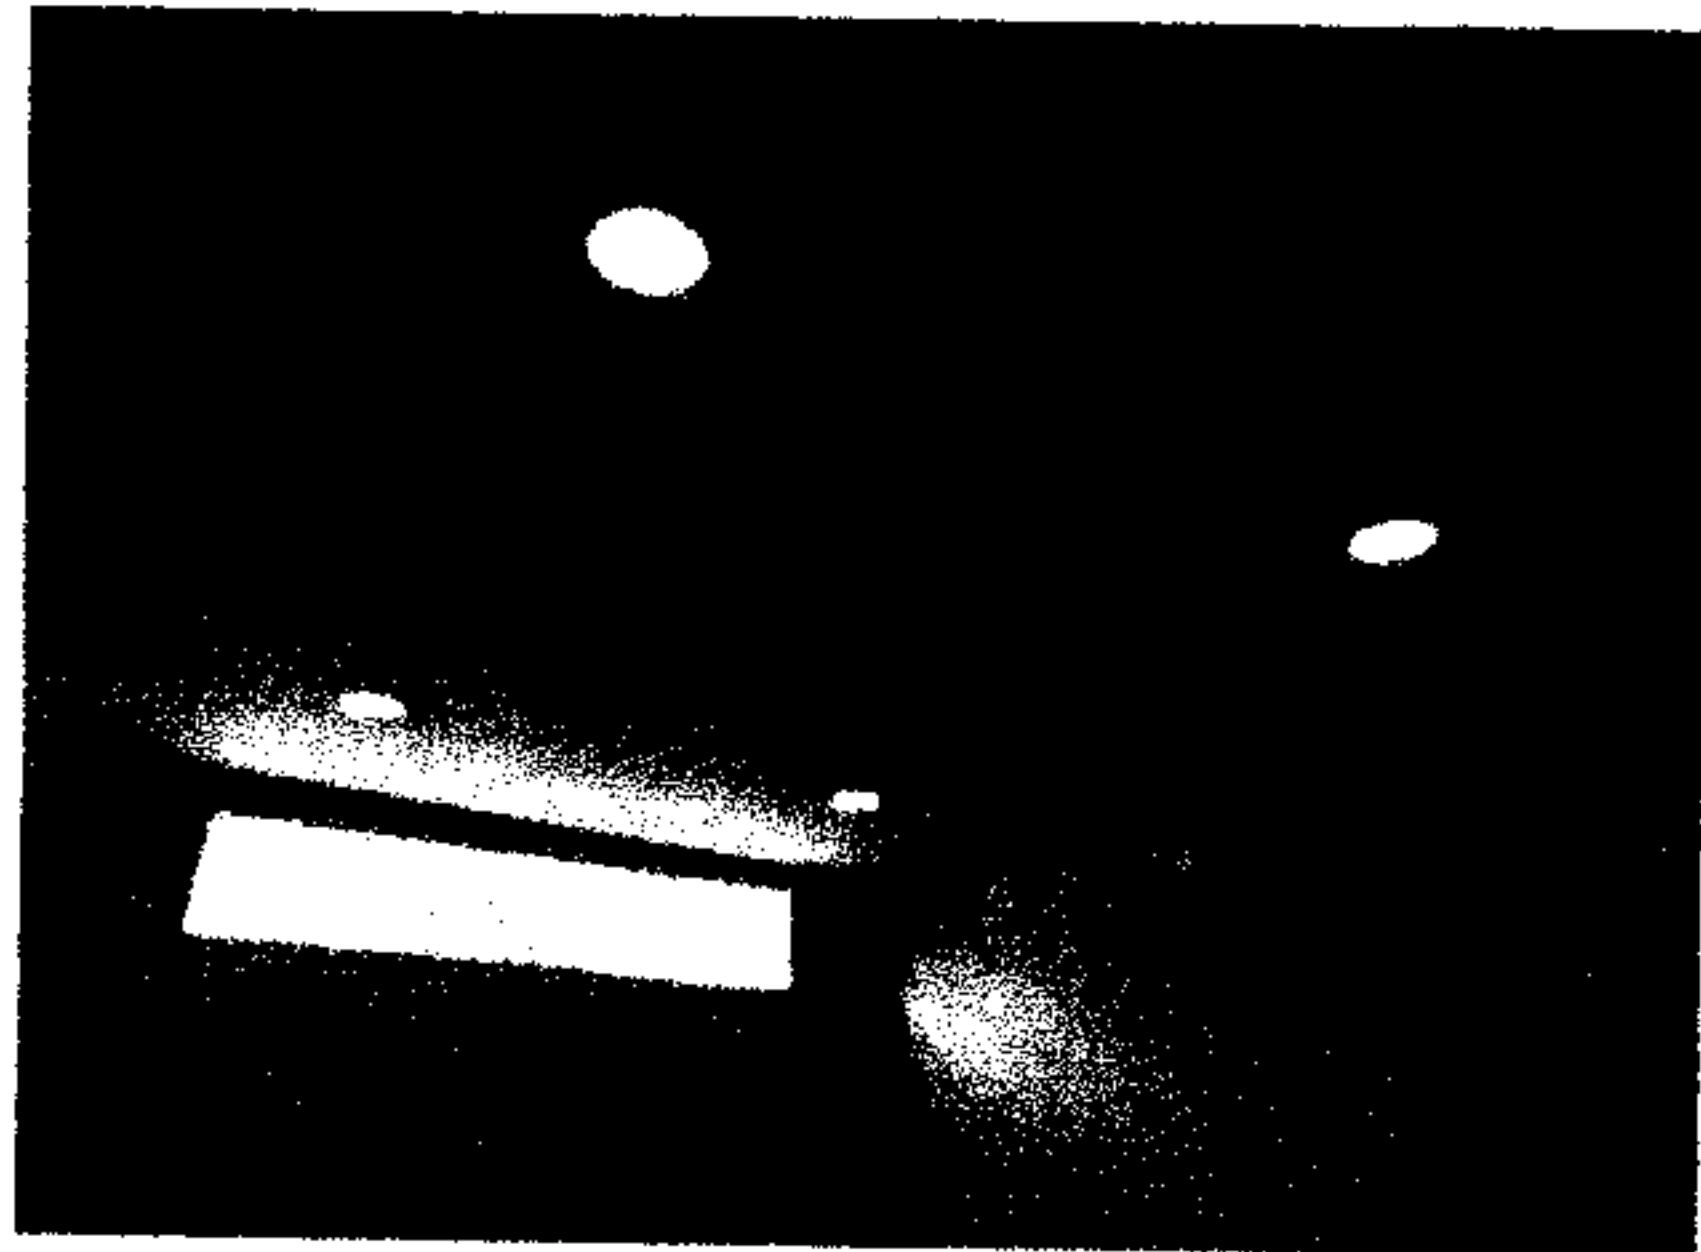

ELABORO.-

C. MANUEL URIARTE BELTRAN
REPRESENTANTE LEGAL

REVISO.-

ARQ.BRICEIDA GUADALUPE NIEBLAS MARTINEZ
SUPERVISOR

AUTORIZO.-

ING. RUBIEL RINCON RAMOS
DIRECTOR DE O.P.D.U. Y E.



Fecha y hora de consulta 01/04/2025 12:33:46 PM

Contrato 00798320
Nombre del Cliente MUNICIPIO DE BADIRAGUATO

BBVA Net Cash - Pagos Interbancarios

Operación autorizada

Transferencia en proceso de validación y aplicación.

Datos del firmante

Usuario: ADMIN1 Poder: 100%

Datos de la operación

Tipo de operación: Pago Interbancario
Descripción: EST 02 NOR AD001
Cuenta de retiro: 0117899181
Divisa de la cuenta: MXP
Titular de la cuenta: MUNICIPIO DE BADIRAG UATO
Nombre banco destino: BANORTE
Fecha de creación: 01/04/2025
Concepto de pago: EST 02 NOR AD001
Instrumento de seguridad: ASD 6551749382
Importe de la operación: 144,524.12 MXP
Cuenta de depósito: 072730002039434985
Divisa de la cuenta: MXP
Titular de la cuenta: MANUEL URIARTE BELTRAN
Fecha de aplicación: 01/04/2025
Referencia numérica:
Hora de captura en el canal: 12:33:44

Datos de confirmación de la transferencia

Folio interbancario: 0000111822
Folio de firma: 0044779021
Clave de rastreo: 002601002504010000111822
Folio único: 1401202504011233430044779027

Estado operación

Porcentaje Firmado: 100% Estado: Operado

Detalle de firmas

Acción	Usuario	Porcentaje aportado	Fecha
CREO	ADMIN1	— %	01/04/2025
FIRMO	ADMIN1	100 %	01/04/2025
