





Badiraguato

GENERANDO BUENOS RESULTADOS



OFICIO No. OPDUyE/086/2025

ASUNTO: SOLICITUD PAGO ESTIMACIÓN

01 ADICIONAL FINIQUITO

Badiraguato, Sin., a 14 de Febrero de 2025

MTRO. GONZALO IRINEO CABALLERO TERRAZAS

TESORERO MUNICIPAL

PRESENTE.-

POR MEDIO DE LA PRESENTE, LE SOLICITO EL PAGO POR: **CONCEPTO DE PAGO ESTIMACIÓN 01 ADICIONAL FINIQUITO**, DEL IMPORTE DEL CONTRATO, A FAVOR DE LA EMPRESA: **MANUEL URIARTE BELTRAN**, LA CUAL REALIZA LOS TRABAJOS APROBADOS POR EL CABILDO MUNICIPAL, CON EL ACTA DE CABILDO NÚMERO: **04 (CUATRO) CON FECHA DE 26 DE DICIEMBRE DE 2024**, A CONTINUACIÓN, SE DETALLA:

- **NOMBRE DE LA OBRA:** CONSTRUCCIÓN DE BAÑOS PÚBLICOS UBICADOS A UN COSTADO DE TECHUMBRE EN LA COMUNIDAD DE CIÉNEGA DE LOS LARA, SINDICATURA DE CIÉNEGA DE LOS LARA, EN EL MUNICIPIO DE BADIRAGUATO, SINALOA.
- **No. DE CONTRATO:** MBGBR-AD-GC-001/2025
- **IMPORTE DEL CONTRATO:** \$558,450.83 (QUINIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTAS PESOS 83/100 M.N)
- **CONCEPTO DEL PAGO:** PAGO DE ESTIMACIÓN 01 ADICIONAL FINIQUITO
- **IMPORTE A PAGAR:** \$3,018.69 (TRES MIL DIECIOCHO PESOS 69/100 M.N)
- **RECURSOS:** FONDO DEL GASTO CORRIENTE MUNICIPAL, EJERCICIO 2025
- **EMPRESA:** MANUEL URIARTE BELTRAN
- **R.F.C.** UIBM811007HY3
- **DOMICILIO FISCAL:** CALLE ANDRIO 4993, FRACCIONAMIENTO VILLA DEL CEDRO ENTRE BOULEVARD BILOGÍA Y CIRCUITO SALERNO, C.P. 80058
- **No. DE FACTURA:** # C-287, DE FECHA 13 DE FEBRERO DE 2025

SE ANEXA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DE SOPORTE, COMO AMPARO DE DICHO PAGO.

AGRADECIENDO DE ANTEMANO LA ATENCIÓN QUE SE SIRVA DAR A LA PRESENTE, ME DESPIDO QUEDANDO A SUS ÓRDENES.



DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS,
DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA,
BADIRAGUATO, SINALOA.

ATENTAMENTE

C. ING. RUBIEL RINCÓN RAMOS
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS,
DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA



**MUNICIPIO DE
BADIRAGUATO**
TESORERÍA


14 FEB 2025


RECIBIDO

2:47 PM

Alexis

C.C.P. ARCHIVO.





MANUEL URIARTE BELTRAN

RFC: UIBM811007HY3

Tipo de Comprobante: I - Ingreso
Lugar de Expedición: 80058
Régimen Fiscal: 612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

Forma de pago: 99 - Por definir
Método de pago: PPD - Pago en parcialidades o diferido
Moneda: MXN - Peso Mexicano
Exportación: 01 - No aplica

Folio: C - 287
Fecha: 13/2/2025 10:30:37
Tipo de cambio:

Datos del cliente

Cliente: MUNICIPIO DE BADIRAGUATO
R.F.C.: MBA850101214
Domicilio fiscal: Gabriel Leyva Solano No. , Badiraguato, C.P. 80500, , Sinaloa, México
Uso CFDI: G03 - Gastos en general.
Régimen fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

Cantidad	Unidad	Clave Unidad SAT	Clave Producto/Servicio	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Descuentos	Impuestos	Importe
				PAGO DE ESTIMACION 01 ADICIONAL FINIQUITO DE LA OBRA CONSTRUCCIÓN DE BAÑOS PÚBLICOS UBICADOS A UN COSTADO DE TECHUMBRE EN LA COMUNIDAD DE CIÉNEGA DE LOS LARA, SINDICATURA DE CIÉNEGA DE LOS LARA, EN EL MUNICIPIO DE BADIRAGUATO, SINALOA. MBGBR-AD-GC- 001/2025 MONTO DEL CONTRATO NETO : \$ 558,450.83 MONTO BRUTO GENERADO POR LOS TRABAJOS EN LA PRESENTE ESTIMACION : \$ 4169.46 IVA DE LOS TRABAJOS GENERADOS: \$667.11 MONTO TOTAL DE LOS TRABAJOS GENERADOS INC IVA: \$ 4,836.57 MONTO BRUTO AMORTIZACION ANTICIPO : \$ 1,459.31 IVA AMORTIZACION ANTICIPO : \$ 233.49 MONTO NETO AMORTIZACION ANTICIPO: \$ 1,692.80 MONTO BRUTO A FACTURAR: \$ 2,710.15 IVA A FACTURAR: \$ 433.62 TOTAL A FACTURAR DE LA ESTIMACION :\$ 3,143.77 MENOS 3% DE SERVICIOS DE VERIFICACION INSPECCION, FISCALIZACION, Y CONTROL (S.V.I.F.Y C.) \$ 125.08 TOTAL DEDUCCIONES :\$ 1,817.88				
1.00	SERVICIO	E48 - Unidad de servicio	72101500 - Servicios de apoyo para la construcción		2,710.15	0.00	002 - IVA - 433.62	2,710.15

MONTO LIQUIDO
A RECIBIR: \$
3,018.69 (SON
TRES
MIL DIECIOCHO
PESOS 69/100
M.N.)

Importe con letra
TRES MIL CIENTO CUARENTA Y TRES PESOS 77/100 M.N.

Subtotal	2,710.15
IVA	433.62
Total	3,143.77

CFDI Relacionados:	
Tipo Relación	CFDI Relacionados



Serie del Certificado del emisor	00001000000518359851
Folio fiscal	8297F0DB-D181-4FEF-8D4E-F5D7357A0D86
No. de Serie del Certificado del SAT	00001000000709182898
Fecha y hora de certificación	Febrero 13 2025 - 11:30:38

Este documento es una representación impresa de un CFDI


Sello Digital del CFDI
pYhT2EumFrNEAY3qi6crVJPBc5Xdz8AXOHP8x3LHBWGSSSQeMOW7F/PGIIPy7trW02yK5pHbdk5A6rk5QQZvAx
+LEzrRdVhrgDoFRsL+Yavof/28RHRoQhSDLOEJ2xvVbNZYtArbRE33a0sEi5qSVxPhq9Xu2YCH1fEotDoDHNeg
/DCOjDdz/dnoUFalv4u7CwBxrPrzoP5P5PKtEIIku1vhuT5Sx1fidVca6bkfPJy44jf9B2foMD7ghzwnnDf/gD
IZILnDM9b2wvXrPg0bLSUVcAgH4CviD0onuckCY0i61yHICxfb4WxbNQqfnkUZ6U6CqBZDfnNjzK1w3DbVFw==

Sello del SAT
fr5ZE2nTZAcX8YIEfxarUX1IqG2ceZzyCwkQ0sQk3TurwO2dWB1F4YT+MtIGBghTabVTmU//3bZkA8+Q
dqU4NQbMHZXn2RDPo5QXMKC0FD3NWFTgfOneL9izX95x+bmigHEqwpOgNskD7SutHRXIYBEWRv63pq1b
pFr4TzDQM+DLgS+cb4h6FibgNYmNn7gZrBCyryHplhbW5sjGQEVF9Bywl/SVm7krPd/uiT1TSPOXAtNT
MawZVbDjsBMNMKK3qiQ07ohV0w4EPz/sEmvz8QMrMeB9xuHphwJxWq1T+pqk9jyUAp9UivMNzSWwW2Ev
daJk2V4y/6erISrnOWV8WQ==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT
||1.1|8297F0DB-D181-4FEF-8D4E-F5D7357A0D86|2025-02-13T11:30:38|MAS0810247C0|pYhT
2EumFrNEAY3qi6crVJPBc5Xdz8AXOHP8x3LHBWGSSSQeMOW7F/PGIIPy7trW02yK5pHbdk5A6rk5QQZv
Ax+LEzrRdVhrgDoFRsL+Yavof/28RHRoQhSDLOEJ2xvVbNZYtArbRE33a0sEi5qSVxPhq9Xu2YCH1fEo
tDoDHNeg/DCOjDdz/dnoUFalv4u7CwBxrPrzoP5P5PKtEIIku1vhuT5Sx1fidVca6bkfPJy44jf9B2fo
MD7ghzwnnDf/gDiZiLnDM9b2wvXrPg0bLSUVcAgH4CviD0onuckCY0i61yHICxfb4WxbNQqfnkUZ6U6C
qBZDfnNjzK1w3DbVFw==|00001000000709182898||

This XML file does not appear to have any style information associated with it. The document tree is shown below.

```
<cfdi:Comprobante xmlns:cfdi="http://www.sat.gob.mx/cfd/4" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/cfd/4 http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/4/cfdv40.xsd" Version="4.0" Serie="C" Folio="287" Fecha="2025-02-13T10:30:37" Sello="pYhT2EumfRNEAY3qi6crVJPBc5Xdz8AXOHp8x3LHBWGS5S5QeM0W7F/PGLIpy7trW02yK5pHbdk5A6rk5QQZvAx+LEzrRdVhrgDoFRsL+Yavof/28RHRQhSDL0EJ2xvVbNZYtArbRE33a0sEi5qSVxPhq9Xu2YCH1fEotDoDHNeg/DCOfJddz/dnoUFaIv4u7CwB8X FormaPago="99" NoCertificado="00001000000518359851" Certificado="MIIF6zCCA90GAIBAGIUMDAwMDAwMDA1MTgzNTk4NTEwDQYJKoZIhvcNAQELBQAwggGEMSAwHgYDVQQDBDBVVRPUKLEQUgQ0VSVE1GSUNBRE9SQTEUMCwGA1UECgwlU0VSVk1DSU8gREUGCURNSU5JUIRSQUJNT04gVFJQJ1VUQVJJQTEaMBGGA1SubTotal="2710.15" Moneda="MXN" Total="3143.77" TipoDeComprobante="I" Exportacion="01" MetodoPago="PPD" LugarExpedicion="80058">
  <cfdi:Emisor RegimenFiscal="612" Rfc="UIBM811007HY3" Nombre="MANUEL URIARTE BELTRAN"/>
  <cfdi:Receptor Rfc="MBA850101214" Nombre="MUNICIPIO DE BADIRAGUATO" DomicilioFiscalReceptor="80500" RegimenFiscalReceptor="603" UsoCFDI="G03"/>
  <cfdi:Conceptos>
    <cfdi:Concepto ClaveProdServ="72101500" ClaveUnidad="E48" Cantidad="1.00" Unidad="SERVICIO" NoIdentificacion="501" Descripcion="PAGO DE ESTIMACION 01" ValorUnitario="2710.15" Importe="2710.15"
      ObjetoImp="02">
      <cfdi:Impuestos>
        <cfdi:Traslados>
          <cfdi:Traslado Base="2710.15" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.160000" Importe="433.62"/>
          </cfdi:Traslados>
          <cfdi:Impuestos>
            <cfdi:Concepto>
              <cfdi:Conceptos>
                <cfdi:ImpuestosTotalImpuestosTrasladados="433.62">
                  <cfdi:Traslados>
                    <cfdi:Traslado Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.160000" Importe="433.62" Base="2710.15"/>
                    </cfdi:Traslados>
                    <cfdi:Impuestos>
                      <cfdi:Complemento>
                        <cfdi:TimbreFiscalDigital xmlns:tfd="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/TimbreFiscalDigital/TimbreFiscalDigitalv11.xsd" Version="1.1" UUID="8297F0D8-D181-4FEF-8D4E-F5D7357A0D86" FechaTimbrado="2025-02-13T11:30:38"
                          RfcProvCertif="MAS0810247C0"
                          SelloCFD="pYhT2EumfRNEAY3qi6crVJPBc5Xdz8AXOHp8x3LHBWGS5S5QeM0W7F/PGLIpy7trW02yK5pHbdk5A6rk5QQZvAx+LEzrRdVhrgDoFRsL+Yavof/28RHRQhSDL0EJ2xvVbNZYtArbRE33a0sEi5qSVxPhq9Xu2YCH1fEotDoDHNeg/DCOfJddz/dnoUFaIv4u7CwB8X"
                          NoCertificadosSAT="00001000000070918298"
                          SelloSAT="fr5ZE2nT7AcX8V1EfXarUX11q62ceZzyCwkQ0sQk3Turw02dWBIF4YT+MtlGBghtabVTmU//3bZKA9+QddqU4NQbWHZXn2RDPo5QXMKC0FD3NwFTgf0neL9i2X95x+bmigHEqwpOgNskD75utHRXIYBEMRW63pq1bpFr4TzDQM+DLG5+cb4h6fibgNwMn7"
                          </cfdi:Comprobante>
                        </cfdi:Comprobante>
                      </cfdi:Impuestos>
                    </cfdi:Complemento>
                  </cfdi:Traslados>
                </cfdi:Conceptos>
              </cfdi:Concepto>
            </cfdi:Impuestos>
          </cfdi:Conceptos>
        </cfdi:Impuestos>
      </cfdi:Concepto>
    </cfdi:Conceptos>
  </cfdi:Conceptos>
</cfdi:Comprobante>
```



Dependencia : Ayuntamiento de Badiraguato
Control de Estimaciones

MANUEL URIARTE BELTRAN.

CONSTRUCCIÓN DE BAÑOS PÚBLICOS UBICADOS A UN COSTADO DE TECHUMBRE EN LA COMUNIDAD DE CIÉNEGA DE LOS LARA, SINDICATURA DE CIÉNEGA DE LOS LARA, EN EL MUNICIPIO DE BADIRAGUATO, SINALOA.				Fecha:		Estimacion:		
				6 de febrero de 2025		01 ADICIONAL FINQUITO		
Periodo de la estimacion:		03/01/2025 06/02/2025		Localidad:		No. De contrato:		
Periodo de Ejecución:		16/01/2025 06/02/2025		CIENEGA DE LOS LARA		NBGBR-AD-GC-001/2025		
Importe del contrato con I.V.A:		Imp. Contratado sin I.V.A		Anticipo		Importe Anticipo sin I.V.A		% de Avance
\$ 558,450.83		\$ 481,423.13		\$ 195,457.79		\$ 168,498.09		1%
								% Avance Total
								100%

Control Del Anticipo	Liquidacion de Estimacion		Control de Estimacion
AMORTIZA ESTA ESTIMACION	Importe de la Estimacion (+)	\$ 4,169.46	ESTA ESTIMACION
\$ 1,692.80	16 % I.V.A (+)	\$ 667.11	\$ 4,836.57
	Sub- Total A (=)	\$ 4,836.57	
	Amortizacion Anticipo	\$ 1,459.31	
AMORTIZACION ANTERIOR	16 % I.V.A (+)	\$ 233.49	ACUMULADO ANTERIOR
\$ 193,764.99	Total (=)	\$ 1,692.80	\$ 553,614.26
TOTAL AMORTIZADO	Importe TOTAL	\$ 2,710.15	TOTAL ACUMULADO.
\$ 195,457.79	16 % I.V.A (+)	\$ 433.62	
	Total (=)	\$ 3,143.77	\$ 558,450.83
ANTICIPO OTORGADO	3 % SVIFYC:	\$ 125.08	
\$ 195,457.79	Total Deducciones (=)	\$ 1,817.88	CONTRATADO
	Importe TOTAL	\$ 3,018.69	\$ 558,450.83
SALDO DEL ANTICIPO	NETO A PAGAR		
\$0.00	\$ 3,018.69		SALDO
	(SON TRES MIL DIECIOCHO PESOS 69/100 M.N.)		\$ -

ELABORO.


C. MANUEL URIARTE BELTRAN
REPRESENTANTE LEGAL

REVISÓ

ING. JOSE RODOLFO CONTRERAS LÓPEZ
COSTOS Y PRESUPUESTOS

AUTORIZO

ING. RUBIEL RINCON RAMOS
DIRECTOR DE D. O. P. D. U. Y. E.



Fecha: 6 de febrero de 2025

CARATULA DE ESTIMACIÓN

CONTRATISTA:	MANUEL URIARTE BELTRAN.		ESTIMACIÓN No:	01 ADICIONAL FINIQUITO
DOMICILIO:	Calle Andrio 4993, Fraccionamiento Villas del Cedro Entre Boulevard Bologna y Circuito Salerno C.P.80058		PERIODO DE ESTIMACION:	
TELÉFONO:	CEL:		DEL	18-ene-25
66 72 96 48 27	66 72 96 48 27		AL	06-feb-25
R.F.C.			FECHA DE CONTRATO:	
UIBM811007HY3				02-ene-25
DEPENDENCIA:-				

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA, AYUNTAMIENTO DE BADIRAGUATO.

LOCALIDAD:	MUNICIPIO:	PERIODO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO:
CIENEGA DE LOS LARA	BADIRAGUATO	INICIO: 03-ene-25
		TERMINACIÓN: 06-feb-25

DESCRIPCIÓN:

CONSTRUCCIÓN DE BAÑOS PÚBLICOS UBICADOS A UN COSTADO DE TECHUMBRE EN LA COMUNIDAD DE CIENEGA DE LOS LARA, SINDICATURA DE CIENEGA DE LOS LARA, EN EL MUNICIPIO DE BADIRAGUATO, SINALOA.

CONTRATO No:

MBGBR-AD-GC-001/2025

IMPORTE SIN IVA DE LA OBRA	IMPORTE CON IVA DE LA OBRA	35% ANTICIPO DE LA OBRA	IMPORTE TOTAL DE CONTRATO:
\$481,423.13	\$558,450.83	\$195,457.79	\$558,450.83

RECIBI DEL H. AYUNTAMIENTO DE BADIRAGUATO: BUENO POR: \$ 3,018.69

\$ 3,018.69 (SON TRES MIL DIECIOCHO PESOS 69/100 M.N.)

EN PAGO DE ESTIMACIÓN: 01 ADICIONAL FINIQUITO

DEDUCCIONES:		CALCULO DE ESTIMACIÓN	
AMORTIZACIÓN ANTICIPO 35%	\$ 1,459.31	IMPORTE DE LA OBRA EJECUTADA SIN IVA	\$ 4,169.46
MAS I.V.A.:	\$ 233.49	MAS I.V.A 16 %	\$ 667.11
TOTAL AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO:	\$ 1,692.80	TOTAL DE LA OBRA EJECUTADA CON IVA	\$ 4,836.57
3 % SVIFYC:	\$ 125.08	MENOS TOTAL DEDUCCIONES:	\$ 1,817.88
TOTAL DEDUCCIONES:	\$ 1,817.88	TOTAL A FACTURAR MAS IVA	\$ 3,143.77

SALDO A PAGAR: \$ 3,018.69

ELABORO

C. MANUEL URIARTE BELTRAN
REPRESENTANTE LEGAL

REVISOR

ING. JOSE RODOLFO CONTRERAS LÓPEZ
COSTOS Y PRESUPUESTOS


AUTORIZO

ING. RUBEN RINCON RAMOS
DIRECTOR D. O. P. D. U. Y. E.

ELABORO.- 
C. MANUEL URIARTE BELTRÁN
REPRESENTANTE LEGAL

REVISO.- 
ING. JOSE RODOLOFO CONTRERAS LÓPEZ
COSTOS Y PRESUPUESTOS

AUTORIZO.- 
ING. RUBIEL RINCON RAMOS
DIRECTOR DE O.P.D.U.Y.E.



CONTRATISTA:	MANUEL URIARTE BELTRAN.	DEPENDENCIA:	AYUNTAMIENTO DE BADIRAGUATO
DOMICILIO:	Calle Andrio 4993, Fraccionamiento Villas del Cedro Entre Boulevard Bologna y Circuito	FECHA:	6 de febrero de 2025
R.F.C.	UIBM811007HY3		

RESÚMEN DE ESTIMACIÓN

LOCALIDAD:	CIENEGA DE LOS LARA	ESTIMACIÓN:	01 ADICIONAL FINIQUITO
DESCRIPCIÓN:	CONSTRUCCIÓN DE BAÑOS PÚBLICOS UBICADOS A UN COSTADO DE TECHUMBRE EN LA COMUNIDAD DE CIENEGA DE LOS LARA, SINDICATURA DE CIENEGA DE LOS LARA, EN EL MUNICIPIO DE BADIRAGUATO, SINALOA.		

IMPORTE DE OBRA SIN IVA:	\$ 481,423.13
IMPORTE DE ANTICIPO DE OBRA:	\$ 195,457.79
IMPORTE TOTAL DE CONTRATO:	\$ 558,450.83

DESTAJO		IMPORTE
SALA DE CABILDO		
101	PRELIMINARES	\$ -
2	CIMENTACION	\$ -
3	ALBAÑILERIA	\$ -
4	AZOTEAS	\$ -
5	PUERTAS Y VENTANAS	\$ -
6	ACABADOS	\$ 4,169.46
7	INSTALACIONES HIDROSANITARIAS	\$ -
8	INSTALACIONES ELÉCTRICAS	\$ -
SUBTOTAL ESTIMACIÓN:		\$ 4,169.46

SUB TOTAL=	\$ 4,169.46
I.V.A AL 16 %	\$ 667.11
TOTAL =	\$ 4,836.57

ELABORO.-

C. MANUEL URIARTE BELTRAN.
REPRESENTANTE LEGAL

REVISO.-

ING. JOSE RODOLFO CONTRERAS LÓPEZ
COSTOS Y PRESUPUESTOS

AUTORIZO.-

ING. RUBIEL RINCON RAMOS
DIRECTOR D. O. P. D. U. Y E.



DESGLOSE

CONTRATISTA:	MANUEL URIARTE BELTRAN.	DEPENDENCIA:	AYUNTAMIENTO DE BADRAGUATO	FECHA:	06/02/2025
DOMICILIO:	Calle Andrio 4993, Fraccionamiento Villas del Cedro Entre Boulevard Bologna y Circuito Salerno C.P.80058	R.F.C.	UIBM811007HY3		

DESGLOSE DE CONCEPTOS DE ESTIMACIÓN

DESCRIPCIÓN:	CONSTRUCCIÓN DE BAÑOS PÚBLICOS UBICADOS A UN COSTADO DE TECHUMBRE EN LA COMUNIDAD DE CIENEGA DE LOS LARA, SINDICATURA DE CIENEGA DE LOS LARA, EN EL MUNICIPIO DE BADRAGUATO, SINALOA.	LOCALIDAD:	CIENEGA DE LOS LARA	ESTIMACIÓN:	01 ADICIONAL FINIQUITO
--------------	---	------------	---------------------	-------------	------------------------

IMPORTE DE OBRA SIN IVA:	\$481,423.13	IMPORTE DE ANTICIPO DE OBRA:	\$185,457.79	IMPORTE TOTAL DE CONTRATO:	\$558,450.83
--------------------------	--------------	------------------------------	--------------	----------------------------	--------------

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	SEGUN PROYECTO			VOLUMEN TOTAL ESTIMADO	HASTA ESTIM ANTERIOR	EXCEDENTE	DE ESTA ESTIMACIÓN	IMPORTE
			CANT	P.U.	TOTAL					
101	PRELIMINARES									
GP001	TRAZO Y NIVELACIÓN DEL TERRENO ESTABLECIENDO EJES Y NIVELETAS DE REFERENCIA, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M2	37.33	\$ 17.23	\$ 643.20	37.33	37.33	0.00	0.00	\$ -
2	CIMENTACION									
GP2403	EXCAVACIÓN POR MEDIOS MANUALES DE 0 A -2.00 M, EN MATERIAL TIPO B, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA	M3	9.33	\$ 364.07	\$ 3,396.77	9.33	9.33	0.00	0.00	\$ -
GP26	RELLENO COMPACTADO AL 95% CON BALARINA EN CAPAS DE 20 CMS DE ESPESOR CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN, INCLUYE: AGUA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU TERMINACIÓN.	M3	9.33	\$ 246.64	\$ 2,301.15	9.33	9.33	0.00	0.00	\$ -
GP033	AFINE DE FONDOS Y TALUDES DE LAS EXCAVACIONES HECHAS INCLUYE: MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M2	6.15	\$ 26.00	\$ 158.90	6.15	6.15	0.00	0.00	\$ -
GP64	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE HULE NEGRO CALIBRE 600, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA TERMINACIÓN	M2	37.33	\$ 36.64	\$ 1,367.77	37.33	37.33	0.00	0.00	\$ -
GP644	LOSA DE CIMENTACIÓN DE 10 CM DE ESPESOR CON CONCRETO F'C= DE 200 KG/CM HECHO EN OBRA, ARMADO CON VARILLA DE 3/8" @ 30 CMS EN AMBOS SENTIDOS, INCLUYE: CIMBRA, MANO DE OBRA, MATERIALES,EQUIPO Y HERRAMIENTAS.	M2	37.33	\$ 1,481.19	\$ 55,292.82	37.33	37.33	0.00	0.00	\$ -
3	ALBAÑILERIA									
GP336	CASTILLO Y/O DALA DE 15X20 CM ARMADO CON ARMEX Y REFORZADO CON 2 VARILLAS DE 3/8", ACABADO APARENTE, CONCRETO HECHO EN OBRA CON UN F'C=200 KG/CM2, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTAS.	ML	34.20	\$ 460.02	\$ 15,732.68	34.20	34.20	0.00	0.00	\$ -
GP5033	FABRICACIÓN Y COLOCACIÓN DE CADENA DE CERRAMIENTO DE 15x20 cm, ARMADA CON ARMEX CON CONCRETO F'C=250 KG/CM2, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA	ML	33.50	\$ 470.77	\$ 15,770.80	28.45	28.45	0.00	0.00	\$ -
GP505	MURO DE TABICON, DE 0 A 3MTS DE ALTURA INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M2	54.90	\$ 695.56	\$ 38,186.24	54.90	54.90	0.00	0.00	\$ -
GP237	LOSA DE 10 CM DE ESPESOR CON CONCRETO F'C= DE 200 KG/CM HECHO EN OBRA, ARMADO CON VARILLA DE 3/8" @ 20 CMS EN AMBOS SENTIDOS, INCLUYE: CIMBRA, MANO DE OBRA, MATERIALES,EQUIPO Y HERRAMIENTAS.	M2	39.91	\$ 1,108.31	\$ 44,232.65	39.91	39.91	0.00	0.00	\$ -
GP509	BARRA DE 60 CMS DE ANCHO Y DE 10 CMS DE ESPESOR ACABADO PULIDO REFORZADO CON MALLA LAC 6-8/10-10, CONCRETO HECHO EN OBRA CON F'C=200 KG/CM2 AGREGADO DE 3/4", INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	ML	3.65	\$ 671.88	\$ 2,452.36	3.65	3.65	0.00	0.00	\$ -
GP510	APLANADO FINO CON MORTERO CEMENTO ARENA, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	M2	147.48	\$ 286.24	\$ 42,214.68	147.48	147.48	0.00	0.00	\$ -
*TEMP1	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE VIGA IPR, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	1.00	\$ 8,635.08	\$ 8,635.08	1.00	1.00	0.00	0.00	\$ -
4	AZOTEAS									
GP828	IMPERMEABILIZACIÓN A BASE DE DOS CAPAS DE IMPERMEABILIZANTE ACRILICO ELASTOMERICO 7 AÑOS MOD. SETTIMO MCA, IMPAC O SIMILAR CON MALLA DE REFUERZO, INCLUYE: LIMPIEZA DE LA SUPERFICIE, SELLADO Y RESANE DE GRIETAS A BASE DE CEMENTO PLASTICO, FIBRA DE REFUERZO Y DOS CAPAS DE IMPERMEABILIZANTE.	M2	37.33	\$ 156.96	\$ 5,859.32	0.00	0.00	0.00	0.00	\$ -
GP829	PRETEL DE 40 CMS A BASE DE BLOCK 20x20x40 CMS, APARENTE ASENTADO CON MEZCLA MORTERO-ARENA 1:3 INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA DE 0.00 A 3.00 MTS. DE ALTURA.	ML	26.30	\$ 406.96	\$ 10,703.05	26.30	26.30	0.00	0.00	\$ -
GP830	CHAFLÁN CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3 EN AZOTEA DE SECCIÓN 15 X 15 CM. INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	ML	26.30	\$ 171.34	\$ 4,506.24	26.30	26.30	0.00	0.00	\$ -
5	PUERTAS Y VENTANAS									
GP252	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PUERTA LAMINADA DE 0.90 MTS X 2.10 MTS, INCLUYE: MARCO, CHAPA, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	2.00	\$ 4,852.83	\$ 9,905.86	2.00	2.00	0.00	0.00	\$ -
GP225	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE VENTANA DE ALUMINIO DE 2" NATURAL Y CRISTAL DE 6MM, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, INSTALACIÓN HERRAMIENTA Y EQUIPO.	M2	2.20	\$ 2,742.31	\$ 6,033.08	2.20	2.20	0.00	0.00	\$ -

ELABORO

C. MANUEL URIARTE BELTRAN
REPRESENTANTE LEGAL

REVISÓ

ING. JOSE RODOLFO CONTRERAS LÓPEZ
COSTOS Y PRESUPUESTOS

AUTORIZO

ING. RUBEN RINCON RAMOS
DIRECTOR DE O.P.D.U.Y.E.



DESGLOSE

CONTRATISTA:	MANUEL URIARTE BELTRAN.	DEPENDENCIA:	AYUNTAMIENTO DE BADIRAGUATO	FECHA:	06/02/2025
DOMICILIO:	Calle Andrio 4993, Fraccionamiento Villas del Cedro Entre Boulevard Bologna y Circuito Salerno C.P.80058	R.F.C.:	UIM811007HY3		

DESGLOSE DE CONCEPTOS DE ESTIMACIÓN

DESCRIPCIÓN:	CONSTRUCCION DE BAÑOS PUBLICOS UBICADOS A UN COSTADO DE TECHUMBRE EN LA COMUNIDAD DE CIENEGA DE LOS LARA, SINDICATURA DE CIENEGA DE LOS LARA, EN EL MUNICIPIO DE BADIRAGUATO, SINALOA.	LOCALIDAD:	CIENEGA DE LOS LARA	ESTIMACIÓN:	01 ADICIONAL FINQUITO
--------------	--	------------	---------------------	-------------	-----------------------

IMPORTE DE OBRA SIN IVA:	\$481,423.13	IMPORTE DE ANTICIPO DE OBRA:	\$185,457.79	IMPORTE TOTAL DE CONTRATO:	\$558,450.83
--------------------------	--------------	------------------------------	--------------	----------------------------	--------------

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	SEGUN PROYECTO			VOLUMEN TOTAL ESTIMADO	HASTA ESTIM. ANTERIOR	EXCEDENTE	DE ESTA ESTIMACIÓN	IMPORTE
			CANT.	P.U.	TOTAL					
6	ACABADOS									
GP357	APLICACIÓN DE REDIMIX EN PLAFON, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	M2	29.09	\$ 83.19	\$ 2,420.00	29.09	29.09	0.00	0.00	\$ -
GP155	PINTURA VINÍLICA EN MUROS Y PLAFONES, MARCA BEREL (BERELINTE) O SIMILAR, INCLUYE: PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, APLICACIÓN DE SELLADOR, DOS MANOS DE PINTURA, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	M2	63.90	\$ 82.39	\$ 5,264.72	63.90	63.90	0.00	0.00	\$ -
GP810	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE JUNQUILLO DE ALUMINIO EN MURO INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, RECORTES, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO	ML	7.00	\$ 256.01	\$ 1,792.07	7.00	7.00	0.00	0.00	\$ -
GP820	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MAMPARAS PARA BAÑOS DE CANCELERIA INCLUYE: CHAPA, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	3.00	\$ 8,987.64	\$ 26,962.92	3.00	3.00	0.00	0.00	\$ -
GP821	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MAMPARAS PARA MINIGITORIOS DE BAÑOS DE CANCELERIA INCLUYE: CHAPA, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	2.00	\$ 3,377.29	\$ 6,754.58	2.00	2.00	0.00	0.00	\$ -
GP801	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PISO RAINFOREST GRAY DE 20X60 CMS ASENTADO CON ADHESIVO PARA PISO PORCELANICO CON EMBOQUILLADOR INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, RECORTES, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	33.29	\$ 722.29	\$ 24,045.03	33.29	33.29	0.00	0.00	\$ -
GP802	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE AZULEJO LUCENTIA NERO SUPREMO DE 40X60 CMS ASENTADO CON ADHESIVO PARA PISO PORCELANICO CON EMBOQUILLADOR INCLUYE:	M2	22.80	\$ 682.57	\$ 15,562.60	22.80	22.80	6.11	6.10847	\$ 4,169.46
GP803	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE AZULEJO LUCENTIA CALACATTA SUPREMO DE 40X60 CMS ASENTADO CON ADHESIVO PARA PISO PORCELANICO CON EMBOQUILLADOR	M2	63.68	\$ 682.57	\$ 43,466.06	63.68	63.68		0.00	\$ -
GP804	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PLAFON ARREBOL NOCE SUPREMO DE 20X60 CMS ASENTADO CON ADHESIVO PARA PISO PORCELANICO CON EMBOQUILLADOR INCLUYE:	M2	6.08	\$ 669.31	\$ 4,069.40	6.08	6.08	0.00	0.00	\$ -
GP826	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ESPEJO DE 1.5X0.60 CMS INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	2.00	\$ 5,675.06	\$ 11,350.12	2.00	2.00	0.00	0.00	\$ -
7	INSTALACIONES HIDROSANITARIAS									
GP238	SALIDA SANITARIA PARA WC CON TUBERÍA DE 4" SANITARIA HASTA REGISTRO SANITARIO, INCLUYE: CODOS, COPLES, MATERIALES, MANO DE OBRA, INSTALACIÓN	SAL	3.00	\$ 660.16	\$ 1,980.48	3.00	3.00	0.00	0.00	\$ -
GP240	SALIDA SANITARIA PARA LAVABO CON TUBERÍA DE 2" SANITARIA HASTA REGISTRO SANITARIO, INCLUYE: CODOS, COPLES, MATERIALES, MANO DE OBRA, INSTALACIÓN	SAL	4.00	\$ 623.53	\$ 2,494.12	4.00	4.00	0.00	0.00	\$ -
GP241	TUBO VENTILA CON TUBERÍA DE 2" SANITARIA, INCLUYE: CODOS, COPLES, MATERIALES, MANO DE OBRA, INSTALACIÓN HERRAMIENTA Y EQUIPO.	SAL	3.00	\$ 319.91	\$ 959.73	3.00	3.00	0.00	0.00	\$ -
GP246	ALIMENTACIÓN HIDRÁULICA PARA MUEBLE SANITARIO CON TUBERÍA DE CPVC AZUL DE 1/2" DESDE RAMALES, INCLUYE: TUBERÍA, COPLES, CODOS, ADAPTADOR MACHO CON INSERTO DE METAL, LLAVE DE CONTROL, MATERIALES, MANO DE OBRA, INSTALACIÓN HERRAMIENTA Y EQUIPO.	SAL	9.00	\$ 585.88	\$ 5,272.92	9.00	9.00	0.00	0.00	\$ -
GP248	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE WC, INCLUYE: WC, MANGUERA, ASENTADO, CUELLO DE CERA, MATERIALES, MANO DE OBRA, INSTALACIÓN, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	3.00	\$ 2,631.03	\$ 7,893.09	3.00	3.00	0.00	0.00	\$ -
GP249	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LAVABO DE EMPOTRAR, INCLUYE: LAVABO, MANGUERA, MEZCLADORA DE 4", CESPOL, CONTRA DE PUSH, MATERIALES, MANO DE OBRA, INSTALACIÓN, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	4.00	\$ 2,922.04	\$ 11,688.16	4.00	4.00	0.00	0.00	\$ -
GP835	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MINIGITORIO INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, INSTALACIÓN, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	2.00	\$ 4,733.73	\$ 9,467.46	2.00	2.00	0.00	0.00	\$ -
GP250	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ROTOPLAS DE 1100 LTS, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	1.00	\$ 5,193.47	\$ 5,193.47	1.00	1.00	0.00	0.00	\$ -
8	INSTALACIONES ELÉCTRICAS									
GP8EL01	SALIDA PARA DE ALUMBRADO CON POLIFLEX DE 1/2", CABLE CAL.12, INCLUYE: ROSETA Y FOCO, MATERIALES, CABLEADO, DESPERDICIOS, PRUEBAS, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU	SAL	12.00	\$ 988.50	\$ 11,862.00	12.00	12.00	0.00	0.00	\$ -
GP888	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LAMPARAS DE SOBREPONER EN PLAFON, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	12.00	\$ 508.59	\$ 6,103.08	12.00	12.00	0.00	0.00	\$ -
GP340	SALIDA PARA APAGADOR CON POLIFLEX DE 1/2", CABLE CAL.12, INCLUYE: MATERIALES, CABLEADO, DESPERDICIOS, PRUEBAS, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO	SAL	3.00	\$ 947.95	\$ 2,843.85	3.00	3.00	0.00	0.00	\$ -
GP226	SALIDA ELÉCTRICA PARA CONTACTO A BASE DE POLIDUCTO DE 13 MM., CON UN DESARROLLO DE 10 M, CON CABLE THW CAL. 12 Y 14 DESNUDO, LÍNEA ECONÓMICA, CON	SAL	4.00	\$ 1,078.18	\$ 4,312.72	4.00	4.00	0.00	0.00	\$ -
GP178	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CENTRO DE CARGA Q8, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	1.00	\$ 1,795.17	\$ 1,795.17	1.00	1.00	0.00	0.00	\$ -
GP180	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE INTERRUPTOR DE 1X20 SQUARD, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	1.00	\$ 475.73	\$ 475.73	1.00	1.00	0.00	0.00	\$ -

SUB-TOTAL \$ 4,169.46

IVA \$ 667.11

MONTO TOTAL \$ 4,836.57

ELABORÓ


C. MANUEL URIARTE BELTRAN
REPRESENTANTE LEGAL

REVISÓ

ING. JOSE RODOLFO CONTRERAS LÓPEZ
COSTOS Y PRESUPUESTOS

AUTORIZÓ

ING. RUBEN RINCON RAMOS
DIRECTOR DE O. P. D. U. Y. E.



FECHA
jueves, 6 de febrero de 2025

DEPENDENCIA:
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA, AYUNTAMIENTO DE
BADIRAGUATO.

CONTRATISTA:		MANUEL URIARTE BELTRAN.	
R.F.C.		URBM811007HY3	
OBRA:		CONSTRUCCIÓN DE BAÑOS PÚBLICOS UBICADOS A UN COSTADO DE TECHUMBRE EN LA COMUNIDAD DE CIÉNEGA DE LOS LARA, SINDICATURA DE CIÉNEGA DE LOS LARA, EN EL MUNICIPIO DE BADIRAGUATO, SINALOA.	
ESTIMACION		01 ADICIONAL FINQUITO	

GENERADORES DE ESTIMACION									
CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANT	LARGO	ANCHO	ESPESOR	ACUMULADO		OBSERVACIONES
							PARTIAL	TOTAL	
5	ACABADOS								
GPB01	SUMINISTRO Y COLOCACION DE AZULEJO LUCENTIA NERO SUPREMO DE 40X60 CMS ASENTADO CON ADHESIVO PARA PISO PORCELANICO CON EMBOQUILLADOR INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, RECORTES, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2		BAÑOS H	BAÑOS M	ACCESO	TOTAL		VER EN CROQUIS
			6.3000	5.4900	17.1185	28.9085	28.9085	TOTAL	
								6.10847 ADICIONAL	
							22.80	EST ANT.	

ELABORO


ARQ. MANUEL URIARTE BELTRAN
REPRESENTANTE LEGAL

SUPERVISOR

ARQ. BRICEIDA GUADALUPE REBLAS MARTINEZ
SUPERVISOR

AUTORIZO

ING. RUBEN RINCÓN RAMOS
DIRECTOR DE OPDUYE



CONTRATISTA:

MANUEL URIARTE BELTRAN.

FECHA:

Jueves, 8 de febrero de 2025

DEPENDENCIA:

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA,
AYUNTAMIENTO DE BADIRAGUATO.

DOMICILIO:

Calle Andrio 4883, Fraccionamiento Villas del Cedro Entre Boulevard Bologna y Circuito
Salerno C.P.80058

R.F.C.


UIBM811007HY3

OBRA:

CONSTRUCCIÓN DE BAÑOS PÚBLICOS UBICADOS A UN COSTADO DE TECHUMBRE EN LA COMUNIDAD DE CIÉNEGA DE LOS LARA,
SINDICATURA DE CIÉNEGA DE LOS LARA, EN EL MUNICIPIO DE BADIRAGUATO, SINALOA.

CROQUIS ESTIMACION:

CLAVE	CONCEPTO
6	ACABADOS
GPB02	SUMINISTRO Y COLOCACION DE AZULEJO LUCENTIA NERO SUPREMO DE 40X60 CMS ASENTADO CON ADHESIVO PARA PISO PORCELANICO CON EMBOQUILLADOR INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, RECORTES, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

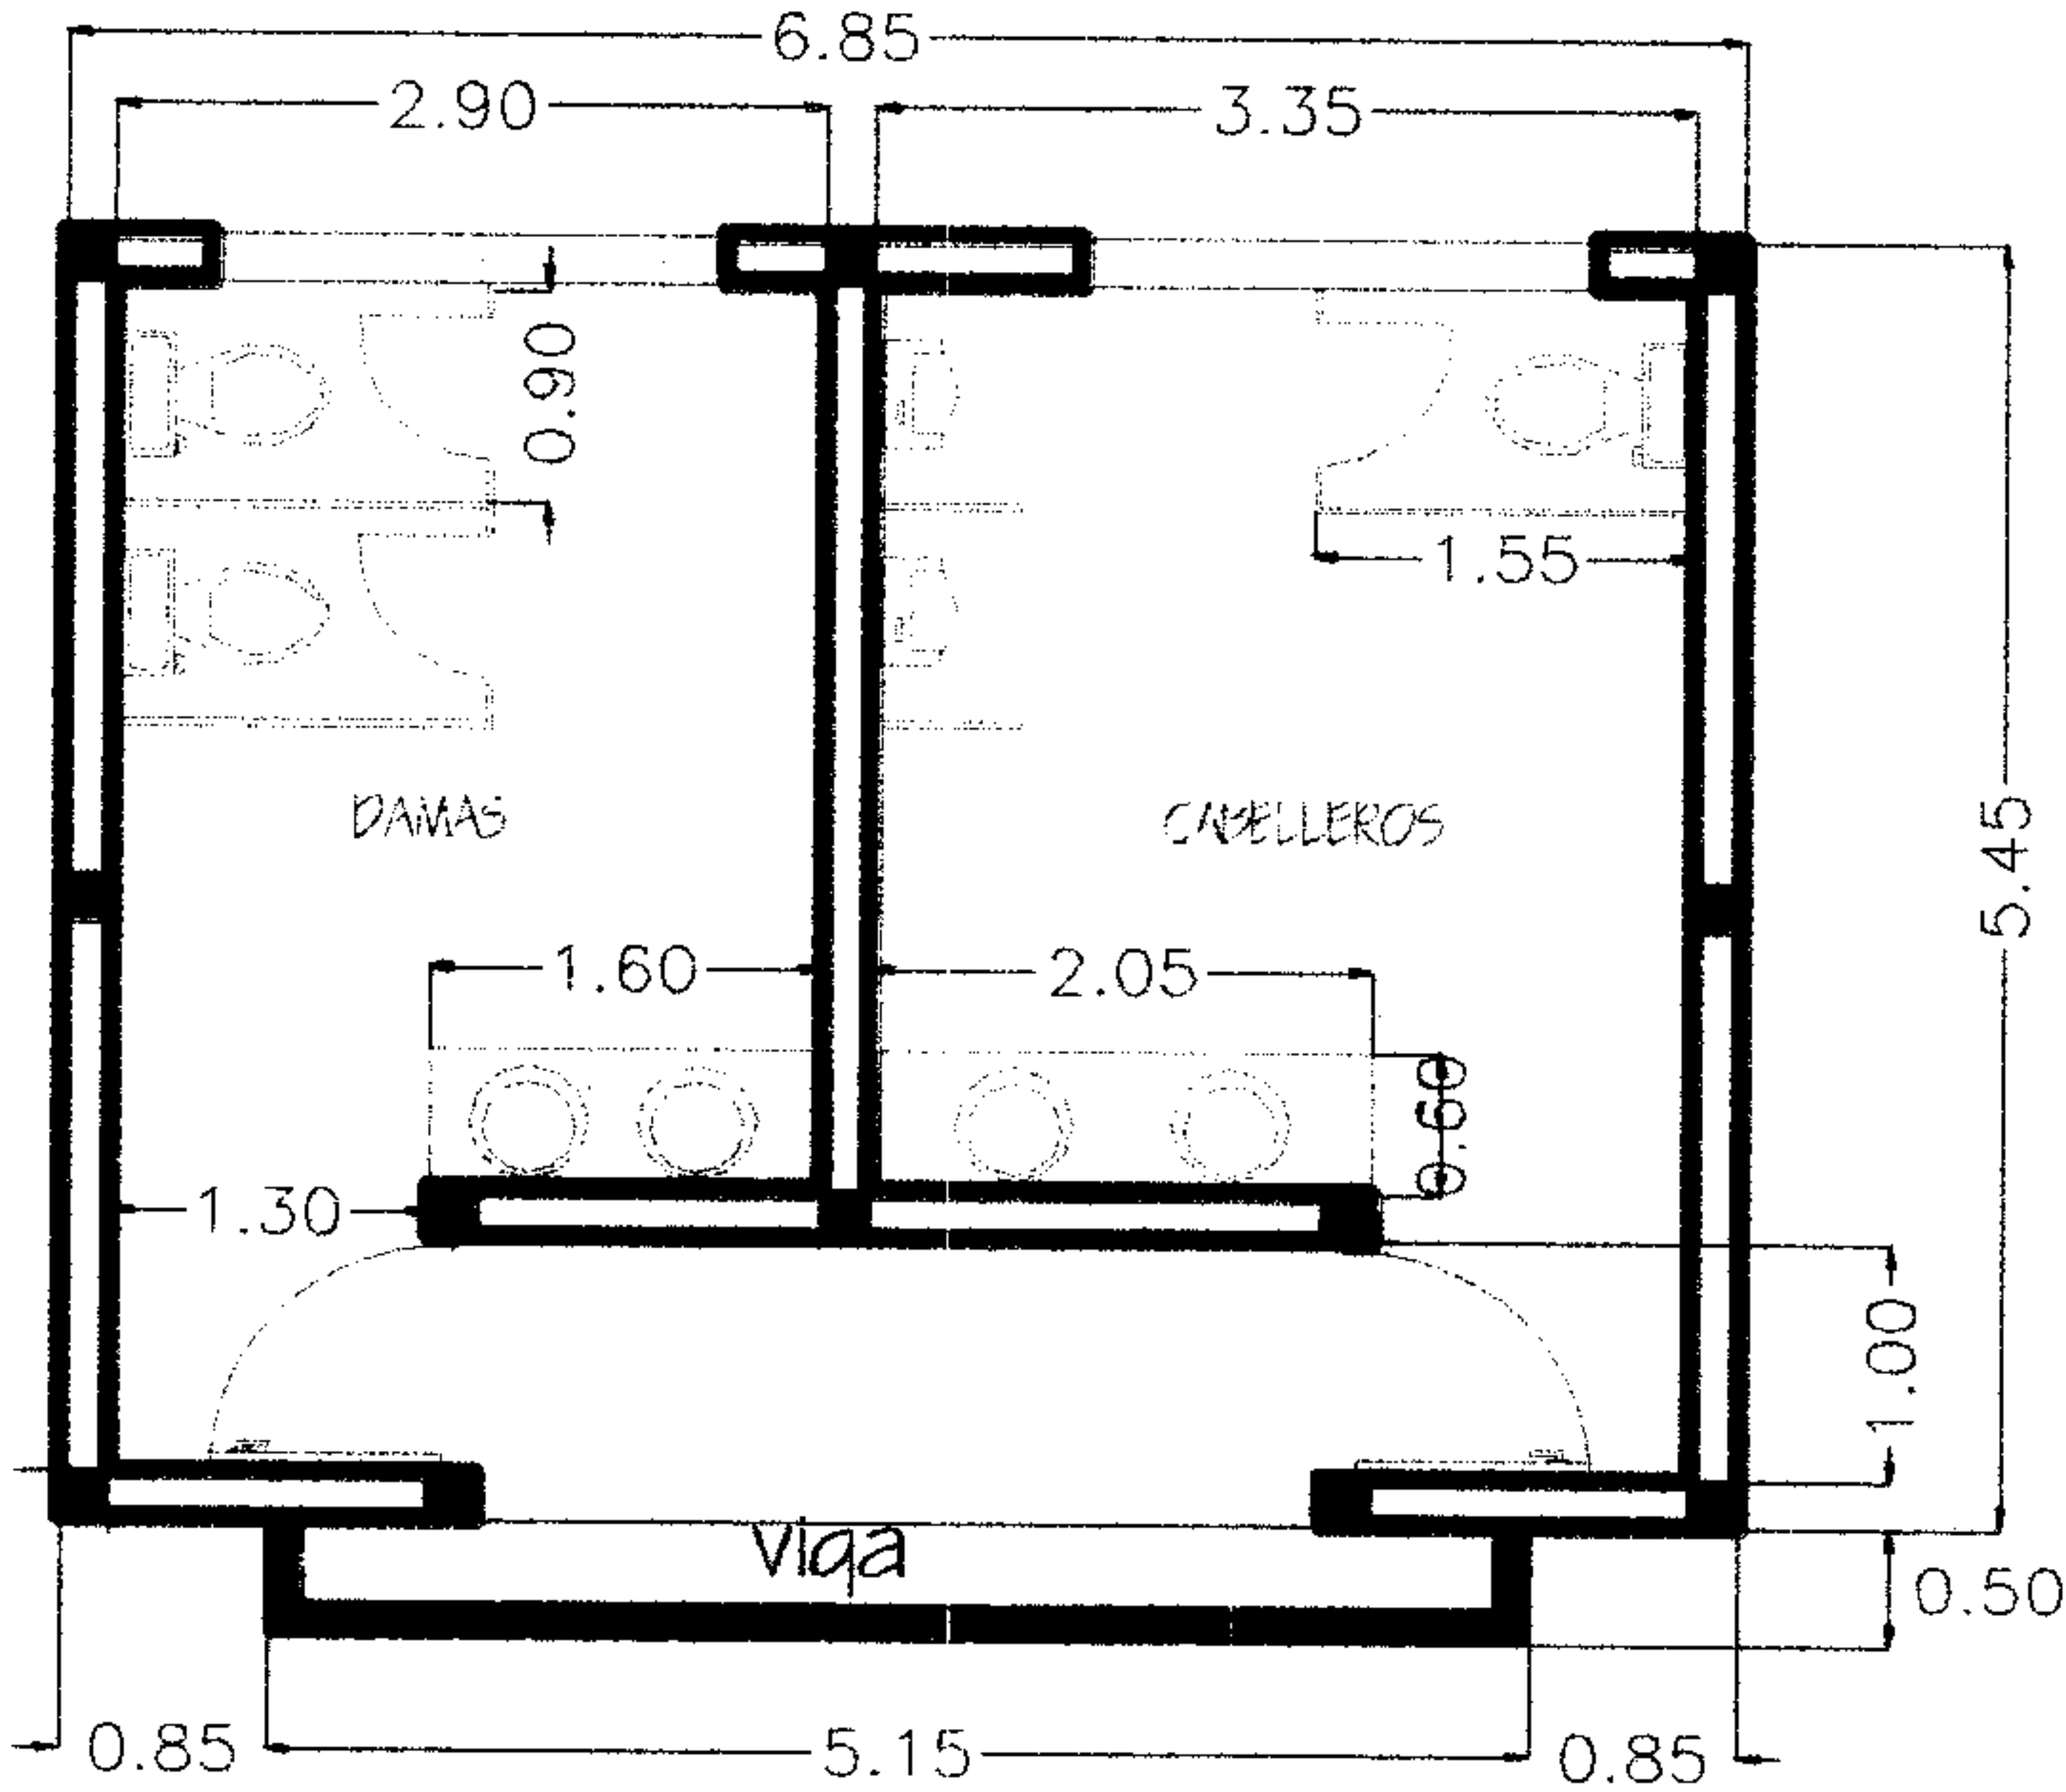

Azulejo Negro

ELABORO.-

C. MANUEL URIARTE BELTRAN
REPRESENTANTE LEGAL

REVISO.-

ARQ. BRICEIDA GUADALUPE NIEBLAS MARTINEZ
SUPERVISOR



AUTORIZO.-

ING. ROBERTO RINCON RAMOS
DIRECTOR O. P. D. U. Y E.

MANUEL URIARTE BELTRAN.



OBRA:	CONSTRUCCIÓN DE BAÑOS PÚBLICOS UBICADOS A UN COSTADO DE TECHUMBRE EN LA COMUNIDAD DE CIÉNEGA DE LOS LARA, SINDICATURA DE CIÉNEGA DE LOS LARA, EN EL MUNICIPIO DE BADIRAGUATO, SINALOA.
ESTIMACION:	01 ADICIONAL FINIQUITO
REPORTE FOTOGRAFICO DE ESTIMACION	
6	ACABADOS
GPB02	SUMINISTRO Y COLOCACION DE AZULEJO LUCENTIA NERO SUPREMO DE 40X60 CMS ASENTADO CON ADHESIVO PARA PISO PORCELANICO CON EMBOQUILLADOR INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, RECORTES, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

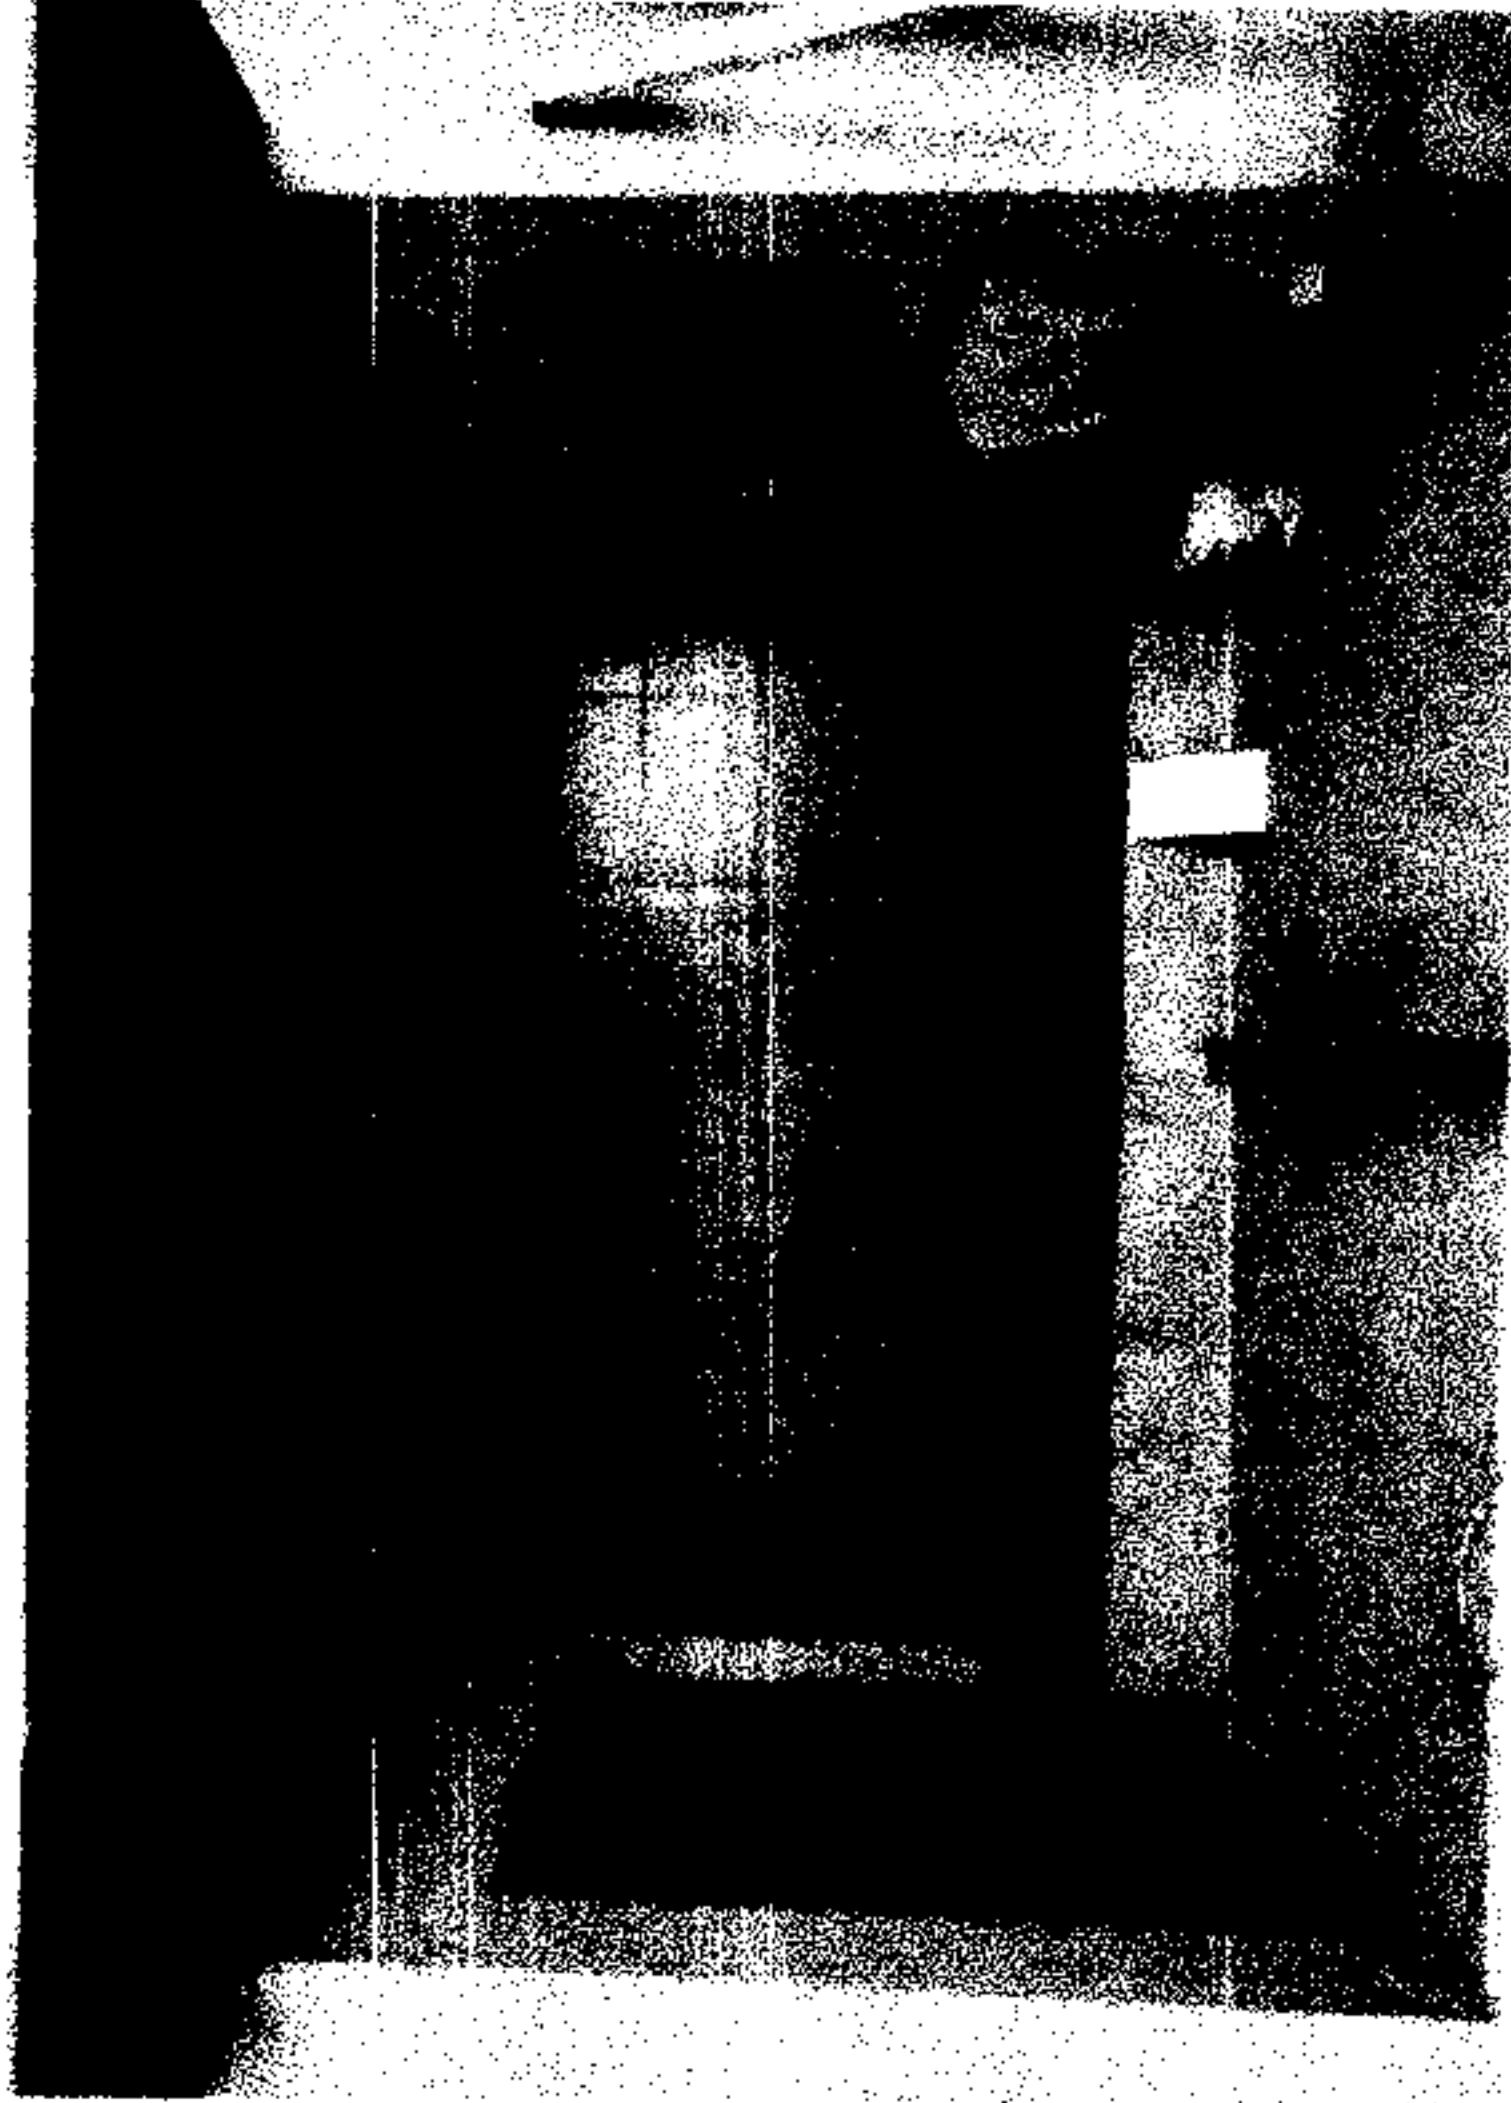

ELABORO.-

C. MANUEL URIARTE BELTRAN
REPRESENTANTE LEGAL

REVISO.-

ARQ. BRICEIDA GUADALUPE NIEBLAS MARTINEZ
SUPERVISOR

AUTORIZO.-

ING. RUBIEL RINCON RAMOS
DIRECTOR DE O.P.D.U. Y E.



Fecha y hora de consulta01/04/2025 12:35:43 PM

Contrato00798320

Nombre del ClienteMUNICIPIO DE BADIRAGUATO

BBVA Net Cash - Pagos Interbancarios

Operación autorizada

Transferencia en proceso de validación y aplicación.

Datos del firmante

Usuario:ADMIN1

Poder:100%

Datos de la operación

Tipo de operación:Pago Interbancario

Descripción:EST 01 AD FIN A001

Cuenta de retiro:0117899181

Divisa de la cuenta: MXP

Titular de la cuenta:MUNICIPIO DE BADIRAG UATO

Nombre banco destino: BANORTE

Fecha de creación:01/04/2025

Concepto de pago:EST 01 AD FIN A001

Instrumento de seguridad: ASD 6551749382

Importe de la operación:3,018.69 MXP

Cuenta de depósito:072730002039434985

Divisa de la cuenta: MXP

Titular de la cuenta: MANUEL URIARTE BELTRAN

Fecha de aplicación:01/04/2025

Referencia numérica:

Hora de captura en el canal:12:35:40

Datos de confirmación de la transferencia

Folio interbancario:0000115951

Folio de firma:0044779037

Clave de rastreo:002601002504010000115951

Folio único:I401202504011235400044779043

Estado operación

Porcentaje Firmado:100%

Estado:Operado

Detalle de firmas

Acción	Usuario	Porcentaje aportado	Fecha
CREO	ADMIN1	— %	01/04/2025
FIRMO	ADMIN1	100 %	01/04/2025
