


NOTA#1 Con esta fecha se abre la presente bitacora para la obra, Pavimentacion en Av. Fray andres Tello entre calle General Viviano Davalos y calle General Ignacio Pesqueira en la colonia 21 de Marzo en el Municipio de Culiacan.

- Contrato No. OPPU-EST-ADJ-PEST-VIAL-1804G-2022
 - Periodo del contrato Fecha Inicio 25 Abril 2022
Fecha de Termina 10 Julio 2022
 - Importe de contrato \$ 1'487,111.15
 - Importe Anticipo 35% \$ 520,488.90
 - Representante Legal. c. Jesus Michel Perry
 - Residente de Obra Contratista: Ing. Heriberto Cazarez Sanchez
 - Supervisor de S.O.P. Ing. Alejandro Sainz Sanchez
- Con esta fecha se presenta a las oficinas de Supervision de Gobierno del Estado Sinaloa, en ciudad de Culiacan, Estado de Sinaloa en el sector llamado 3 Rios, Representante Legal de la empresa contratista. Lic. Jesus Michel Perry, el cual nos informa que no ha recibido el anticipo, por lo tanto no iniciara la obra mencionada.



Ing. Alejandro Sainz Sanchez
Supervisor S.O.P.

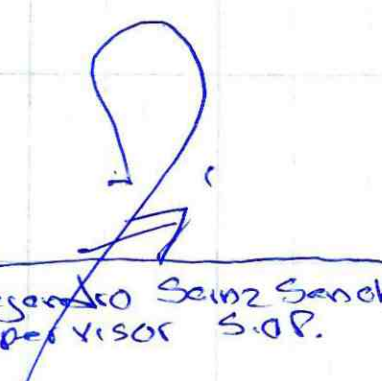

Ing. Heriberto Cazarez Sanchez
Contratista.

NOTA #2 con esta fecha nos informa el contratista Lic. Jesus Michel Perry, presentando copia de deposito otorgado como anticipo para inicio de obra.

- Se hace la visita de obra con residente de Obra: Ing. Heriberto Cazarez Sanchez, donde hacemos el recorrido y se muestra ningun problema para dar inicio a los trabajos
- Por lo tanto este Supervisor hace entrega al contratista para inicio de los trabajos.

- Se inician los trabajos con demolicion de banquetas con equipo neumatico
- Se inician los trabajos de apertura de caja.
- Se le pide al contratista, que presente una programacion de obra, con el desfase de dias por entrega de anticipo, y solicitar un convenio de tiempo.

Ing. Alejandro Sainz Sanchez
Supervisor de S.O.P.

Ing. Heriberto Cazarez Sanchez
Residente Obra Contratista


NOTA #3

10 JUNIO 2022


- Se terminen los trabajos de apertura de caja.
- Se ~~continua~~ terminan los trabajos tendido y compactacion de sub-basante
- Se inician los trabajos de tendido y compactacion de base.

NOTA #4 En supervision de obra se muestra el siguiente avance:

- Se terminan los trabajos de tendido y compactacion de base.
- Se terminan los trabajos de riego de impregnacion
- Se inician los trabajos de colado de guardicion
- Se inician los trabajos de colado de banquetas.



Ing. Alejandro Sainz Sanchez
Supervisor S.O.P.




Ing. Heriberto Cerezo Sanchez
Residente de Obra.

NOTA #5

28 Junio 2022

En supervision de obra se muestra el siguiente avance.

- Se terminan los trabajos de colado de guardicion
- Se continuan los trabajos de colado banquetas.
- Se inician los trabajos de colado losos y arroyo de calle.




NOTA #6 30 Junio 2022

- con esta fecha se entrega la estimacion #1 cobrandose las siguientes partidas.

- Preliminares	- - - - -	\$ 5,708.00
- concreto Hidraulico	- - - - -	\$ 382,317.15
- Obras Viales	- - - - -	\$ 315,469.31
- Banquetas, Gerdurones	- - - - -	\$ 77,319.84

Sub Total	\$ 780,814.30
I.V.A. - Sub IGT	\$ 124,930.29

Total \$ 905,744.59



Ing. Alejandro Sainz Sanchez
Superxior S.O.P.



Ing. Heriberto Carraz Sanchez
Residente Obra.

NOTA #7' En Supervision de obra se muestra el siguiente avance

- Se continuan los trabajos de colocacion de losas con espesor de 15cm., colocandose acero de refuerzo LISO 5/8" de diametro
- Se inician los trabajos de relleno de banquetes
- Se terminan los trabajos de colado de guardaciones tipo "L".
- Se continuan los trabajos de instalacion electrica, (cableado, Registros 40x40x40, arbotantes,)



Ing. Alejandro Sainz Sanchez
Supervisor S.O.P.



Ing. Heriberto Carreza Sanchez
Contratista.

NOTA #8

27 Julio 2022

- En Supervision de obra se muestra el siguiente avance.
- Se terminan los trabajos de colado de losas en Arroyo de calle.
 - Se terminan los trabajos de colado guardaciones tipo "L".
 - Se continuan los trabajos de instalacion Electrica (Arbotantes, Registros, cableado).
 - Se continuan los trabajos de relleno y colado de banquetes de 10cm espesor



NOTA#9 con esta fecha se entrega la estimacion numero dos, cobrandose las siguientes partidas.

- Pavimentacion de concreto Hidraulico

Preliminares - - - - - \$ 98,230.18

Obras Civil - - - - - \$ 36,991.18

Concreto Hidraulico - - - - - \$ 70,158.42

Obras Viales - - - - - \$ 19,292.51

Banquetas Guardaciones - - - - - \$ 138,826.00

- Alumbreado

Instalacion Electrica - - - - - \$ 120,357.88

\$ 483,856.15 s/IVA.



Ing. Alejandro Sainz Sanchez
Supervisor S.O.P.



Ing. Heriberto Cazarez Sanchez
Contratista

NOTA #10 Con esta fecha se finalizan los trabajos de pavimentación en Av. Fray Tello entre General Viviano Dávalos y calle General Ignacio Pesquera en la col. 21 Marzo, quedando ejecutados todos los trabajos al 100%.

- Se entrega la estimación #3 Finales, cobranda los siguientes partidas.

- Instalaciones complementarias - - - - \$ 46,982.30
- Extraordinarias - - - - \$ 229,152.68

Sub-Total \$ 276,054.98

I.V.A (16%) \$ 44,168.80

Total \$ 320,223.78

CANCELADO

Ing. Alejandro Sainz Sanchez
Supervisor S.O.P

Ing. Heriberto Carreón Sanchez
Contratista

Notado lo anterior se cierra la presente bitácora

NOTA #10 Con esta fecha se finalizan los trabajos de Parimintacion de Av. Fray Tello entre German Vivanco Davalos y calle General Ignacio Pesquera en la col. 21 Marzo, quedando ejecutados todos los trabajos.

- con esta fecha se entrega la estimacion #3 Normal, cobrandose la sig. Partida.

- instalaciones complementarias - - - - \$ 46,802.30
S/IVA

- se entrega la estimacion #4 Finiquito extra-ordinario

- Extraordinaria - - - - \$ 229,152.68
S/IVA

- Quedando un saldo de \$ 4.33 S/IVA.


- Anotado lo anterior se declare cerrada esta Bitacora

Ing. Alejandro Srinz Sanchez
Supervisor S.O.P.

Ing. Heriberto Cazarez Sanchez

NOTA # 10 Con esta fecha se entrega la estimación numero #3 Normal, cobrandose las sig. partidas.

Instalaciones complementarias - - - \$ 46,902.80
S/IVO.


Ing. Alejandro Samz Sanchez
Supervisor SOP


Ing. Heriberto Cazarez Sanchez
Contratista

NOTA # 11 16 Agosto

- con la misma fecha se entregan las estimaciones numero 4 Extraordinaria y 5 Finiquito, cobrandose las siguientes partidas, ya que se dividen las estimaciones para su pago de Finiquito
- Se terminan los trabajos en construcción quedando los trabajos ejecutados al 100%.


• Estimación # 4 Extraordinaria

Extraordinaria - - - - - \$ 20,324.01 S/IVO.

• Estimación # 5 Finiquito - - -

Extraordinaria - - - - - \$ 208,828.63 S/IVO.

- Quedando un saldo de \$ 4.38 S/IVO.


Ing. Alejandro Samz Sanchez


Ing. Heriberto Cazarez Sanchez

- Añadiendo lo anterior se declara Cerrada Esta Bitacora
