

NOTA #1

18 DE NOVIEMBRE DE 2022

Con fecha de hoy, Se apertura la presente bitacora del contrato:

OPPU-EST-LF-FISE-VIAL-1411-2022

El periodo de Contrato será del 18 de Nov. del 2022 al 31 de Diciembre de 2022.

El monto de Contrato es de \$ 2,836,170.26 con Iva incluido, el nombre de la obra es:
" Construcción de Pavimento Hidráulico de 15 cm., Red de alcantarillado, red de Agua Potable y alumbrado público, en la vialidad Adolfo Cordero, Ubicada en la cabecera municipal de Badiraguato, Municipio de Badiraguato, Estado de Sinaloa.




ARA JOVIER MARTINEZ PEREZ



TONIAS CONSTRUCCION
SA DE C.V.


NOTA #2 , 18 DE NOVIEMBRE DE 2022

Con fecha de hoy, Se inician los trabajos en obra, Se hace entrega - recepción del inmueble para realizar los trabajos correspondientes.



NOTA #3. 21 DE NOVIEMBRE DE 2022.

con fecha de hoy, Siguen los trabajos en Red de Agua potable, Drenaje Sanitario y en Descargas Sanitarias


MEX Juan P^o MARTINEZ PEREZ

NOTA #4. 30 DE NOVIEMBRE DE 2022

Con fecha de hoy, se autoriza la
Est. 1 Normal con periodo del 18/11/22 al
30/11/22, importe Sin IVA \$ 586,864.54.
Líquido a pagar \$ 424,889.92

RED DE AGUA POTABLE.

P01	PRELIMINARES	\$ 63,456.54
P03	OBRAS CIVIL	\$ 11,924.96
P08	AGUA POTABLE	\$ 109,173.00
P34	SEÑALIZACIÓN VIAL	\$ 235.52

DRENAJE SANITARIO

P01	PRELIMINARES	\$ 77,235.97
P22	ACANTARILLADO	\$ 205,174.03
P34	SEÑALIZACIÓN VIAL	\$ 235.52

DESCARGAS SANITARIAS

P01	PRELIMINARES	\$ 27,178.78
P03	OBRAS CIVIL	\$ 68,345.82
P22	ACANTARILLADO	\$ 23,534.92
P34	SEÑALIZACIÓN VIAL	\$ 69.37


TOTAL
SIN IVA \$ 586,864.54.

Supervisor Sop.

NOTA #5: 12 DE DICIEMBRE DE 2022

Con fecha de hoy continúan los trabajos se observan avances en Guarnición tipo "L" de $15 \times 30 \times 60$ de concreto f' mezclado $f'c = 300 \frac{\text{kg}}{\text{cm}^2}$ compactación de Base grava-arena de 20cm, riego de impregnación con emulsión Cationica, losa de concreto de 15cm de espesor Concreto Premezclado $f'c = 300 / \text{cm}^2$, banquetas de 10cm de espesor concreto hecho en obra, con las pruebas de laboratorio correspondientes para validar la calidad de los materiales.

Contratista prepara estimaciones 2 normal y 3 adicional para futura revisión



SUPERVISOR SUP.
AR. VAN ~~FC~~ MARTINEZ PEREZ



Nota #6. 15 DE DICIEMBRE DE 2022

Con fecha de hoy, se autoriza la estimación 2ª normal
con periodo del 01/12/2022 al 15/12/2022,
importe sin IVA \$ 1,324,686.36, líquido a pagar
\$ 959,072.92.

PA PRELIMINARES 88,806.37

POB OBRAS VIALES 848,634.34


P30 BANQUETAS GUARNICIONES
Y ANDADURES 377,213.76


Alumbrado Público

P20 INST. ELECTRICA

10,031.89

1,324,686.36





NOTA #7. 15 DE DICIEMBRE DE 2022


Con fecha de hoy Se autoriza la Estimación
3 adicional con periodo del 18/11/2022 al
15/12/2022, importe Sin Iva \$ 329,551.30,
liquido a pagar - \$ 238,595.14
Pavimentacion con Concreto Hidraulico


P01 PRELIMINARES	4,960.04
P06 OBRA VIAL	133,101.73
P30 BANQUETA GUARNICIONES Y ANDADORES	18,328.32
RED DE AGUA POTABLE	
P01 PRELIMINARES	36,397.24
P03 OBRA CIVIL	745.31
- P18 AGUA POTABLE	21,558.61

DRENAJE SANITARIO.

P01 PRELIMINARES	47,386.83
P22 ALCANTARILLADO	30,883.90
REDES SANITARIAS	
P01 PRELIMINARES	3,189.52


329,551.30


Juan R. Martinez PRP




NOTA #8. 16 DE DICIEMBRE DE 2022

Se Continuan con los trabajos de:
Pintura en grarnición de 20 x 15cm con
Pintura tipo trafico SCT Color amarillo o
blanco, con uso de maquina pintarrayas.
Se sigue trabajando en grarnición tipo "L"
de 15x30x60 de Concreto premezclado de
 $F'C = 300 \text{ Kg/cm}^2$ T.M.A. DE 1 1/2"

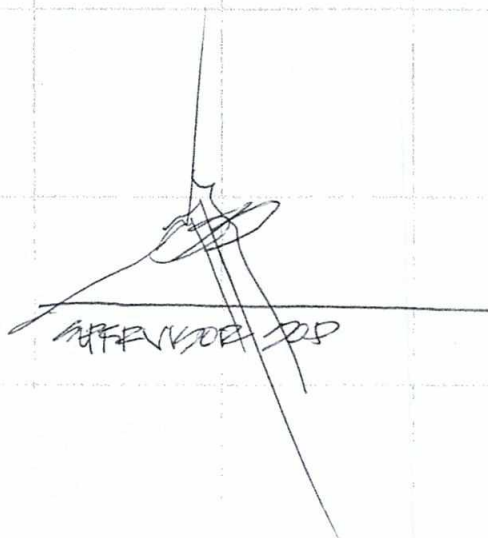


APPROVED




NOTA #9 19 DE DICIEMBRE DE 2022

Con fecha de hoy Continúan los trabajos de losa de concreto premezclado $f'c = 300 \frac{kg}{cm^2}$, Compactación de base grava-arena de 20'cm, riego de Impregnación con emulsión cationica
Contratista prepara estimación A normal para su revisión.


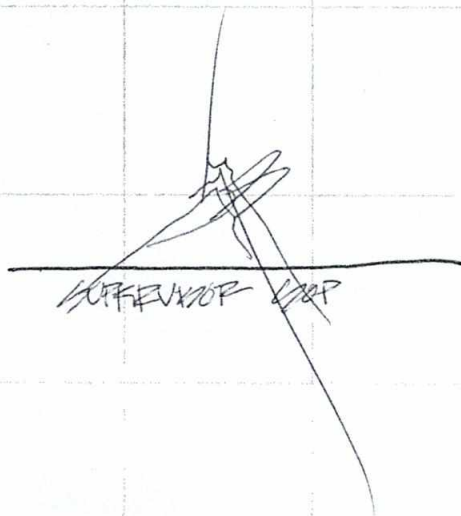


CONTRATISTA



NOTA #10 21 DE DICIEMBRE DE 2022


Se autoriza Convenio de monto con un
Importe de: \$ 314,905.84, Con No de Convenio:
CONV-01-2022-MI-CI411-2022.


NOTA #11 27 DE DICIEMBRE DE 2022

Se trabaja en Corte de Concreto, demolición
de guardación en mal estado, demolición en
concreto y banquetas, pavimento de 10cm con
medios neumáticos y Sondeo de tuberías de
red de alcantarillado existentes.

Contratista entrega estimaciones 4 normal y
5 extraordinaria finiquito para su reusson.



Juan Carlos Martínez Pérez



NOTA #12 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Con esta fecha de hoy se autorizan la estimación 4 normal con periodo del 16/12/2022 al 31/12/2022 con un importe \$ 385,495.77 sin IVA y un liquido a pagar \$ 352,838.12

PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO

P01	PRELIMINARES	\$-3,809.75
P03	OBRA CIVIL	\$ 12,209.75
P06	OBRAS VIACES	\$-57,572.77
P30	BANQUETAS GUARNICIONES Y ANTIADORES	\$ -8,351.70
P34	SENAIZACION VIAL	\$ 20,103.01


ALUMBRADO PUBLICO

P20	INSTALACION ELECTRICA	\$439,068.83
P32	INSTALACIONES COMPLEMENTARIAS	\$ 14,732.30

DRENAJE SANITARIO

P22	ALCANTARILLADO	\$-30,883.90
-----	----------------	--------------

TOTAL S/IVA \$ 385,495.77

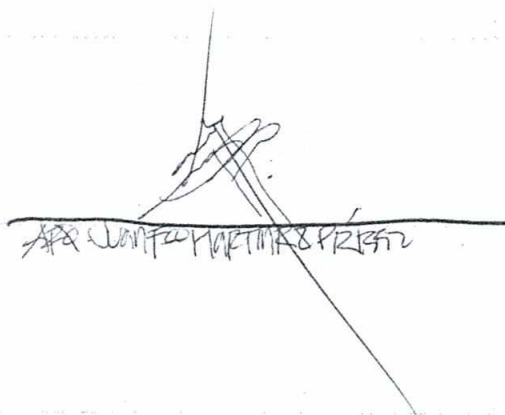
~~APROBADO POR EL COMITÉ DE OBRA~~




NOTA #13 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Con esta fecha de hoy se auteniza la
estimación S extraordinaria finiquito con
periodo del 16/12/2022 al 31/12/2022
con importe de: \$101,526.84 liquido a pagar
y un total de estimación s/iva \$89,846.76

EXTRAORDINARIOS


\$89,846.76

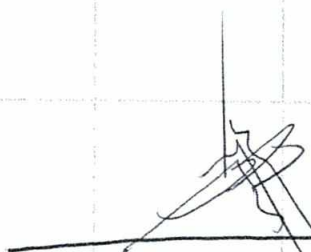

Adolfo Cordero

NOTA #14 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Una vez concluidos los trabajos relacionados
al Contrato No. OPPU-EST-LP-FISE-VIAL-1411-2022 para
la Construcción de pavimento hidráulico de 15cms, red
de alcantarillado Sanitario, red de agua potable y
alumbrado Público, en la vialidad Adolfo Cordero,
ubicada en la Cabecera municipal de Badiraguato se
Procede al Cierre de la presente Bitácora


_____
