

No. Contrato	FAISMUN-AD-006-2025
Montó contrato con IVA:	\$456,596.88
Importe del Anticipo con IVA:	\$159,808.91

Fecha: 13 DE DICIEMBRE DEL 2025

Estimacion No. 1 (UNO) (UNICA)

Ubicacion: BARRAS DE PIAXTLA

C. Ing. Jose Manuel Bastidas Manjarrez

CONSTRUCCION DE 2 CUARTOS DORMITORIOS, EN LA LOCALIDAD DE BARRAS DE PIAXTLA, MUNICIPIO DE SAN IGNACIO, ESTADO DE SINALOA.

Periodo del Contrato:

al 20/dic/2025

ESTADO DE CUENTA

1 de 1

[illegible]

CONTRATISTA

C. ING. JOSE MANUEL BASTIDAS MANJARREZ

REVISO

C. ING. ABELARDO GALVAN ASTORGA
RESIDENTE DE LA DOSPM

ING. IGNACIO GONZALEZ BARRIENTOS
DIRECTOR DE LA DOSPM

C. Ing. Jose Manuel Bastidas Manjarrez

1 de 1

CONSTRUCCION DE 2 CUARTOS DORMITORIOS, EN LA LOCALIDAD DE BARRAS DE PIAXTLA, MUNICIPIO DE SAN IGNACIO, ESTADO DE SINALOA.				Fecha: 13 DE DICIEMBRE DEL 2025	Estimacion: 1 (UNO) (UNICA)	
Periodo de la estimacion:		03/nov/2025	al	13/dic/2025	Localidad: BARRAS DE PIAXTLA	No. De contrato: FAISMUN-AD-006-2025
Periodo de Ejecución:		03/nov/2025	al	20/dic/2025		
Importe del contrato con I.V.A:		Imp. Contratado sin I.V.A		Anticipo	Importe Anticipo sin I.V.A	% de Avance 100.00%
\$456,596.88		\$393,618.00		\$159,808.91	\$137,766.30	% Avance Total 100.00%

Control Del Anticipo	Liquidacion de Estimacion		Control de Estimacion
AMORTIZA ESTA ESTIMACION	Importe de la Estimacion (+)	\$393,618.00	ESTA ESTIMACION
\$159,808.91	16 % I.V.A (+)	\$62,978.88	\$456,596.88
	Sub- Total A (=)	\$456,596.88	
AMORTIZACION ANTERIOR	Amortizacion Anticipo 35%	\$137,766.30	ACUMULADO ANTERIOR
\$0.00	16 % I.V.A (+)	\$22,042.61	\$0.00
	Total (=)	\$159,808.91	
TOTAL AMORTIZADO	Importe TOTAL	\$255,851.70	TOTAL ACUMULADO.
\$159,808.91	16 % I.V.A (+)	\$40,936.27	\$456,596.88
	Total (=)	\$296,787.97	
ANTICIPO OTORGADO	CMIC 0.2% (-)	\$0.00	CONTRATADO
\$159,808.91	VER., INSP., FISC. Y CONT. 3% (-)	\$11,808.54	\$456,596.88
	Total Deducciones (=)	\$11,808.54	
	Importe T O T A L	\$284,979.43	
SALDO DEL ANTICIPO	NETO A PAGAR	\$284,979.43	SALDO
\$0.00	Son		\$0.00
	DOSCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS 43/100 M.N.		

CONTRATISTA

C. ING. JOSE MANUEL BASTIDAS MANJARREZ

REVISOR

C. ING. ABELARDO GALVAN ASTORGA
RESIDENTE DE LA DOSPM

AUTORIZADO

ING. IGNACIO GONZALEZ BARRIENTOS
DIRECTOR DE LA DOSPM

No. Contrato: FAISMUN-AD-006-2025
 Fecha: 13 DE DICIEMBRE DEL 2025
 Monto contrato con IVA: \$456,596.88
 Ubicación: BARRAS DE PIAXTLA
 Monto contrato sin IVA: \$393,618.00
 Estimación No.: 1 (UNO) (UNICA)

C. Ing. Jose Manuel Bastidas Manjarrez

CONSTRUCCION DE 2 CUARTOS DORMITORIOS, EN LA LOCALIDAD DE BARRAS DE PIAXTLA, MUNICIPIO DE SAN IGNACIO, ESTADO DE SINALOA.

Periodo de la estimacion: del 03/11/2025 al 13/12/2025
 Estimacion
 2 de 6

CLAVE	CONCEPTO	PROGRAMADO			ANTERIORMENTE		ESTA ESTIMACION		SALDO	
		Unidad	Cantidad	Precio U.	Importe	Cant.	P.U.	Importe	Cantidad	Importe
01010020	RELLENO COMPACTADO CON PISON DE MANO EN CAPAS DE 20 CMS DE ESPESOR CON MATERIAL DE BANCO (NO INCLUYE MATERIAL) INCLUYE: RIEGO CON AGUA PARA LA SATURACION DEBIDA Y APISONADO CON PISON DE MANO HASTA OBTENER LA COMPACTACION REQUERIDA.	M3	9.04	\$238.59	\$2,156.85	0.00	9.04	\$238.59	0.00	\$0.00
01060087	SUMINISTRO PUESTO EN OBRA DE MATERIAL INERTE PARA RELLENO.	M3	11.76	\$273.64	\$3,218.01	0.00	11.76	\$273.64	0.00	\$0.00
01030017	PISO DE CONCRETO DE 10 CMS DE ESPESOR REFORZADO CON MALLALAC 6/6-10/10 CONCRETO HECHO EN OBRA FC=150 KG/CM2 ACABADO BROCHADO INCLUYE CIMBRA DE FRONTERA, COLADO, DAR ACABADO ESPECIFICADO, CURADO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M2	29.64	\$648.07	\$19,208.79	0.00	29.64	\$648.07	0.00	\$0.00
0104003017	MUROS, DALAS Y CASTILLOS MURO DE BLOCK SOLIDO DE JAL DE 9X14X28 CMS DE 14 CMS DE ESPESOR ASENTADO CON MORTERO DE ALBAÑILERIA-ARENA PROP. 1:3 DE 0.00 A 3.00 MTS DE ALTURA.	M2	70.58	\$867.80	\$61,249.32	0.00	70.58	\$867.80	0.00	\$0.00
01031025	CASTILLO DE 15X15 CMS. REFORZADO CON ARMEX 15X15-4 CON CONCRETO FC=150 KG/CM2 CIMBRA ACABADO COMUN.	ML	24.00	\$446.42	\$10,714.08	0.00	24.00	\$446.42	0.00	\$0.00
Suma esta hoja					\$96,547.05			\$96,547.05		\$0.00
Sumas acumuladas					\$136,870.11			\$136,870.11		\$0.00

CONTRATISTA
 C. ING. JOSE MANUEL BASTIDAS MANJARREZ

REVISOR
 C. ING. ABELARDO GALVAN ASTORGA
 RESIDENTE DE LA DOSPM

AUTORIZADO
 ING. IGNACIO GONZALEZ BARRIENTOS
 DIRECTOR DE LA DOSPM



No. Contrato: FAISMUN-AD-006-2025
Fecha: 13 DE DICIEMBRE DEL 2025
Monto contrato con IVA: \$456,596.88
Ubicacion: BARRAS DE PIAXTLA
Monto contrato sin IVA: \$393,618.00
Estimacion No.: 1 (UNO) (UNICA)

C. Ing. Jose Manuel Bastidas Manjarrez

CONSTRUCCION DE 2 CUARTOS DORMITORIOS, EN LA LOCALIDAD DE BARRAS DE PIAXTLA, MUNICIPIO DE SAN IGNACIO, ESTADO DE SINALOA.

Periodo de la estimacion: del 03/11/2025 al 13/12/2025
3 de 6

Estimacion

CLAVE	CONCEPTO	PROGRAMADO			ANTERIORMENTE		ESTA ESTIMACION			SALDO		
		Unidad	Cantidad	Precio U.	Importe	Cantidad	Importe	Cant.	P.U	Importe	Cantidad	Importe
01031020	DALA DE CERRAMIENTO DE 15X20 CMS. REFORZADA CON ARMEX 15X20-4 CON CONCRETO FC=150 KG/CM2 CIMBRA ACABADO COMUN.	ML	32.00	\$486.78	\$15,576.96	0.00	\$0.00	32.00	\$486.78	\$15,576.96	0.00	\$0.00
0105	LOSA Y AZOTEA											
01040077	LOSA DE CONCRETO ARMADA DE 10 CMS DE ESPESOR ARMADA CON VARILLAS DE 3/8" A CADA 20 CMS EN AMBOS SENTIDOS CONCRETO FC=200 KG/CM2 ACABADO COMUN.	M2	38.60	\$2,014.60	\$77,763.56	0.00	\$0.00	38.60	\$2,014.60	\$77,763.56	0.00	\$0.00
01053027	SUMINISTRO Y APLICACION DE IMPERMEABILIZANTE ELASTOMERICO BLANCO CALIDAD 5 AÑOS A 2 MANOS INCLUYE MATERIALES Y MANO DE OBRA.	M2	38.60	\$223.27	\$8,618.22	0.00	\$0.00	38.60	\$223.27	\$8,618.22	0.00	\$0.00
0106	RECUBRIMIENTOS Y ACABADOS											
01070152	APLANADO EN LOSAS CON MORTERO DE ALBAÑILERIA-ARENA 1:3 TERMINADO FLOTEADO DE 0.00 A 3.00 MTS. DE ALTURA, INCLUYE: PLOMEO, NIVELADO, ELABORACION DEL MORTERO, DESPERDICIOS, MATERIALES, ANDAMIOS, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M2	38.60	\$442.27	\$17,071.62	0.00	\$0.00	38.60	\$442.27	\$17,071.62	0.00	\$0.00
01070153	APLANADO EN MUROS CON MORTERO DE ALBAÑILERIA-ARENA 1:3 TERMINADO FLOTEADO DE 0.00 A 3.00 MTS. DE ALTURA, INCLUYE: PLOMEO, NIVELADO, ELABORACION DEL MORTERO, DESPERDICIOS, MATERIALES, ANDAMIOS, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M2	91.10	\$369.15	\$33,629.57	0.00	\$0.00	91.10	\$369.15	\$33,629.57	0.00	\$0.00
Suma esta hoja					\$152,659.93		\$0.00			\$152,659.93		\$0.00
Sumas acumuladas					\$289,530.04		\$0.00			\$289,530.04		\$0.00

CONTRATISTA

REVISOR

AUTORIZO

C. ING. JOSE MANUEL BASTIDAS MANJARREZ

C. ING. ABELARDO GALVAN ASTORGA
RESIDENTE DE LA DOSPM

ING. IGNACIO GONZALEZ BARRIENTOS
DIRECTOR DE LA DOSPM

No. Contrato: FAISMUN-AD-006-2025
 Fecha: 13 DE DICIEMBRE DEL 2025
 Monto contrato con IVA: \$456,596.88
 Ubicación: BARRAS DE PIAXTLA
 Monto contrato sin IVA: \$393,618.00
 Estimación No.: 1 (UNO) (UNICA)

Obra:

C. Ing. Jose Manuel Bastidas Manjarrez

CONSTRUCCION DE 2 CUARTOS DORMITORIOS, EN LA LOCALIDAD DE BARRAS DE PIAXTLA, MUNICIPIO DE SAN IGNACIO, ESTADO DE SINALOA.

Periodo de la estimación: del 03/11/2025 al 13/12/2025
 4 de 6

Estimación

CLAVE	CONCEPTO	PROGRAMADO			ANTERIORMENTE		ESTA ESTIMACION		SALDO	
		Unidad	Cantidad	Precio U.	Importe	Cantidad	Importe	P.U.	Importe	Importe
06020014	FILOS Y BOQUILLAS DE PUERTAS, VENTANAS Y ESQUINAS FORJADAS CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3 DE 1.5 CMS DE ESPESOR.	ML	19.40	\$163.73	\$3,176.36	0.00	\$0.00	19.40	\$3,176.36	\$0.00
0107	INSTALACIONES ELECTRICAS									
01100001	SALIDA ELECTRICA PARA ALUMBRADO A BASE DE POLIDUCTO NARANJA DE 1/2" CON CABLE THW CAL. 12, CON CAJA CUADRADA DE 4" X 4", CAJA DE 2" X 4" APAGADOR, ROSETA, INCLUYE: MATERIALES, INSTALACION, MANO DE OBRA, PRUEBAS, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	SAL	6.00	\$2,570.53	\$15,423.18	0.00	\$0.00	6.00	\$15,423.18	\$0.00
01100008	SALIDA ELECTRICA PARA CONTACTO A BASE DE POLIDUCTO NARANJA DE 1/2", CON CABLE THW CAL. 12 Y 14, CON CAJA DE 2" X 4", CONTACTO DUPLEX, INCLUYE: MATERIALES, INSTALACION, MANO DE OBRA, PRUEBAS, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	SAL	8.00	\$2,686.43	\$21,491.44	0.00	\$0.00	8.00	\$21,491.44	\$0.00
01100029	CENTRO DE CARGA DE 4 TECLAS MARCA SQUARED INCLUYE INTERRUPTORES TERMOMAGNETICOS SUMINISTRO Y COLOCACION.	PZA	2.00	\$2,794.98	\$5,589.96	0.00	\$0.00	2.00	\$5,589.96	\$0.00
0108	CANCELERIA									
01080202	VENTANA DE 1.15 X 1.15 MTS DE PERFIL DE ALUMINIO NATURAL DE 2" CON VIDRIO TRANSPARENTE DE 6 MM INCLUYE: SECCION FIJA, CORREDIZAS, ACCESORIOS PARA SU COLOCACION, SUMINISTRO Y COLOCACION.	PZA	2.00	\$7,162.62	\$14,325.24	0.00	\$0.00	2.00	\$14,325.24	\$0.00
Suma esta hoja					\$60,006.18		\$0.00		\$60,006.18	\$0.00
Sumas acumuladas					\$349,536.22		\$0.00		\$349,536.22	\$0.00

CONTRATISTA

C. ING. JOSE MANUEL BASTIDAS MANJARREZ

REVISOR

C. ING. ABELARDO GALVAN ASTORGA
 RESIDENTE DE LA DOSPM

AUTORIZO

ING. IGNACIO GONZALEZ BARRIENTOS
 DIRECTOR DE LA DOSPM

13 DE DICIEMBRE DEL 2025

BARRAS DE PIAXTLA

1 (UNO) (UNICA)

Obra:

C. Ing. Jose Manuel Bastidas Manjarrez

CONSTRUCCION DE 2 CUARTOS DORMITORIOS, EN LA LOCALIDAD DE BARRAS DE PIAXTLA, MUNICIPIO DE SAN IGNACIO, ESTADO DE SINALOA.

Periodo de la estimacion:

03/11/2025

al

13/12/2025

6 de 6

Estimacion

[illegible]

Suma esta hoja
Sumas acumuladas

	\$7,785.82	\$0.00
	\$393,618.00	\$0.00
SUB TOTAL \$	393,618.00	SUB TOTAL \$0.00
IVA 16%	62,978.88	IVA 16%\$0.00
TOTAL \$	456,596.88	TOTAL \$0.00

	\$7,785.82	\$0.00
	\$393,618.00	\$0.00
SUB TOTAL	\$393,618.00	0.00
IVA 16%	\$62,978.88	0.00
TOTAL	\$456,596.88	0.00

~~CONFIDENTIAL~~

C. ING. JOSE MANUEL BASTIDAS MANJARREZ

REVISOR

C. ING. ABELARDO GALVAN ASTORGA
RESIDENTE DE LA DOSPM

AUTORIZO

ING. IGNACIO GONZALEZ BARRIENTOS
DIRECTOR DE LA DOSPM

Numeros Generadores

Clave	Concepto	Unidad	Localización		Largo	Ancho	Alto	Pieza o factor	Resultado		Observaciones
			Eje	Tramo					Parcial	Total	
01021307	DADO DE CONCRETO DE 20 X 20 CMS ARMADO CON ARMEX 15X20-4 CONCRETO F'C=200 KG/CM2 INCLUYE HERRAMIENTA, MATERIALES Y MANO DE OBRA.	ML								8.00	
		Cuarto	1	A-B			1.00	2.00	2.00		
		Cuarto	2	A-B			1.00	2.00	2.00		
		Cuarto	1	A-B			1.00	2.00	2.00		
		Cuarto	2	A-B			1.00	2.00	2.00		
01031018	DALA DE DESPLANTE DE 15X20 CMS. REFORZADA CON ARMEX 15X20-4 CON CONCRETO F'C=150 KG/CM2 CIMBRA ACABADO COMUN.	ML								32.00	
			1	A-B	4.15				4.15		
			2	A-B	4.15				4.15		
			A	1-2	3.85				3.85		
			B	1-2	3.85				3.85		
			1	A-B	4.15				4.15		
			2	A-B	4.15				4.15		
			A	1-2	3.85				3.85		
			B	1-2	3.85				3.85		

CONTRATISTA

C. ING. JOSE MANUEL BASTIDAS MANJARREZ

REVISOR

C. ING. ABELARDO GALVAN ASTORGA
RESIDENTE DE LA DOSPM

AUTORIZO

ING. IGNACIO GONZALEZ BARRIENTOS

No. Contrato:

BARRAS DE PIAXTLA

Obra:

C. Ing. Jose Manuel Bastidas Manjarrez

CONSTRUCCION DE 2 CUARTOS DORMITORIOS, EN LA LOCALIDAD DE BARRAS DE PIAXTLA, MUNICIPIO DE SAN IGNACIO. ESTADO DE SINALOA.

Numeros Generadores

4 de 10

Clave	Concepto	Unidad	Localizacion		Largo	Ancho	Alto	Pieza o factor	Resultado		Observaciones
			Eje	Tramo					Parcial	Total	
0104	MUROS, DALAS Y CASTILLOS										
01030017	MURO DE BLOCK SOLIDO DE JAL DE 9X14X28 CMS DE 14 CMS DE ESPESOR ASENTADO CON MORTERO DE ALBAÑILERIA-ARENA PROP. 1:3 DE 0.00 A 3.00 MTS DE ALTURA.	M2							70.58		
			1	A-B	3.85	2.50			9.63		
			2	A-B	3.85	2.50			9.63		
			A	1-2	3.85	2.50			9.63		
			B	1-2	3.85	2.50			9.63		
			VENTANA REC.		1.15	1.15		1	-1.32		
			PUERTA REC.		0.90	2.10		1	-1.89		
			1	A-B	3.85	2.50			9.63		
			2	A-B	3.85	2.50			9.63		
			A	1-2	3.85	2.50			9.63		
			B	1-2	3.85	2.50			9.63		
			VENTANA REC.		1.15	1.15		1	-1.32		
			PUERTA REC.		0.90	2.10		1	-1.89		
01031025	CASTILLO DE 15X15 CMS. REFORZADO CON ARMEX 15X15-4 CON CONCRETO F'C=150 KG/CM2 CIMBRA ACABADO COMUN.	ML							24.00		
			2	A-B		3.00		2.00	6.00		
			3	A-B		3.00		2.00	6.00		
			2	A-B		3.00		2.00	6.00		
			3	A-B		3.00		2.00	6.00		

CONTRATISTA

C. ING. JOSE MANUEL BASTIDAS MANJARREZ

REVISOR

C. ING. ABELARDO GALVAN ASTORGA
RESIDENTE DE LA DOSPM

AUTORIZED

ING. IGNACIO GONZALEZ BARRIENTOS

No. Contrato:

BARRAS DE PIAXTLA

Obra:

C. Ing. Jose Manuel Bastidas Manjarrez

CONSTRUCCION DE 2 CUARTOS DORMITORIOS, EN LA LOCALIDAD DE BARRAS DE PIAXTLA, MUNICIPIO DE SAN IGNACIO, ESTADO DE SINALOA.

Numeros Generadores

5 de 10

[illegible]

CONTRATISTA

C. ING. JOSE MANUEL BASTIDAS MANJARREZ

REVISOR

C. ING. ABELARDO GALVAN ASTORGA
RESIDENTE DE LA DOSPM

AUTORIZED

ING. IGNACIO GONZALEZ BARRIENTOS

C. Ing. Jose Manuel Bastidas Manjarrez

CONSTRUCCION DE 2 CUARTOS DORMITORIOS, EN LA LOCALIDAD DE BARRAS DE PIAXTLA, MUNICIPIO DE SAN IGNACIO, ESTADO DE SINALOA.

6 de 10

Numeros Generadores

Clave	Concepto	Unidad	Localizacion		Largo	Ancho	Alto	Pieza o factor	Resultado		Observaciones
			Eje	Tramo					Parcial	Total	
0106	RECUBRIMIENTOS Y ACABADOS										
01070152	APLANADO EN LOSAS CON MORTERO DE ALBAÑILERIA-ARENA 1:3 TERMINADO FLOTEADO DE 0.00 A 3.00 MTS. DE ALTURA, INCLUYE: PLOMEO, NIVELADO, ELABORACION DEL MORTERO, DESPERDICIOS, MATERIALES, ANDAMIOS, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M2								38.60	
				LOSA	4.65	4.15			19.30		
				LOSA	4.65	4.15			19.30		
01070153	APLANADO EN MUROS CON MORTERO DE ALBAÑILERIA-ARENA 1:3 TERMINADO FLOTEADO DE 0.00 A 3.00 MTS. DE ALTURA, INCLUYE: PLOMEO, NIVELADO, ELABORACION DEL MORTERO, DESPERDICIOS, MATERIALES ANDAMIOS, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M2								91.10	
			1	A-B	3.85	2.70			10.40		
			2	A-B	3.85	2.70		2.00	20.79		
			A	1-2	3.85	2.70			10.40		
			B	1-2	3.85	2.70			10.40		
	VENTANA REC.				1.15	1.15		2	-2.65		
	PUERTA REC.				0.90	2.10		2	-3.78		
			1	A-B	3.85	2.70			10.40		
			2	A-B	3.85	2.70		2.00	20.79		
			A	1-2	3.85	2.70			10.40		
			B	1-2	3.85	2.70			10.40		
	VENTANA REC.				1.15	1.15		2	-2.65		
	PUERTA REC.				0.90	2.10		2	-3.78		

CONTRATISTA

C. ING. JOSE MANUEL BASTIDAS MANJARREZ

REVISOR

C. ING. ABELARDO GALYAN ASTORGA
RESIDENTE DE LA DOSPM

AUTORIZO

ING. IGNACIO GONZALEZ BARRIENTOS

C. Ing. Jose Manuel Bastidas Manjarrez

CONSTRUCCION DE 2 CUARTOS DORMITORIOS, EN LA LOCALIDAD DE BARRAS DE PIAXTLA, MUNICIPIO DE SAN IGNACIO, ESTADO DE SINALOA.

Numeros Generadores

7 de 10

[illegible]

CONTRATISTA

C. ING. JOSE MANUEL BASTIDAS MANJARREZ

REVISO

C. ING. ABELARDO GALVAN ASTORGA
RESIDENTE DE LA DOSPM

AUTORIZO

ING. IGNACIO GONZALEZ BARRIENTOS

No. Contrato:

BARRAS DE PIAXTLA

Obra:

C. Ing. Jose Manuel Bastidas Manjarrez

CONSTRUCCION DE 2 CUARTOS DORMITORIOS, EN LA LOCALIDAD DE BARRAS DE PIAXTLA, MUNICIPIO DE SAN IGNACIO. ESTADO DE SINALOA.

Numeros Generadores

8 de 10

[illegible]

CONTRATISTA

~~C. ING. JOSE MANUEL BASTIDAS MANJARREZ~~

REVISO

C. ING. ABELARDO GALVAN ASTORGA
RESIDENTE DE LA DOSPM

AUTORIZO

ING. IGNACIO GONZALEZ BARRIENTOS

C. Ing. Jose Manuel Bastidas Manjarrez

CONSTRUCCION DE 2 CUARTOS DORMITORIOS, EN LA LOCALIDAD DE BARRAS DE PIAXTLA, MUNICIPIO DE SAN IGNACIO, ESTADO DE SINALOA.

Numeros Generadores

9 de 10

Clave	Concepto	Unidad	Localizacion		Largo	Ancho	Alto	Pieza o factor	Resultado		Observaciones
			Eje	Tramo					Parcial	Total	
0109	PINTURA	M2								129.70	
01110001	PINTURA VINILICA EN MUROS Y PLAFONES A DOS MANOS INCLUYE: APLICACION DE SELLADOR, MATERIALES, PREPARACION DE LA SUPERFICIE, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA.		1	LOSA	4.65	4.15			19.30		
			2	A-B	3.85	2.70			10.40		
			A	A-B	3.85	2.70		2.00	20.79		
			1-2	1-2	3.85	2.70			10.40		
			B	1-2	3.85	2.70			10.40		
			VENTANA REC.		1.15	1.15		2	-2.65		
			PUERTA REC.		0.90	2.10		2	-3.78		
			1	LOSA	4.65	4.15			19.30		
			2	A-B	3.85	2.70			10.40		
			A	A-B	3.85	2.70		2.00	20.79		
			1-2	1-2	3.85	2.70			10.40		
			B	1-2	3.85	2.70			10.40		
			VENTANA REC.		1.15	1.15		2	-2.65		
			PUERTA REC.		0.90	2.10		2	-3.78		
0110	LIMPIEZA	M2								34.44	
01040154	LIMPIEZA GRUESA Y FINA DE OBRA INCLUYE RETIRO DE ESCOMBRO INCLUYE MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.										
				Cuarto	4.15	4.15			17.22		
				Cuarto	4.15	4.15			17.22		

CONTRATISTA

C. ING. JOSE MANUEL BASTIDAS MANJARREZ

REVISO

C. ING. ABELARDO GALVAN ASTORGA
RESIDENTE DE LA DOSPM

AUTORIZO

ING. IGNACIO GONZALEZ BARRIENTOS

INGBAS

No. Contrato: FAISMUN-AD-006-2025

Fecha: 13 DE DICIEMBRE DEL 2025

Ubicación:

BARRAS DE PIAXTLA

Obra:

CONSTRUCCION DE 2 CUARTOS DORMITORIOS, EN LA LOCALIDAD DE BARRAS DE PIAXTLA, MUNICIPIO DE SAN IGNACIO, ESTADO DE SINALOA.

C. Ing. Jose Manuel Bastidas Manjarrez

Album Fotografico

1 de 6



CONTRATISTA

C. ING. JOSE MANUEL BASTIDAS MANJARREZ

REVISOR

C. ING. ABELARDO GALVAN ASTORGA
RESIDENTE DE LA DOSPM

AUTORIZADO

ING. IGNACIO GONZALEZ BARRIENTOS
DIRECTOR DE LA DOSPM

INGBAS

No. Contrato: FAISMUN-AD-006-2025

Fecha: 13 DE DICIEMBRE DEL 2025

Ubicacion: BARRAS DE PIAXTLA


Obra:

CONSTRUCCION DE 2 CUARTOS DORMITORIOS, EN LA LOCALIDAD DE BARRAS DE PIAXTLA, MUNICIPIO DE SAN IGNACIO, ESTADO DE SINALOA.

C. Ing. Jose Manuel Bastidas Manjarrez

Album Fotografico

2 de 6

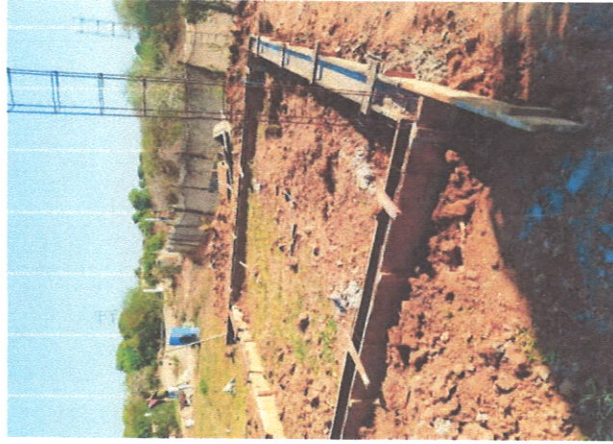

CONTRATISTA

C. ING. JOSE MANUEL BASTIDAS MANJARREZ

REVISOR

C. ING. ABELARDO GALVAN ASTORGA
RESIDENTE DE LA DOSPM

AUTORIZO

ING. IGNACIO GONZALEZ BARRIENTOS
DIRECTOR DE LA DOSPM



Fecha: 13 DE DICIEMBRE DEL 2025

No. Contrato: FAISMUN-AD-006-2025

Ubicación: BARRAS DE PIAXTLA


Obra:

CONSTRUCCION DE 2 CUARTOS DORMITORIOS, EN LA LOCALIDAD DE BARRAS DE PIAXTLA, MUNICIPIO DE SAN IGNACIO, ESTADO DE SINALOA.

C. Ing. Jose Manuel Bastidas Manjarrez

Album Fotografico

3 de 6

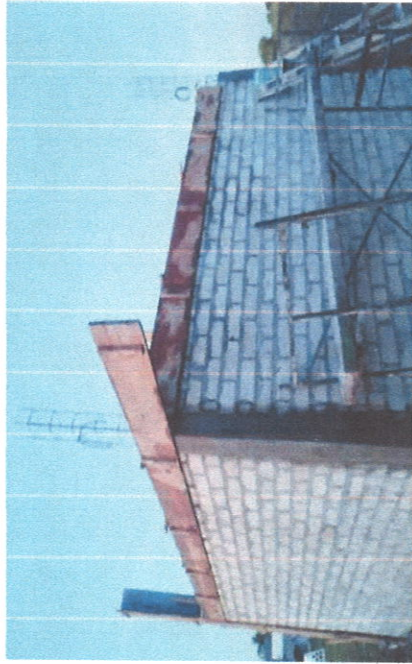

CONTRATISTA

C. ING. JOSE MANUEL BASTIDAS MANJARREZ

REVISOR

C. ING. ABELARDO GALVAN ASTORGA
RESIDENTE DE LA DOSPM

AUTORIZO

ING. IGNACIO GONZALEZ BARRIENTOS
DIRECTOR DE LA DOSPM

INGBAS

No. Contrato: FAISMUN-AD-006-2025

Fecha: 13 DE DICIEMBRE DEL 2025

Ubicación: BARRAS DE PIAXTLA

Obra:

CONSTRUCCION DE 2 CUARTOS DORMITORIOS, EN LA LOCALIDAD DE BARRAS DE PIAXTLA, MUNICIPIO DE SAN IGNACIO, ESTADO DE SINALOA.

C. Ing. Jose Manuel Bastidas Manjarrez

Album Fotografico

4 de 6



CONTRATISTA

C. ING. JOSE MANUEL BASTIDAS MANJARREZ

REVISO

C. ING. ABELARDO GALVAN ASTORGA
RESIDENTE DE LA DOSPM

AUTORIZO

ING. IGNACIO GONZALEZ BARRIENTOS
DIRECTOR DE LA DOSPM



Fecha: 13 DE DICIEMBRE DEL 2025

FAISMUN-AD-006-2025

No. Contrato:

BARRAS DE PIAXTLA

Ubicación:





Obra:

CONSTRUCCION DE 2 CUARTOS DORMITORIOS, EN LA LOCALIDAD DE BARRAS DE PIAXTLA, MUNICIPIO DE SAN IGNACIO, ESTADO DE SINALOA.

C. Ing. Jose Manuel Bastidas Manjarrez

Album Fotografico

5 de 6

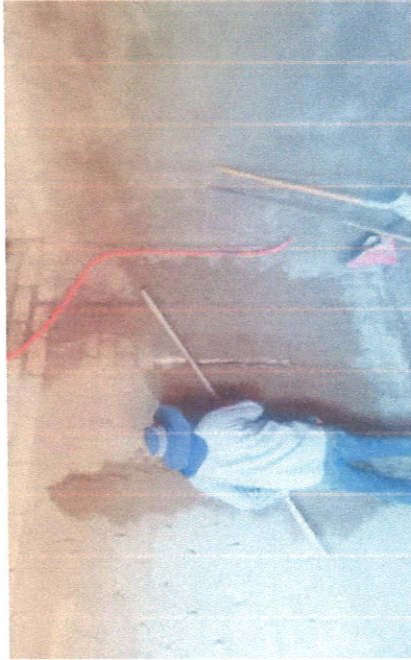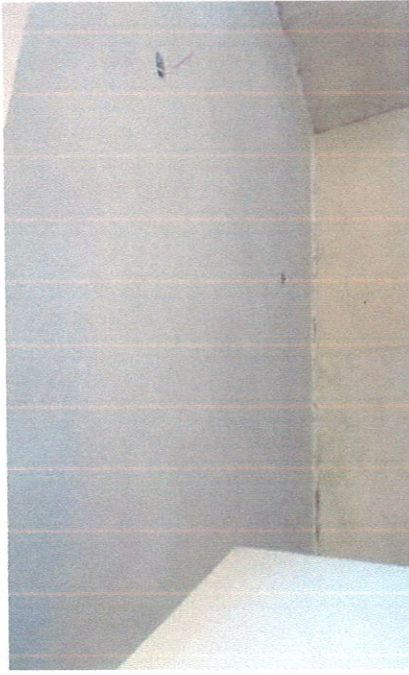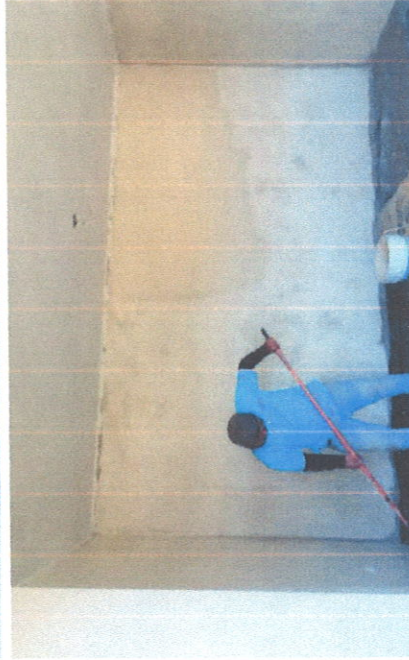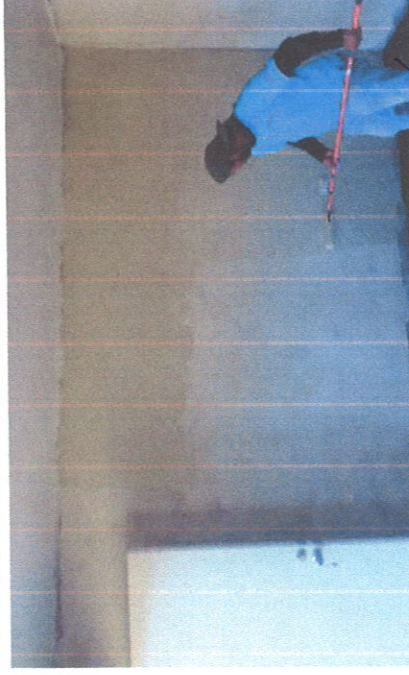

CONTRATISTA

REVISO

AUTORIZO

C. ING. JOSE MANUEL BASTIDAS MANJARREZ

C. ING. ABELARDO GALVAN ASTORGA
RESIDENTE DE LA DOSPM

ING. IGNACIO GONZALEZ BARRIENTOS
DIRECTOR DE LA DOSPM

INGBAS

No. Contrato: FAISMUN-AD-006-2025

Ubicación: BARRAS DE PIAXTLA

Fecha: 13 DE DICIEMBRE DEL 2025

Obra:

C. Ing. Jose Manuel Bastidas Manjarrez

CONSTRUCCION DE 2 CUARTOS DORMITORIOS, EN LA LOCALIDAD DE BARRAS DE PIAXTLA, MUNICIPIO DE SAN IGNACIO, ESTADO DE SINALOA.

Album Fotografico

6 de 6



CONTRATISTA

C. ING. JOSE MANUEL BASTIDAS MANJARREZ

REVISOR

C. ING. ABELARDO GALVAN ASTORGA
RESIDENTE DE LA DOSPM

AUTORIZO

ING. IGNACIO GONZALEZ BARRIENTOS
DIRECTOR DE LA DOSPM
