



MUNICIPIO DE AHOME
AUTORIZACION PRESUPUESTAL
AUTORIZACION CONTRATOS



FOLIO
182549

FECHA DE EXPEDICION
26/12/2025

CTA. CARGO

2113/1/000911/008321/000000/00
0000

CTA. CARGO: 000000 - ALVARADO MACHADO STEPHANY PALOMA

FAISMUN-VIV-092PR-094ORA-AH-2025/092PR / (092AH25PR) CONSTRUCCIÓN DE 14 CUARTOS DORMITORIO (17.95 M2) EN
DISTINTAS LOCALIDADES DE LA SINDICATURA CENTRAL, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION DEL ARTICULO O SERVICIO	PRECIO	IMPORTE
			CLAVE PRESUPUESTARIA		
0	1.00		(092AH25PR) CONSTRUCCIÓN DE 14 CUARTOS DORMITORIO (17.95 M2) EN DISTINTAS LOCALIDADES DE	1,237,832.23	1,237,832.23

2025-9-0911-222-10-10-21-56-614956-123540000090009110 FAISMUN-PROGR. MEJORAMIENTO VIV .CUARTO DORMITORIO- FONDOS FEDERALES- APLICACIÓN FONDO DE
D1154000000 APORTACIONES PARA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL

Proyecto: 56 OBRAS FISM - APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL
COG: 614956 FAISMUN-PROGR. MEJORAMIENTO VIV .CUARTO DORMITORIO



FAISMUN-VIV-092PR-094PR-AH-2025
PAGO DE ESTIMACIÓN 1 (UNO)

Cargo: (092AH25PR) CONSTRUCCIÓN DE 14 CUARTOS DORMITORIO (17.95 M2) EN DISTINTAS
LOCALIDADES DE LA SINDICATURA CENTRAL, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.

SUB- TOTAL: 1,237,832.23
DESCUENTO:
I VA: 0.00
RETENCIONES: 57,133.10
TOTAL: 1,180,699.13

REQUISITOS PARA ENTREGA, REVISION Y PAGO
Recibí bien/servicio a satisfacción

ELABORÓ

Naivi Perez

NAIVI PAOLA PEREZ ALVAREZ

AUTORIZO

JOAQUIN PAEZ ROIZ



Ahome
La Casa de Todos

Secretaría de Obras
Públicas, Urbanismo
y Ecología

H. Ayuntamiento de Ahome
Secretaría de Obras Públicas, Urbanismo y Ecología
Dirección de Obras Públicas
Subdirección Administrativa

Oficio: No. SOP/2261-25
Asunto: Se solicita pago de estimación.

Ahome, Sinaloa, 24 de diciembre del 2025.

C. JOAQUÍN PAÉZ ROÍZ
SECRETARIO DE BIENESTAR
P R E S E N T E.-

Anexo al presente envío para su revisión y elaboración de autorización presupuestal para pago de **estimación 1 (uno)**: factura, verificación de factura, estado de cuenta, autorización de inversión, recibo para pago de estimación, resumen de estimación, hojas normales de estimación, números generadores, croquis generadores, finiquito, reporte fotográfico, hojas de bitácora, croquis de ubicación, plano de obra terminada, solicitud de convenio de diferimiento, aviso de elaboración de convenio de diferimiento, reprogramación de obra, asignación de superintendente y complemento, asignación de residente, oficio de inicio dirigido a obras públicas, oficio de inicio enviado a contraloría, oficio de termino dirigido a obras públicas, pruebas de laboratorio, lista de beneficiarios, opinión de cumplimiento de obligaciones fiscales "32D", constancia de no adeudo al buro municipal, convenio de diferimiento, acta de entrega de recepción, invitación a contraloría, de la siguiente obra:

Importe contratado: \$ 2'992,917.84 ✓
Importe contratado de la obra: \$ 1'904,584.08 ✓
Importe total estimado: \$ 1'904,436.66 ✓
Importe total a pagar: \$ 1'180,699.13 ✓

No. DE CONTRATO	OBRA	CONTRATISTA
FAISMUN-VIV-092PR-094PR-AH-2025 ✓	(092AH25PR) Construcción de 14 cuartos dormitorio (17.95 m2) en distintas localidades de la sindicatura central, municipio de Ahome, Sinaloa. ✓	STEPHANY PALOMA ALVARADO MACHADO ✓

Sin otro particular, le hago llegar un cordial saludo, reiterándonos a sus apreciables órdenes.

ATENTAMENTE

ING. JORGE ISAAC ISLAS ARREDONDO
SECRETARIO DE OBRAS PÚBLICAS, URBANISMO Y ECOLOGÍA
JIIA/MYRG



EMISOR:

STEPHANY PALOMA ALVARADO MACHADO

RFC: AAMS950703AQ4

Régimen Fiscal: 612

Dirección: Calle ERNESTINA ZAZUETA, No. 1612, Col. TEPECA, CP. 81229, SINALOA, MEXICO.

RECEPTOR:

MUNICIPIO DE AHOME

RFC: MAH1701013C0

Régimen Fiscal: 601

Fecha: 2025-12-24T08:39:55	Tipo de Comprobante: I	No. Certificado: 00001000000714999946
Lugar de Expedición: 81229	Moneda: MXN	Tipo de Cambio: 1.000000
Forma de Pago: 99	Método de Pago: PPD	Uso CFDI: G03

CANT Y UNID.	DESCRIPCIÓN.	UNITARIO.	IMPORTE.
1	<p>PAGO DE ESTIMACIÓN 1 (UNO) CORRESPONDIENTE A LA OBRA (092AH25PR) CONSTRUCCIÓN DE 14 CUARTOS DORMITORIOS (17.95 M2) EN DISTINTAS LOCALIDADES DE LA SINDICATURA CENTRAL, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA. CONTRATO No. FAISMUN-VIV-092PR-094PR-AH-2025. IMPORTE DE ESTIMACIÓN NETO \$1,904,436.66, AMORTIZACIÓN 35% ANTICIPO \$666,604.43 RET. DE VERIF. INSPECCIÓN FISC. CONTROL 2% ASE \$38,088.73, RET. DE VERIF. INSPECCIÓN FISC. CONTROL 1% OIC \$19,044.37, DEDUCCIONES \$723,737.53. IMPORTE A PAGAR \$1,180,699.13.</p> <p>ClaveUnidad: E48 NoIdentificación: GEN001 ClaveProdServ: 72101500</p>	1,237,832.23	1,237,832.23

Comentarios:



Importe en letra: Un Millón Doscientos Treinta y Siete Mil Ochocientos Treinta y Dos Pesos 23/100 M.N.

Folio Fiscal UUID: 10dfbc51-1b5c-4d09-8cb4-2c42866fc894

Fecha de Timbrado: 2025-12-24T09:39:55

RFC Proveedor de Certificación: LSO1306189R5

No. Certificado SAT: 00001000000719545303

SubTotal: 1,237,832.23

IVA Exento 0.00

Total: 1,237,832.23

Sello SAT:

T56DRxPHRMGeYp8ePjhC8ky1RjxFGSA80CiuSocPZ8ha7G8L6DqAKochziyhbIEphySmSz
AwXzN8Rkqv0TLF3KJ4+o8r8JMDzmy5qSjXKqOCN1QqBpULQI2UPLQ+T8HVYd86UinnAap
yhcz3CNT1oq8dIKK5f0se5tznQvpHU0G01p1mLZo3uopFghM2ZLHZDvwnK2vNY5QulleO5gKJ
8KC8nS9dXGwKNNLhJdW5C8urki+oy1f1CuxKtHDDg8i4B5Ro877vaXODW7OHdHt68R8
ZkpKrvks4voq7B2XEh94nazIAQJxCdvZG8u8ZrTQg==

Sello CFD:

14n+EELOU0XwbaTyTjole5RKBAdTA5e2LR+UamK1X+Y4zh1grCRMz8xFS5qsPV2P4Avn7P
vEn7XetVIRDj+eNmmUWZDqwdCHZRhY44YJD9dMR+nNyNw5cMsh25F1r1x9cScC5elQw
q3MBv3K7lXp8Sf4ggE9a8abTVunZP+fgY0E25QyVt2KxhBDeF1+nIBuzgPfuActiIR70Dj3wWg
IGWmpSvcekLqD+YhMV8eOOGNV/2kG5AScQD1bGaC5Jc0AE08pr8IT5KPS5JgwpRZuXf9p3W
vFj8bnk0afn0HYUzrp8ha8xyymVjmtUd3Uu+le3w==

Cadena original SAT:

||1.1||10dfbc51-1b5c-4d09-8cb4-2c42866fc894|2025-12-24T09:39:55|LSO1306189R5||n+EELO
U0XwbaTyTjole5RKBAdTA5e2LR+UamK1X+Y4zh1grCRMz8xFS5qsPV2P4Avn7PvEn7Xet
VIRDj+eNmmUWZDqwdCHZRhY44YJD9dMR+nNyNw5cMsh25F1r1x9cScC5elQwq3MBv3K7lXp8
Sf4ggE9a8abTVunZP+fgY0E25QyVt2KxhBDeF1+nIBuzgPfuActiIR70Dj3wWgIGWmpS
vcekLqD+YhMV8eOOGNV/2kG5AScQD1bGaC5Jc0AE08pr8IT5KPS5JgwpRZuXf9p3WvFj8bnk
0afn0HYUzrp8ha8xyymVjmtUd3Uu+le3w==||00001000000719545303||

Paloma Alvarado





Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
----------------	----------------------------------	------------------	------------------------------------

AAMS950703AQ4

STEPHANY
PALOMA
ALVARADO
MACHADO

MAH1701013C0

MUNICIPIO DE
AHOME**Folio fiscal**10DFBC51-1B5C-
4D09-8CB4-
2C42866FC894**Fecha de expedición**2025-12-
24T08:39:55**Fecha certificación SAT**2025-12-
24T09:39:55**PAC que certificó**

LSO1306189R5

Total del CFDI**Efecto del
comprobante****Estado CFDI****Estatus de
cancelación**

\$1,237,832.23 ✓

Ingreso

Vigente

Cancelable sin
aceptaciónSECRETARÍA DE OBRAS
PÚBLICAS, URBANISMO Y
ECOLOGÍADIRECCIÓN DE
OBRAS PÚBLICAS



ESTADO DE CUENTA

OBRA:

(092AH25PR) CONSTRUCCIÓN DE 14 CUARTOS DORMITORIO (17.95 M2) EN DISTINTAS LOCALIDADES DE LA SINDICATURA CENTRAL, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.

ORIGEN DEL RECURSO

FECHA ACTUAL

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FAISMUN EJERCICIO 2025), autorizado por Tesorería Municipal, mediante oficio con número FAISMUN-092/2025 y FAISMUN-094/2025 de fecha 12 de septiembre de 2025. Obras que fueron autorizadas por el Subcomité de Desarrollo Social del Municipio de Ahome, incluidas en el Programa Anual de Inversión en Obra Pública (POA) 2025 con números O-218 y O-220. Y aprobadas para su ejecución mediante oficio con número AHO/PRES/484/2025 y AHO/PRES/486/2025 de fecha 12 de septiembre de 2025.

24 DE DICIEMBRE DEL 2025

IMPORTE DE
CONTRATO

\$2,992,917.84

ANTICIPO DE
CONTRATO

\$1,047,521.25

CONTRATO NO.

FAISMUN-VIV-092PR-094PR-AH-2025

PERIODO SEGÚN CONTRATO:

DEL 04 DE DICIEMBRE DEL 2025 AL 30 DE DICIEMBRE DEL 2025

27

NO. ESTIMACIÓN	PERIODO		IMPORTE DE ESTIMACIÓN (I.V.A. INCLUIDO)	DEDUCCIONES				TOTAL DEDUCCIONES	LIQUIDO A PAGAR
				AMORT. DE ANTICIPO	RET. VERIF. INSPECCIÓN, FISC. CONTROL				
					2 AL MILLAR C.M.I.C.	A.S.E. 2%	O.I.C. 1%		
ESTIMACIÓN NO. 1 (UNO)(092AH2SPR)	DEL:	04 DE DICIEMBRE DEL 2025	\$1,904,436.66	\$666,604.43	\$0.00	\$38,088.73	\$19,044.37	\$723,737.53	\$1,180,699.13
	AL:	24 DE DICIEMBRE DEL 2025							
TOTALES:			\$1,904,436.66	\$666,604.43	\$0.00	\$38,088.73	\$19,044.37	\$723,737.53	\$1,180,699.13

SALDO DE CONTRATO POR ESTIMAR:
CONFORME

\$1,088,481.18

ANTICIPO POR AMORTIZAR CONT

~~\$180,916.82~~

AUTORIZA

Paloma Alvarado

STEPHANY PALOMA ALVARADO MACHADO
CONTRATISTA

REVISAR

ARQ. MIGUEL ANGEL CABANILLAS REYES
RESIDENTE DE OBRA



SECRETARÍA DE OBRAS
PÚBLICAS, URBANISMO Y
ECOLOGÍA
DIRECCIÓN DE
OBRAS PÚBLICAS

ARQ. JESUS ERNESTO TAPIA CASTRO
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS



Los Mochis, Sinaloa., a 12 de septiembre de 2025

LIC. ANTONIO MENÉNDEZ DE LLANO BERMÚDEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL DE AHOME
P R E S E N T E:

Por medio del presente y en atención a la necesidad que le fue manifestada a usted, por los beneficiarios referente a la obra:

“(092AH25PR) CONSTRUCCIÓN DE 14 CUARTOS DORMITORIO (17.95 M2) EN DISTINTAS LOCALIDADES DE LA SINDICATURA CENTRAL, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.”

Me permito comunicarle que esta Tesorería Municipal aprueba recursos totales por \$1,914,861.76 (Son: Un Millón Novecientos Catorce Mil Ochocientos Sesenta y Un pesos 76/100 M.N.), con cargo presupuestal de acuerdo a la distribución y modificación presupuestal siguiente:

<i>Autorización</i>	<i>Origen del Recurso</i>	<i>Proyecto</i>	<i>COG</i>	<i>Cuenta Contable</i>
FAISMUN-092/2025	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL EJERCICIO 2025	56	614956	1235/4/9/911/1154

La totalidad de estos recursos serán aplicados de conformidad a la información proporcionada y hago de su conocimiento que a la fecha se cuenta con los recursos económicos suficientes para la ejecución de la obra.

ATENTAMENTE

LIC. ROBERTO MORALES LEYVA
Tesorero Municipal



C.c.p. . LIC. JOAQUÍN PÁEZ ROIZ. - Secretario de Bienestar
C.c.p. Archivo





AYUNTAMIENTO
DE AHOME

MUNICIPIO DE AHOME
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, URBANISMO Y ECOLOGÍA
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS



ESTIMACIÓN NO.
1 (UNO)

RECIBO PARA PAGO DE ESTIMACIONES

DATOS DEL CONTRATISTA	RAZON SOCIAL	STHEPHANY PALOMA ALVARADO MACHADO		
	DOMICILIO	calle Ernestina Zazueta, número exterior: 1612, Fraccionamiento Tepeca, entre calle Circunvalación y Boulevard Río de las Cañas, código postal 81229, de la ciudad de Los Mochis, Ahome, Sinaloa		
	CIUDAD: LOS MOCHIS	ESTADO: SINALOA	TELEFONO: (668) 130 73 85	

DATOS DEL CONTRATO	No. de Contrato:	FECHA DE CONTRATO	04/11/2025	IMPORTE DEL CONTRATO
	FAISMUN-VIV-092PR-094PR-AH-2025			\$2,992,917.84
	TIPO DE OBRA Y LOCALIZACIÓN			
	(092AH25PR) CONSTRUCCIÓN DE 14 CUARTOS DORMITORIO (17.95 M2) EN DISTINTAS LOCALIDADES DE LA SINDICATURA CENTRAL, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.	IMPORTE DE LA OBRA \$1,904,584.08		

AÑO 2025

BUENO POR: \$1,180,699.13

RECIBIMOS DEL MUNICIPIO DE AHOME LA CANTIDAD DE: \$1,180,699.13

(Son: Un Millón Ciento Ochenta Mil Seiscientos Noventa y Nueve Pesos con 13/100 M.N.)

EN PAGO DE LA ESTIMACIÓN QUE SE INDICA POR TRABAJOS EN LA OBRA REFERIDA EN EL PERIODO COMPRENDIENDO

DEL 04 DE DICIEMBRE DEL 2025 AL 24 DE DICIEMBRE DEL 2025

DE ACUERDO CON LA LIQUIDACIÓN:

	IMPORTE A FACTURAR	LIQUIDACIÓN	LIQUIDACIÓN DEFINITIVA
IMPORTE DE ESTIMACIÓN CON PRECIOS UNITARIOS:	\$1,237,832.23	\$1,904,436.66	0
I.V.A. 16%:	\$0.00	\$0.00	
SUMA:	\$1,237,832.23	\$1,904,436.66	
DEDUCCIONES			
AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO:		\$666,604.43	
RET. VERIF. INSPECCIÓN, FISC. CONTROL 2% A.S.E.		\$38,088.73	0
RET. VERIF. INSPECCIÓN, FISC. CONTROL 1% O.I.C.		\$19,044.37	0
TOTAL DE DEDUCCIONES:		\$723,737.53	
IMPORTE A PAGAR:		\$1,180,699.13	


LUGAR Y FECHA: LOS MOCHIS, SINALOA, A 24 DE DICIEMBRE DEL 2025

RECIBI

Stephany Alvarado
STHEPHANY PALOMA ALVARADO MACHADO
CONTRATISTA

AUTORIZA

Arq. Jesus Ernesto Tapia Castro
ARQ. JESUS ERNESTO TAPIA CASTRO
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS



DIRECCIÓN DE
OBRAS PÚBLICAS

IMPORTE A FACTURAR:	\$1,237,832.23
IMPORTE A PAGAR:	\$1,180,699.13

<div style="display: inline-block; vertical-align: middle; text-align: center;"> <p>MUNICIPIO DE AHOME</p> <p>SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, URBANISMO Y ECOLOGÍA</p> <p>DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS</p> </div> <div style="display: inline-block; vertical-align: middle; text-align: center;"> <p>La Casa de Todos</p> </div>							ESTIMACIÓN NO 1 (UNO)		
							HOJA	1	
							DE	8	
OBRA:	(092AH25PR) CONSTRUCCIÓN DE 14 CUARTOS DORMITORIO (17.95 M2) EN DISTINTAS LOCALIDADES DE LA SINDICATURA CENTRAL, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.						CONTRATO:	FAISMUN-VIV-092PR-094PR-AH-2025	
							CONTRATISTA:	STHEPHANY PALOMA ALVARADO MACHADO	
PERIODO DEL : 04 DE DICIEMBRE DEL 2025 AL 24 DE DICIEMBRE DEL 2025							FECHA: 24 DE DICIEMBRE DEL 2025		
NO.	CONCEPTO	UNIDAD	HOJA GENERADOR	SEGÚN PROYECTO	ESTIMADO A LA FECHA	HASTA ESTIMACIÓN ANTERIOR	ESTA ESTIMACIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
	VIVIENDA (CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS)								
1	TRABAJOS PRELIMINARES								
1.01	TRAZO Y NIVELACION MANUAL DEL AREA POR CONSTRUIR PARA ESTABLECER EJES, BANCOS DE NIVEL Y REFERENCIAS, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M2	1 de 16	17.45	17.45	0.00	17.45	\$8.44	\$147.28
1.02	SUMINISTRO DE MATERIAL INERTE (BALASTRE FINO GRADUADO) CALIDAD SUB-BASE PARA COLOCAR EN RELLENO BAJO PISOS, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M3	1 de 16	3.34	3.34	0.00	3.34	\$876.61	\$2,927.88
1.03	RELLENO COMPACTADO DE MATERIAL DE BANCO (BALASTRE FINO GRADUADO) POR MEDIOS MECANICOS PARA COLOCAR EN RELLENO BAJO PISOS Y BANQUETAS, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M3	2 de 16	3.34	3.34	0.00	3.34	\$237.03	\$791.68
1.04	EXCAVACION A MANO EN TRABES DE CIMENTACION, EN MATERIAL TIPO "B" EN SECO, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M3	2 de 16	0.17	0.17	0.00	0.17	\$387.23	\$65.83
SUBTOTAL DE TRABAJOS PRELIMINARES									\$3,932.67
SUBTOTAL POR 14 ACCIONES									\$55,057.38
2	CIMENTACION								
2.01	TRABE DE CIMENTACION DE 12CM. DE BASE, 20 CM. DE ALTURA CON 10 CM. DENTRO DE LOSA DE CIMENTACION, CONCRETO F'C= 200 KG/CM2 T.M.A. DE 38 MM. REFUERZO HORIZONTAL CON ARMEX 12X20-4 Y BASTONES EN L CON ACERO NO. 3 A CADA 40 CM. INCLUYE: CIMBRA, ARMADO, COLADO, MATERIALES NECESARIOS Y MANO DE OBRA.	ML	3 DE 16	14.28	14.28	0.00	14.28	\$396.71	\$5,665.02

CONFORME

Paloma Alvarado

STHEPHANY PALOMA ALVARADO MACHADO
CONTRATISTA

REVISÓ

ARQ. MIGUEL ANGEL CABANILLAS REYES
RESIDENTE DE OBRA

SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, URBANISMO Y ECOLOGÍA
 DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

AUTORIZÓ

D. JESUS ERNESTO TAPIA CASTRO
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

MUNICIPIO DE AHOME								ESTIMACIÓN NC 1 (UNO)	
SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, URBANISMO Y ECOLOGÍA								HOJA	2
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS								DE	8
OBRA: (092AH25PR) CONSTRUCCIÓN DE 14 CUARTOS DORMITORIO (17.95 M2) EN DISTINTAS LOCALIDADES DE LA SINDICATURA CENTRAL, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.						CONTRATO:	FAISMUN-VIV-092PR-094PR-AH-2025		
						CONTRATISTA:	STHEPHANY PALOMA ALVARADO MACHADO		
PERIODO DEL : 04 DE DICIEMBRE DEL 2025 AL 24 DE DICIEMBRE DEL 2025								FECHA: 24 DE DICIEMBRE DEL 2025	
NO.	CONCEPTO	UNIDAD	HOJA GENERADOR	SEGUN PROYECTO	ESTIMADO A LA FECHA	HASTA ESTIMACIÓN ANTERIOR	ESTA ESTIMACIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
2.02	PISO DE CONCRETO CON F'C=200 KG/CM2 ARMADO CON MALLALACK 6/6-6/6 DE 10 CM DE ESPESOR ACABADO PULIDO, INCLUYE: COLOCACION DE SILLETAS SEGÚN NORMA Y ESPECIFICACION, MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M2	3 DE 16	13.59	13.59	0.00	13.59	\$788.36	\$10,713.81
2.03	SUMINISTRO, HABILITADO Y COLOCACION DE VARILLA DE 3/8", F'Y=4200 KG/CM2, EN TRABES Y LOSAS, INCLUYE: HABILITADO, ARMADO, GANCHOS, TRASLAPES, DESPERDICIOS, COLOCACION, Y MANO DE OBRA.	TON	4 DE 16	0.008	0.008	0.00	0.008	\$46,317.73	\$370.54
2.04	ANCLAJE DE CASTILLOS (C-1) DE 12X12 CM. A UNA PROFUNDIDAD DE 20 CM, REFORZADO CON ARMEX 12X12-4, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	PZA	4 DE 16	2.00	2.00	0.00	2.00	\$145.88	\$291.76
2.05	ANCLAJE DE CASTILLOS (C-2) DE 12X19 CM. A UNA PROFUNDIDAD DE 20 CM, REFORZADO CON ARMEX 12X20-4, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	PZA	5 DE 16	2.00	2.00	0.00	2.00	\$145.88	\$291.76
2.06	ANCLAJE DE CASTILLOS INTEGRAL (CI) A UNA PROFUNDIDAD DE 20 CM. CON UNA VARILLA DE 3/8".	PZA	5 DE 16	8.00	8.00	0.00	8.00	\$97.20	\$777.60
2.07	CURADO PARA SUPERFICIE DE CONCRETO A BASE DE CURACRETO BLANCO, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, MANDO INTERMEDIO Y HERRAMIENTA MENOR, DESPERDICIOS.	M2	6 DE 16	13.59	13.59	0.00	13.59	\$38.52	\$523.49
SUBTOTAL DE CIMENTACION									\$18,633.98
SUBTOTAL POR 14 ACCIONES									\$260,875.72
3	ESTRUCTURA								
3.01	MURO DE BLOCK DE 12X20X40 CM. ACABADO APARENTE A DOS CARAS, ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA PROPORCION 1:4, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M2	6 DE 16	25.08	25.08	0.00	25.08	\$715.63	\$17,948.00

CONFORME

Paloma Alvarado
STHEPHANY PALOMA ALVARADO MACHADO
CONTRATISTA

[Firma]
REVISA
ARQ. MIGUEL ANGE CABANILLAS REYES SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, URBANISMO Y ECOLOGÍA
RESIDENTE DE OBRA



[Firma]
AUTORIZO
ARQ. JESUS ERNESTO TAPIA CASTRO
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

<div style="display: inline-block; vertical-align: middle; text-align: center;"> MUNICIPIO DE AHOME SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, URBANISMO Y ECOLOGÍA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS </div> <div style="display: inline-block; vertical-align: middle; text-align: center; margin-left: 20px;"> <i>La Casa de Todos</i> </div>		ESTIMACIÓN NC 1 (UNO)	
		HOJA	
		DE	
		3	
		8	

OBRA:	(092AH25PR) CONSTRUCCIÓN DE 14 CUARTOS DORMITORIO (17.95 M2) EN DISTINTAS LOCALIDADES DE LA SINDICATURA CENTRAL, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.	CONTRATO:	FAISMUN-VIV-092PR-094PR-AH-2025
		CONTRATISTA:	STHEPHANY PALOMA ALVARADO MACHADO

PERIODO DEL : 04 DE DICIEMBRE DEL 2025		AL 24 DE DICIEMBRE DEL 2025		FECHA: 24 DE DICIEMBRE DEL 2025	
--	--	-----------------------------	--	---------------------------------	--

NO.	CONCEPTO	UNIDAD	HOJA GENERADOR	SEGÚN PROYECTO	ESTIMADO A LA FECHA	HASTA ESTIMACIÓN ANTERIOR	ESTA ESTIMACIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
3.02	CASTILLO (C-1) DE 12X12 CM. DE SECCION DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2 REDORZADO CON ACERO ARMEX 12X12-4, INCLUYE: CIMBRA Y ACABADO APARENTE CON TUJINO DE 1", ARMADO, COLADO, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	ML	7 DE 16	4.24	4.24	0.00	4.24	\$486.64	\$2,063.35
3.03	CASTILLO (C-2) DE 12X19 CM. DE SECCION DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2 REDORZADO CON ACERO ARMEX 12X20-4, INCLUYE: CIMBRA Y ACABADO APARENTE CON TUJINO DE 1", ARMADO, COLADO, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	ML	7 DE 16	4.20	4.20	0.00	4.20	\$575.16	\$2,415.67
3.04	CASTILLO INTEGRAL (CI) EN BLOCK HUECO DE 12X20X40 CMS: ARMADO CON 1 (UNA) VARILLA DE 3/8" DE DIAMETRO, CONCRETO F'C= 150KG/CM2 INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	ML	8 DE 16	16.80	16.80	0.00	16.80	\$229.48	\$3,855.26
3.05	DALA DE CERRAMIENTO DE 12X20 HASTA 12 X 30 CM. PROMEDIO, ACABADO APARENTE ARMADO CON ARMEX 12X12-4 Y 12X20-4 (SEGÚN PLANO DE PROYECTO), CONCRETO F'C= 200KG/CM2, INCLUYE: CIMBRA Y ACABADO APARENTE CON TUJINO DE 1", DESCIMBRA, VIBRADO, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTAS.	ML	8 DE 16	14.28	14.28	0.00	14.28	\$814.03	\$11,624.35
3.06	CADENA DE BLOCK "U" DE 12X20X40 CM REFORZADA CON UNA VARILLA DE 3/8, ACABADO APARENTE ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA PROPORCION 1:4, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA	ML	9 DE 16	1.43	1.43	0.00	1.43	\$351.62	\$502.82
SUBTOTAL DE ESTRUCTURA									\$38,409.45
SUBTOTAL POR 14 ACCIONES									\$537,732.30

CONFORME

Paloma Alvarado

STHEPHANY PALOMA ALVARADO MACHADO
CONTRATISTA

REVISÓ

ARQ. MIGUEL ÁNGEL CABANILLAS REYES
RESIDENTE DE OBRA

SECRETARIA DE OBRAS
PÚBLICAS, URBANISMO Y
ECOLOGÍA

**DIRECCIÓN DE
OBRAS PÚBLICAS**

AUTORIZÓ

ARQ. JESÚS ERNESTO TAPIA CASTRO
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

<div style="display: inline-block; vertical-align: middle; text-align: center;"> <p>MUNICIPIO DE AHOMÉ</p> <p>SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, URBANISMO Y ECOLOGÍA</p> <p>DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS</p> </div> <div style="display: inline-block; vertical-align: middle; text-align: center;"> <p>la Casa de Todos</p> </div>							ESTIMACIÓN NO 1 (UNO)		
							HOJA	4	
							DE	8	
OBRA:	(092AH25PR) CONSTRUCCIÓN DE 14 CUARTOS DORMITORIO (17.95 M2) EN DISTINTAS LOCALIDADES DE LA SINDICATURA CENTRAL, MUNICIPIO DE AHOMÉ, SINALOA.						CONTRATO:	FAISMUN-VIV-092PR-094PR-AH-2025	
							CONTRATISTA:	STHEPHANY PALOMA ALVARADO MACHADO	
PERIODO DEL :							FECHA:		
04 DE DICIEMBRE DEL 2025							AL 24 DE DICIEMBRE DEL 2025		
NO.	CONCEPTO	UNIDAD	HOJA GENERADOR	SEGÚN PROYECTO	ESTIMADO A LA FECHA	HASTA ESTIMACIÓN ANTERIOR	ESTA ESTIMACIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
4	LOSAS								
4.01	LOSA DE CONCRETO DE 10 CM. DE ESPESOR, INCLUYE: CIMBRA ACABADO APARENTE CON CIMBRAPLAY DE PINO DE 16 MM, REFORZADA CON VARILLA #3 Y MALLA ELECTRO SOLDADA 6X6-6-6, COLOCACION DE SILLETAS SEGÚN NORMA Y ESPECIFICACION, CONCRETO F'C=200 KG/CM2 FABRICADO CON REVOLVEDORA Y ACABADO PLANEADO, PARA RECIBIR IMPERMEABILIZANTE, DESCIMBRA, DETALLADO FINO PARTE POSTERIOR CON MORTERO, TUINO DE 1" PARA GOTERO, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M2	9 DE 16	17.95	17.95	0.00	17.95	\$2,191.72	\$39,341.37
4.02	CURADO PARA SUPERFICIE DE CONCRETO A BASE DE CURACRETO BLANCO, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, MANDO INTERMEDIO Y HERRAMIENTA MENOR, DESPERDICIOS.	M2	10 DE 16	17.95	17.95	0.00	17.95	\$38.52	\$691.43
SUBTOTAL DE LOSAS									\$40,032.80
SUBTOTAL POR 14 ACCIONES									\$560,459.20
5	INSTALACIÓN ELÉCTRICA								
5.01	INSTALACIÓN ELÉCTRICA A BASE DE TUBO POLIDUCTO NARANJA DE 1/2", CAJAS DE REGISTRO DE LAMINA GALVANIZADA, ROSETAS DE PORCELANA DE 3" Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS MARCA MODUS Ó SIMILAR EN CALIDAD, INCLUYE: PRUEBA DEL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LA INSTALACIÓN, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, SEGÚN PLANO DE PROYECTO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	LOTE	10 DE 16	1	1	0.00	1.00	\$2,716.76	\$2,716.76
SUBTOTAL DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA									\$2,716.76
SUBTOTAL POR 14 ACCIONES									\$38,034.64

CONFORME

Paloma Alvarado

STHEPHANY PALOMA ALVARADO MACHADO
CONTRATISTA

REVISÓ

ARQ. MIGUEL ÁNGEL CABANILLAS REYES
RESIDENTE DE OBRA

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, URBANISMO Y ECOLOGÍA
 DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

AUTORIZÓ

ARQ. JESUS ERNESTO TAPIA CASTRO
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

MUNICIPIO DE AHOME SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, URBANISMO Y ECOLOGÍA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS		Ahome La Casa de Todos		ESTIMACIÓN NO 1 (UNO)					
		HOJA		5					
		DE		8					
OBRA: (092AH25PR) CONSTRUCCIÓN DE 14 CUARTOS DORMITORIO (17.95 M2) EN DISTINTAS LOCALIDADES DE LA SINDICATURA CENTRAL, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.				CONTRATO: FAISMUN-VIV-092PR-094PR-AH-2025	CONTRATISTA: STHEPHANY PALOMA ALVARADO MACHADO				
PERIODO DEL: 04 DE DICIEMBRE DEL 2025 AL 24 DE DICIEMBRE DEL 2025				FECHA: 24 DE DICIEMBRE DEL 2025					
NO.	CONCEPTO	UNIDAD	HOJA GENERADOR	SEGUN PROYECTO	ESTIMADO A LA FECHA	HASTA ESTIMACIÓN ANTERIOR	ESTA ESTIMACIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
6	CANCELERIA								
6.01	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE VENTANA DE ALUMINIO NATURAL LÍNEA 1 1/2", DE 1.25X1.04 M., FORMADA DE UN FIJO Y UN CORREDIZO, INCLUYE: MOSQUITERO, CRISTAL CLARO DE 3 MM., MATERIALES DE FIJACIÓN, SELLADOR, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	11 DE 16	1	1	0.00	1.00	\$2,498.81	\$2,498.81
SUBTOTAL DE CANCELERIA									\$2,498.81
SUBTOTAL POR 14 ACCIONES									\$34,983.34
7	HERRERIA								
7.01	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PROTECCIÓN PARA VENTANA DE 1.25 X 1.04 MTS. FABRICADA CON MARCO DE SOLERA DE 1 1/2" x 1/8" Y REDONDO DE 1/2", PINTADO CON PRIMARIO ANTICORROSIVO Y TERMINADO CON ESMALTE COLOR BLANCO, INCLUYE: MATERIAL Y MANO DE OBRA NECESARIO, PARA SU FABRICACIÓN Y COLOCACIÓN Y HERRAMIENTA MENOR, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	11 DE 16	1	1	0.00	1.00	\$2,713.16	\$2,713.16
7.02	SUMINISTRO, FABRICACIÓN Y COLOCACIÓN DE MARCO EMPOTRADO 5 CM. EN LOSA DE CIMENTACIÓN, DE 97 CM. DE ANCHO X 217 CM. DE ALTURA, CON PERFIL TUBULAR No. 129 CAL. 20, PINTADO CON PRIMARIO ANTICORROSIVO Y TERMINADO CON ESMALTE COLOR BLANCO, INCLUYE: RESANE EN PISO PULIDO CON MORTERO CEMENTO ARENA 1:3, BISAGRAS LATONADAS DE 3" (3 PZAS) SOLDADAS A PERFIL, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	12 DE 16	1	1	0.00	1.00	\$1,973.92	\$1,973.92
SUBTOTAL DE HERRERIA									\$4,687.08
SUBTOTAL POR 14 ACCIONES									\$65,619.12

CONFORME

STHEPHANY PALOMA ALVARADO MACHADO
 CONTRATISTA

REVISÓ

 ARQ. MIGUEL ÁNGEL CABANILLAS REYES
 RESIDENTE DE OBRA

SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, URBANISMO Y ECOLOGÍA
 DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
 AUTORIZÓ

 J. JESÚS ERNESTO TAPIA CASTRO
 DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

<div style="display: inline-block; vertical-align: middle; text-align: center;"> <p>MUNICIPIO DE AHOMÉ</p> <p>SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, URBANISMO Y ECOLOGÍA</p> <p>DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS</p> </div> <div style="display: inline-block; vertical-align: middle; text-align: center;"> <p>La Casa de Todos</p> </div>		ESTIMACIÓN NO 1 (UNO)	
		HOJA	
		DE	
		6	
		8	

OBRA:	(092AH25PR) CONSTRUCCIÓN DE 14 CUARTOS DORMITORIO (17.95 M2) EN DISTINTAS LOCALIDADES DE LA SINDICATURA CENTRAL, MUNICIPIO DE AHOMÉ, SINALOA.	CONTRATO:	FAISMUN-VIV-092PR-094PR-AH-2025
		CONTRATISTA:	STHEPHANY PALOMA ALVARADO MACHADO

PERIODO DEL : 04 DE DICIEMBRE DEL 2025		AL		24 DE DICIEMBRE DEL 2025		FECHA: 24 DE DICIEMBRE DEL 2025			
--	--	----	--	--------------------------	--	---------------------------------	--	--	--

NO.	CONCEPTO	UNIDAD	HOJA GENERADOR	SEGÚN PROYECTO	ESTIMADO A LA FECHA	HASTA ESTIMACIÓN ANTERIOR	ESTA ESTIMACIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
8	CARPINTERIA								
8.01	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PUERTA MULTYPANEL LISA DE 0.90 X 2.10 M. DE ALTURA, INCLUYE: PHILLIPS POMO GAMMA BAÑO ACERO INOXIDABLE O SIMILAR, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	12 DE 16	1	1	0.00	1.00	\$3,605.02	\$3,605.02
SUBTOTAL DE CARPINTERIA									\$3,605.02
SUBTOTAL POR 14 ACCIONES									\$50,470.28
9	VARIOS								
9.01	IMPERMEABILIZANTE EN LOSA DE AZOTEA A BASE DE IMPERMEABILIZANTE AFIBRATADO, INCLUYE: LIMPIEZA DE SUPERFICIE, SELLADO DE GRIETAS CON CEMENTO PLASTICO ACRILICO, APLICACIÓN DE UNA CAPA DE SELLADOR ACRILICO DILUIDO CON AGUA EN PROPORCION 1:3 CON CEPILLO DE IXTLE, UNA CAPA DE THERMOTEK RESIDENCIAL 5 AÑOS O SIMILAR, UNA VEZ SECA LA PRIMERA CAPA SE APLICA UNA SEGUNDA CAPA DE THERMOTEK RESIDENCIAL 5 AÑOS O SIMILAR	M2	13 DE 16	17.95	17.95	0.00	17.95	\$168.87	\$3,031.22
9.02	SUMINISTRO É INSTALACIÓN DE PLACA EN MURO AL FRENTE EN UN LUGAR VISIBLE, A BASE DE ACRÍLICO DE 15X30 CM. CON CALCOMANÍA EN VINIL Y LEYENDA SEGÚN PROGRAMA, FIJADA CON PIJAS Y TAQUETES DE PLÁSTICO, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA NECESARIAS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	13 DE 16	1	1	0.00	1.00	\$164.41	\$164.41

CONFORME

Paloma Alvarado

STHEPHANY PALOMA ALVARADO MACHADO
CONTRATISTA

REVISÓ

ARQ. MIGUEL ANGEL CEBALLAS REYES
RESIDENTE DE OBRA

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, URBANISMO Y ECOLOGÍA
 DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

AUTORIZÓ

ARQ. JESUS ERNESTO TAPIA CASTRO
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

MUNICIPIO DE AHOME							ESTIMACIÓN NO. 1 (UNO)		
SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, URBANISMO Y ECOLOGÍA							HOJA 7		
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS							DE 8		
OBRA:	(092AH25PR) CONSTRUCCIÓN DE 14 CUARTOS DORMITORIO (17.95 M2) EN DISTINTAS LOCALIDADES DE LA SINDICATURA CENTRAL, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.						CONTRATO:	FAISMUN-VIV-092PR-094PR-AH-2025	
							CONTRATISTA:	STHEPHANY PALOMA ALVARADO MACHADO	
PERIODO DEL : 04 DE DICIEMBRE DEL 2025 AL 24 DE DICIEMBRE DEL 2025							FECHA: 24 DE DICIEMBRE DEL 2025		
NO.	CONCEPTO	UNIDAD	HOJA GENERADOR	SEGÚN PROYECTO	ESTIMADO A LA FECHA	HASTA ESTIMACIÓN ANTERIOR	ESTA ESTIMACIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
9.03	PINTURA VINÍLICA EN MUROS INTERIORES Y PLAFONES A DOS MANOS, CON BROCHA Y/O RODILLO, MARCA BERELINTE DE BEREL O CALIDAD SIMILAR, INCLUYE: PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE PROTEGIENDO PISOS, HERRERÍA Y CANCELERÍA, APLICACIÓN DE SELLADOR, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y ANDAMIOS, COLORES INDICADOS POR OBRAS PÚBLICAS.	M2	14 DE 16	40.97	40.97	0.00	40.97	\$111.09	\$4,551.36
9.04	PINTURA VINÍLICA EN MUROS EN EXTERIORES, BOQUILLAS EN PUERTAS Y VENTANAS Y CORTELOSA, VOLADOS, CON BROCHA Y/O RODILLO, A DOS MANOS, MARCA BERELINTE DE BEREL O CALIDAD SIMILAR, INCLUYE: PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE PROTEGIENDO PISOS, HERRERÍA Y CANCELERÍA, APLICACIÓN DE SELLADOR, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, COLORES INDICADOS POR OBRAS PÚBLICAS.	M2	14,15 DE 16	40.03	39.97	0.00	39.97	\$111.09	\$4,440.27
9.05	MOLDURA DE APLANADO RESALTADO DE 10 CM. DE ANCHO Y 2.00 CM DE ESPESOR, ACABADO FLOTEADO DE MEZCLA EN PERIMETRO DE VENTANA, CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	ML	15 DE 16	4.98	4.98	0.00	4.98	\$297.06	\$1,479.36
SUBTOTAL DE VARIOS									\$13,666.62
SUBTOTAL POR 14 ACCIONES									\$191,332.68

CONFORME

Paloma Alvarado

STHEPHANY PALOMA ALVARADO MACHADO

CONTRATISTA

REVISÓ

[Firma]

ARQ. MIGUEL ANGEL CABANILLAS REYES

RESIDENTE DE OBRA



SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, URBANISMO Y ECOLOGÍA

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

AUTORIZO

[Firma]

ARQ. JESUS ERNESTO TAPIA CASTRO

DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

MUNICIPIO DE AHOME						ESTIMACIÓN NO 1 (UNO)			
SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, URBANISMO Y ECOLOGÍA						HOJA 8			
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS						DE 8			
OBRA: (092AH25PR) CONSTRUCCIÓN DE 14 CUARTOS DORMITORIO (17.95 M2) EN DISTINTAS LOCALIDADES DE LA SINDICATURA CENTRAL, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.						CONTRATO:	FAISMUN-VIV-092PR-094PR-AH-2025		
						CONTRATISTA:	STHEPHANY PALOMA ALVARADO MACHADO		
PERIODO DEL : 04 DE DICIEMBRE DEL 2025 AL 24 DE DICIEMBRE DEL 2025						FECHA: 24 DE DICIEMBRE DEL 2025			
NO.	CONCEPTO	UNIDAD	HOJA GENERADOR	SEGÚN PROYECTO	ESTIMADO A LA FECHA	HASTA ESTIMACIÓN ANTERIOR	ESTA ESTIMACIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
9.06	BANQUETA DE ACCESO								
9.06.1	RELLENO CON MATERIAL INERTE (BALASTRE CRIBADO) COMPACTADO AL 90 % PROCTOR, POR MEDIOS MECÁNICOS, EN CAPAS DE 15 CM. DE ESPESOR, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIAL Y HERRAMIENTA MENOR.	M3	15 DE 16	0.77	0.77	0.00	0.77	\$1,070.00	\$823.90
9.06.2	EXCAVACIÓN A MANO EN DENTELLÓN DE BANQUETA, EN MATERIAL TIPO "B" EN SECO, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M3	15 DE 16	0.18	0.17	0.00	0.17	\$387.23	\$65.83
9.06.3	DENTELLÓN TIPO DE 0.20 X 0.15 CON ARMEX 15X20-4 F'C= 150 KG/CM2. INCLUYE: RECORTES, CIMBRA, COLADO DE CONCRETO, ACABADO CON VOLTEADOR, CURADO, DESCIMBRADO Y LIMPIEZA DE FORMAS.	ML	15 DE 16	5.56	5.56	0.00	5.56	\$506.51	\$2,816.20
9.06.4	BANQUETA DE CONCRETO DE 10 CM. DE ESPESOR, ARMADO CON MALLA ELECTROSOLDADA 6-6/10-10, CONCRETO F'C=150 KG/CM2 H.O., ACABADO ESCOBILLADO, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, CIMBRA, DESCIMBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M2	16 DE 16	3.86	3.86	0.00	3.86	\$805.23	\$3,108.19
9.06.5	CURADO PARA SUPERFICIE DE CONCRETO A BASE DE CURACRETO BLANCO, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, MANDO INTERMEDIO Y HERRAMIENTA MENOR, DESPERDICIOS.	M2	16 DE 16	3.86	3.86	0.00	3.86	\$38.55	\$148.80
9.06.6	MANIOBRA Y MOVIMIENTO DE MATERIALES PARA CONSTRUCCIÓN EN SITIO, ACARREO EN CARRETILLA, CON PERSONAL Y EQUIPO, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	LOTE	16 DE 16	1.00	1.00	0.00	1.00	\$885.08	\$885.08
SUBTOTAL DE BANQUETA DE ACCESO									\$7,848.00
SUBTOTAL POR 14 ACCIONES									\$109,872.00
SUBTOTAL									\$1,904,436.66
I.V.A. (16%)									\$0.00
TOTAL									\$1,904,436.66

CONFORME

Paloma Alvarado
STHEPHANY PALOMA ALVARADO MACHADO
CONTRATISTA

REVISÓ
[Firma]
ARQ. MIGUEL ANGEL CABANILLAS REYES
RESIDENTE DE OBRA


SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, URBANISMO Y ECOLOGÍA
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

AUTORIZÓ
[Firma]
ARQ. JESUS ERNESTO TAPIA CASTRO
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

AYUNTAMIENTO DE AHOMÉ

MUNICIPIO DE AHOMÉ

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, URBANISMO Y ECOLOGÍA

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

Ahome

La Casa de Todos

GENERADORES

HOJA	1
DE	16
EST #	1 (UNO)

OBRA:

(092AH25PR) CONSTRUCCIÓN DE 14 CUARTOS DORMITORIO (17.95 M2) EN DISTINTAS LOCALIDADES DE LA SINDICATURA CENTRAL, MUNICIPIO DE AHOMÉ, SINALOA.

CONTRATO:

FAISMUN-VIV-092PR-094PR-AH-2025

CONTRATISTA:

STHEPHANY PALOMA ALVARADO MACHADO

FECHA:

24 DE DICIEMBRE DEL 2025

NO.	CONCEPTO	UNIDAD	EJE	TRAMO	LARGO	ANCHO	ALTO	PZAS.	PARCIAL	TOTAL	OBSERVACIONES
	(092AH25PR) CONSTRUCCIÓN DE 14 CUARTOS DORMITORIO (17.95 M2) EN DISTINTAS LOCALIDADES DE LA SINDICATURA CENTRAL, MUNICIPIO DE AHOMÉ, SINALOA.										
	VIVIENDA (CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS)										
1	TRABAJOS PRELIMINARES										
1.01	TRAZO Y NIVELACION MANUAL DEL AREA POR CONSTRUIR PARA ESTABLECER EJES, BANCOS DE NIVEL Y REFERENCIAS, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M2								17.45	
			A-B	1-2	3.86	3.52			13.59		01 ZAMBRANO VALENZUELA ROSARIO
					3.86	1.00		3.86			02 ARMENTA VALENZUELA RAMONA
											03 CRUZ PACHECO EDUARDO ALBERTO
											04 TORRES FLORES SELENE
											05 MARISCAL ZUÑIGA MANUELA ARACELY
											06 VARGAS QUINTANA DIANA KARELY
											07 BERRELLEZA TORRES JOSE EDUARDO
											08 SANCHEZ ANTONIO ABISAIL
											09 CASTAÑEDA JOCOBI MARISOL
											10 MOROYOQUI COTA KAREN LIZBETH
											11 REYES CRUZ CLAUDIA PATRICA
											12 VALDEZ SOTO MARIA
											13 ZAMBRANO ROCHA JESSICA JAZMIN
											14 OLIVO BACA GLORIA RUFINA
1.02	SUMINISTRO DE MATERIAL INERTE (BALASTRE FINO GRADUADO) CALIDAD SUB-BASE PARA COLOCAR EN RELLENO BAJO PISOS, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M3								3.34	
			1-2	A-B	4.26	3.92	0.20		3.34		01 ZAMBRANO VALENZUELA ROSARIO
											02 ARMENTA VALENZUELA RAMONA
											03 CRUZ PACHECO EDUARDO ALBERTO
											04 TORRES FLORES SELENE
											05 MARISCAL ZUÑIGA MANUELA ARACELY
											06 VARGAS QUINTANA DIANA KARELY
											07 BERRELLEZA TORRES JOSE EDUARDO
											08 SANCHEZ ANTONIO ABISAIL
											09 CASTAÑEDA JOCOBI MARISOL
											10 MOROYOQUI COTA KAREN LIZBETH
											11 REYES CRUZ CLAUDIA PATRICA
											12 VALDEZ SOTO MARIA
											13 ZAMBRANO ROCHA JESSICA JAZMIN
											14 OLIVO BACA GLORIA RUFINA

Stephany Paloma Alvarado Machado

STHEPHANY PALOMA ALVARADO MACHADO

REPRESENTANTE LEGAL

Alvarado



ARQ. MIGUEL ANGEL CABANILLAS REYES

RESIDENTE DE OBRA

OBRA: (092AH25PR) CONSTRUCCIÓN DE 14 CUARTOS DORMITORIO (17.95 M2) EN DISTINTAS LOCALIDADES DE LA SINDICATURA CENTRAL, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.

CONTRATO:	FAISMUN-VIV-092PR-094PR-AH-2025
CONTRATISTA:	STHEPHANY PALOMA ALVARADO MACHADO

FECHA: 24 DE DICIEMBRE DEL 2025

[illegible]

Pellama Alvarado

STEPHANY PALOMA ALVARADO MACHADO
REPRESENTANTE LEGAL

Adam Ross

SECRETARÍA DE OBRAS
PÚBLICAS, URBANISMO Y
ECOLOGÍA
DIRECCIÓN DE
OBRAS PÚBLICAS

ARQ. MIGUEL ANGEL CABANILLAS REYES
RESIDENTE DE OBRA

AYUNTAMIENTO DE AHOMÉ

MUNICIPIO DE AHOMÉ

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, URBANISMO Y ECOLOGÍA

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

Ahome
La Casa de Todos

GENERADORES	
HOJA	3
DE	16
EST #	1 (UNO)

OBRA:

(092AH25PR) CONSTRUCCIÓN DE 14 CUARTOS DORMITORIO (17.95 M2) EN DISTINTAS LOCALIDADES DE LA SINDICATURA CENTRAL, MUNICIPIO DE AHOMÉ, SINALOA.

CONTRATO:

FAISMUN-VIV-092PR-094PR-AH-2025

CONTRATISTA:

STHEPHANY PALOMA ALVARADO MACHADO

FECHA:

24 DE DICIEMBRE DEL 2025

NO.	CONCEPTO	UNIDAD	EJE	TRAMO	LARGO	ANCHO	ALTO	PZAS.	PARCIAL	TOTAL	OBSERVACIONES
2	CIMENTACION										
2.01	TRABE DE CIMENTACION DE 12CM. DE BASE, 20 CM. DE ALTURA CON 10 CM. DENTRO DE LOSA DE CIMENTACION, CONCRETO F'C= 200 KG/CM2 T.M.A. DE 38 MM. REFUERZO HORIZONTAL CON ARMEX 12X20-4 Y BASTONES EN L CON ACERO NO. 3 A CADA 40 CM. INCLUYE: CIMBRA, ARMADO, COLADO, MATERIALES NECESARIOS Y MANO DE OBRA.	ML								14.28	
			1	A-B	3.86				3.86		01 ZAMBRANO VALENZUELA ROSARIO
			2	A-B	3.86				3.86		02 ARMENTA VALENZUELA RAMONA
			A	1-2	3.28				3.28		03 CRUZ PACHECO EDUARDO ALBERTO
			B	1-2	3.28				3.28		04 TORRES FLORES SELENE
											05 MARISCAL ZUÑIGA MANUELA ARACELY
											06 VARGAS QUINTANA DIANA KARELY
											07 BERRELLEZA TORRES JOSE EDUARDO
											08 SANCHEZ ANTONIO ABISAIL
											09 CASTAÑEDA JOCOBI MARISOL
											10 MOROYOQUI COTA KAREN LIZBETH
											11 REYES CRUZ CLAUDIA PATRICA
											12 VALDEZ SOTO MARIA
											13 ZAMBRANO ROCHA JESSICA JAZMIN
											14 OLIVO BACA GLORIA RUFINA
2.02	PISO DE CONCRETO CON F'C=200 KG/CM2 ARMADO CON MALLALACK 6/6-6/6 DE 10 CM DE ESPESOR ACABADO PULIDO, INCLUYE: COLOCACION DE SILLETAS SEGÚN NORMA Y ESPECIFICACION, MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M2								13.59	
			A-B	1-2	3.86	3.52			13.59		01 ZAMBRANO VALENZUELA ROSARIO
											02 ARMENTA VALENZUELA RAMONA
											03 CRUZ PACHECO EDUARDO ALBERTO
											04 TORRES FLORES SELENE
											05 MARISCAL ZUÑIGA MANUELA ARACELY
											06 VARGAS QUINTANA DIANA KARELY
											07 BERRELLEZA TORRES JOSE EDUARDO
											08 SANCHEZ ANTONIO ABISAIL
											09 CASTAÑEDA JOCOBI MARISOL
											10 MOROYOQUI COTA KAREN LIZBETH
											11 REYES CRUZ CLAUDIA PATRICA
											12 VALDEZ SOTO MARIA
											13 ZAMBRANO ROCHA JESSICA JAZMIN
											14 OLIVO BACA GLORIA RUFINA

AYUNTAMIENTO DE AHOMÉ

MUNICIPIO DE AHOMÉ

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, URBANISMO Y ECOLOGÍA

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

Ahome
La Casa de Todos

GENERADORES	
HOJA	4
DE	16
EST #	1 (UNO)

OBRA:

(092AH25PR) CONSTRUCCIÓN DE 14 CUARTOS DORMITORIO (17.95 M2) EN DISTINTAS LOCALIDADES DE LA SINDICATURA CENTRAL, MUNICIPIO DE AHOMÉ, SINALOA.

CONTRATO:

FAISMUN-VIV-092PR-094PR-AH-2025

CONTRATISTA:

STHEPHANY PALOMA ALVARADO MACHADO

FECHA:

24 DE DICIEMBRE DEL 2025

NO.	CONCEPTO	UNIDAD	EJE	TRAMO	LARGO	ANCHO	ALTO	PZAS.	PARCIAL	TOTAL	OBSERVACIONES
2.03	SUMINISTRO, HABILITADO Y COLOCACION DE VARILLA DE 3/8", F'Y=4200 KG/CM2, EN TRABES Y LOSAS, INCLUYE: HABILITADO, ARMADO, GANCHOS, TRASLAPES, DESPERDICIOS, COLOCACION, Y MANO DE OBRA.	TON								0.008	
			A	1-2	1.00	0.557	0.001	3.00	0.0020		01 ZAMBRANO VALENZUELA ROSARIO
			B	1-2	1.00	0.557	0.001	3.00	0.0020		02 ARMENTA VALENZUELA RAMONA
			A	1-2	1.00	0.557	0.001	4.00	0.0020		03 CRUZ PACHECO EDUARDO ALBERTO
			B	1-2	1.00	0.557	0.001	4.00	0.0020		04 TORRES FLORES SELENE
											05 MARISCAL ZUÑIGA MANUELA ARACELY
											06 VARGAS QUINTANA DIANA KARELY
											07 BERRELLEZA TORRES JOSE EDUARDO
											08 SANCHEZ ANTONIO ABISAIL
											09 CASTAÑEDA JOCOBI MARISOL
											10 MOROYOQUI COTA KAREN LIZBETH
											11 REYES CRUZ CLAUDIA PATRICA
											12 VALDEZ SOTO MARIA
											13 ZAMBRANO ROCHA JESSICA JAZMIN
											14 OLIVO BACA GLORIA RUFINA
2.04	ANCLAJE DE CASTILLOS (C-1) DE 12X12 CM. A UNA PROFUNDIDAD DE 20 CM, REFORZADO CON ARMEX 12X12-4, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	PZA								2.00	
			2	A-B				2.00	2.00		01 ZAMBRANO VALENZUELA ROSARIO
											02 ARMENTA VALENZUELA RAMONA
											03 CRUZ PACHECO EDUARDO ALBERTO
											04 TORRES FLORES SELENE
											05 MARISCAL ZUÑIGA MANUELA ARACELY
											06 VARGAS QUINTANA DIANA KARELY
											07 BERRELLEZA TORRES JOSE EDUARDO
											08 SANCHEZ ANTONIO ABISAIL
											09 CASTAÑEDA JOCOBI MARISOL
											10 MOROYOQUI COTA KAREN LIZBETH
											11 REYES CRUZ CLAUDIA PATRICA
											12 VALDEZ SOTO MARIA
											13 ZAMBRANO ROCHA JESSICA JAZMIN
											14 OLIVO BACA GLORIA RUFINA

STEPHANY PALOMA ALVARADO MACHADO

 REPRESENTANTE LEGAL

ARQ. MIGUEL ANGEL CABANILLAS REYES

 RESIDENTE DE OBRA



ARQ. MIGUEL ANGEL CABANILLAS REYES

 RESIDENTE DE OBRA

MUNICIPIO DE AHOME											GENERADORES	
SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, URBANISMO Y ECOLOGÍA											HOJA	5
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS											DE	16
											EST #	1 (UNO)
OBRA:	(092AH25PR) CONSTRUCCIÓN DE 14 CUARTOS DORMITORIO (17.95 M2) EN DISTINTAS LOCALIDADES DE LA SINDICATURA CENTRAL, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.						CONTRATO:	FAISMUN-VIV-092PR-094PR-AH-2025				
							CONTRATISTA:	STHEPHANY PALOMA ALVARADO MACHADO				
											FECHA:	24 DE DICIEMBRE DEL 2025
NO.	CONCEPTO	UNIDAD	EJE	TRAMO	LARGO	ANCHO	ALTO	PZAS.	PARCIAL	TOTAL	OBSERVACIONES	
2.05	ANCLAJE DE CASTILLOS (C-2) DE 12X19 CM. A UNA PROFUNDIDAD DE 20 CM, REFORZADO CON ARMEX 12X20-4, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	PZA								2.00		
			1	A-B				2.00	2.00		01 ZAMBRANO VALENZUELA ROSARIO	
											02 ARMENTA VALENZUELA RAMONA	
											03 CRUZ PACHECO EDUARDO ALBERTO	
											04 TORRES FLORES SELENE	
											05 MARISCAL ZUÑIGA MANUELA ARACELY	
											06 VARGAS QUINTANA DIANA KARELY	
											07 BERRELLEZA TORRES JOSE EDUARDO	
											08 SANCHEZ ANTONIO ABISAIL	
											09 CASTAÑEDA JOCOBI MARISOL	
											10 MOROYOQUI COTA KAREN LIZBETH	
											11 REYES CRUZ CLAUDIA PATRICA	
											12 VALDEZ SOTO MARIA	
											13 ZAMBRANO ROCHA JESSICA JAZMIN	
											14 OLIVO BACA GLORIA RUFINA	
2.06	ANCLAJE DE CASTILLOS INTEGRAL (CI) A UNA PROFUNDIDAD DE 20 CM. CON UNA VARILLA DE 3/8".	PZA								8.00		
			1	A-B				2.00	2.00		01 ZAMBRANO VALENZUELA ROSARIO	
			2	A-B				2.00	2.00		02 ARMENTA VALENZUELA RAMONA	
			A	1-2				2.00	2.00		03 CRUZ PACHECO EDUARDO ALBERTO	
			B	1-2				2.00	2.00		04 TORRES FLORES SELENE	
											05 MARISCAL ZUÑIGA MANUELA ARACELY	
											06 VARGAS QUINTANA DIANA KARELY	
											07 BERRELLEZA TORRES JOSE EDUARDO	
											08 SANCHEZ ANTONIO ABISAIL	
											09 CASTAÑEDA JOCOBI MARISOL	
											10 MOROYOQUI COTA KAREN LIZBETH	
											11 REYES CRUZ CLAUDIA PATRICA	
											12 VALDEZ SOTO MARIA	
											13 ZAMBRANO ROCHA JESSICA JAZMIN	
											14 OLIVO BACA GLORIA RUFINA	

Paloma Alvarado

STEPHANY PALOMA ALVARADO MACHADO
REPRESENTANTE LEGAL

Sanjos



ARQ. MIGUEL ANGEL CABANILLAS REYES
RESIDENTE DE OBRA

FECHA: 24 DE DICIEMBRE DEL 2025


SECRETARÍA DE OBRAS
PÚBLICAS, URBANISMO Y
ECOLOGÍA
DIRECCIÓN DE
OBRAS PÚBLICAS

ARQ. MIGUEL ANGEL CABANILLAS REYES
RESIDENTE DE OBRA

OBRA:	(092AH25PR) CONSTRUCCIÓN DE 14 CUARTOS DORMITORIO (17.95 M2) EN DISTINTAS LOCALIDADES DE LA SINDICATURA CENTRAL, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.	CONTRATO:	FAISMUN-VIV-092PR-094PR-AH-2025
		CONTRATISTA:	STHEPHANY PALOMA ALVARADO MACHADO

FECHA: 24 DE DICIEMBRE DEL 2025

NO.	CONCEPTO	UNIDAD	EJE	TRAMO	LARGO	ANCHO	ALTO	PZAS.	PARCIAL	TOTAL	OBSERVACIONES
3.02	CASTILLO (C-1) DE 12X12 CM. DE SECCION DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2 REDORIZADO CON ACERO ARMEX 12X12-4, INCLUYE: CIMBRA Y ACABADO APARENTE CON TUINO DE 1", ARMADO, COLADO, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	ML								4.24	
			1	A-B			2.12	2.00	4.24		01 ZAMBRANO VALENZUELA ROSARIO 02 ARMENTA VALENZUELA RAMONA 03 CRUZ PACHECO EDUARDO ALBERTO 04 TORRES FLORES SELENE 05 MARISCAL ZUÑIGA MANUELA ARACELY 06 VARGAS QUINTANA DIANA KARELY 07 BERRELLEZA TORRES JOSE EDUARDO 08 SANCHEZ ANTONIO ABISAIL 09 CASTAÑEDA JOCOBI MARISOL 10 MOROYOQUI COTA KAREN LIZBETH 11 REYES CRUZ CLAUDIA PATRICA 12 VALDEZ SOTO MARIA 13 ZAMBRANO ROCHA JESSICA JAZMIN 14 OLIVO BACA GLORIA RUFINA
3.03	CASTILLO (C-2) DE 12X19 CM. DE SECCION DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2 REDORIZADO CON ACERO ARMEX 12X20-4, INCLUYE: CIMBRA Y ACABADO APARENTE CON TUINO DE 1", ARMADO, COLADO, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	ML								4.20	
			1	A-B			2.1	2.00	4.2		01 ZAMBRANO VALENZUELA ROSARIO 02 ARMENTA VALENZUELA RAMONA 03 CRUZ PACHECO EDUARDO ALBERTO 04 TORRES FLORES SELENE 05 MARISCAL ZUÑIGA MANUELA ARACELY 06 VARGAS QUINTANA DIANA KARELY 07 BERRELLEZA TORRES JOSE EDUARDO 08 SANCHEZ ANTONIO ABISAIL 09 CASTAÑEDA JOCOBI MARISOL 10 MOROYOQUI COTA KAREN LIZBETH 11 REYES CRUZ CLAUDIA PATRICA 12 VALDEZ SOTO MARIA 13 ZAMBRANO ROCHA JESSICA JAZMIN 14 OLIVO BACA GLORIA RUFINA



SECRETARIA DE OBRAS
PÚBLICAS, URBANISMO Y
ECOLOGIA
DIRECCIÓN DE
OBRAS PÚBLICAS

Stephany Paloma Alvarado Machado

STEPHANY PALOMA ALVARADO MACHADO
REPRESENTANTE LEGAL

Miguel Angel Cabanillas Reyes

ARQ. MIGUEL ANGEL CABANILLAS REYES
RESIDENTE DE OBRA

MUNICIPIO DE AHOMÉ
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, URBANISMO Y ECOLOGÍA
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

GENERADORES
HOJA 8
DE 16
EST # 1 (UNO)

OBRA: (092AH25PR) CONSTRUCCIÓN DE 14 CUARTOS DORMITORIO (17.95 M2) EN DISTINTAS LOCALIDADES DE LA SINDICATURA CENTRAL, MUNICIPIO DE AHOMÉ, SINALOA.

CONTRATO: FAISMUN-VIV-092PR-094PR-AH-2025
CONTRATISTA: STHEPHANY PALOMA ALVARADO MACHADO

FECHA: 24 DE DICIEMBRE DEL 2025

NO.	CONCEPTO	UNIDAD	EJE	TRAMO	LARGO	ANCHO	ALTO	PZAS.	PARCIAL	TOTAL	OBSERVACIONES
3.04	CASTILLO INTEGRAL (C) EN BLOCK HUECO DE 12X20X40 CMS. ARMADO CON 1 (UNA) VARILLA DE 3/8" DE DIAMETRO, CONCRETO F'C= 150KG/CM2 INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	ML								16.80	
			A	1-2			2.1	2.00	4.2		01 ZAMBRANO VALENZUELA ROSARIO
			B	1-2			2.1	2.00	4.2		02 ARMENTA VALENZUELA RAMONA
			1	A-B			2.1	2.00	4.2		03 CRUZ PACHECO EDUARDO ALBERTO
			2	A-B			2.1	2.00	4.2		04 TORRES FLORES SELENE
											05 MARISCAL ZUÑIGA MANUELA ARACELY
											06 VARGAS QUINTANA DIANA KARELY
											07 BERRELLEZA TORRES JOSE EDUARDO
											08 SANCHEZ ANTONIO ABISAIL
											09 CASTAÑEDA JOCOBI MARISOL
											10 MOROYOQUI COTA KAREN LIZBETH
											11 REYES CRUZ CLAUDIA PATRICA
											12 VALDEZ SOTO MARIA
											13 ZAMBRANO ROCHA JESSICA JAZMIN
											14 OLIVO BACA GLORIA RUFINA
3.05	DALA DE CERRAMIENTO DE 12X20 HASTA 12 X 30 CM. PROMEDIO, ACABADO APARENTE ARMADO CON ARMEX 12X12-4 Y 12X20-4 (SEGÚN PLANO DE PROYECTO), CONCRETO F'C= 200KG/CM2, INCLUYE: CIMBRA Y ACABADO APARENTE CON TUINO DE 1", DESCIMBRA, VIBRADO, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTAS.	ML								14.28	
			2	A-B	3.62			1.00	3.62		01 ZAMBRANO VALENZUELA ROSARIO
			1	A-B	3.62			1.00	3.62		02 ARMENTA VALENZUELA RAMONA
			A	1-2	3.52			1.00	3.52		03 CRUZ PACHECO EDUARDO ALBERTO
			B	1-2	3.52			1.00	3.52		04 TORRES FLORES SELENE
											05 MARISCAL ZUÑIGA MANUELA ARACELY
											06 VARGAS QUINTANA DIANA KARELY
											07 BERRELLEZA TORRES JOSE EDUARDO
											08 SANCHEZ ANTONIO ABISAIL
											09 CASTAÑEDA JOCOBI MARISOL
											10 MOROYOQUI COTA KAREN LIZBETH
											11 REYES CRUZ CLAUDIA PATRICA
											12 VALDEZ SOTO MARIA
											13 ZAMBRANO ROCHA JESSICA JAZMIN
											14 OLIVO BACA GLORIA RUFINA

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, URBANISMO Y ECOLOGÍA
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS


STEPHANY PALOMA ALVARADO MACHADO
REPRESENTANTE LEGAL

ARQ. MIGUEL ANGEL CABANILLAS REYES
RESIDENTE DE OBRA

OBRA:	(092AH25PR) CONSTRUCCIÓN DE 14 CUARTOS DORMITORIO (17.95 M2) EN DISTINTAS LOCALIDADES DE LA SINDICATURA CENTRAL, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.	CONTRATO:	FAISMUN-VIV-092PR-094PR-AH-2025
		CONTRATISTA:	STHEPHANY PALOMA ALVARADO MACHADO

FECHA: 24 DE DICIEMBRE DEL 2025

NO.	CONCEPTO	UNIDAD	EJE	TRAMO	LARGO	ANCHO	ALTO	PZAS.	PARCIAL	TOTAL	OBSERVACIONES
3.06	CADENA DE BLOCK "U" DE 12X20X40 CM REFORZADA CON UNA VARILLA DE 3/8, ACABADO APARENTE ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA PROPORCION 1:4, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA	ML								1.43	
			2	A-B	1.43			1.00	1.43		01 ZAMBRANO VALENZUELA ROSARIO 02 ARMENTA VALENZUELA RAMONA 03 CRUZ PACHECO EDUARDO ALBERTO 04 TORRES FLORES SELENE 05 MARISCAL ZUÑIGA MANUELA ARACELY 06 VARGAS QUINTANA DIANA KARELY 07 BERRELLEZA TORRES JOSE EDUARDO 08 SANCHEZ ANTONIO ABISAIL 09 CASTAÑEDA JOCABI MARISOL 10 MOROYOQUI COTA KAREN LIZBETH 11 REYES CRUZ CLAUDIA PATRICA 12 VALDEZ SOTO MARIA 13 ZAMBRANO ROCHA JESSICA JAZMIN 14 OLIVO BACA GLORIA RUFINA
4	LOSAS										
4.01	LOSA DE CONCRETO DE 10 CM. DE ESPESOR, INCLUYE: CIMBRA ACABADO APARENTE CON CIMBRAPLAY DE PINO DE 18 MM, REFORZADA CON VARILLA #3 Y MALLA ELECTRO SOLDADA 6X6-6-6, COLOCACION DE SILLETAS SEGÚN NORMA Y ESPECIFICACION, CONCRETO F'C=200 KG/CM2 FABRICADO CON REVOLVEDORA Y ACABADO PLANEADO, PARA RECIBIR IMPERMEABILIZANTE, DESCIMBRA, DETALLADO FINO PARTE POSTERIOR CON MORTERO, TUINO DE 1" PARA GOTERO, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M2								17.95	
			A-B	1-2	4.06	4.42			17.95		01 ZAMBRANO VALENZUELA ROSARIO 02 ARMENTA VALENZUELA RAMONA 03 CRUZ PACHECO EDUARDO ALBERTO 04 TORRES FLORES SELENE 05 MARISCAL ZUÑIGA MANUELA ARACELY 06 VARGAS QUINTANA DIANA KARELY 07 BERRELLEZA TORRES JOSE EDUARDO 08 SANCHEZ ANTONIO ABISAIL 09 CASTAÑEDA JOCABI MARISOL 10 MOROYOQUI COTA KAREN LIZBETH 11 REYES CRUZ CLAUDIA PATRICA 12 VALDEZ SOTO MARIA 13 ZAMBRANO ROCHA JESSICA JAZMIN 14 OLIVO BACA GLORIA RUFINA



SECRETARIA DE OBRAS
PÚBLICAS, URBANISMO Y
ECOLOGÍA
DIRECCIÓN DE
OBRAS PÚBLICAS

Stephany Paloma Alvarado

STEPHANY PALOMA ALVARADO MACHADO
REPRESENTANTE LEGAL

Arq. Miguel Ángel Cabanillas Reyes

Arq. Miguel Ángel Cabanillas Reyes
ARQ, MIGUEL ÁNGEL CABANILLAS REYES
RESIDENTE DE OBRA

MUNICIPIO DE AHOME											GENERADORES		
SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, URBANISMO Y ECOLOGÍA											HOJA	10	
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS											DE	16	
											EST #	1 (UNO)	
OBRA:	(092AH25PR) CONSTRUCCIÓN DE 14 CUARTOS DORMITORIO (17.95 M2) EN DISTINTAS LOCALIDADES DE LA SINDICATURA CENTRAL, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.										CONTRATO:	FAISMUN-VIV-092PR-094PR-AH-2025	
											CONTRATISTA:	STHEPHANY PALOMA ALVARADO MACHADO	
											FECHA:	24 DE DICIEMBRE DEL 2025	
NO.	CONCEPTO	UNIDAD	EJE	TRAMO	LARGO	ANCHO	ALTO	PZAS.	PARCIAL	TOTAL	OBSERVACIONES		
4.02	CURADO PARA SUPERFICIE DE CONCRETO A BASE DE CURACRETO BLANCO, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, MANDO INTERMEDIO Y HERRAMIENTA MENOR, DESPERDICIOS.	M2								17.95	01 ZAMBRANO VALENZUELA ROSARIO 02 ARMENTA VALENZUELA RAMONA 03 CRUZ PACHECO EDUARDO ALBERTO 04 TORRES FLORES SELENE 05 MARISCAL ZUÑIGA MANUELA ARACELY 06 VARGAS QUINTANA DIANA KARELY 07 BERRELLEZA TORRES JOSE EDUARDO 08 SANCHEZ ANTONIO ABISAIL 09 CASTAÑEDA JOCOBI MARISOL 10 MOROYOQUI COTA KAREN LIZBETH 11 REYES CRUZ CLAUDIA PATRICA 12 VALDEZ SOTO MARIA 13 ZAMBRANO ROCHA JESSICA JAZMIN 14 OLIVO BACA GLORIA RUFINA		
			A-B	1-2	4.06	4.42			17.95				
5	INSTALACIÓN ELÉCTRICA										01 ZAMBRANO VALENZUELA ROSARIO 02 ARMENTA VALENZUELA RAMONA 03 CRUZ PACHECO EDUARDO ALBERTO 04 TORRES FLORES SELENE 05 MARISCAL ZUÑIGA MANUELA ARACELY 06 VARGAS QUINTANA DIANA KARELY 07 BERRELLEZA TORRES JOSE EDUARDO 08 SANCHEZ ANTONIO ABISAIL 09 CASTAÑEDA JOCOBI MARISOL 10 MOROYOQUI COTA KAREN LIZBETH 11 REYES CRUZ CLAUDIA PATRICA 12 VALDEZ SOTO MARIA 13 ZAMBRANO ROCHA JESSICA JAZMIN 14 OLIVO BACA GLORIA RUFINA		
5.01	INSTALACIÓN ELÉCTRICA A BASE DE TUBO POLIDUCTO NARANJA DE 1/2", CAJAS DE REGISTRO DE LAMINA GALVANIZADA, ROSETAS DE PORCELANA DE 3" Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS MARCA MODUS Ó SIMILAR EN CALIDAD, INCLUYE: PRUEBA DEL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LA INSTALACIÓN, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, SEGÚN PLANO DE PROYECTO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	LOTE								1.00			
			A-B	1-2				1.00	1.00				

Paloma Alvarado
STEPHANY PALOMA ALVARADO MACHADO
REPRESENTANTE LEGAL

Alfonso


SECRETARIA DE OBRAS
PÚBLICAS, URBANISMO Y
ECOLOGÍA
DIRECCIÓN DE
OBRAS PÚBLICAS

ARQ. Miguel Ángel Cabanillas Reyes
ARQ. MIGUEL ÁNGEL CABANILLAS REYES
RESIDENTE DE OBRA

OBRA:	(092AH25PR) CONSTRUCCIÓN DE 14 CUARTOS DORMITORIO (17.95 M2) EN DISTINTAS LOCALIDADES DE LA SINDICATURA CENTRAL, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.	CONTRATO:	FAISMUN-VIV-092PR-094PR-AH-2025
		CONTRATISTA:	STHEPHANY PALOMA ALVARADO MACHADO

FECHA: 24 DE DICIEMBRE DEL 2025

NO.	CONCEPTO	UNIDAD	EJE	TRAMO	LARGO	ANCHO	ALTO	PZAS.	PARCIAL	TOTAL	OBSERVACIONES
6	CANCELERIA										
6.01	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE VENTANA DE ALUMINIO NATURAL LÍNEA 1 1/2", DE 1.25X1.04 M., FORMADA DE UN FIJO Y UN CORREDIZO, INCLUYE: MOSQUITERO, CRISTAL CLARO DE 3 MM., MATERIALES DE FIJACIÓN, SELLADOR, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA								1.00	
			2	A-B				1.00	1.00		01 ZAMBRANO VALENZUELA ROSARIO 02 ARMENTA VALENZUELA RAMONA 03 CRUZ PACHECO EDUARDO ALBERTO 04 TORRES FLORES SELENE 05 MARISCAL ZUÑIGA MANUELA ARACELY 06 VARGAS QUINTANA DIANA KARELY 07 BERRELLEZA TORRES JOSE EDUARDO 08 SANCHEZ ANTONIO ABISAIL 09 CASTAÑEDA JOCOBI MARISOL 10 MOROYOQUI COTA KAREN LIZBETH 11 REYES CRUZ CLAUDIA PATRICA 12 VALDEZ SOTO MARIA 13 ZAMBRANO ROCHA JESSICA JAZMIN 14 OLIVO BACA GLORIA RUFINA
7	HERRERIA										
7.01	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PROTECCIÓN PARA VENTANA DE 1.25 X 1.04 MTS. FABRICADA CON MARCO DE SOLERA DE 1 1/2" x 1/8" Y REDONDO DE 1/2", PINTADO CON PRIMARIO ANTICORROSIVO Y TERMINADO CON ESMALTE COLOR BLANCO, INCLUYE: MATERIAL Y MANO DE OBRA NECESARIO, PARA SU FABRICACIÓN Y COLOCACIÓN Y HERRAMIENTA MENOR, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA								1.00	
			2	A-B				1.00	1.00		01 ZAMBRANO VALENZUELA ROSARIO 02 ARMENTA VALENZUELA RAMONA 03 CRUZ PACHECO EDUARDO ALBERTO 04 TORRES FLORES SELENE 05 MARISCAL ZUÑIGA MANUELA ARACELY 06 VARGAS QUINTANA DIANA KARELY 07 BERRELLEZA TORRES JOSE EDUARDO 08 SANCHEZ ANTONIO ABISAIL 09 CASTAÑEDA JOCOBI MARISOL 10 MOROYOQUI COTA KAREN LIZBETH 11 REYES CRUZ CLAUDIA PATRICA 12 VALDEZ SOTO MARIA 13 ZAMBRANO ROCHA JESSICA JAZMIN 14 OLIVO BACA GLORIA RUFINA



SECRETARIA DE OBRAS
PÚBLICAS, URBANISMO Y
ECOLOGÍA
DIRECCIÓN DE
OBRAS PÚBLICAS

Paloma Alvarado
STEPHANY PALOMA ALVARADO MACHADO
REPRESENTANTE LEGAL

[Firma]

[Firma]
ARQ. MIGUEL ANGEL CABANILLAS REYES
RESIDENTE DE OBRA

FECHA: 24 DE DICIEMBRE DEL 2025

01	ZAMBRANO VALENZUELA ROSARIO
02	ARMIENTA VALENZUELA RAMONA
03	CRUZ PACHECO EDUARDO ALBERTO
04	TORRES FLORES SELENE
05	MARISCAL ZUÑIGA MANUELA ARACELY
06	VARGAS QUINTANA DIANA KARELY
07	BERRELLEZA TORRES JOSE EDUARDO
08	SANCHEZ ANTONIO ABISAIL
09	CASTAÑEDA JACOBI MARISOL
10	MOROYOQUI COTA KAREN LIZBETH
11	REYES CRUZ CLAUDIA PATRICA
12	VALDEZ SOTO MARIA
13	ZAMBRANO ROCHA JESSICA JAZMIN
14	OLIVO BACA GLORIA RUFINA

ARQ. MIGUEL ANGEL CABANILLAS REYES
RESIDENTE DE OBRA



AYUNTAMIENTO
DE AHOME

MUNICIPIO DE AHOME
SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, URBANISMO Y ECOLOGÍA
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS



GENERADORES

HOJA 13

DE 16

EST # 1 (UNO)

OBRA: (092AH25PR) CONSTRUCCIÓN DE 14 CUARTOS DORMITORIO (17.95 M2) EN DISTINTAS LOCALIDADES DE LA SINDICATURA CENTRAL, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA

CONTRATO: FAISMUN-VIV-092PR-094PR-AH-2025

CONTRATISTA: STEPHANY PALOMA ALVARADO MACHADO

FECHA:

24 DE DICIEMBRE DEL 2025

NO.	CONCEPTO	UNIDAD	EJE	TRAMO	LARGO	ANCHO	ALTO	PZAS.	PARCIAL	TOTAL	OBSERVACIONES
9	VIARIOS										
9.01	IMPERMEABILIZANTE EN LOSA DE AZOTEA A BASE DE IMPERMEABILIZANTE AFIBRATADO, INCLUYE: LIMPIEZA DE SUPERFICIE, SELLADO DE GRIETAS CON CEMENTO PLASTICO ACRILICO, APLICACIÓN DE UNA CAPA DE SELLADOR ACRILICO DILUIDO CON AGUA EN PROPORCION 1:3 CON CEPILLO DE IXTLE, UNA CAPA DE THERMOTOK RESIDENCIAL 5 AÑOS O SIMILAR, UNA VEZ SECA LA PRIMERA CAPA, SE APLICA UNA SEGUNDA CAPA DE THERMOTOK RESIDENCIAL 5 AÑOS O SIMILAR	M2								17.95	
			A-B	1-2	4.06	4.42			17.95		01 ZAMBRANO VALENZUELA ROSARIO 02 ARMENTA VALENZUELA RAMONA 03 CRUZ PACHECO EDUARDO ALBERTO 04 TORRES FLORES SELENE 05 MARISCAL ZUÑIGA MANUELA ARACELY 06 VARGAS QUINTANA DIANA KARELY 07 BERRELLEZA TORRES JOSE EDUARDO 08 SANCHEZ ANTONIO ABISAIL 09 CASTAÑEDA JOCOBI MARISOL 10 MOROYOQUI COTA KAREN LIZBETH 11 REYES CRUZ CLAUDIA PATRICA 12 VALDEZ SOTO MARIA 13 ZAMBRANO ROCHA JESSICA JAZMIN 14 OLIVO BACA GLORIA RUFINA
9.02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PLACA EN MURO AL FRENTE EN UN LUGAR VISIBLE, A BASE DE ACRILICO DE 15X30 CM. CON CALCOMANIA EN VINIL Y LEYENDA SEGÚN PROGRAMA, FIJADA CON PIJAS Y TAQUETES DE PLÁSTICO, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA NECESARIAS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA								1.00	
								1.00	1.00		01 ZAMBRANO VALENZUELA ROSARIO 02 ARMENTA VALENZUELA RAMONA 03 CRUZ PACHECO EDUARDO ALBERTO 04 TORRES FLORES SELENE 05 MARISCAL ZUÑIGA MANUELA ARACELY 06 VARGAS QUINTANA DIANA KARELY 07 BERRELLEZA TORRES JOSE EDUARDO 08 SANCHEZ ANTONIO ABISAIL 09 CASTAÑEDA JOCOBI MARISOL 10 MOROYOQUI COTA KAREN LIZBETH 11 REYES CRUZ CLAUDIA PATRICA 12 VALDEZ SOTO MARIA 13 ZAMBRANO ROCHA JESSICA JAZMIN 14 OLIVO BACA GLORIA RUFINA

Paloma Alvarado

STEPHANY PALOMA ALVARADO MACHADO
REPRESENTANTE LEGAL

Man Rios

SECRETARIA DE OBRAS
PÚBLICAS, URBANISMO Y
ECOLOGIA
DIRECCIÓN DE
OBRAS PÚBLICAS

ARQ. MIGUEL ANGEL CABANILLAS REYES
RESIDENTE DE OBRA

FECHA: 24 DE DICIEMBRE DEL 2025

05	MARISCAL LONJIA IVANDELA ARACELY
06	VARGAS QUINTANA DIANA KARELY
07	BERRELLEZA TORRES JOSE EDUARDO
08	SANCHEZ ANTONIO ABISAIL
09	GASTAÑEDA JOCOBI MARISOL
10	MOROYOQUI COTA KAREN LIZBETH
11	REYES CRUZ CLAUDIA PATRICA
12	VALDEZ SOTO MARIA
13	ZAMBRANO ROCHA JESSICA JAZMIN
14	OLIVO BACA GLORIA RUFINA

ARQ. MIGUEL ANGEL CABANILLAS REYES
RESIDENTE DE OBRA

OBRA:	(092AH25PR) CONSTRUCCIÓN DE 14 CUARTOS DORMITORIO (17.95 M2) EN DISTINTAS LOCALIDADES DE LA SINDICATURA CENTRAL, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.	CONTRATO:	FAISMUN-VIV-092PR-094PR-AH-2025
		CONTRATISTA:	STHEPHANY PALOMA ALVARADO MACHADO

FECHA: 24 DE DICIEMBRE DEL 2025

NO.	CONCEPTO	UNIDAD	EJE	TRAMO	LARGO	ANCHO	ALTO	PZAS.	PARCIAL	TOTAL	OBSERVACIONES
		PUERTA	2	A-B	5.26	0.12		1.00	0.63		
		VENTANA	2	A-B	4.58	0.12		1.00	0.55		
									1.18		
9.05	MOLDURA DE APLANADO RESALTADO DE 10 CM. DE ANCHO Y 2.00 CM DE ESPESOR, ACABADO FLOTEADO DE MEZCLA EN PERIMETRO DE VENTANA, CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	ML								4.98	
			2	A-B	1.25				1.25		
			B	1-2	1.25				1.25		
			1	A-B	1.24				1.24		
			2	A-B	1.24				1.24		
9.06	BANQUETA DE ACCESO										
9.06.1	RELLENO CON MATERIAL INERTE (BALASTRE CRIBADO) COMPACTADO AL 90 % PROCTOR, POR MEDIOS MECÁNICOS, EN CAPAS DE 15 CM. DE ESPESOR, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIAL Y HERRAMIENTA MENOR.	M3								0.77	
			2	A-B	3.86	1.00	0.20	1.00	0.77		
9.06.2	EXCAVACIÓN A MANO EN DENTELLÓN DE BANQUETA, EN MATERIAL TIPO "B" EN SECO, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M3								0.17	
			2	A-B	1.00	0.15	0.20	1.00	0.03		
					1.00	0.15	0.20	1.00	0.03		
					3.56	0.15	0.20	1.00	0.11		
9.06.3	DENTELLÓN TIPO DE 0.20 X 0.15 CON ARMEX 15X20-4 F'C= 150 KG/CM2. INCLUYE: RECORTES, CIMBRA, COLADO DE CONCRETO, ACABADO CON VOLTEADOR, CURADO, DESCIMBRADO Y LIMPIEZA DE FORMAS.	ML								5.56	
			2	A-B	1.00			1.00	1.00		
					1.00			1.00	1.00		
					3.56			1.00	3.56		

01 ZAMBRANO VALENZUELA ROSARIO
02 ARMENTA VALENZUELA RAMONA
03 CRUZ PACHECO EDUARDO ALBERTO
04 TORRES FLORES SELENE
05 MARISCAL ZUÑIGA MANUELA ARACELY
06 VARGAS QUINTANA DIANA KARELY
07 BERRELLEZA TORRES JOSE EDUARDO
08 SANCHEZ ANTONIO ABISAIL
09 CASTAÑEDA JOCOBI MARISOL
10 MOROYOQUI COTA KAREN LIZBETH
11 REYES CRUZ CLAUDIA PATRICA
12 VALDEZ SOTO MARIA
13 ZAMBRANO ROCHA JESSICA JAZMIN
14 OLIVO BACA GLORIA RUFINA

01 ZAMBRANO VALENZUELA ROSARIO
02 ARMENTA VALENZUELA RAMONA
03 CRUZ PACHECO EDUARDO ALBERTO
04 TORRES FLORES SELENE
05 MARISCAL ZUÑIGA MANUELA ARACELY
06 VARGAS QUINTANA DIANA KARELY
07 BERRELLEZA TORRES JOSE EDUARDO
08 SANCHEZ ANTONIO ABISAIL
09 CASTAÑEDA JOCOBI MARISOL
10 MOROYOQUI COTA KAREN LIZBETH
11 REYES CRUZ CLAUDIA PATRICA

Paloma Alvarado
STEPHANY PALOMA ALVARADO MACHADO
REPRESENTANTE LEGAL

Man Ros

SECRETARIA DE OBRAS
PÚBLICAS, URBANISMO Y
ECOLOGÍA
DIRECCIÓN DE
OBRAS PÚBLICAS

Man Ros
ARQ. MIGUEL ANGEL CABANILLAS REYES
RESIDENTE DE OBRA

MUNICIPIO DE AHOME											GENERADORES	
SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, URBANISMO Y ECOLOGÍA											HOJA	16
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS											DE	16
											EST #	1 (UNO)
OBRA:	(092AH25PR) CONSTRUCCIÓN DE 14 CUARTOS DORMITORIO (17.95 M2) EN DISTINTAS LOCALIDADES DE LA SINDICATURA CENTRAL, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.							CONTRATO:	FAISMUN-VIV-092PR-094PR-AH-2025			
								CONTRATISTA:	STHEPHANY PALOMA ALVARADO MACHADO			
											FECHA:	24 DE DICIEMBRE DEL 2025
NO.	CONCEPTO	UNIDAD	EJE	TRAMO	LARGO	ANCHO	ALTO	PZAS.	PARCIAL	TOTAL	OBSERVACIONES	
9.06.4	BANQUETA DE CONCRETO DE 10 CM. DE ESPESOR, ARMADO CON MALLA ELECTROSOLDADA 6-6/10-10, CONCRETO F'c=150 KG/CM2 H.O., ACABADO ESCOBILLADO, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, CIMBRA, DESCIMBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M2								3.86	12 VALDEZ SOTO MARIA	
			2	A-B	3.86	1.00		1.00	3.86		13 ZAMBRANO ROCHA JESSICA JAZMIN	
											14 OLIVO BACA GLORIA RUFINA	
9.06.5	CURADO PARA SUPERFICIE DE CONCRETO A BASE DE CURACRETO BLANCO, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, MANDO INTERMEDIO Y HERRAMIENTA MENOR, DESPERDICIOS.	M2								3.86		
			2	A-B	3.86	1.00		1.00	3.86			
9.06.6	MANIOBRA Y MOVIMIENTO DE MATERIALES PARA CONSTRUCCIÓN EN SITIO, ACARREO EN CARRETILLA, CON PERSONAL Y EQUIPO, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	LOTE								1.00		
			1-2	A-B				1.00	1.00			

Paloma Alvarado
STEPHANY PALOMA ALVARADO MACHADO
REPRESENTANTE LEGAL

Adrian Rojas




Miguel Angel Cabanillas Reyes
ARQ, MIGUEL ANGEL CABANILLAS REYES
RESIDENTE DE OBRA



MUNICIPIO DE AHOME
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, URBANISMO Y ECOLOGIA
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS




CONTRATISTA:	STHEPHANY PALOMA ALVARADO MACHADO		
NOMBRE DE LA OBRA :	(092AH25PR) CONSTRUCCIÓN DE 14 CUARTOS DORMITORIO (17.95 M2) EN DISTINTAS LOCALIDADES DE LA SINDICATURA CENTRAL, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.		
NUMERO DE CONTRATO :	FAISMUN-VIV-092PR-094PR-AH-2025		
FECHA :	24 DE DICIEMBRE DEL 2025	ESTIMACION NO. :	1 (UNO)
1.01	TRAZO Y NIVELACION MANUAL DEL AREA POR CONSTRUIR PARA ESTABLECER EJES, BANCOS DE NIVEL Y REFERENCIAS, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.		
1.04	EXCAVACION A MANO EN TRABES DE CIMENTACION, EN MATERIAL TIPO "B" EN SECO, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.		

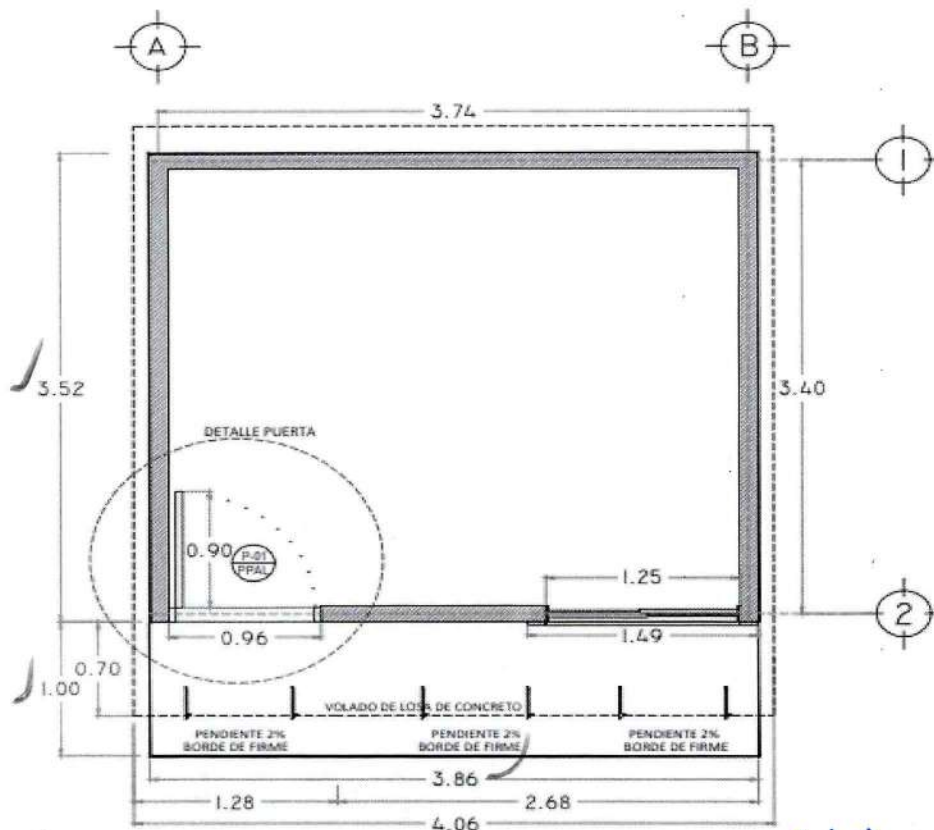

Paloma Awarado

STHEPHANY PALOMA ALVARADO MACHADO
REPRESENTANTE LEGAL

ARQ. MIGUEL ANGEL CABANILLAS REYES
RESIDENTE DE OBRA



SECRETARIA DE OBRAS
PUBLICAS, URBANISMO Y
ECOLOGIA

YES DIRECCIÓN DE
OBRAS PÚBLICAS



AYUNTAMIENTO
DE AHOMÉ

MUNICIPIO DE AHOMÉ
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, URBANISMO Y ECOLOGÍA
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS



CROQUIS DE GENERADORES

CONTRATISTA: STEPHANY PALOMA ALVARADO MACHADO

NOMBRE DE LA OBRA:

(092AH25PR) CONSTRUCCIÓN DE 14 CUARTOS DORMITORIO (17.95 M2) EN DISTINTAS LOCALIDADES DE LA SINDICATURA CENTRAL, MUNICIPIO DE AHOMÉ, SINALOA.


NUMERO DE CONTRATO: FAISMUN-VIV-092PR-094PR-AH-2025

FECHA: 24 DE DICIEMBRE DEL 2025

ESTIMACION NO.: 1 (UNO)

2.01

TRABE DE CIMENTACION DE 12CM. DE BASE, 20 CM. DE ALTURA CON 10 CM. DENTRO DE LOSA DE CIMENTACION, CONCRETO F'C= 200 KG/CM2 T.M.A. DE 38 MM. REFUERZO HORIZONTAL CON ARMEX 12X20-4 Y BASTONES EN L CON ACERO NO. 3 A CADA 40 CM. INCLUYE: CIMBRA, ARMADO, COLADO, MATERIALES NECESARIOS Y MANO DE OBRA.

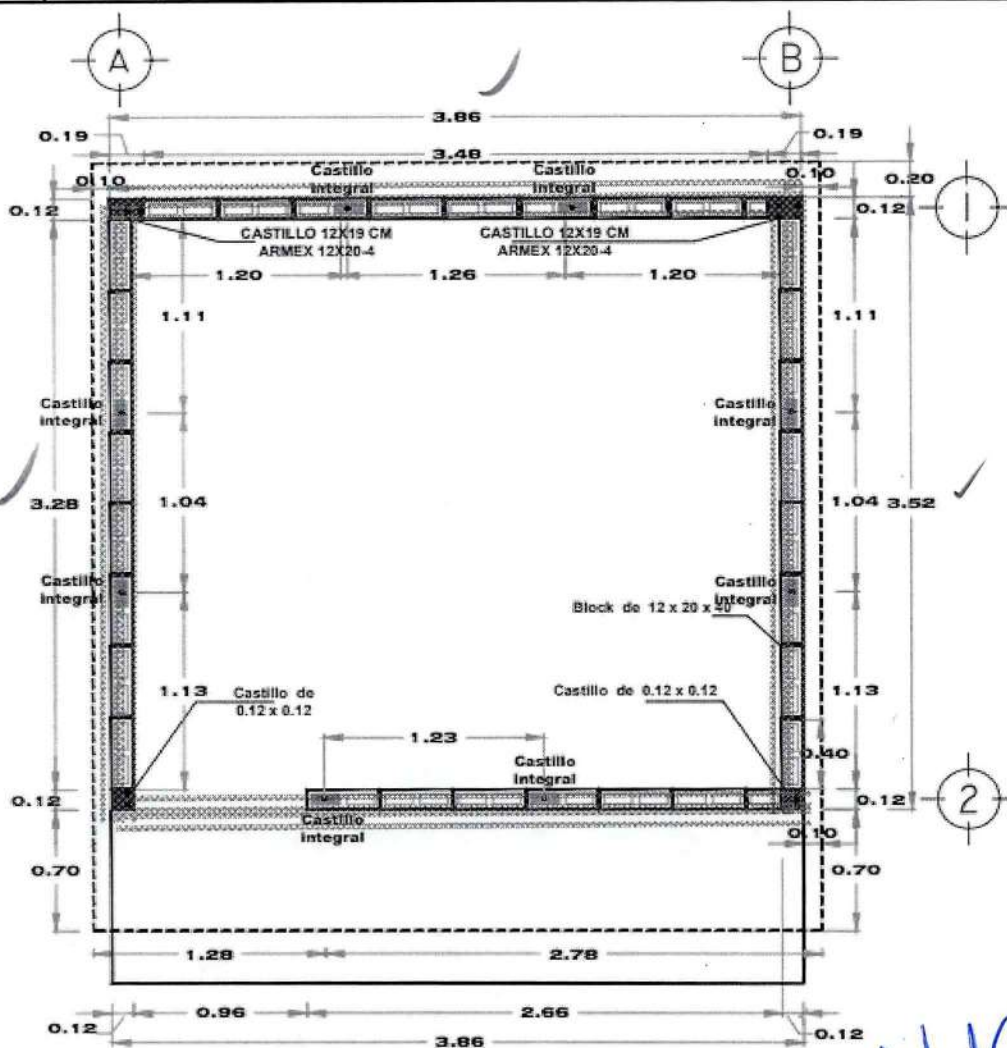

Paloma Alvarado

STEPHANY PALOMA ALVARADO MACHADO
REPRESENTANTE LEGAL

ARQ. MIGUEL ANGEL CABANILLAS REYES
RESIDENTE DE OBRA



SECRETARÍA DE OBRAS
PÚBLICAS, URBANISMO Y
ECOLOGÍA

DIRECCIÓN DE
OBRAS PÚBLICAS



AYUNTAMIENTO
DE AHOMÉ

MUNICIPIO DE AHOMÉ
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, URBANISMO Y ECOLOGIA
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS




CROQUIS DE GENERADORES

CONTRATISTA:	STHEPHANY PALOMA ALVARADO MACHADO
NOMBRE DE LA OBRA:	(092AH25PR) CONSTRUCCIÓN DE 14 CUARTOS DORMITORIO (17.95 M2) EN DISTINTAS LOCALIDADES DE LA SINDICATURA CENTRAL, MUNICIPIO DE AHOMÉ, SINALOA
NUMERO DE CONTRATO:	FAISMUN-VIV-092PR-094PR-AH-2025
FECHA:	24 DE DICIEMBRE DEL 2025
ESTIMACION NO.:	1 (UNO)

2.02

PISO DE CONCRETO CON F'C=200 KG/CM2 ARMADO CON MALLALACK 6/6-6/6 DE 10 CM DE ESPESOR ACABADO PULIDO, INCLUYE: COLOCACION DE SILLETAS SEGÚN NORMA Y ESPECIFICACION, MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.

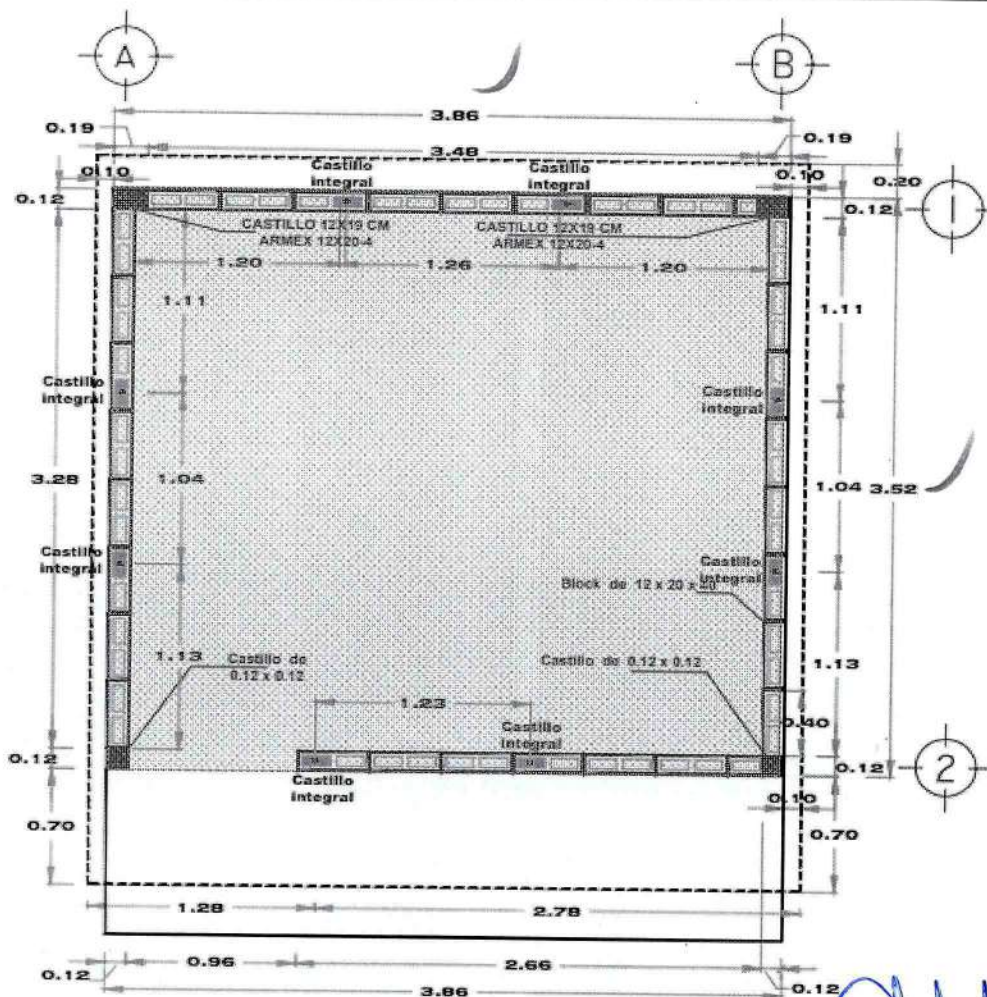

Paloma Alvarado
STHEPHANY PALOMA ALVARADO MACHADO
REPRESENTANTE LEGAL

ARQ. MIGUEL ANGEL CABANILLAS REYES
RESIDENTE DE OBRA



SECRETARIA DE OBRAS
PUBLICAS, URBANISMO Y
ECOLOGIA

DIRECCIÓN DE
OBRAS PÚBLICAS



AYUNTAMIENTO
DE AHOME

MUNICIPIO DE AHOME
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, URBANISMO Y ECOLOGIA
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS



CROQUIS DE GENERADORES

CONTRATISTA: STHEPHANY PALOMA ALVARADO MACHADO

NOMBRE DE LA OBRA :

(092AH25PR) CONSTRUCCIÓN DE 14 CUARTOS DORMITORIO (17.95 M2) EN DISTINTAS LOCALIDADES DE LA SINDICATURA CENTRAL, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.


NUMERO DE CONTRATO : FAISMUN-VIV-092PR-094PR-AH-2025

FECHA : 24 DE DICIEMBRE DEL 2025

ESTIMACION NO. : 1 (UNO)

2.03

SUMINISTRO, HABILITADO Y COLOCACION DE VARILLA DE 3/8", F'Y=4200 KG/CM2, EN TRABES Y LOSAS, INCLUYE: HABILITADO, ARMADO, GANCHOS, TRASLAPES, DESPERDICIOS, COLOCACION, Y MANO DE OBRA.

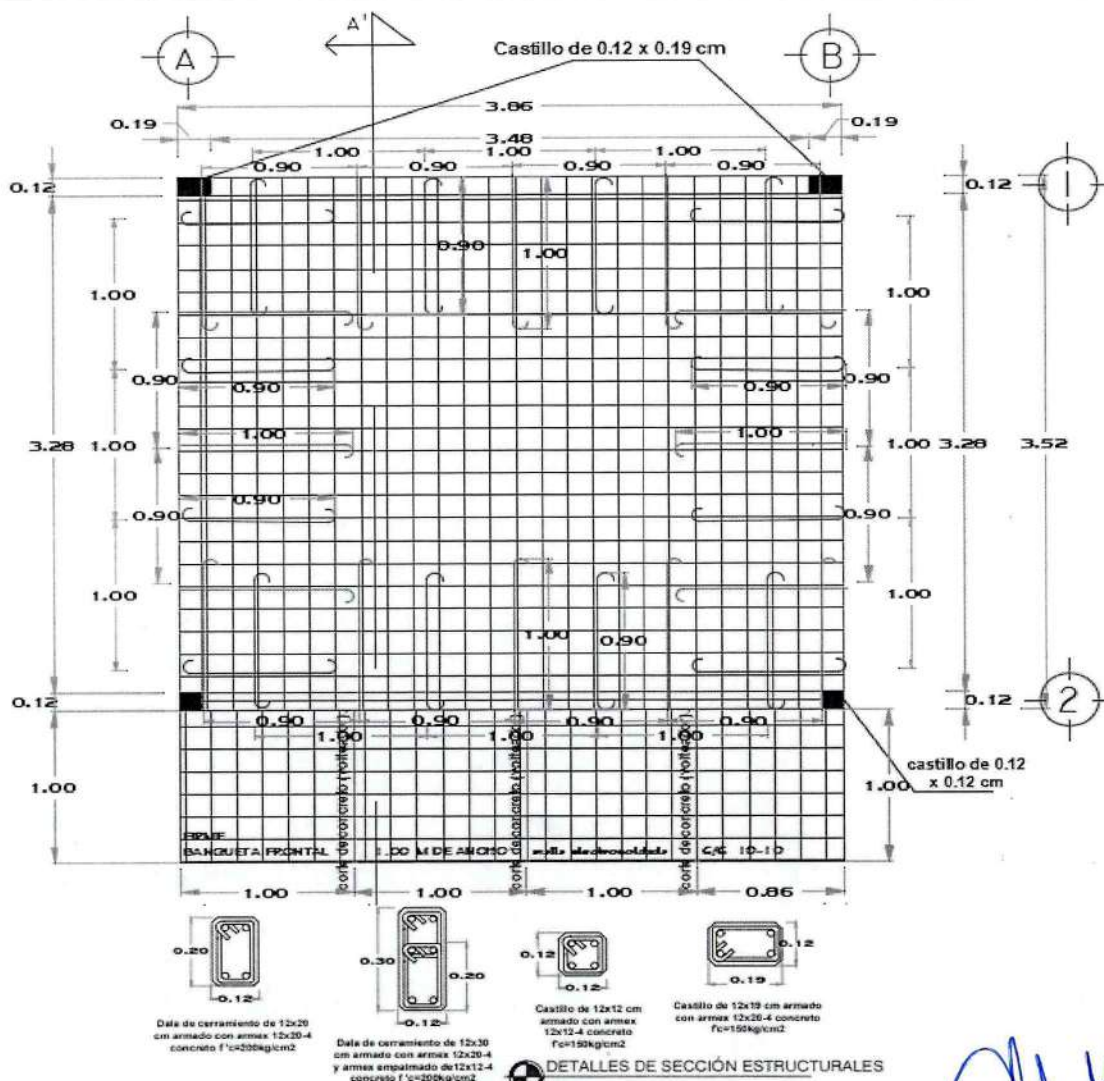

Paloma Alvarado
STHEPHANY PALOMA ALVARADO MACHADO
REPRESENTANTE LEGAL

ARQ. MIGUEL ANGEL GABANILLOS REYES
RESIDENTE DE OBRA



SECRETARIA DE OBRAS
PUBLICAS, URBANISMO Y
ECOLOGIA

DIRECCION DE
OBRAS PUBLICAS





AYUNTAMIENTO
DE AHOME

MUNICIPIO DE AHOME
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, URBANISMO Y ECOLOGIA
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS



CROQUIS DE GENERADORES

CONTRATISTA: STHEPHANY PALOMA ALVARADO MACHADO

NOMBRE DE LA OBRA : (092AH25PR) CONSTRUCCIÓN DE 14 CUARTOS DORMITORIO (17.95 M2) EN DISTINTAS LOCALIDADES DE LA SINDICATURA CENTRAL, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.


NUMERO DE CONTRATO : FAISMUN-VIV-092PR-094PR-AH-2025

FECHA : 24 DE DICIEMBRE DEL 2025

ESTIMACION NO. : 1 (UNO)

2.05

ANCLAJE DE CASTILLOS (C-2) DE 12X19 CM. A UNA PROFUNDIDAD DE 20 CM, REFORZADO CON ARMEX 12X20-4, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.

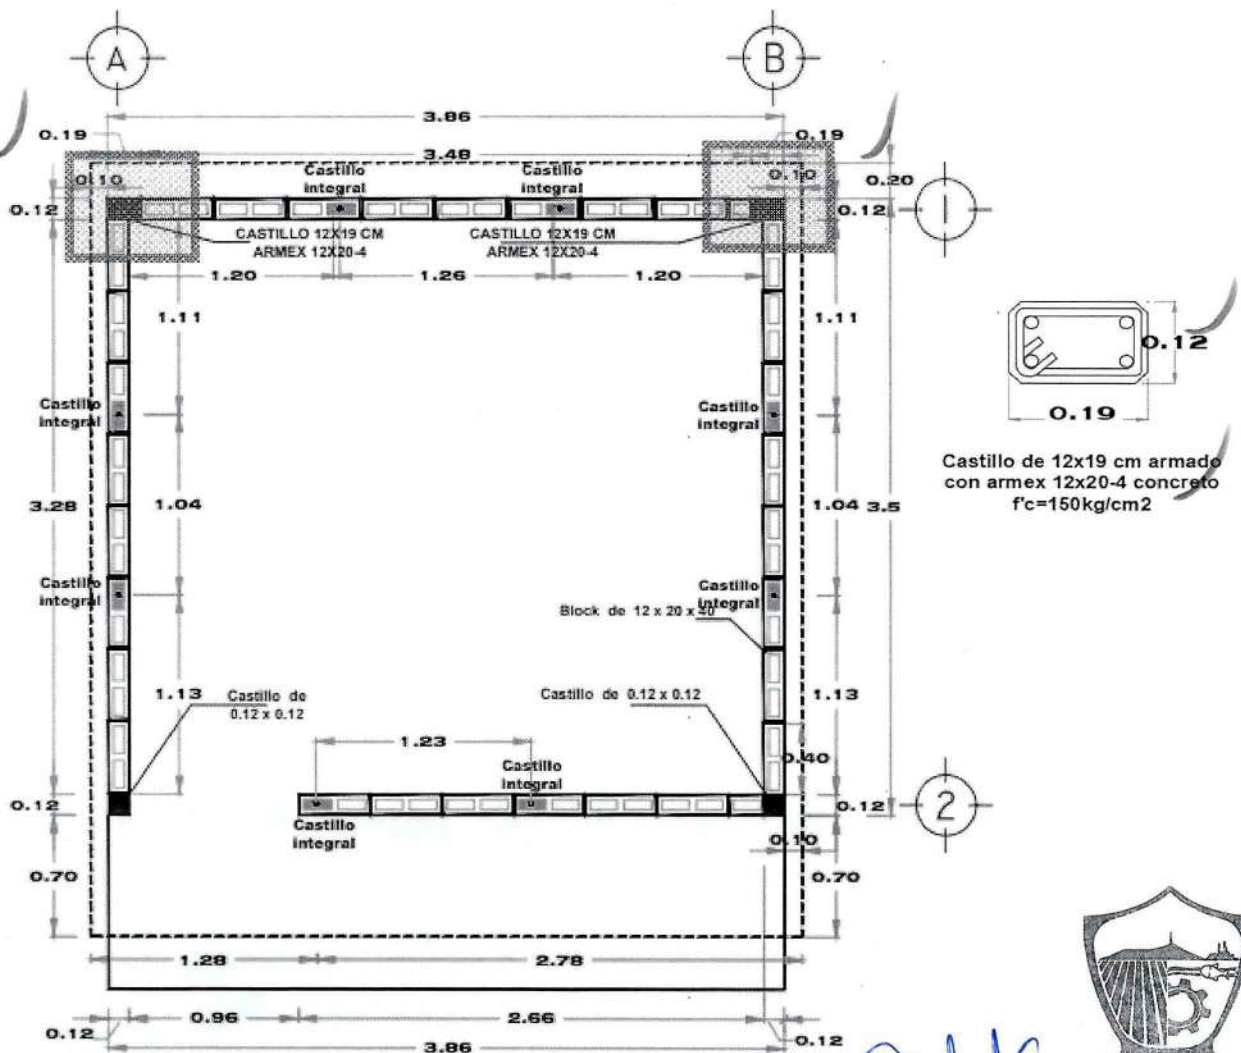

Paloma Alvarado
STHEPHANY PALOMA ALVARADO MACHADO
REPRESENTANTE LEGAL

Miguel Angel Cabanillas Reyes
ARQ. MIGUEL ANGEL CABANILLAS REYES
RESIDENTE DE OBRA



SECRETARIA DE OBRAS
PUBLICAS, URBANISMO Y
ECOLOGIA
DIRECCION DE
OBRAS PÚBLICAS



DIRECCIÓN DE
OBRAS PÚBLICAS



AYUNTAMIENTO
DE AHOME

MUNICIPIO DE AHOME
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, URBANISMO Y ECOLOGIA
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS



CROQUIS DE GENERADORES

CONTRATISTA: STHEPHANY PALOMA ALVARADO MACHADO

NOMBRE DE LA OBRA :

(092AH25PR) CONSTRUCCIÓN DE 14 CUARTOS DORMITORIO (17.95 M2) EN DISTINTAS LOCALIDADES DE LA SINDICATURA CENTRAL, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.


NUMERO DE CONTRATO : FAISMUN-VIV-092PR-094PR-AH-2025

FECHA : 24 DE DICIEMBRE DEL 2025

ESTIMACION NO. : 1 (UNO)

2.07

CURADO PARA SUPERFICIE DE CONCRETO A BASE DE CURACRETO BLANCO, INCLUYE:
MATERIALES, MANO DE OBRA, MANDO INTERMEDIO Y HERRAMIENTA MENOR, DESPERDICIOS.

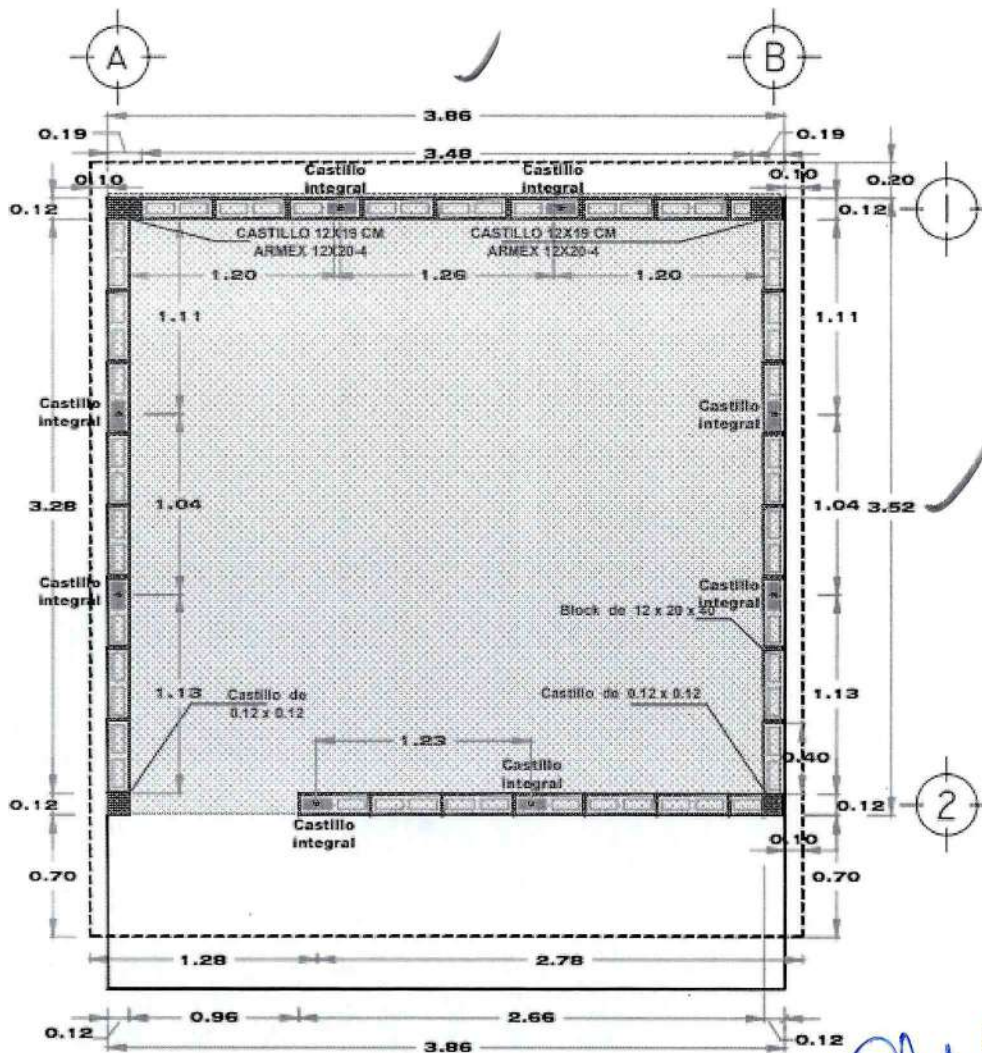

Paloma Alvarado
STHEPHANY PALOMA ALVARADO MACHADO
REPRESENTANTE LEGAL

Miguel Angel Cabani
ARQ. MIGUEL ANGEL CABANI LAS REYES
RESIDENTE DE OBRA

SECRETARIA DE OBRAS
PUBLICAS, URBANISMO Y
ECOLOGIA
DIRECCION DE
OBRAS PUBLICAS



MUNICIPIO DE AHOME
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, URBANISMO Y ECOLOGIA
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS



CONTRATISTA: STEPHANY PALOMA ALVARADO MACHADO

NOMBRE DE LA OBRA:	(092AH25PR) CONSTRUCCIÓN DE 14 CUARTOS DORMITORIO (17.95 M2) EN DISTINTAS LOCALIDADES DE LA SINDICATURA CENTRAL, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.
--------------------	---



NUMERO DE CONTRATO :	FAISMUN-VIV-092PR-094PR-AH-2025
----------------------	---------------------------------

FECHA : 24 DE DICIEMBRE DEL 2025

ESTIMACION NO.: 1 (UNO)

3.01

MURO DE BLOCK DE 12X20X40 CM. ACABADO APARENTE A DOS CARAS, ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA PROPORCION 1:4, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA

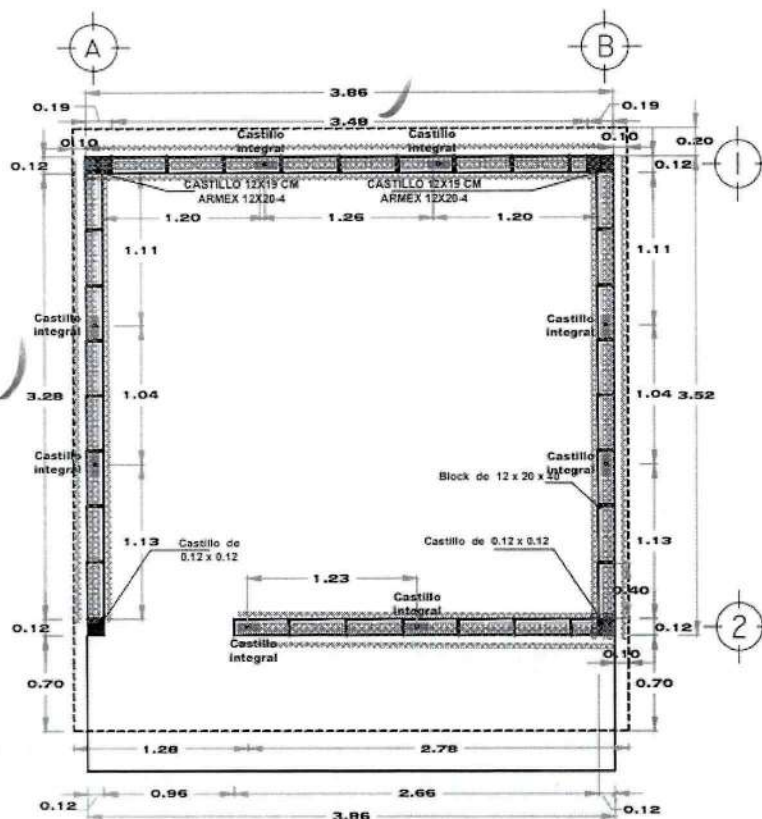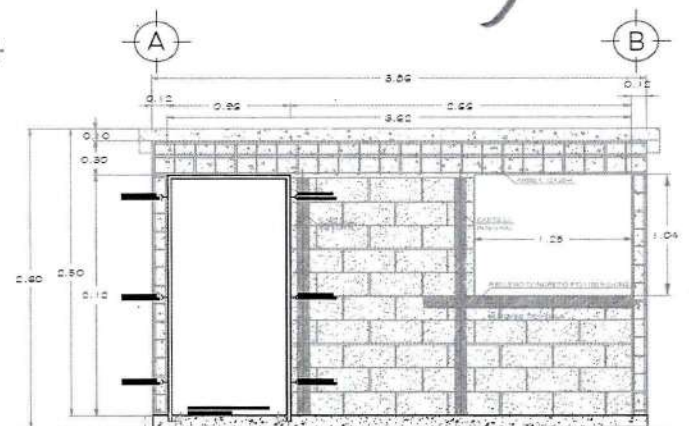

Paloma Alvarado
STHEPHANY PALOMA ALVARADO MACHADO
REPRESENTANTE LEGAL

ARQ. MIGUEL ANGEL CABANILLAS REYES
RESIDENTE DE OBRA



SECRETARIA DE OBRAS
PÚBLICAS, URBANISMO Y
ECOLOGÍA

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS



MUNICIPIO DE AHOME
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, URBANISMO Y ECOLOGIA
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS



CROQUIS DE GENERADORES

CONTRATISTA: STHEPHANY PALOMA ALVARADO MACHADO

NOMBRE DE LA OBRA:	(092AH25PR) CONSTRUCCIÓN DE 14 CUARTOS DORMITORIO (17.95 M2) EN DISTINTAS LOCALIDADES DE LA SINDICATURA CENTRAL, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.
--------------------	---


NUMERO DE CONTRATO :	FAISMUN-VIV-092PR-094PR-AH-2025
----------------------	---------------------------------

FECHA : 24 DE DICIEMBRE DEL 2025

ESTIMACION NO.: 1 (UNO)

3.02

CASTILLO (C-1) DE 12X12 CM. DE SECCION DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2 REDORZADO CON ACERO ARMEX 12X12-4, INCLUYE: CIMBRA Y ACABADO APARENTE CON TUINO DE 1", ARMADO, COLADO. MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.

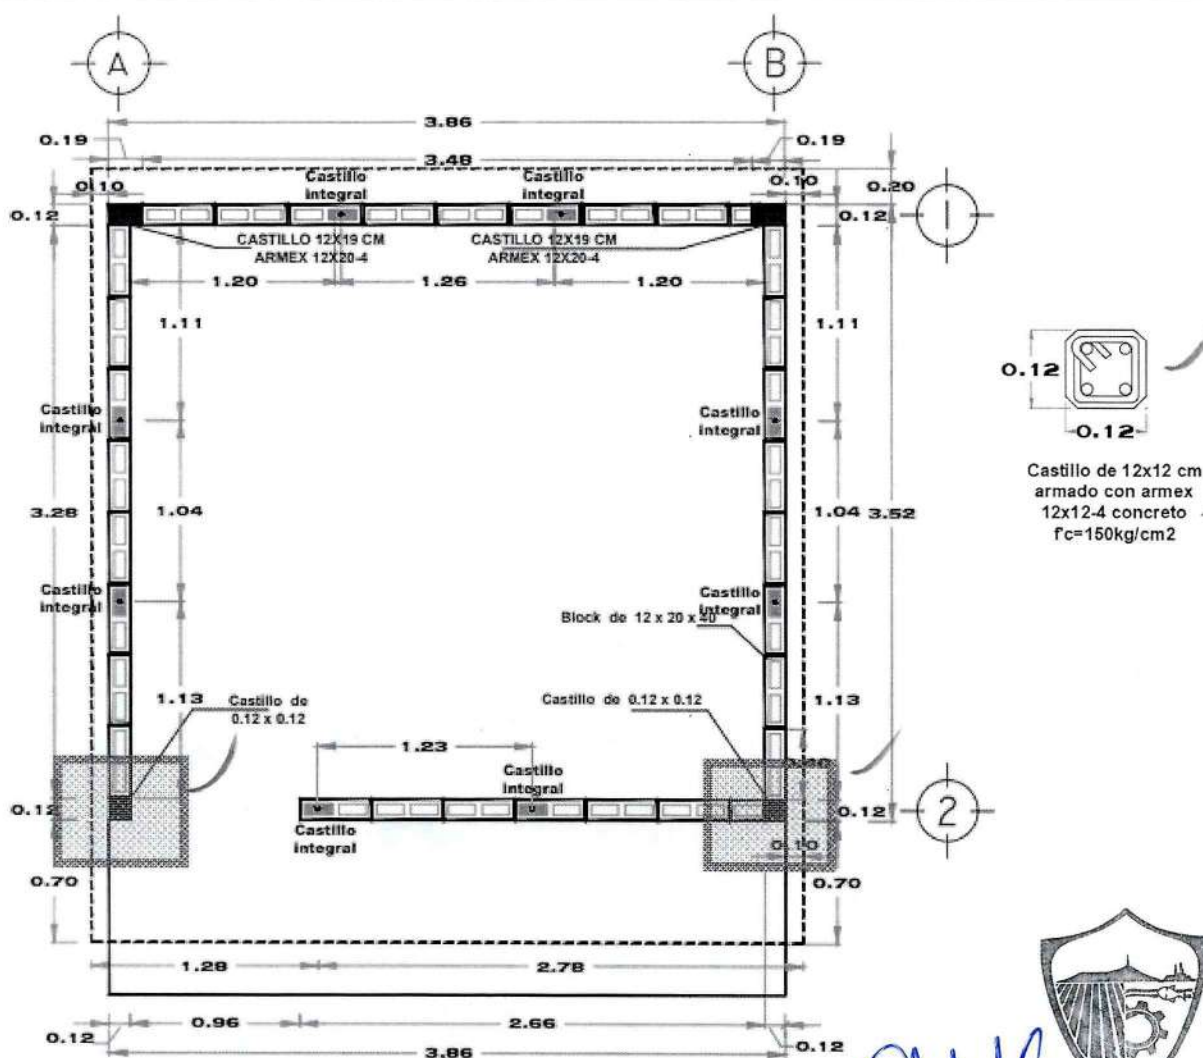

Paloma Alvarado
STHEPHANY PALOMA ALVARADO MACHADO
REPRESENTANTE LEGAL

ARQ. MIGUEL ANGEL CABANILLAS REYES
RESIDENTE DE OBRA

**DIRECCIÓN DE
OBRAS PÚBLICAS**



AYUNTAMIENTO
DE AHOME

MUNICIPIO DE AHOME
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, URBANISMO Y ECOLOGIA
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS



CROQUIS DE GENERADORES

CONTRATISTA: STHEPHANY PALOMA ALVARADO MACHADO

NOMBRE DE LA OBRA :

(092AH25PR) CONSTRUCCIÓN DE 14 CUARTOS DORMITORIO (17.95 M2) EN DISTINTAS LOCALIDADES DE LA SINDICATURA CENTRAL, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.


NUMERO DE CONTRATO : FAISMUN-VIV-092PR-094PR-AH-2025

FECHA : 24 DE DICIEMBRE DEL 2025

ESTIMACION NO. : 1 (UNO)

3.03

CASTILLO (C-2) DE 12X19 CM. DE SECCION DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2 REDORZADO CON ACERO ARMEX 12X20-4, INCLUYE: CIMBRA Y ACABADO APARENTE CON TUINO DE 1", ARMADO, COLADO, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.

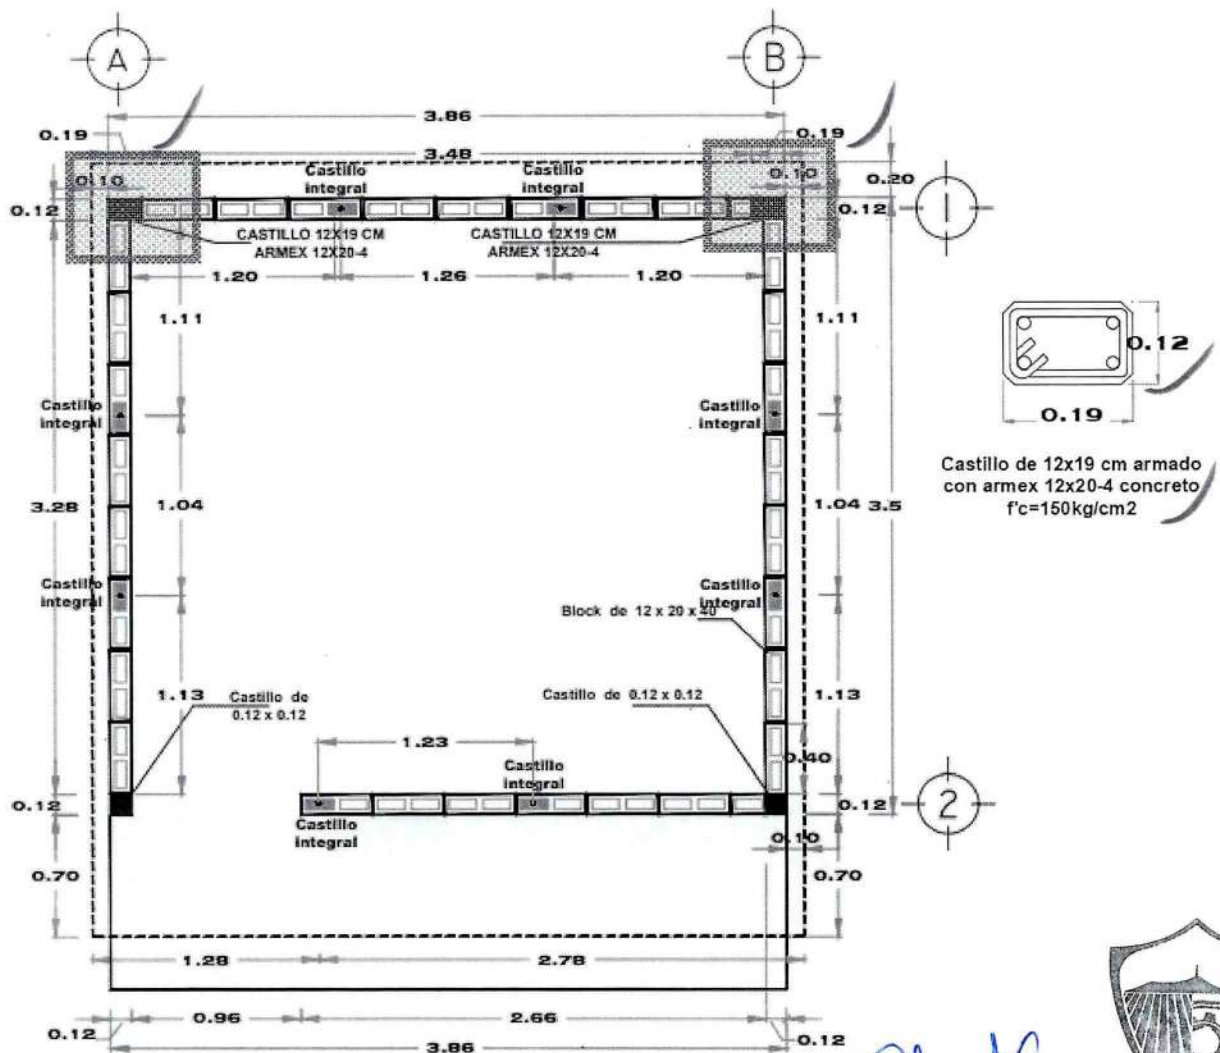

Castillo de 12x19 cm armado con armex 12x20-4 concreto f'c=150kg/cm2

Paloma Alvarado
STHEPHANY PALOMA ALVARADO MACHADO
REPRESENTANTE LEGAL

Miguel Angel Cabanillas Reyes
ARQ. MIGUEL ANGEL CABANILLAS REYES
RESIDENTE DE OBRA



SECRETARIA DE OBRAS
PUBLICAS, URBANISMO Y
ECOLOGIA

DIRECCION DE
OBRAS PUBLICAS



AYUNTAMIENTO
DE AHOME

MUNICIPIO DE AHOME
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, URBANISMO Y ECOLOGIA
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS



CROQUIS DE GENERADORES

CONTRATISTA: STHEPHANY PALOMA ALVARADO MACHADO

NOMBRE DE LA OBRA :

(092AH25PR) CONSTRUCCIÓN DE 14 CUARTOS DORMITORIO (17.95 M2) EN DISTINTAS LOCALIDADES DE LA SINDICATURA CENTRAL, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.


NUMERO DE CONTRATO : FAISMUN-VIV-092PR-094PR-AH-2025

FECHA : 24 DE DICIEMBRE DEL 2025

ESTIMACION NO. : 1 (UNO)

3.04

CASTILLO INTEGRAL (CI) EN BLOCK HUECO DE 12X20X40 CMS. ARMADO CON 1 (UNA) VARILLA DE 3/8" DE DIAMETRO, CONCRETO F'C= 150KG/CM2 INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.

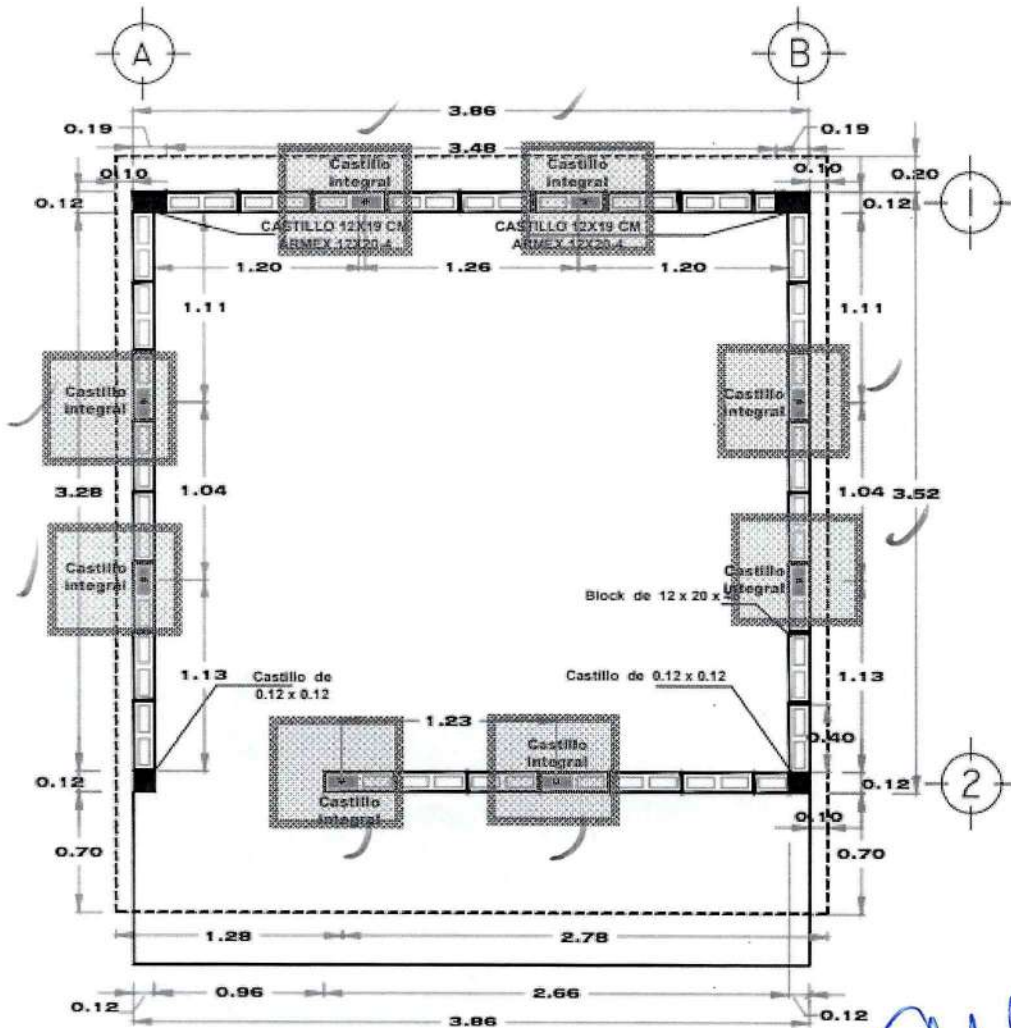

Paloma Alvarado
STHEPHANY PALOMA ALVARADO MACHADO
REPRESENTANTE LEGAL

Miguel Angel Cabanillas Reyes
ARQ. MIGUEL ANGEL CABANILLAS REYES
RESIDENTE DE OBRA



SECRETARIA DE OBRAS
PUBLICAS, URBANISMO Y
ECOLOGIA
DIRECCION DE
OBRAS PUBLICAS



AYUNTAMIENTO
DE AHOMÉ

MUNICIPIO DE AHOMÉ
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, URBANISMO Y ECOLOGÍA
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS




CROQUIS DE GENERADORES

CONTRATISTA:	STHEPHANY PALOMA ALVARADO MACHADO
NOMBRE DE LA OBRA:	(092AH25PR) CONSTRUCCIÓN DE 14 CUARTOS DORMITORIO (17.95 M2) EN DISTINTAS LOCALIDADES DE LA SINDICATURA CENTRAL, MUNICIPIO DE AHOMÉ, SINALOA.
NUMERO DE CONTRATO:	FAISMUN-VIV-092PR-094PR-AH-2025
FECHA:	24 DE DICIEMBRE DEL 2025
ESTIMACION NO.:	1 (UNO)

3.05

DALA DE CERRAMIENTO DE 12X20 HASTA 12 X 30 CM. PROMEDIO, ACABADO APARENTE ARMADO CON ARMEX 12X12-4 Y 12X20-4 (SEGÚN PLANO DE PROYECTO), CONCRETO F'C= 200KG/CM2, INCLUYE: CIMBRA Y ACABADO APARENTE CON TUINO DE 1", DESCIMBRA, VIBRADO, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTAS.

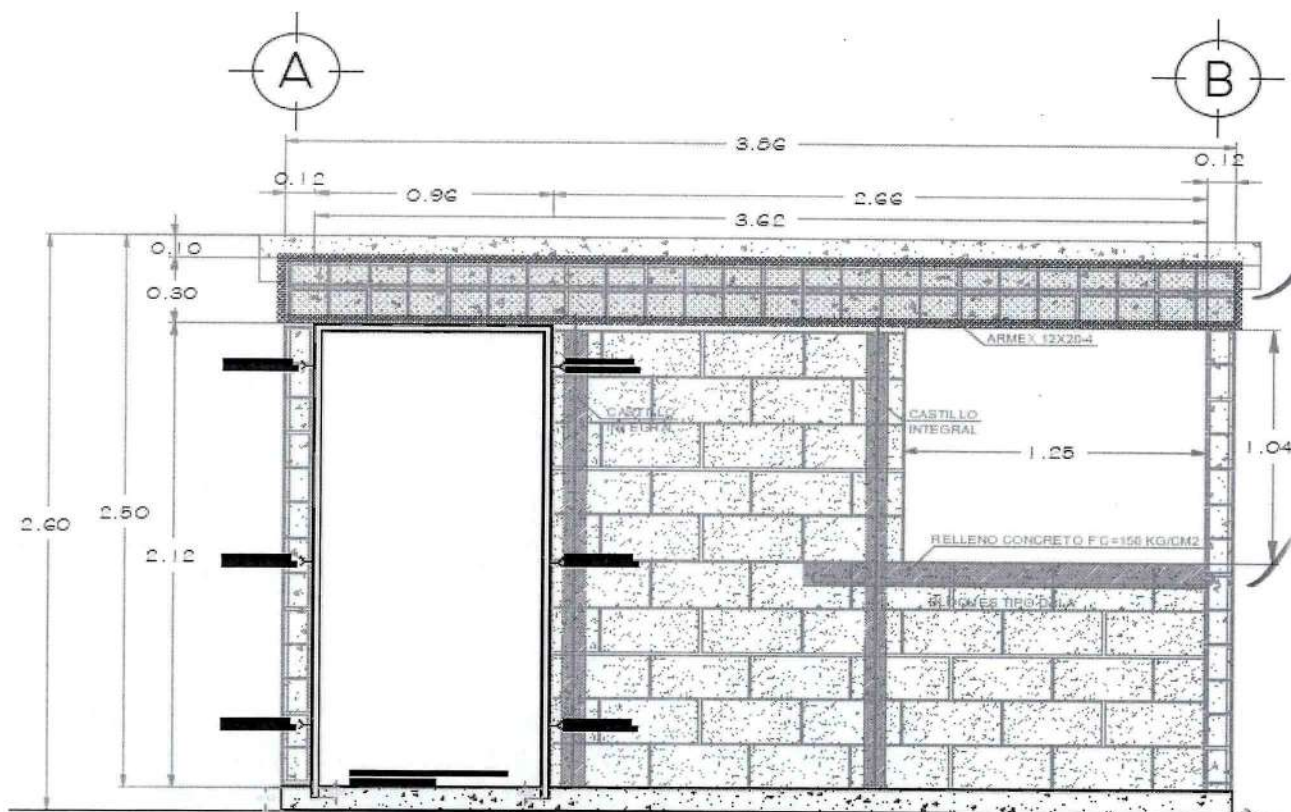

Paloma Alvarado
STHEPHANY PALOMA ALVARADO MACHADO
REPRESENTANTE LEGAL

Miguel Angel Cabanillas Reyes
ARQ. MIGUEL ANGEL CABANILLAS REYES
RESIDENTE DE OBRA





AYUNTAMIENTO
DE AHOME

MUNICIPIO DE AHOME
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, URBANISMO Y ECOLOGIA
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS



CROQUIS DE GENERADORES

CONTRATISTA: STHEPHANY PALOMA ALVARADO MACHADO

NOMBRE DE LA OBRA :

(092AH25PR) CONSTRUCCIÓN DE 14 CUARTOS DORMITORIO (17.95 M2) EN DISTINTAS LOCALIDADES DE LA SINDICATURA CENTRAL, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.

NUMERO DE CONTRATO : FAISMUN-VIV-092PR-094PR-AH-2025


FECHA : 24 DE DICIEMBRE DEL 2025

ESTIMACION NO. :

1 (UNO)

3.06

CADENA DE BLOCK "U" DE 12X20X40 CM REFORZADA CON UNA VARILLA DE 3/8, ACABADO APARENTE ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA PROPORCION 1:4, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA

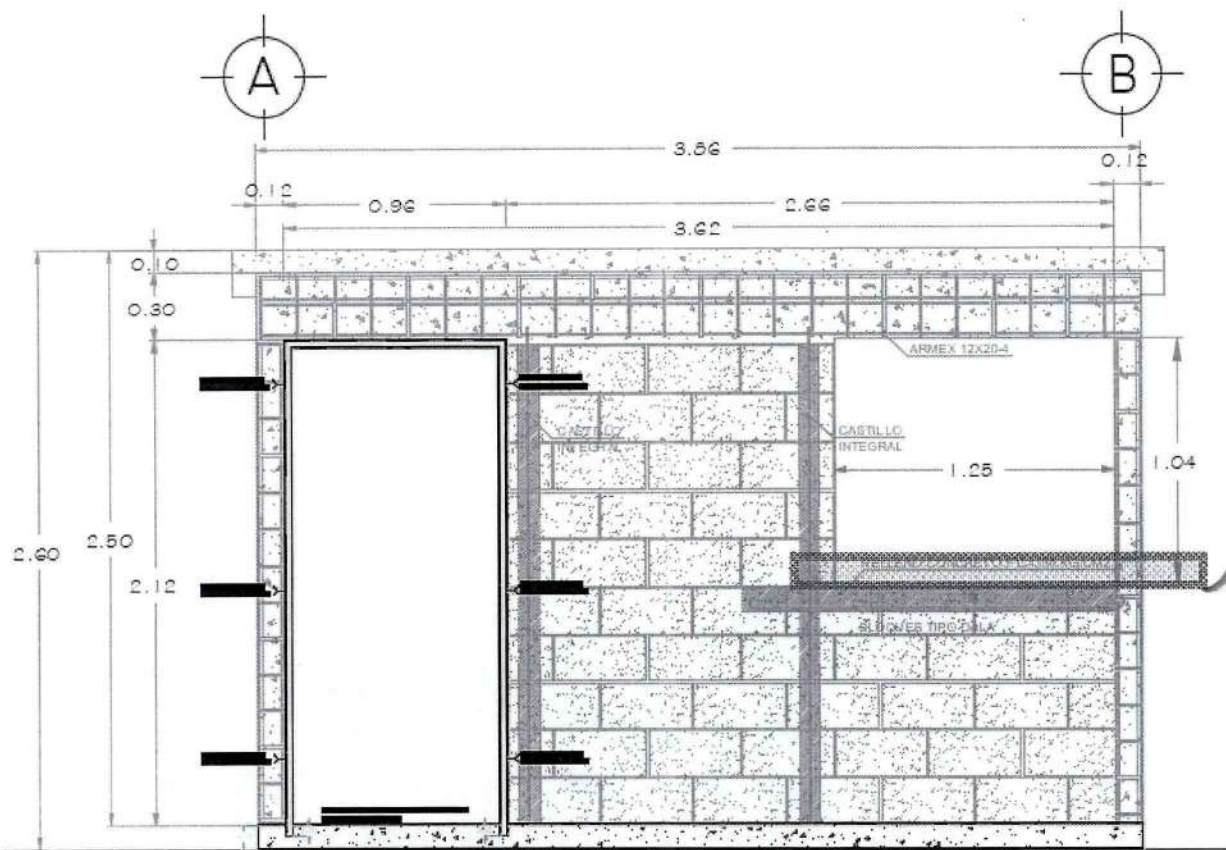

Paloma Alvarado
STHEPHANY PALOMA ALVARADO MACHADO
REPRESENTANTE LEGAL

Miguel Angel Cabanillas Reyes
ARQ. MIGUEL ANGEL CABANILLAS REYES
RESIDENTE DE OBRA



SECRETARIA DE OBRAS
PUBLICAS, URBANISMO Y
ECOLOGIA
DIRECCION DE
OBRAS PUBLICAS



AYUNTAMIENTO
DE AHOMÉ

MUNICIPIO DE AHOMÉ
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, URBANISMO Y ECOLOGIA
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS



CROQUIS DE GENERADORES

CONTRATISTA: STHEPHANY PALOMA ALVARADO MACHADO

NOMBRE DE LA OBRA : (092AH25PR) CONSTRUCCIÓN DE 14 CUARTOS DORMITORIO (17.95 M2) EN DISTINTAS LOCALIDADES DE LA SINDICATURA CENTRAL, MUNICIPIO DE AHOMÉ, SINALOA.

NUMERO DE CONTRATO : FAISMUN-VIV-092PR-094PR-AH-2025

FECHA : 24 DE DICIEMBRE DEL 2025


ESTIMACION NO. : 1 (UNO)

4.01

LOSA DE CONCRETO DE 10 CM . DE ESPESOR, INCLUYE: CIMBRA ACABADO APARENTE CON CIMBRAPLAY DE PINO DE 16 MM, REFORZADA CON VARILLA #3 Y MALLA ELECTRO SOLDADA 6X6-6-6, COLOCACION DE SILLETAS SEGÚN NORMA Y ESPECIFICACION, CONCRETO F'C=200 KG/CM2 FABRICADO CON REVOLVEDORA Y ACABADO PLANEADO, PARA RECIBIR IMPERMEABILIZANTE, DESCIMBRA, DETALLADO FINO PARTE POSTERIOR CON MORTERO, TUNO DE 1" PARA GOTERO, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.

4.02

CURADO PARA SUPERFICIE DE CONCRETO A BASE DE CURACRETO BLANCO, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, MANDO INTERMEDIO Y HERRAMIENTA MENOR, DESPERDICIOS.

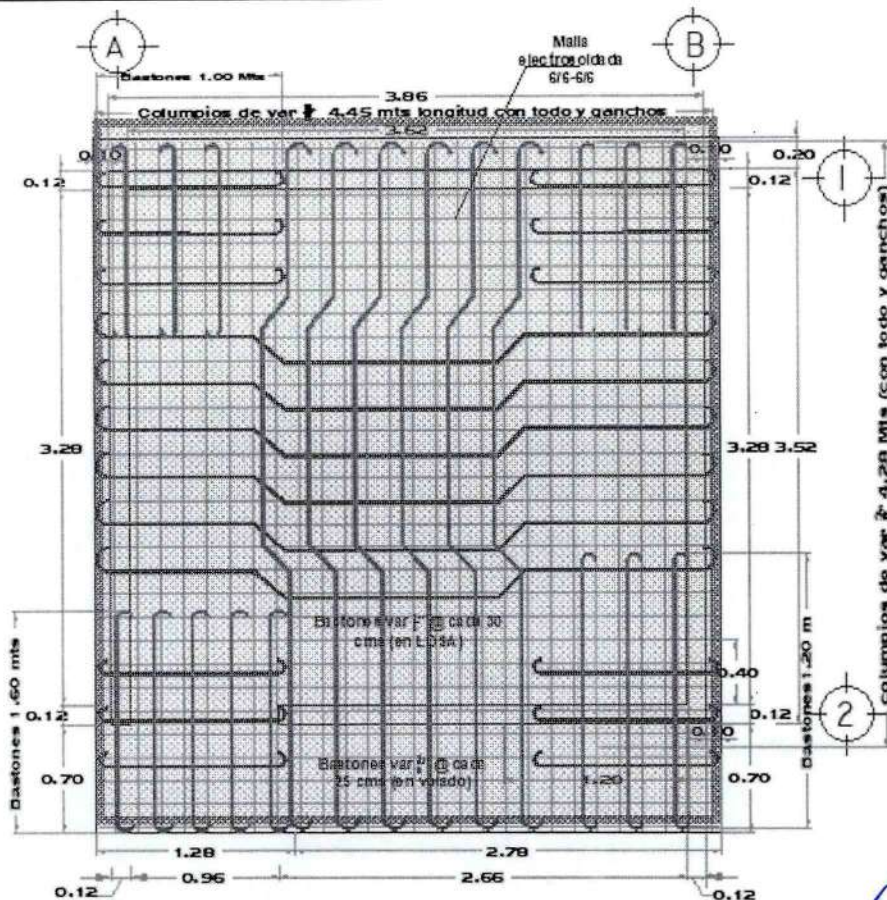

Paloma Alvarado
STHEPHANY PALOMA ALVARADO MACHADO
REPRESENTANTE LEGAL

Miguel Angel Cabanillas Reyes
ARQ. MIGUEL ANGEL CABANILLAS REYES
RESIDENTE DE OBRA



SECRETARIA DE OBRAS
PUBLICAS, URBANISMO Y
ECOLOGIA
DIRECCION DE
OBRAS PUBLICAS



AYUNTAMIENTO
DE AHOMÉ

MUNICIPIO DE AHOMÉ
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, URBANISMO Y ECOLOGÍA
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS



CROQUIS DE GENERADORES

CONTRATISTA: STHEPHANY PALOMA ALVARADO MACHADO

NOMBRE DE LA OBRA :

(092AH25PR) CONSTRUCCIÓN DE 14 CUARTOS DORMITORIO (17.95 M2) EN DISTINTAS LOCALIDADES DE LA SINDICATURA CENTRAL, MUNICIPIO DE AHOMÉ, SINALOA.

NUMERO DE CONTRATO : FAISMUN-VIV-092PR-094PR-AH-2025


FECHA : 24 DE DICIEMBRE DEL 2025

ESTIMACION NO. :

1 (UNO)

5.01

INSTALACIÓN ELÉCTRICA A BASE DE TUBO POLIDUCTO NARANJA DE 1/2", CAJAS DE REGISTRO DE LAMINA GALVANIZADA, ROSETAS DE PORCELANA DE 3" Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS MARCA MODUS Ó SIMILAR EN CALIDAD, INCLUYE: PRUEBA DEL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LA INSTALACIÓN, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, SEGÚN PLANO DE PROYECTO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.

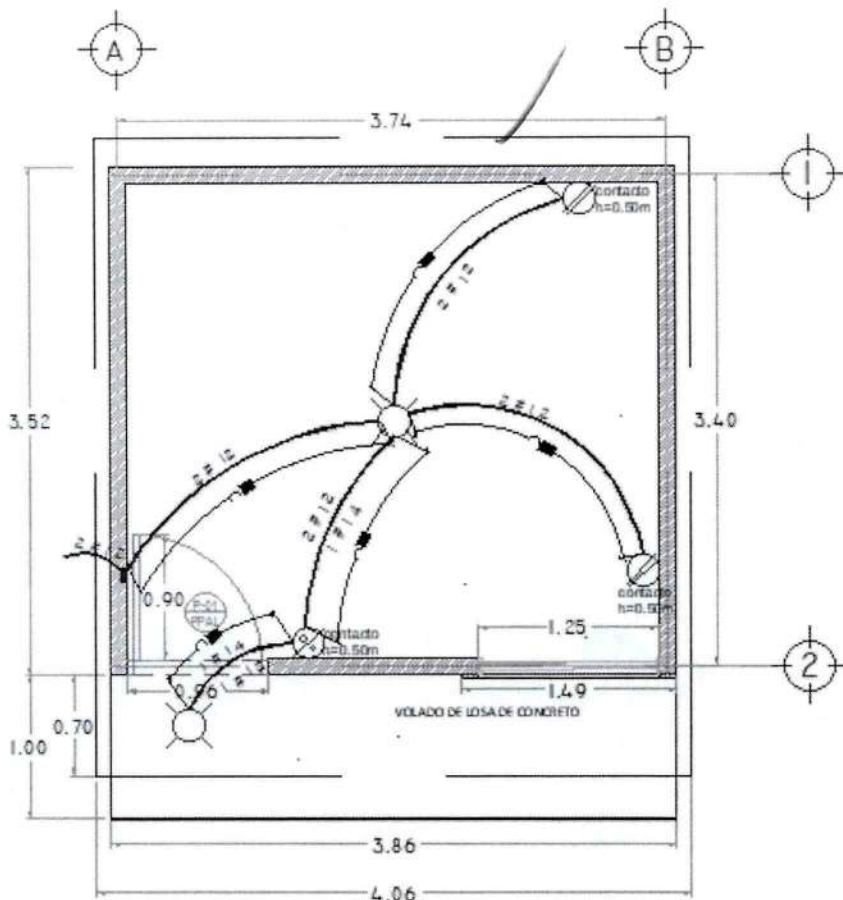

SIMBOLOGIA ELECTRICA

	SAIDA DE CENTRO
	AFAGADOR
	CONTACTO DOBLE 110 V.
	CHALUPA 2"x4" TAPA CIEGA AHOGADA EN LOSA

Paloma Alvarado
STHEPHANY PALOMA ALVARADO MACHADO
REPRESENTANTE LEGAL

Miguel Angel Cabanillas Reyes
ARQ. MIGUEL ANGEL CABANILLAS REYES
RESIDENTE DE OBRA



SECRETARÍA DE OBRAS
PÚBLICAS, URBANISMO Y
ECOLOGIA
DIRECCIÓN DE
OBRAS PÚBLICAS



AYUNTAMIENTO
DE AHOMÉ


MUNICIPIO DE AHOMÉ
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, URBANISMO Y ECOLOGÍA
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS



CROQUIS DE GENERADORES

CONTRATISTA:	STHEPHANY PALOMA ALVARADO MACHADO		
NOMBRE DE LA OBRA :	(092AH25PR) CONSTRUCCIÓN DE 14 CUARTOS DORMITORIO (17.95 M2) EN DISTINTAS LOCALIDADES DE LA SINDICATURA CENTRAL, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.		
NUMERO DE CONTRATO :	FAISMUN-VIV-092PR-094PR-AH-2025		
FECHA :	24 DE DICIEMBRE DEL 2025	ESTIMACION NO. :	1 (UNO)

6.01	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE VENTANA DE ALUMINIO NATURAL LÍNEA 1 1/2", DE 1.25X1.04 M., FORMADA DE UN FIJO Y UN CORREDIZO, INCLUYE: MOSQUITERO, CRISTAL CLARO DE 3 MM., MATERIALES DE FIJACIÓN, SELLADOR, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.
7.01	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PROTECCIÓN PARA VENTANA DE 1.25 X 1.04 MTS. FABRICADA CON MARCO DE SOLERA DE 1 1/2" x 1/8" Y REDONDO DE 1/2", PINTADO CON PRIMARIO ANTICORROSIVO Y TERMINADO CON ESMALTE COLOR BLANCO, INCLUYE: MATERIAL Y MANO DE OBRA NECESARIO, PARA SU FABRICACIÓN Y COLOCACIÓN Y HERRAMIENTA MENOR, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.

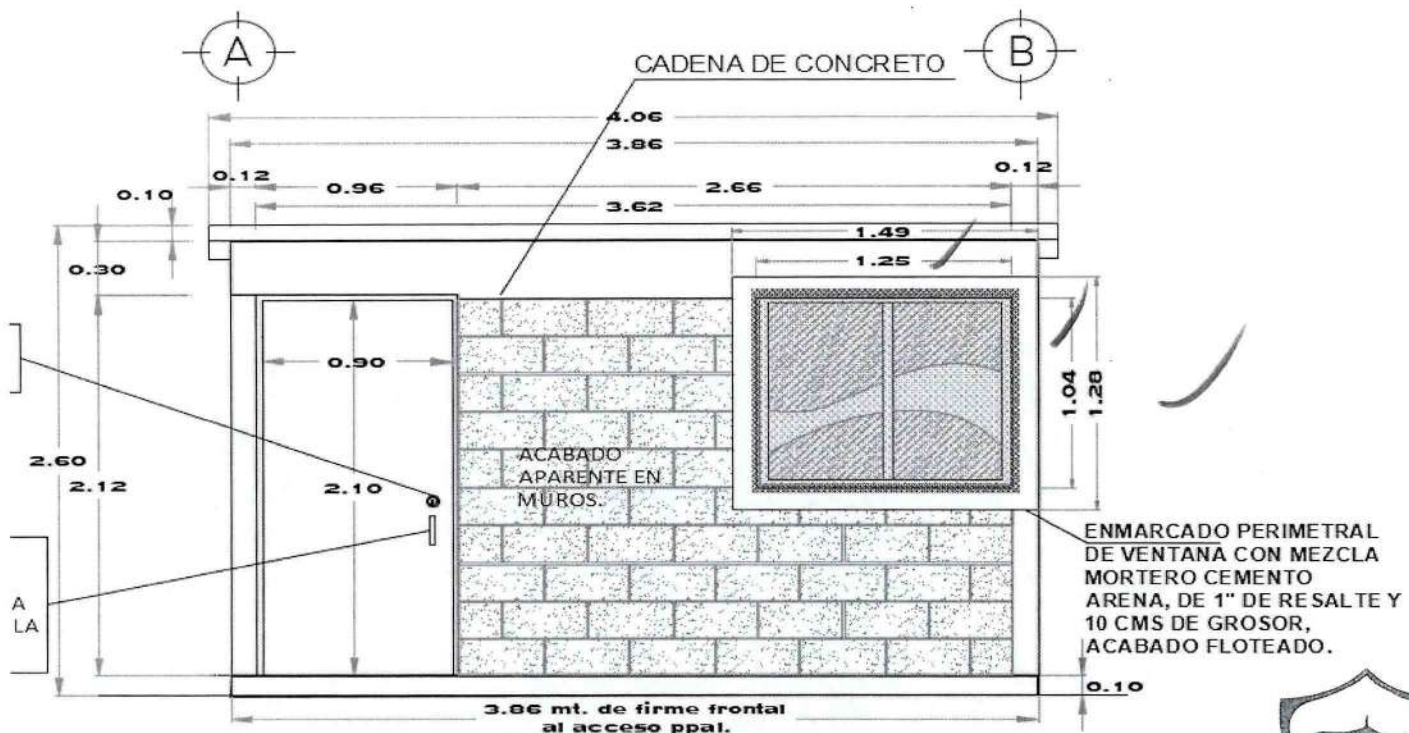

Paloma Alvarado

STHEPHANY PALOMA ALVARADO MACHADO
REPRESENTANTE LEGAL

ARQ. MIGUEL ANGEL CABANILLAS REYES
RESIDENTE DE OBRA



SECRETARÍA DE OBRAS
PÚBLICAS, URBANISMO Y
ECOLOGÍA
DIRECCIÓN DE
OBRAS PÚBLICAS



AYUNTAMIENTO
DE AHOMÉ

MUNICIPIO DE AHOMÉ
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, URBANISMO Y ECOLOGÍA
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS



CROQUIS DE GENERADORES

CONTRATISTA: STHEPHANY PALOMA ALVARADO MACHADO

NOMBRE DE LA OBRA: (092AH25PR) CONSTRUCCIÓN DE 14 CUARTOS DORMITORIO (17.95 M2) EN DISTINTAS LOCALIDADES DE LA SINDICATURA CENTRAL, MUNICIPIO DE AHOMÉ, SINALOA.


NUMERO DE CONTRATO: FAISMUN-VIV-092PR-094PR-AH-2025

FECHA: 24 DE DICIEMBRE DEL 2025

ESTIMACION NO.: 1 (UNO)


7.02

SUMINISTRO, FABRICACIÓN Y COLOCACIÓN DE MARCO EMPOTRADO 5 CM. EN LOSA DE CIMENTACIÓN, DE 97 CM. DE ANCHO X 217 CM. DE ALTURA, CON PERFIL TUBULAR No. 129 CAL. 20, PINTADO CON PRIMARIO ANTICORROSIVO Y TERMINADO CON ESMALTE COLOR BLANCO, INCLUYE: RESANE EN PISO PULIDO CON MORTERO CEMENTO ARENA 1:3, BISAGRAS LATONADAS DE 3" (3 PZAS) SOLDADAS A PERFIL, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.

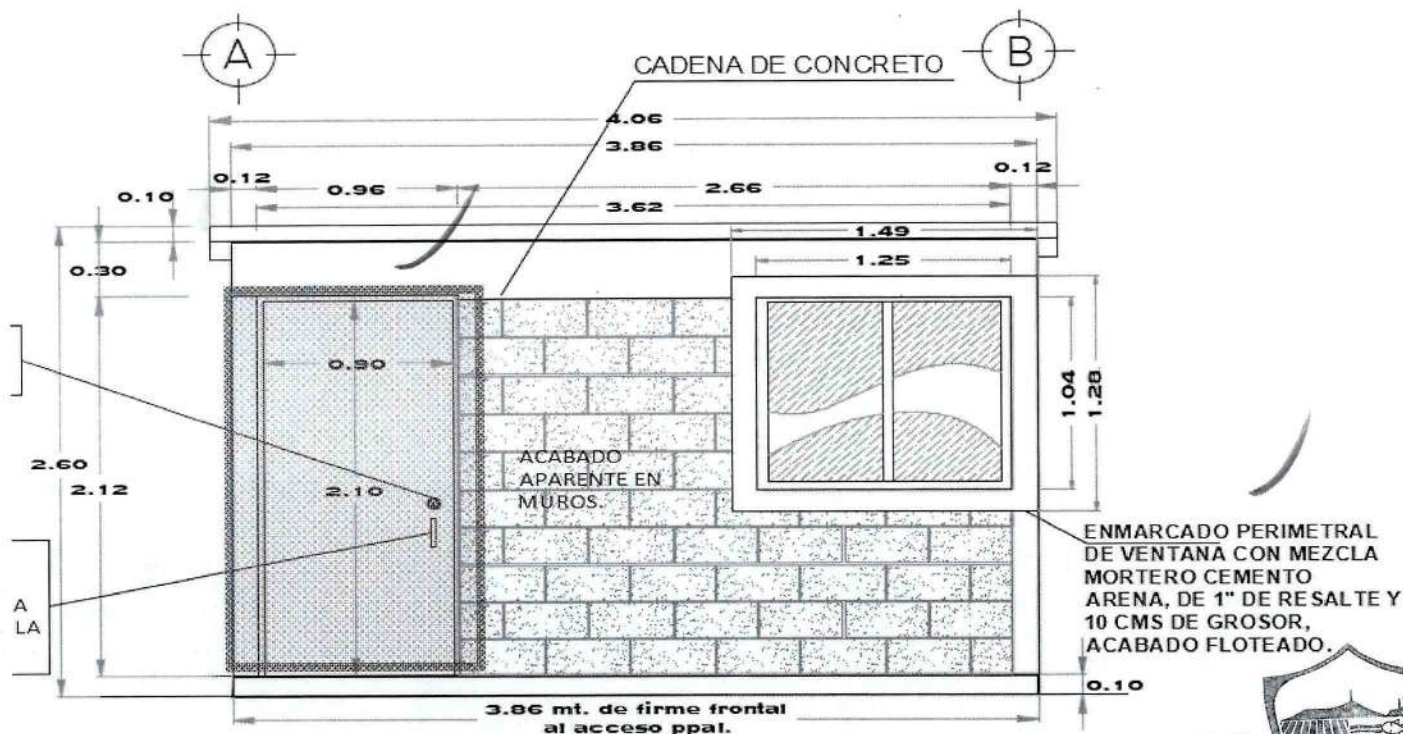

Paloma Alvarado
STHEPHANY PALOMA ALVARADO MACHADO
REPRESENTANTE LEGAL

Miguel Angel Cabanillas Reyes
ARQ. MIGUEL ANGEL CABANILLAS REYES
RESIDENTE DE OBRA



DIRECCIÓN DE
OBRAS PÚBLICAS



AYUNTAMIENTO
DE AHOMÉ

MUNICIPIO DE AHOMÉ
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, URBANISMO Y ECOLOGÍA
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS



CROQUIS DE GENERADORES

CONTRATISTA: STHEPHANY PALOMA ALVARADO MACHADO

NOMBRE DE LA OBRA :

(092AH25PR) CONSTRUCCIÓN DE 14 CUARTOS DORMITORIO (17.95 M2) EN DISTINTAS LOCALIDADES DE LA SINDICATURA CENTRAL, MUNICIPIO DE AHOMÉ, SINALOA.

NUMERO DE CONTRATO : FAISMUN-VIV-092PR-094PR-AH-2025


FECHA : 24 DE DICIEMBRE DEL 2025

ESTIMACION NO. :

1 (UNO)


8.01

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PUERTA MULTYPANEL LISA DE 0.90 X 2.10 M. DE ALTURA, INCLUYE: PHILLIPS POMO GAMMA BAÑO ACERO INOXIDABLE O SIMILIRA, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.

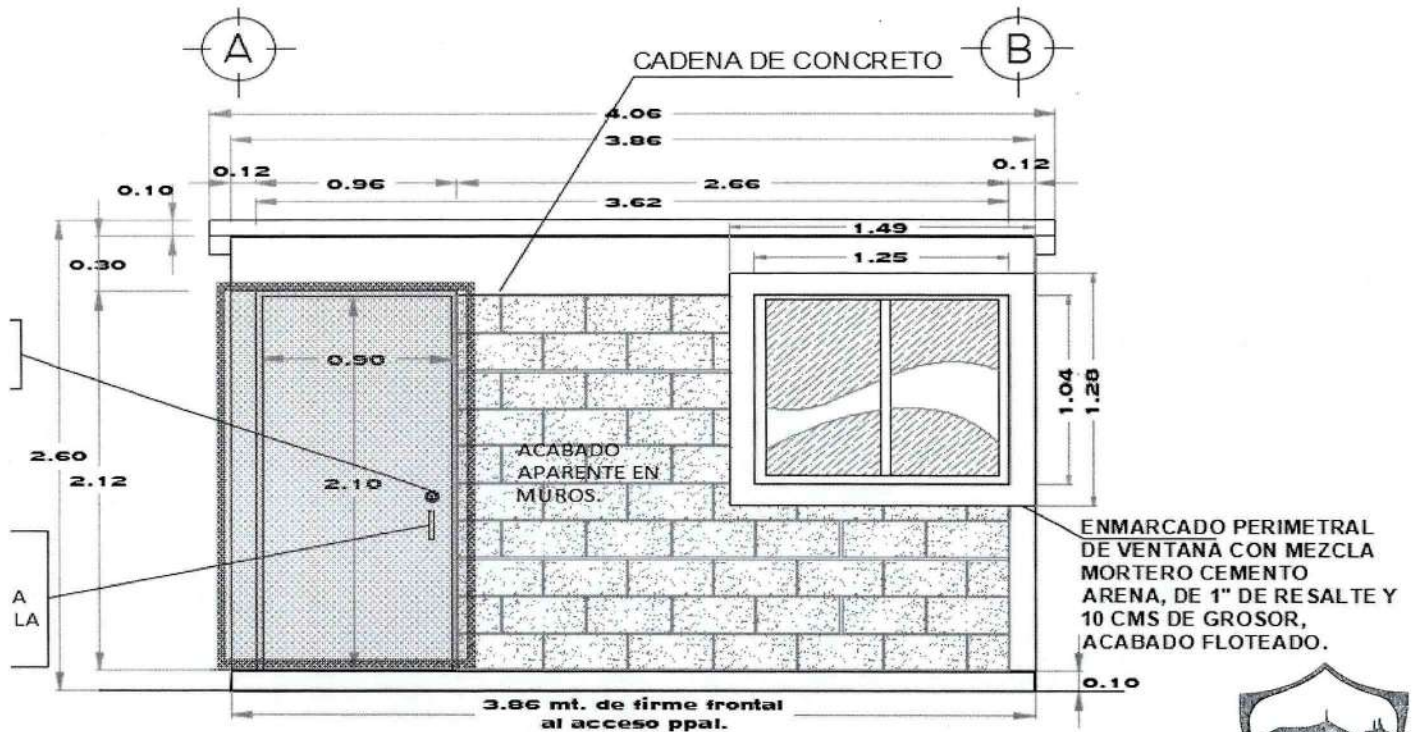

Paloma Alvarado
STHEPHANY PALOMA ALVARADO MACHADO
REPRESENTANTE LEGAL

Miguel Angel Cabanillas Reyes
ARQ. MIGUEL ANGEL CABANILLAS REYES
RESIDENTE DE OBRA





AYUNTAMIENTO
DE AHOME

MUNICIPIO DE AHOME
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, URBANISMO Y ECOLOGIA
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS




CROQUIS DE GENERADORES

CONTRATISTA:	STHEPHANY PALOMA ALVARADO MACHADO
NOMBRE DE LA OBRA :	(092AH25PR) CONSTRUCCIÓN DE 14 CUARTOS DORMITORIO (17.95 M2) EN DISTINTAS LOCALIDADES DE LA SINDICATURA CENTRAL, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.
NUMERO DE CONTRATO :	FAISMUN-VIV-092PR-094PR-AH-2025
FECHA :	24 DE DICIEMBRE DEL 2025
ESTIMACION NO. :	1 (UNO)

9.01

IMPERMEABILIZANTE EN LOSA DE AZOTEA A BASE DE IMPERMEABILIZANTE AFIBRATADO, INCLUYE: LIMPIEZA DE SUPERFICIE, SELLADO DE GRIETAS CON CEMENTO PLASTICO ACRILICO, APLICACIÓN DE UNA CAPA DE SELLADOR ACRILICO DILUIDO CON AGUA EN PROPORCION 1:3 CON CEPILLO DE IXTLE, UNA CAPA DE THERMOTЕК RESIDENCIAL 5 AÑOS O SIMILAR, UNA VEZ SECA LA PRIMERA CAPA SE APLICA UNA SEGUNDA CAPA DE THERMOTЕК RESIDENCIAL 5 AÑOS O SIMILAR

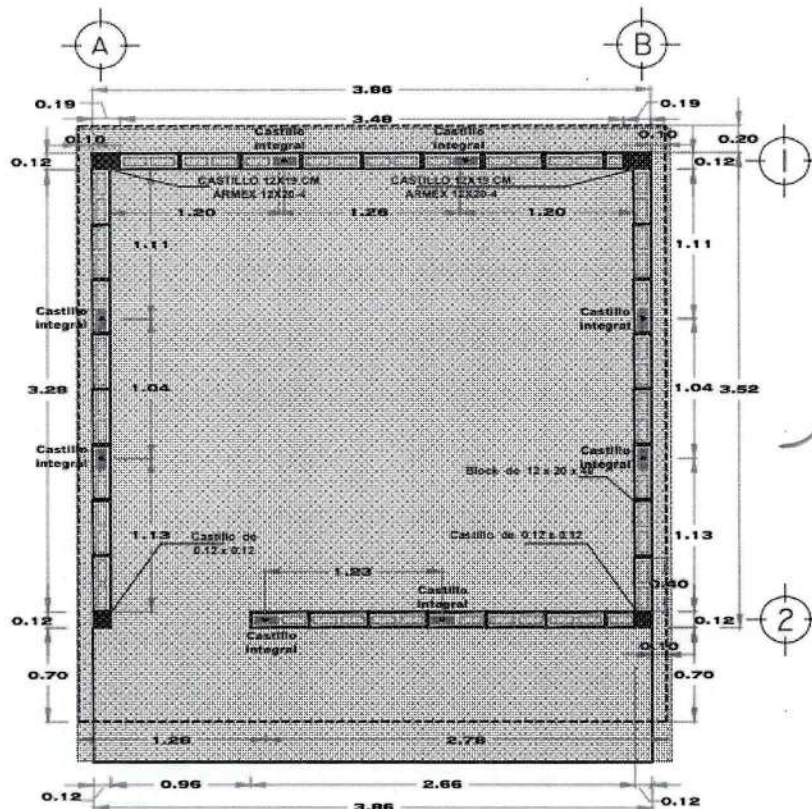

Paloma Alvarado
STHEPHANY PALOMA ALVARADO MACHADO
REPRESENTANTE LEGAL

Miguel Angel Cabanillas Reyes
ARQ. MIGUEL ANGEL CABANILLAS REYES
RESIDENTE DE OBRA
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, URBANISMO Y ECOLOGIA
DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS



AYUNTAMIENTO
DE AHOMÉ

MUNICIPIO DE AHOMÉ
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, URBANISMO Y ECOLOGÍA
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS



CROQUIS DE GENERADORES

CONTRATISTA: STHEPHANY PALOMA ALVARADO MACHADO

NOMBRE DE LA OBRA :

(092AH25PR) CONSTRUCCIÓN DE 14 CUARTOS DORMITORIO (17.95 M2) EN DISTINTAS LOCALIDADES DE LA SINDICATURA CENTRAL, MUNICIPIO DE AHOMÉ, SINALOA.


NUMERO DE CONTRATO : FAISMUN-VIV-092PR-094PR-AH-2025

FECHA : 24 DE DICIEMBRE DEL 2025

ESTIMACION NO. : 1 (UNO)

9.05

MOLDURA DE APLANADO RESALTADO DE 10 CM. DE ANCHO Y 2.00 CM DE ESPESOR, ACABADO FLOTEADO DE MEZCLA EN PERIMETRO DE VENTANA, CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.

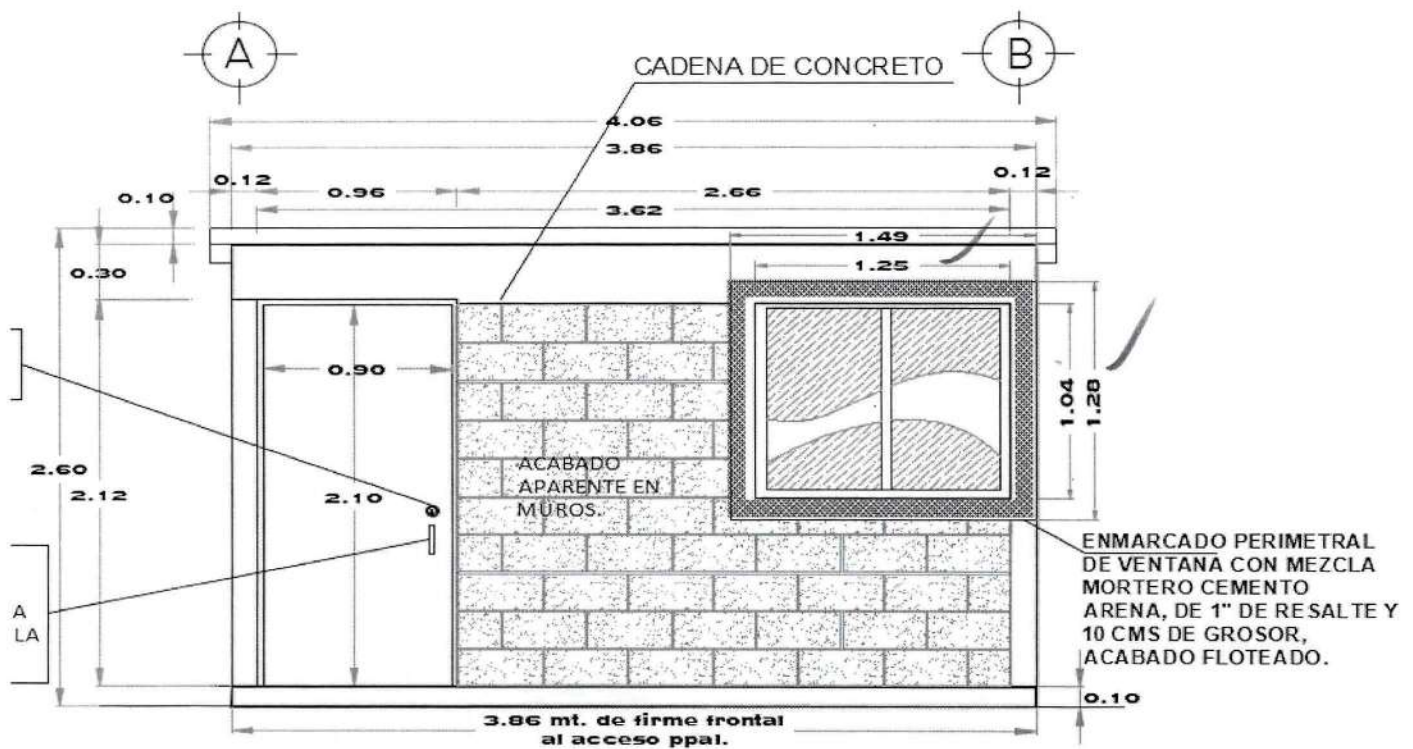

Paloma Alvarado
STHEPHANY PALOMA ALVARADO MACHADO
REPRESENTANTE LEGAL

Miguel Angel Cabanillas Reyes
ARQ. MIGUEL ANGEL CABANILLAS REYES
RESIDENTE DE OBRA



SECRETARÍA DE OBRAS
PÚBLICAS, URBANISMO Y
ECOLOGÍA
DIRECCIÓN DE
OBRAS PÚBLICAS



MUNICIPIO DE AHOME
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, URBANISMO Y ECOLOGIA
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS



CONTRATISTA: STEPHANY PALOMA ALVARADO MACHADO

NOMBRE DE LA OBRA :

(092AH25PR) CONSTRUCCIÓN DE 14 CUARTOS DORMITORIO (17.95 M2) EN DISTINTAS LOCALIDADES DE LA SINDICATURA CENTRAL. MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.

NUMERO DE CONTRATO :	FAISMUN-VIV-092PR-094PR-AH-2025
----------------------	---------------------------------

FECHA : 24 DE DICIEMBRE DEL 2025



ESTIMACION NO.: 1 (UNO)

9.06.1

RELLENO CON MATERIAL INERTE (BALASTRE CRIBADO) COMPACTADO AL 90 % PROCTOR, POR MEDIOS MECÁNICOS. EN CAPAS DE 15 CM. DE ESPESOR, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIAL Y HERRAMIENTA MENOR.

9.06.2

EXCAVACIÓN A MANO EN DENTELLÓN DE BANQUETA, EN MATERIAL TIPO "B" EN SECO,
INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.

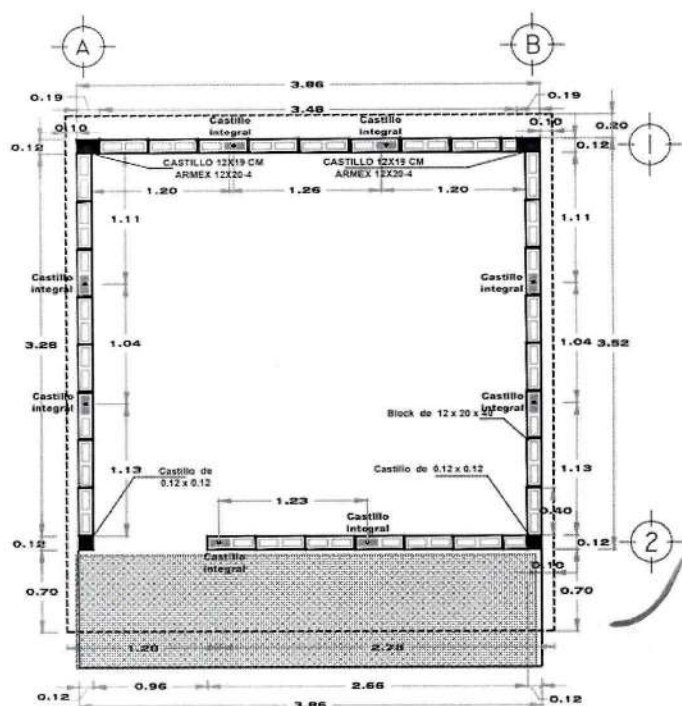

Paloma Alvarado
STHEPHANY PALOMA ALVARADO MACHADO
REPRESENTANTE LEGAL

ARQ. MIGUEL ANGEL CABANILLAS REYES
RESIDENTE DE OBRA





AYUNTAMIENTO
DE AHOME

MUNICIPIO DE AHOME
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, URBANISMO Y ECOLOGIA
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS




CROQUIS DE GENERADORES

CONTRATISTA:	STHEPHANY PALOMA ALVARADO MACHADO
NOMBRE DE LA OBRA :	(092AH25PR) CONSTRUCCIÓN DE 14 CUARTOS DORMITORIO (17.95 M2) EN DISTINTAS LOCALIDADES DE LA SINDICATURA CENTRAL, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.
NUMERO DE CONTRATO :	FAISMUN-VIV-092PR-094PR-AH-2025
FECHA :	24 DE DICIEMBRE DEL 2025
ESTIMACION NO. :	1 (UNO)


9.06.3

DENTELLÓN TIPO DE 0.20 X 0.15 CON ARMEX 15X20-4 F'C= 150 KG/CM2. INCLUYE: RECORTES, CIMBRA, COLADO DE CONCRETO, ACABADO CON VOLTEADOR, CURADO, DESCIMBRADO Y LIMPIEZA DE FORMAS.

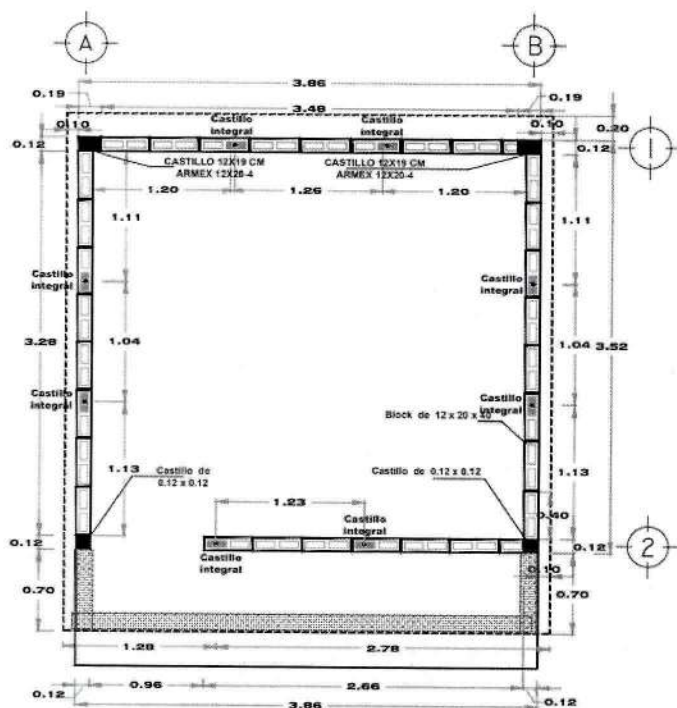

Paloma Alvarado
STHEPHANY PALOMA ALVARADO MACHADO
REPRESENTANTE LEGAL

Arq. Miguel Angel Cabanillas Reyes
ARQ. MIGUEL ANGEL CABANILLAS REYES
RESIDENTE DE OBRA



SECRETARIA DE OBRAS
PUBLICAS, URBANISMO Y
ECOLOGIA
DIRECCION DE
OBRAS PUBLICAS



AYUNTAMIENTO
DE AHOME

MUNICIPIO DE AHOME
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, URBANISMO Y ECOLOGIA
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS



CROQUIS DE GENERADORES

CONTRATISTA: STHEPHANY PALOMA ALVARADO MACHADO

NOMBRE DE LA OBRA :

(092AH25PR) CONSTRUCCIÓN DE 14 CUARTOS DORMITORIO (17.95 M2) EN DISTINTAS LOCALIDADES DE LA SINDICATURA CENTRAL, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA

NUMERO DE CONTRATO : FAISMUN-VIV-092PR-094PR-AH-2025

FECHA : 24 DE DICIEMBRE DEL 2025

ESTIMACION NO. :


1 (UNO)

9.06.4

BANQUETA DE CONCRETO DE 10 CM. DE ESPESOR, ARMADO CON MALLA ELECTROSOLDADA 6-6/10-10, CONCRETO F'c=150 KG/CM2 H.O., ACABADO ESCOBILLADO, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, CIMBRA, DESCIMBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.

9.06.5

CURADO PARA SUPERFICIE DE CONCRETO A BASE DE CURACRETO BLANCO, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, MANDO INTERMEDIO Y HERRAMIENTA MENOR, DESPERDICIOS.

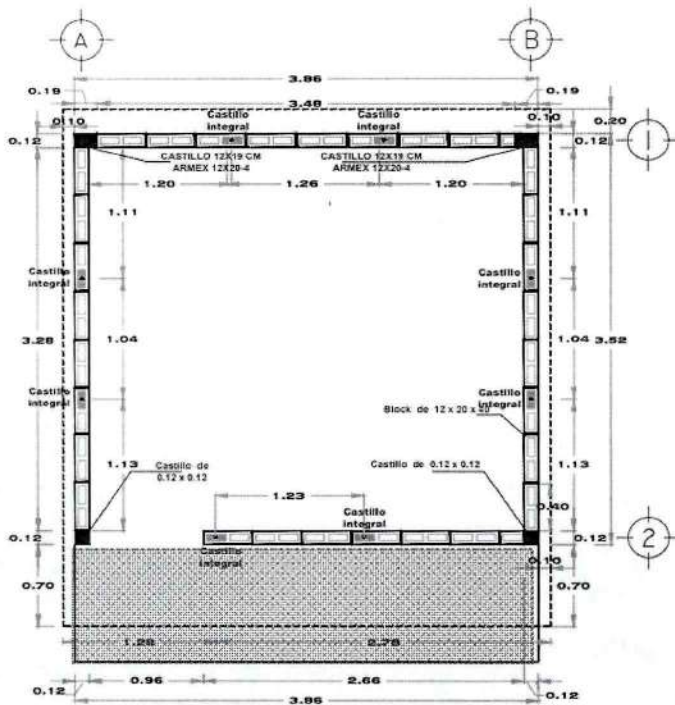

Paloma Alvarado
STHEPHANY PALOMA ALVARADO MACHADO
REPRESENTANTE LEGAL

Miguel Angel Cabanillas Reyes
ARQ. MIGUEL ANGEL CABANILLAS REYES
RESIDENTE DE OBRA



MUNICIPIO DE AHOME							FINIQUITO		
		SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, URBANISMO Y ECOLOGÍA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS					HOJA		1
							DE		5
OBRA: (092AH25PR) CONSTRUCCIÓN DE 14 CUARTOS DORMITORIO (17.95 M2) EN DISTINTAS LOCALIDADES DE LA SINDICATURA CENTRAL, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.		CONTRATO:		FAISMUN-VIV-092PR-094PR-AH-2025					
		CONTRATISTA:		STHEPHANY PALOMA ALVARADO MACHADO					
							FECHA:		24 DE DICIEMBRE DEL 2025
PERIODO DEL : 04 DE DICIEMBRE DEL 2025 AL 24 DE DICIEMBRE DEL 2025									
NO.	CONCEPTO	UNIDAD	SEGÚN PROYECTO	VOLUMENES EJECUTADOS			DIFERENCIA DE VOLUMEN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
				E1	0	TOTALES			
	VIVIENDA (CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS)								
1	TRABAJOS PRELIMINARES								
1.01	TRAZO Y NIVELACION MANUAL DEL AREA POR CONSTRUIR PARA ESTABLECER EJES, BANCOS DE NIVEL Y REFERENCIAS, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M2	244.30	244.30	0.00	244.30	0.00	\$8.44	\$0.00
1.02	SUMINISTRO DE MATERIAL INERTE (BALASTRE FINO GRADUADO) CALIDAD SUB-BASE PARA COLOCAR EN RELLENO BAJO PISOS. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M3	46.76	46.76	0.00	46.76	0.00	\$876.61	\$0.00
1.03	RELLENO COMPACTADO DE MATERIAL DE BANCO (BALASTRE FINO GRADUADO) POR MEDIOS MECANICOS PARA COLOCAR EN RELLENO BAJO PISOS Y BANQUETAS, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M3	46.76	46.76	0.00	46.76	0.00	\$237.03	\$0.00
1.04	EXCAVACION A MANO EN TRABES DE CIMENTACION, EN MATERIAL TIPO "B" EN SECO, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M3	2.38	2.38	0.00	2.38	0.00	\$387.23	\$0.00
SUBTOTAL DE TRABAJOS PRELIMINARES									\$0.00
2	CIMENTACION								
2.01	TRABE DE CIMENTACION DE 12CM. DE BASE, 20 CM. DE ALTURA CON 10 CM. DENTRO DE LOSA DE CIMENTACION, CONCRETO F'C= 200 KG/CM2 T.M.A. DE 38 MM. REFUERZO HORIZONTAL CON ARMEX 12X20-4 Y BASTONES EN L CON ACERO NO. 3 A CADA 40 CM. INCLUYE: CIMBRA, ARMADO, COLADO, MATERIALES NECESARIOS Y MANO DE OBRA.	ML	199.92	199.92	0.00	199.92	0.00	\$396.71	\$0.00
2.02	PISO DE CONCRETO CON F'C=200 KG/CM2 ARMADO CON MALLALACK 6/6-6/6 DE 10 CM DE ESPESOR ACABADO PULIDO, INCLUYE: COLOCACION DE SILLETAS SEGÚN NORMA Y ESPECIFICACION, MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M2	190.26	190.26	0.00	190.26	0.00	\$788.36	\$0.00
2.03	SUMINISTRO, HABILITADO Y COLOCACION DE VARILLA DE 3/8", F'Y=4200 KG/CM2, EN TRABES Y LOSAS, INCLUYE: HABILITADO, ARMADO, GANCHOS, TRASLAPES, DESPERDICIOS, COLOCACION, Y MANO DE OBRA.	TON	0.112	0.112	0.00	0.112	0.00	\$46,317.73	\$0.00
2.04	ANCLAJE DE CASTILLOS (C-1) DE 12X12 CM. A UNA PROFUNDIDAD DE 20 CM, REFORZADO CON ARMEX 12X12-4, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	PZA	28.00	28.00	0.00	28.00	0.00	\$145.88	\$0.00
2.05	ANCLAJE DE CASTILLOS (C-2) DE 12X19 CM. A UNA PROFUNDIDAD DE 20 CM, REFORZADO CON ARMEX 12X20-4, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	PZA	28.00	28.00	0.00	28.00	0.00	\$145.88	\$0.00
2.06	ANCLAJE DE CASTILLOS INTEGRAL (CI) A UNA PROFUNDIDAD DE 20 CM. CON UNA VARILLA DE 3/8".	PZA	112.00	112.00	0.00	112.00	0.00	\$97.20	\$0.00

CONFORME


STHEPHANY PALOMA ALVARADO MACHADO
CONTRATISTA


REVISOR
ARQ. MIGUEL ANGEL CABANILLAS REYES
RESIDENTE DE OBRA

SECRETARIA DE OBRAS
PÚBLICAS, URBANISMO Y
ECOLOGÍA
DIRECCIÓN DE
OBRAS PÚBLICAS


ANTONIO
ARQ. JESUS ERNESTO TANIA CASTRO
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

MUNICIPIO DE AHOME							FINIQUITO		
<div><div><div></div><div>AYUNTAMIENTO DE AHOME</div></div><div>SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, URBANISMO Y ECOLOGÍA</div><div>DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS</div></div> <div><div></div><div>La Casa de Todos</div></div>							HOJA	2	
							DE	5	
OBRA:	(092AH25PR) CONSTRUCCIÓN DE 14 CUARTOS DORMITORIO (17.95 M2) EN DISTINTAS LOCALIDADES DE LA SINDICATURA CENTRAL, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.						CONTRATO:	FAISMUN-VIV-092PR-094PR-AH-2025	
							CONTRATISTA:	STHEPHANY PALOMA ALVARADO MACHADO	
							FECHA:	24 DE DICIEMBRE DEL 2025	
PERIODO DEL : 04 DE DICIEMBRE DEL 2025				AL		24 DE DICIEMBRE DEL 2025			
NO.	CONCEPTO	UNIDAD	SEGÚN PROYECTO	VOLUMENES EJECUTADOS			DIFERENCIA DE VOLUMEN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
				E1	0	TOTALES			
2.07	CURADO PARA SUPERFICIE DE CONCRETO A BASE DE CURACRETO BLANCO, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, MANDO INTERMEDIO Y HERRAMIENTA MENOR, DESPERDICIOS.	M2	190.26	190.26	0.00	190.26	0.00	\$38.52	\$0.00
SUBTOTAL DE CIMENTACION									\$0.00
3	ESTRUCTURA								
3.01	MURO DE BLOCK DE 12X20X40 CM. ACABADO APARENTE A DOS CARAS, ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA PROPORCION 1:4, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA	M2	351.12	351.12	0.00	351.12	0.00	\$715.63	\$0.00
3.02	CASTILLO (C-1) DE 12X12 CM. DE SECCION DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2 REDORZADO CON ACERO ARMEX 12X12-4, INCLUYE: CIMBRA Y ACABADO APARENTE CON TUINO DE 1", ARMADO, COLADO, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	ML	59.36	59.36	0.00	59.36	0.00	\$486.64	\$0.00
3.03	CASTILLO (C-2) DE 12X19 CM. DE SECCION DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2 REDORZADO CON ACERO ARMEX 12X20-4, INCLUYE: CIMBRA Y ACABADO APARENTE CON TUINO DE 1", ARMADO, COLADO, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	ML	58.80	58.80	0.00	58.80	0.00	\$575.16	\$0.00
3.04	CASTILLO INTEGRAL (CI) EN BLOCK HUECO DE 12X20X40 CMS. ARMADO CON 1 (UNA) VARILLA DE 3/8" DE DIAMETRO, CONCRETO F'C= 150KG/CM2 INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	ML	235.20	235.20	0.00	235.20	0.00	\$229.48	\$0.00
3.05	DALA DE CERRAMIENTO DE 12X20 HASTA 12 X 30 CM. PROMEDIO, ACABADO APARENTE ARMADO CON ARMEX 12X12-4 Y 12X20-4 (SEGÚN PLANO DE PROYECTO), CONCRETO F'C= 200KG/CM2, INCLUYE: CIMBRA Y ACABADO APARENTE CON TUINO DE 1", DESCIMBRA, VIBRADO, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTAS.	ML	199.92	199.92	0.00	199.92	0.00	\$814.03	\$0.00
3.06	CADENA DE BLOCK "U" DE 12X20X40 CM REFORZADA CON UNA VARILLA DE 3/8, ACABADO APARENTE ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA PROPORCION 1:4, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA	ML	20.02	20.02	0.00	20.02	0.00	\$351.62	\$0.00
SUBTOTAL DE ESTRUCTURA									\$0.00
4	LOSAS								
4.01	LOSA DE CONCRETO DE 10 CM. DE ESPESOR, INCLUYE: CIMBRA ACABADO APARENTE CON CIMBRAPLAY DE PINO DE 16 MM, REFORZADA CON VARILLA #3 Y MALLA ELECTRO SOLDADA 6X6-6-6, COLOCACION DE SILLETAS SEGÚN NORMA Y ESPECIFICAION, CONCRETO F'C=200 KG/CM2 FABRICADO CON REVOLVEDORA Y ACABADO PLANEADO, PARA RECIBIR IMPERMEABILIZANTE, DESCIMBRA, DETALLADO FINO PARTE POSTERIOR CON MORTERO, TUINO DE 1" PARA GOTERO, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA	M2	251.30	251.30	0.00	251.30	0.00	\$2,191.72	\$0.00

CONFORME

Paloma Alvarado

STHEPHANY PALOMA ALVARADO MACHADO
CONTRATISTA

REVISAR

[Firma]

ARG. MIGUEL ANGEL CABANILLAS REYES
RESIDENTE DE OBRA

DIRECCIÓN DE
OBRAS PÚBLICAS

AUTORIZAR

[Firma]

ARG. JESUS ERNESTO TAPIA CASTRO
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

<div> AYUNTAMIENTO DE AHOMÉ</div> <div>SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, URBANISMO Y ECOLOGÍA</div> <div>DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS</div>							<div> Ahome La Casa de Todos</div>		FINIQUITO	
							HOJA	3		
							DE	5		
OBRA:	(092AH25PR) CONSTRUCCIÓN DE 14 CUARTOS DORMITORIO (17.95 M2) EN DISTINTAS LOCALIDADES DE LA SINDICATURA CENTRAL, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.						CONTRATO:	FAISMUN-VIV-092PR-094PR-AH-2025		
							CONTRATISTA:	STHEPHANY PALOMA ALVARADO MACHADO		
							FECHA:	24 DE DICIEMBRE DEL 2025		
PERIODO DEL : 04 DE DICIEMBRE DEL 2025 AL 24 DE DICIEMBRE DEL 2025										
NO.	CONCEPTO	UNIDAD	SEGÚN PROYECTO	VOLUMENES EJECUTADOS			DIFERENCIA DE VOLUMEN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	
				E1	0	TOTALES				
4.02	CURADO PARA SUPERFICIE DE CONCRETO A BASE DE CURACRETO BLANCO, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, MANDO INTERMEDIO Y HERRAMIENTA MENOR, DESPERDICIOS.	M2	251.30	251.30	0.00	251.30	0.00	\$38.52	\$0.00	
SUBTOTAL DE LOSAS									\$0.00	
5	INSTALACIÓN ELÉCTRICA									
5.01	INSTALACIÓN ELÉCTRICA A BASE DE TUBO POLIDUCTO NARANJA DE 1/2", CAJAS DE REGISTRO DE LAMINA GALVANIZADA, ROSETAS DE PORCELANA DE 3" Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS MARCA MODUS Ó SIMILAR EN CALIDAD, INCLUYE: PRUEBA DEL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LA INSTALACIÓN, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, SEGÚN PLANO DE PROYECTO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	LOTE	14.00	14.00	0.00	14.00	0.00	\$2,716.76	\$0.00	
SUBTOTAL DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA									\$0.00	
6	CANCELERIA									
6.01	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE VENTANA DE ALUMINIO NATURAL LÍNEA 1 1/2", DE 1.25X1.04 M., FORMADA DE UN FIJO Y UN CORREDIZO, INCLUYE: MOSQUITERO, CRISTAL CLARO DE 3 MM., MATERIALES DE FIJACIÓN, SELLADOR, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	14.00	14.00	0.00	14.00	0.00	\$2,498.81	\$0.00	
SUBTOTAL DE CANCELERIA									\$0.00	
7	HERRERIA									
7.01	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PROTECCIÓN PARA VENTANA DE 1.25 X 1.04 MTS. FABRICADA CON MARCO DE SOLERA DE 1 1/2" x 1/8" Y REDONDO DE 1/2", PINTADO CON PRIMARIO ANTICORROSIVO Y TERMINADO CON ESMALTE COLOR BLANCO, INCLUYE: MATERIAL Y MANO DE OBRA NECESARIO, PARA SU FABRICACIÓN Y COLOCACIÓN Y HERRAMIENTA MENOR, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	14.00	14.00	0.00	14.00	0.00	\$2,713.16	\$0.00	
7.02	SUMINISTRO, FABRICACIÓN Y COLOCACIÓN DE MARCO EMPOTRADO 5 CM. EN LOSA DE CIMENTACIÓN, DE 97 CM. DE ANCHO X 217 CM. DE ALTURA, CON PERFIL TUBULAR No. 129 CAL. 20, PINTADO CON PRIMARIO ANTICORROSIVO Y TERMINADO CON ESMALTE COLOR BLANCO, INCLUYE: RESANE EN PISO PULIDO CON MORTERO CEMENTO ARENA 1:3, BISAGRAS LATONADAS DE 3" (3 PZAS) SOLDADAS A PERFIL, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	14.00	14.00	0.00	14.00	0.00	\$1,973.92	\$0.00	
SUBTOTAL DE HERRERIA									\$0.00	

CONFORME

STHEPHANY PALOMA ALVARADO MACHADO
CONTRATISTA

REVISÓ

ARQ. MIGUEL ANGEL CABANILLAS REYES
RESIDENTE DE OBRA

AUTORIZÓ

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, URBANISMO Y ECOLOGÍA
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
JESUS ERNESTO TARIA CASTRO
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

<div><div><div><div><div></div><div>AYUNTAMIENTO DE AHOMÉ</div></div><div>SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, URBANISMO Y ECOLOGÍA</div><div>DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS</div></div><div><div><div><div><div></div><div>La Casa de Todos</div></div></div></div></div></div></div>			FINIQUITO						
			HOJA		4				
			DE		5				
OBRA: (092AH25PR) CONSTRUCCIÓN DE 14 CUARTOS DORMITORIO (17.95 M2) EN DISTINTAS LOCALIDADES DE LA SINDICATURA CENTRAL, MUNICIPIO DE AHOMÉ, SINALOA.			CONTRATO:		FAISMUN-VIV-092PR-094PR-AH-2025				
			CONTRATISTA:		STHEPHANY PALOMA ALVARADO MACHADO				
			FECHA:		24 DE DICIEMBRE DEL 2025				
PERIODO DEL : 04 DE DICIEMBRE DEL 2025			AL		24 DE DICIEMBRE DEL 2025				
NO.	CONCEPTO	UNIDAD	SEGÚN PROYECTO	VOLUMENES EJECUTADOS			DIFERENCIA DE VOLUMEN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
				E1	0	TOTALES			
8	CARPINTERIA								
8.01	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PUERTA MULTYPANEL LISA DE 0.90 X 2.10 M. DE ALTURA, INCLUYE: PHILLIPS POMO GAMMA BAÑO ACERO INOXIDABLE O SIMILAR, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	14.00	14.00	0.00	14.00	0.00	\$3,605.02	\$0.00
SUBTOTAL DE CARPINTERIA									\$0.00
9	VARIOS								
9.01	IMPERMEABILIZANTE EN LOSA DE AZOTEA A BASE DE IMPERMEABILIZANTE AFIBRATADO, INCLUYE: LIMPIEZA DE SUPERFICIE, SELLADO DE GRIETAS CON CEMENTO PLASTICO ACRILICO, APLICACIÓN DE UNA CAPA DE SELLADOR ACRILICO DILUIDO CON AGUA EN PROPORCIÓN 1:3 CON CEPILLO DE IXTLE, UNA CAPA DE THERMOTEK RESIDENCIAL 5 AÑOS O SIMILAR, UNA VEZ SECA LA PRIMERA CAPA SE APLICA UNA SEGUNDA CAPA DE THERMOTEK RESIDENCIAL 5 AÑOS O SIMILAR	M2	251.30	251.30	0.00	251.30	0.00	\$168.87	\$0.00
9.02	SUMINISTRO É INSTALACIÓN DE PLACA EN MURO AL FRENTE EN UN LUGAR VISIBLE, A BASE DE ACRÍLICO DE 15X30 CM. CON CALCOMANÍA EN VINIL Y LEYENDA SEGÚN PROGRAMA, FIJADA CON PIJAS Y TAQUETES DE PLÁSTICO, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA NECESARIAS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	14.00	14.00	0.00	14.00	0.00	\$164.41	\$0.00
9.03	PINTURA VINÍLICA EN MUROS INTERIORES Y PLAFONES A DOS MANOS, CON BROCHA Y/O RODILLO, MARCA BERELINTE DE BEREL O CALIDAD SIMILAR, INCLUYE: PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE PROTEGIENDO PISOS, HERRERÍA Y CANCELERÍA, APLICACIÓN DE SELLADOR, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y ANDAMIOS, COLORES INDICADOS POR OBRAS PÚBLICAS.	M2	573.58	573.58	0.00	573.58	0.00	\$111.09	\$0.00
9.04	PINTURA VINÍLICA EN MUROS EN EXTERIORES, BOQUILLAS EN PUERTAS Y VENTANAS Y CORTELOSA, VOLADOS, CON BROCHA Y/O RODILLO, A DOS MANOS, MARCA BERELINTE DE BEREL Ó CALIDAD SIMILAR, INCLUYE: PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE PROTEGIENDO PISOS, HERRERÍA Y CANCELERÍA, APLICACIÓN DE SELLADOR, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, COLORES INDICADOS POR OBRAS PÚBLICAS.	M2	560.42	559.58	0.00	559.58	0.84	\$111.09	\$93.28

CONFORME

Paloma Alvarado

STHEPHANY PALOMA ALVARADO MACHADO

CONTRATISTA

REVISAR

[Firma]

ARQ. MIGUEL ANGEL CABANILLAS REYES

RESIDENTE DE OBRA

AUTORIZAR

[Firma]

ARO. JESUS ERNESTO TAPIA CASTRO

DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, URBANISMO Y ECOLOGÍA

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

 AYUNTAMIENTO DE AHOME		MUNICIPIO DE AHOME SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, URBANISMO Y ECOLOGÍA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS				 Ahome La Casa de Todos		FINIQUITO	
								HOJA	5
								DE	5
OBRA:	(092AH25PR) CONSTRUCCIÓN DE 14 CUARTOS DORMITORIO (17.95 M2) EN DISTINTAS LOCALIDADES DE LA SINDICATURA CENTRAL, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.					CONTRATO:	FAISMUN-VIV-092PR-094PR-AH-2025		
						CONTRATISTA:	STHEPHANY PALOMA ALVARADO MACHADO		
						FECHA:	24 DE DICIEMBRE DEL 2025		
PERIODO DEL :		04 DE DICIEMBRE DEL 2025		AL		24 DE DICIEMBRE DEL 2025			
NO.	CONCEPTO	UNIDAD	SEGÚN PROYECTO	VOLUMENES EJECUTADOS			DIFERENCIA DE VOLUMEN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
				E1	0	TOTALES			
9.05	MOLDURA DE APLANADO RESALTADO DE 10 CM. DE ANCHO Y 2.00 CM DE ESPESOR, ACABADO FLOTEADO DE MEZCLA EN PERIMETRO DE VENTANA, CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	ML	69.72	69.72	0.00	69.72	0.00	\$297.06	\$0.00
SUBTOTAL DE VARIOS								\$93.28	
9.06	BANQUETA DE ACCESO								
9.06.1	RELLENO CON MATERIAL INERTE (BALASTRE CRIBADO) COMPACTADO AL 90 % PROCTOR, POR MEDIOS MECÁNICOS, EN CAPAS DE 15 CM. DE ESPESOR, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIAL Y HERRAMIENTA MENOR.	M3	10.78	10.78	0.00	10.78	0.00	\$1,070.00	\$0.00
9.06.2	EXCAVACIÓN A MANO EN DENTELLÓN DE BANQUETA, EN MATERIAL TIPO "B" EN SECO, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M3	2.52	2.38	0.00	2.38	0.14	\$387.23	\$54.14
9.06.3	DENTELLÓN TIPO DE 0.20 X 0.15 CON ARMEX 15X20-4 F'C= 150 KG/CM2. INCLUYE: RECORTES, CIMBRA, COLADO DE CONCRETO, ACABADO CON VOLTEADOR, CURADO, DESCIMBRADO Y LIMPIEZA DE FORMAS.	ML	77.84	77.84	0.00	77.84	0.00	\$506.51	\$0.00
9.06.4	BANQUETA DE CONCRETO DE 10 CM. DE ESPESOR, ARMADO CON MALLA ELECTROSOLDADA 6-6/10-10, CONCRETO F'c=150 KG/CM2 H.O., ACABADO ESCOBILLADO, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, CIMBRA, DESCIMBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M2	54.04	54.04	0.00	54.04	0.00	\$805.23	\$0.00
9.06.5	CURADO PARA SUPERFICIE DE CONCRETO A BASE DE CURACRETO BLANCO, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, MANDO INTERMEDIO Y HERRAMIENTA MENOR, DESPERDICIOS.	M2	54.04	54.04	0.00	54.04	0.00	\$38.55	\$0.00
9.06.6	MANIOBRA Y MOVIMIENTO DE MATERIALES PARA CONSTRUCCIÓN EN SITIO, ACARREO EN CARRETILLA, CON PERSONAL Y EQUIPO, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	LOTE	14.00	14.00	0.00	14.00	0.00	\$885.08	\$0.00
SUBTOTAL DE BANQUETA DE ACCESO								\$54.14	
SUBTOTAL								\$147.42	
IV.A. 16%								\$0.00	
TOTAL:								\$147.42	
INVERSIÓN CONTRATADA DE LA OBRA:								\$1,904,584.08	
INVERSIÓN EJERCIDA DE LA OBRA:								\$1,904,436.66	
SALDO NO EJERCIDO DE LA OBRA:								\$147.42	


CONFORME

Paloma Alvarado

STHEPHANY PALOMA ALVARADO MACHADO
CONTRATISTA

REVISAR

ARQ. MIGUEL ANGEL CABANILLAS REYES
RESIDENTE DE OBRA



SECRETARIA DE OBRAS
PÚBLICAS, URBANISMO Y
ECOLOGÍA

DIRECCIÓN DE
OBRAS PÚBLICAS

AUTORIZAR

ARQ. JESUS ERNESTO TAPIA CASTRO
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS



AYUNTAMIENTO
DE AHOME

MUNICIPIO DE AHOME
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS,
URBANISMO Y ECOLOGÍA
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS



REPORTE FOTOGRÁFICO

CONTRATISTA:	STHEPHANY PALOMA ALVARADO MACHADO		
NOMBRE DE LA OBRA	(092AH25PR) CONSTRUCCIÓN DE 14 CUARTOS DORMITORIO (17.95 M2) EN DISTINTAS LOCALIDADES DE LA SINDICATURA CENTRAL, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.		
NUMERO DE CONTRATO	FAISMUN-VIV-092PR-094PR-AH-2025		
FECHA	24 DE DICIEMBRE DEL 2025	ESTIMACIÓN NO.	1 (UNO)



01

ZAMBRANO VALENZUELA ROSARIO

Paloma Alvarado

STHEPHANY PALOMA ALVARADO MACHADO
CONTRATISTA

Miguel Angel Cabanillas Reyes

ARQ. MIGUEL ANGEL CABANILLAS REYES
RESIDENTE DE OBRA



SECRETARÍA DE OBRAS
PÚBLICAS, URBANISMO Y
ECOLOGÍA

DIRECCIÓN DE
OBRAS PÚBLICAS



AYUNTAMIENTO
DE AHOME

MUNICIPIO DE AHOME
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS,
URBANISMO Y ECOLOGÍA
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS



REPORTE FOTOGRÁFICO

CONTRATISTA:	STHEPHANY PALOMA ALVARADO MACHADO		
NOMBRE DE LA OBRA	(092AH25PR) CONSTRUCCIÓN DE 14 CUARTOS DORMITORIO (17.95 M2) EN DISTINTAS LOCALIDADES DE LA SINDICATURA CENTRAL, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.		
NUMERO DE CONTRATO	FAISMUN-VIV-092PR-094PR-AH-2025		
FECHA	24 DE DICIEMBRE DEL 2025	ESTIMACIÓN NO.	1 (UNO)



02

ARMENTA VALENZUELA RAMONA

Paloma Alvarado

STHEPHANY PALOMA ALVARADO MACHADO
CONTRATISTA

ARQ. MIGUEL ANGEL CABANILLAS REYES
RESIDENTE DE OBRA

SECRETARIA DE OBRAS
PÚBLICAS, URBANISMO Y
ECOLOGÍA
DIRECCIÓN DE
OBRAS PÚBLICAS



AYUNTAMIENTO
DE AHOME

MUNICIPIO DE AHOME
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS,
URBANISMO Y ECOLOGÍA
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS



REPORTE FOTOGRÁFICO

CONTRATISTA:	STHEPHANY PALOMA ALVARADO MACHADO		
NOMBRE DE LA OBRA	(092AH25PR) CONSTRUCCIÓN DE 14 CUARTOS DORMITORIO (17.95 M2) EN DISTINTAS LOCALIDADES DE LA SINDICATURA CENTRAL, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.		
NUMERO DE CONTRATO	FAISMUN-VIV-092PR-094PR-AH-2025		
FECHA	24 DE DICIEMBRE DEL 2025	ESTIMACIÓN NO.	1 (UNO)



03

CRUZ PACHECO EDUARDO ALBERTO

Paloma Alvarado
STHEPHANY PALOMA ALVARADO MACHADO
CONTRATISTA
CONTRATISTA

Miguel Angel Cabanillas Reyes
ARQ. MIGUEL ANGEL CABANILLAS REYES
RESIDENTE DE OBRA





AYUNTAMIENTO
DE AHOME

MUNICIPIO DE AHOME
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS,
URBANISMO Y ECOLOGÍA
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS



REPORTE FOTOGRÁFICO

CONTRATISTA:	STHEPHANY PALOMA ALVARADO MACHADO		
NOMBRE DE LA OBRA	(092AH25PR) CONSTRUCCIÓN DE 14 CUARTOS DORMITORIO (17.95 M2) EN DISTINTAS LOCALIDADES DE LA SINDICATURA CENTRAL, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.		
NUMERO DE CONTRATO	FAISMUN-VIV-092PR-094PR-AH-2025		
FECHA	24 DE DICIEMBRE DEL 2025	ESTIMACIÓN NO.	1 (UNO)



04

TORRES FLORES SELENE

Paloma Alvarado
STHEPHANY PALOMA ALVARADO MACHADO
CONTRATISTA

Miguel Ángel Cabanillas Reyes
ARQ. MIGUEL ÁNGEL CABANILLAS REYES
RESIDENTE DE OBRA





AYUNTAMIENTO
DE AHOMÉ

MUNICIPIO DE AHOMÉ
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS,
URBANISMO Y ECOLOGÍA
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS



REPORTE FOTOGRÁFICO

CONTRATISTA:	STHEPHANY PALOMA ALVARADO MACHADO		
NOMBRE DE LA OBRA	(092AH25PR) CONSTRUCCIÓN DE 14 CUARTOS DORMITORIO (17.95 M2) EN DISTINTAS LOCALIDADES DE LA SINDICATURA CENTRAL, MUNICIPIO DE AHOMÉ, SINALOA.		
NUMERO DE CONTRATO	FAISMUN-VIV-092PR-094PR-AH-2025		
FECHA	24 DE DICIEMBRE DEL 2025	ESTIMACIÓN NO.	1 (UNO)



05

MARISCAL ZUÑIGA MANUELA ARACELY

Paloma Alvarado
STHEPHANY PALOMA ALVARADO MACHADO
CONTRATISTA

Miguel Angel Cabanillas Reyes
ARQ. MIGUEL ANGEL CABANILLAS REYES
RESIDENTE DE OBRA





AYUNTAMIENTO
DE AHOME

MUNICIPIO DE AHOME
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS,
URBANISMO Y ECOLOGÍA
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS



REPORTE FOTOGRÁFICO

CONTRATISTA:	STHEPHANY PALOMA ALVARADO MACHADO		
NOMBRE DE LA OBRA	(092AH25PR) CONSTRUCCIÓN DE 14 CUARTOS DORMITORIO (17.95 M2) EN DISTINTAS LOCALIDADES DE LA SINDICATURA CENTRAL, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA:		
NUMERO DE CONTRATO	FAISMUN-VIV-092PR-094PR-AH-2025		
FECHA	24 DE DICIEMBRE DEL 2025	ESTIMACIÓN NO.	1 (UNO)



06

VARGAS QUINTANA DIANA KARELY

Paloma Alvarado
STHEPHANY PALOMA ALVARADO MACHADO
CONTRATISTA

Miguel Angel Cabanillas Reyes
ARQ. MIGUEL ANGEL CABANILLAS REYES
RESIDENTE DE OBRA





AYUNTAMIENTO
DE AHOMÉ

MUNICIPIO DE AHOME
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS,
URBANISMO Y ECOLOGÍA
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS



REPORTE FOTOGRÁFICO

CONTRATISTA:	STHEPHANY PALOMA ALVARADO MACHADO		
NOMBRE DE LA OBRA	(092AH25PR) CONSTRUCCIÓN DE 14 CUARTOS DORMITORIO (17.95 M2) EN DISTINTAS LOCALIDADES DE LA SINDICATURA CENTRAL, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.		
NUMERO DE CONTRATO	FAISMUN-VIV-092PR-094PR-AH-2025		
FECHA	24 DE DICIEMBRE DEL 2025	ESTIMACIÓN NO.	1 (UNO)



07

BERRELLEZA TORRES JOSE EDUARDO

Paloma Alvarado
STHEPHANY PALOMA ALVARADO MACHADO
CONTRATISTA

Miguel Angel Cabanillas Reyes
ARQ. MIGUEL ANGEL CABANILLAS REYES
RESIDENTE DE OBRA





AYUNTAMIENTO
DE AHOME

MUNICIPIO DE AHOME
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS,
URBANISMO Y ECOLOGÍA
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS



REPORTE FOTOGRÁFICO

CONTRATISTA:	STHEPHANY PALOMA ALVARADO MACHADO		
NOMBRE DE LA OBRA	(092AH25PR) CONSTRUCCIÓN DE 14 CUARTOS DORMITORIO (17.95 M2) EN DISTINTAS LOCALIDADES DE LA SINDICATURA CENTRAL, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.		
NUMERO DE CONTRATO	FAISMUN-VIV-092PR-094PR-AH-2025		
FECHA	24 DE DICIEMBRE DEL 2025	ESTIMACIÓN NO.	1 (UNO)



08

SANCHEZ ANTONIO ABISAIL

Paloma Alvarado
STHEPHANY PALOMA ALVARADO MACHADO
CONTRATISTA

Miguel Angel Cabanillas Reyes
ARQ. MIGUEL ANGEL CABANILLAS REYES
RESIDENTE DE OBRA





AYUNTAMIENTO
DE AHOME

MUNICIPIO DE AHOME
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS,
URBANISMO Y ECOLOGÍA
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS



REPORTE FOTOGRÁFICO

CONTRATISTA:	STHEPHANY PALOMA ALVARADO MACHADO		
NOMBRE DE LA OBRA	(092AH25PR) CONSTRUCCIÓN DE 14 CUARTOS DORMITORIO (17.95 M2) EN DISTINTAS LOCALIDADES DE LA SINDICATURA CENTRAL, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.		
NUMERO DE CONTRATO	FAISMUN-VIV-092PR-094PR-AH-2025		
FECHA	24 DE DICIEMBRE DEL 2025	ESTIMACIÓN NO.	1 (UNO)



09

CASTAÑEDA JOCOBI MARISOL

Paloma Alvarado
STHEPHANY PALOMA ALVARADO MACHADO
CONTRATISTA

Miguel Angel Cabanillas Reyes
ARQ. MIGUEL ANGEL CABANILLAS REYES
RESIDENTE DE OBRA






AYUNTAMIENTO
DE AHOME

MUNICIPIO DE AHOME
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS,
URBANISMO Y ECOLOGÍA
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS



REPORTE FOTOGRÁFICO

CONTRATISTA:	STHEPHANY PALOMA ALVARADO MACHADO		
NOMBRE DE LA OBRA	(092AH25PR) CONSTRUCCIÓN DE 14 CUARTOS DORMITORIO (17.95/M2) EN DISTINTAS LOCALIDADES DE LA SINDICATURA CENTRAL, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.		
NUMERO DE CONTRATO	FAISMUN-VIV-092PR-094PR-AH-2025		
FECHA	24 DE DICIEMBRE DEL 2025	ESTIMACIÓN NO.	1 (UNO)

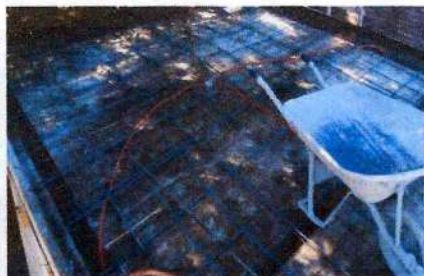

10

MOROYOQUI COTA KAREN LIZBETH

Paloma Alvarado
STHEPHANY PALOMA ALVARADO MACHADO
CONTRATISTA

Miguel Angel Cabanillas Reyes
ARQ. MIGUEL ANGEL CABANILLAS REYES
RESIDENTE DE OBRA





AYUNTAMIENTO
DE AHOMÉ

MUNICIPIO DE AHOMÉ
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS,
URBANISMO Y ECOLOGÍA
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS



REPORTE FOTOGRÁFICO

CONTRATISTA:	STHEPHANY PALOMA ALVARADO MACHADO		
NOMBRE DE LA OBRA	(092AH25PR) CONSTRUCCIÓN DE 14 CUARTOS DORMITORIO (17.95 M2) EN DISTINTAS LOCALIDADES DE LA SINDICATURA CENTRAL, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.		
NUMERO DE CONTRATO	FAISMUN-VIV-092PR-094PR-AH-2025		
FECHA	24 DE DICIEMBRE DEL 2025	ESTIMACIÓN NO.	1 (UNO)



11

REYES CRUZ CLAUDIA PATRICA

Paloma Alvarado
STHEPHANY PALOMA ALVARADO MACHADO
CONTRATISTA

Miguel Angel Cabanillas Reyes
ARQ. MIGUEL ANGEL CABANILLAS REYES
RESIDENTE DE OBRA





AYUNTAMIENTO
DE AHOME

MUNICIPIO DE AHOME
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS,
URBANISMO Y ECOLOGÍA
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS



REPORTE FOTOGRÁFICO

CONTRATISTA:	STHEPHANY PALOMA ALVARADO MACHADO		
NOMBRE DE LA OBRA	(092AH25PR) CONSTRUCCIÓN DE 14 CUARTOS DORMITORIO (17.95 M2) EN DISTINTAS LOCALIDADES DE LA SINDICATURA CENTRAL, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.		
NUMERO DE CONTRATO	FAISMUN-VIV-092PR-094PR-AH-2025		
FECHA	24 DE DICIEMBRE DEL 2025	ESTIMACIÓN NO.	1 (UNO)



12

VALDEZ SOTO MARIA

Paloma Alvarado
STHEPHANY PALOMA ALVARADO MACHADO
CONTRATISTA

Miguel Angel Cabanillas Reyes
ARQ. MIGUEL ANGEL CABANILLAS REYES
RESIDENTE DE OBRA

SECRETARÍA DE OBRAS
PÚBLICAS, URBANISMO Y
ECOLOGÍA
DIRECCIÓN DE
OBRAS PÚBLICAS



AYUNTAMIENTO
DE AHOMÉ

MUNICIPIO DE AHOME
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS,
URBANISMO Y ECOLOGÍA
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS



REPORTE FOTOGRÁFICO

CONTRATISTA:	STHEPHANY PALOMA ALVARADO MACHADO		
NOMBRE DE LA OBRA	(092AH25PR) CONSTRUCCIÓN DE 14 CUARTOS DORMITORIO (17.95 M2) EN DISTINTAS LOCALIDADES DE LA SINDICATURA CENTRAL, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.		
NUMERO DE CONTRATO	FAISMUN-VIV-092PR-094PR-AH-2025		
FECHA	24 DE DICIEMBRE DEL 2025	ESTIMACIÓN NO.	1 (UNO)



13

ZAMBRANO ROCHA JESSICA JAZMIN

Paloma Alvarado
STHEPHANY PALOMA ALVARADO MACHADO
CONTRATISTA

Miguel Angel Cabanillas Reyes
ARQ. MIGUEL ANGEL CABANILLAS REYES
RESIDENTE DE OBRA





AYUNTAMIENTO
DE AHOME

MUNICIPIO DE AHOME
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS,
URBANISMO Y ECOLOGÍA
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS



REPORTE FOTOGRÁFICO

CONTRATISTA:	STHEPHANY PALOMA ALVARADO MACHADO		
NOMBRE DE LA OBRA	(092AH25PR) CONSTRUCCIÓN DE 14 CUARTOS DORMITORIO (17.95 M2) EN DISTINTAS LOCALIDADES DE LA SINDICATURA CENTRAL, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.		
NUMERO DE CONTRATO	FAISMUN-VIV-092PR-094PR-AH-2025		
FECHA	24 DE DICIEMBRE DEL 2025	ESTIMACIÓN NO.	1 (UNO)



14

OLIVO BACA GLORIA RUFINA

Paloma Alvarado
STHEPHANY PALOMA ALVARADO MACHADO
CONTRATISTA

Miguel Angel Cabanillas Reyes
ARQ. MIGUEL ANGEL CABANILLAS REYES
RESIDENTE DE OBRA

SECRETARIA DE OBRAS
PÚBLICAS, URBANISMO Y
ECOLOGÍA
DIRECCIÓN DE
OBRAS PÚBLICAS



AYUNTAMIENTO
DE AHOMÉ

MUNICIPIO DE AHOME
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS,
URBANISMO Y ECOLOGÍA
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS



DATOS DE LA OBRA			HOJA PORTADA	
NOMBRE:	(092AH25PR) CONSTRUCCIÓN DE 14 CUARTOS DORMITORIO (17.95 M2) EN DISTINTAS LOCALIDADES DE LA SINDICATURA CENTRAL, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.			
UBICACIÓN:	SINDICATURA CENTRAL			
No. CONTRATO:	FAISMUN-VIV-092PR-094PR-AH-2025		PROGRAMA	
MONTO DEL CONTRATO:	\$ 2,992,917.84	IMPORTE TOTAL	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FAISMUN EJERCICIO 2025), autorizado por Tesorería Municipal, mediante oficios con número FAISMUN-092/2025 y FAISMUN-094/2025 de fecha 12 de septiembre de 2025. Obras que fueron autorizadas por el Subcomité de Desarrollo Social del Municipio de Ahome, incluidas en el Programa Anual de Inversión en Obra Pública (POA) 2025 con números O-218 y O-220. Y aprobadas para su ejecución mediante oficios con número AHO/PRES/484/2025 y AHO/PRES/486/2025 de fecha 12 de septiembre de 2025.	
MONTO DE LA OBRA:	\$ 1,904,584.08		SUBPROGRAMA	
FECHA DE INICIO:	5 DE NOVIEMBRE DEL 2025	REAL:	04 DE DICIEMBRE DEL 2025	
FECHA DE TERMINO:	24 DE DICIEMBRE DEL 2025	REAL:	24 DE DICIEMBRE DEL 2025	
DATOS DEL CONTRATISTA:				
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL:		STHEPHANY PALOMA ALVARADO MACHADO		
DOMICILIO:	calle Ernestina Zazueta, número exterior: 1612, Fraccionamiento Tepeca, entre calle Circunvalación y Boulevard Río de las Cañas, código postal 81229, de la ciudad de Los Mochis, Ahome, Sinaloa.			
TELÉFONOS:	(668) 130 73 85			
REPRESENTANTE:	STEPHANY PALOMA ALVARADO MACHADO			
TÉCNICOS RESPONSABLES EN OBRA:				
DEL CONTRATISTA		DEL MUNICIPIO DE AHOME		
1.- <u>Paloma Alvarado</u> STHEPHANY PALOMA ALVARADO MACHADO STHEPHANY PALOMA ALVARADO MACHADO CONTRATISTA		<u>ARQ. MIGUEL ANGEL CABANILLAS REYES</u> RESIDENTE DE OBRA		
NOMBRE, CARGO Y FIRMA:				



AYUNTAMIENTO
DE AHOME

MUNICIPIO DE AHOME
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS,
URBANISMO Y ECOLOGÍA
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS



(092AH25PR) CONSTRUCCIÓN DE 14 CUARTOS DORMITORIO (17.95 M2) EN DISTINTAS LOCALIDADES DE LA SINDICATURA CENTRAL, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.		HOJA DE BITACORA No. 01	
		UBICACIÓN:	SINDICATURA CENTRAL
CONTRATISTA:	STHEPHANY PALOMA ALVARADO MACHADO	CONTRATO:	FAISMUN-VIV-092PR-094PR-AH-2025
No. DE NOTA	FECHA TIPO DE NOTA	NOTAS Y CROQUIS	
	04/12/2025		
01	Apertura bitacora	Se abre la presente bitacora correspondiente a la obra 092AH25PR construcción de 14 cuartos Dormitorios (17.95m2) en distintas localidades de la sindicatura central, municipio de Ahome Sinaloa.	
02	Visita de obra.	<p>Se realiza recorrido de obra para verificación de beneficiarios y ubicaciones de las diferentes localidades con personal de bienestar, contratista y obras públicas.</p> <p>De acuerdo a la visita en cada ubicación para la construcción de los cuartos dormitorios se solicita al contratista no modificar la ubicación de dicho cuarto una vez definido con el beneficiario para poder ejecutar la obra conforme a proyecto.</p> <p>Las localidades asignadas y visitadas son Bachamobampo 2, compuestas, la Arroyera (Elano), la amocera chura, y primero de Mayo.</p> <p>Asi mismo comenta el contratista se inicia el mismo día el suministro de material agregado para el inicio del relleno para cimentación.</p> <p>Blanca Alvarado</p>	



DIRECCIÓN DE
OBRAS PÚBLICAS



AYUNTAMIENTO
DE AHOME

MUNICIPIO DE AHOME
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS,
URBANISMO Y ECOLOGÍA
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS



(092AH25PR) CONSTRUCCIÓN DE 14 CUARTOS DORMITORIO (17.95 M2) EN DISTINTAS LOCALIDADES DE LA SINDICATURA CENTRAL, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.		HOJA DE BITACORA No. 02	
UBICACIÓN:		SINDICATURA CENTRAL	
CONTRATISTA:	STHEPHANY PALOMA ALVARADO MACHADO	CONTRATO:	FAISMUN-VIV-092PR-094PR-AH-2025
No. DE NOTA	FECHA TIPO DE NOTA	NOTAS Y CROQUIS	
	05/12/2025		
01	Suministro	Se continua los trabajos de suministro de material para relleno balastre fino granulada así como grava cuerna y acero beneficiados 2, 3, 7, 8 y 9.	
02	Trabajos	Se inician trabajos de relleno de material balastre fino cubado compactado por medios mecánicos a beneficiados 2, 3, 7, 8 y 9.	
03	laboratorio	Se realiza prueba de compactación de relleno a beneficiados 2 y 3 dando positivo para continuar con los trabajos de relleno.	
04	trabajos	Se realiza el colado de ferra de concreto $f'c=200\text{kg/cm}^2$ de 10cm de espesor armado con malbatack 6-6 6x6 y acero 3/8 de refuerzo y banquetas de 10cm de espesor con malla y armex perimetral para dentellon de 15x20 vibrado y curado acabado esmerillado fino a beneficiados 2 y 3.	
05	laboratorio	Se realiza muestra de concreto para prueba de resistencia a la compresion de los 7, 8 y 9 a beneficiados 2 y 3 se anexa reporte.	

Paloma Alvarado



DIRECCIÓN DE
OBRAS PÚBLICAS



AYUNTAMIENTO
DE AHOME

MUNICIPIO DE AHOME
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS,
URBANISMO Y ECOLOGÍA
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS



(092AH25PR) CONSTRUCCIÓN DE 14 CUARTOS DORMITORIO (17.95 M2) EN DISTINTAS LOCALIDADES DE LA SINDICATURA CENTRAL, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.		HOJA DE BITACORA No. 03	
CONTRATISTA: STHEPHANY PALOMA ALVARADO MACHADO		UBICACIÓN:	SINDICATURA CENTRAL
CONTRATO: FAISMUN-VIV-092PR-094PR-AH-2025			
No. DE NOTA	FECHA TIPO DE NOTA	NOTAS Y CROQUIS	
	07/12/2025		
01	Trabajos	Se continúan los trabajos de relleno de material balastro fino cribado compactado por medios mecánicos con placa compactadora a beneficiarios 12, 13 y 14. Así mismo se suministra material de acero y agregado para proceder con el proceso de colado.	
02	laboratorio	Se realizó prueba de compactación de relleno de material a beneficiarios 7, 8 y 9. dando positivo para continuar con los trabajos de colado.	
03	trabajos	Se continúan los trabajos de colado de firme con concreto f/c=280kg/cm ² de 10cm de espesor armado con malla de 6/6 y acero 3/8 de refuerzo. Bustones y armex perimetral para dentellón, anclaje de castillos con armex. Monolíticamente se realiza el colado de banquetas de 10cm de espesor con malla y armex perimetral de 15x20 para dentellón vibrado y curado alacido eschillado fino a beneficiarios 7, 8 y 9.	
04	laboratorio	Se realiza muestra de concreto de cimentación para prueba de resistencia a la compresión de 7, 14 y 28 días a beneficiarios 7, 8 y 9.	
05	trabajos	Se inician los trabajos de pegado de muro de block picado de 12x20x40 acabado a dos caras asentado con mortero cemento arena a beneficiarios 2 y 3.	

Paloma Alvarado



SECRETARÍA DE OBRAS
PÚBLICAS, URBANISMO Y
ECOLOGÍA
DIRECCIÓN DE
OBRAS PÚBLICAS

[Signature]



AYUNTAMIENTO
DE AHOME


MUNICIPIO DE AHOME
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS,
URBANISMO Y ECOLOGÍA
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS



(092AH25PR) CONSTRUCCIÓN DE 14 CUARTOS DORMITORIO (17.95 M2) EN DISTINTAS LOCALIDADES DE LA SINDICATURA CENTRAL, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.		HOJA DE BITACORA No. 04	
UBICACIÓN:		SINDICATURA CENTRAL	
CONTRATISTA:	STHEPHANY PALOMA ALVARADO MACHADO	CONTRATO:	FAISMUN-VIV-092PR-094PR-AH-2025

No. DE NOTA	FECHA TIPO DE NOTA	NOTAS Y CROQUIS
	09/12/2025	
01	trabajos	Se continúan los trabajos de relleno de material balante fino gradado compactado por medios mecánicos a beneficiarios 4, 5, 6, 10 y 11
02	trabajos	Colado de firme para cimentación con concreto f'c=200 kg/cm ² de 10cm de espesor armado con mallablock 6x6 6/6 y acero 3/8 de refuerzo bustones y armex perimetral para dentellón, anclaje de castillos con armex, mandolita. Estando se realiza el colado de banquetas de 10cm de espesor armada con malla y armex perimetral de 15x26 para dentellón vibrado y acabado acabado eschillado fino a beneficiarios 12, 13 y 14
03	trabajos	Se continúan los trabajos de pegado de muro de bloques pesados de 12x20x40 armado a guisa de los cerros asentado con mortero cemento arena a beneficiarios 7, 8 y 9
04	trabajos	Se inician los trabajos de cimbrado y colado de losa de azotea armada con acero de refuerzo de 3/8, malla electrosoldada 6x6 6/6 de 10cm de espesor con concreto f'c=200 kg/cm ² a beneficiarios 2 y 3
05	laboratorio	Se realiza muestra de concreto en losa de azotea para prueba de resistencia a la compresión de los 7, 14 y 28 días a beneficiarios 2 y 3

Paloma Alvarado



SECRETARÍA DE OBRAS
PÚBLICAS, URBANISMO Y
ECOLOGÍA
DIRECCIÓN DE
OBRAS PÚBLICAS

[Handwritten signature]



AYUNTAMIENTO
DE AHOME

MUNICIPIO DE AHOME
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS,
URBANISMO Y ECOLOGÍA
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS



(092AH25PR) CONSTRUCCIÓN DE 14 CUARTOS DORMITORIO (17.95 M2) EN DISTINTAS LOCALIDADES DE LA SINDICATURA CENTRAL, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.		HOJA DE BITACORA No. 05	
UBICACIÓN:		SINDICATURA CENTRAL	
CONTRATISTA:	STHEPHANY PALOMA ALVARADO MACHADO	CONTRATO:	FAISMUN-VIV-092PR-094PR-AH-2025
No. DE NOTA	FECHA TIPO DE NOTA	NOTAS Y CROQUIS	
	11/12/2025		
01	Trabajos	Se continúan los trabajos de pegado de muro de block pesados de 12x20x40 acabado aparente a dos caras asentado con mortero, cemento arena a beneficiarios 12, 13 y 14.	
02	trabajos	Colado de firme para cimentación con concreto f'c=200 kg/cm ² de 10cm de espesor armado con malla black 6x6 6/6 y acero 3/8 de refuerzo bastones y armaz. perimetral Colado de banquetas monolíticamente de 10cm de espesor armado con malla, armaz. perimetral de 15x20 para dentellón vibrado y curado acabado escabillado a beneficiarios 10 y 11	
03	trabajos	Se continúan los trabajos de armado y colado de losa de azotea con acero de refuerzo de 3/8 malla electrosoldada 6x6 6/6 de 10cm de espesor con concreto f'c=200kg/cm ² a beneficiarios 7, 8 y 9.	
04	laboratorio.	Se realiza muestra de concreto en losa de azotea para prueba de resistencia a la compresión de los 7, 14 y 28 días a beneficiarios 7, 8 y 9.	
05	Trabajos	Se inician los trabajos de instalación de marco metálico para puerta con perfil tubular N. 129 pintado y buxigas latencidas de 3" así como protección con marco de sbo y redondo de 1/2 para ventana a beneficiarios 2 y 3.	

Paloma Alvarado

SECRETARÍA DE OBRAS
PÚBLICAS, URBANISMO Y
ECOLOGÍA
DIRECCIÓN DE
OBRAS PÚBLICAS

MUNICIPIO DE AHOME

AYUNTAMIENTO
DE AHOMESECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS,
URBANISMO Y ECOLOGÍA

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

(092AH25PR) CONSTRUCCIÓN DE 14 CUARTOS
DORMITORIO (17.95 M2) EN DISTINTAS LOCALIDADES DE LA
SINDICATURA CENTRAL, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.

HOJA DE BITACORA No.

06

UBICACIÓN:

SINDICATURA CENTRAL

CONTRATISTA:

STEPHANY PALOMA ALVARADO
MACHADO

CONTRATO:

FAISMUN-VIV-092PR-094PR-AH-2025

No. DE
NOTAFECHA
TIPO DE NOTA

NOTAS Y CROQUIS

13/12/2025

01

Trabajos

Se continúan los trabajos de colado de firme para cimentación en concreto f/c=200 kg/cm² de 10cm de espesor vibrado y curado acabado pulido, armado con malla brick 6x6 6/6 y acero de refuerzo de 3/8 y bastones, anclaje perimetral. Colado de banquetas monolíticamente de 10cm de espesor dentellón perimetral de 15x20 y malla de refuerzo acabado brochado a beneficiarios 4, 5 y 6.

02

Trabajos

Pegado de muro de block aparente a dos caras asentado con cemento, mortero arena de 12x20x40 a beneficiarios 10 y 11.

03

Trabajos


Se continúan los trabajos de cimbrado, armado y colado de losa de concreto, con acero de refuerzo de 3/8 malla cuadrada 6x6 6/6 de 10cm de espesor con concreto f/c=200 kg/cm² a beneficiarios 12, 13 y 14.

04

Trabajos

Se inician los trabajos de aplicación de impermeabilizante afibrado, sellado de grietas con cemento plástico a dos manos, así como aplicación de pintura a dos manos en muros interiores y exteriores, plataba, corte de losa a beneficiarios 2 y 3.

Paloma Alvarado

DIRECCIÓN DE
OBRAS PÚBLICAS



AYUNTAMIENTO
DE AHOME

MUNICIPIO DE AHOME
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS,
URBANISMO Y ECOLOGÍA
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS



(092AH25PR) CONSTRUCCIÓN DE 14 CUARTOS DORMITORIO (17.95 M2) EN DISTINTAS LOCALIDADES DE LA SINDICATURA CENTRAL, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.		HOJA DE BITACORA No. 07	
CONTRATISTA: STHEPHANY PALOMA ALVARADO MACHADO		UBICACIÓN:	SINDICATURA CENTRAL
CONTRATO:		FAISMUN-VIV-092PR-094PR-AH-2025	
No. DE NOTA	FECHA TIPO DE NOTA	NOTAS Y CROQUIS	
	14/12/2025		
01	trabajos	Trabajos de relleno compactado con material inerte (balasto fino cribado) excavación, habilitado y colocación de acero de refuerzo para losa de cimentación, Colado de firme de concreto $f'c=200 \text{ Kg/cm}^2$ curado con mallabida $6 \times 6/6$ de 10cm de espesor acabado pulido vibrado y curado en superficie a beneficiarios 1.	
02	trabajos	Se continúan los trabajos de proyecto de muro de block pesado de $12 \times 20 \times 40$ acabado exponiendo a dos caras a beneficiarios 4, 5 y 6.	
03	trabajos	Se continúa también los trabajos de cimbrado, habilitado y colocación de acero de refuerzo de $3/8$, malla electrosoldada para el colado de losa de azotea con concreto $f'c=200 \text{ Kg/cm}^2$ acabado planeado para recibir impermeabilizante a beneficiarios 10 y 11.	
04	trabajos	Trabajos de instalación de marco metálico para puerta con perfil tubular No 129 pintado y bisagras latencidas de $3/4$ así como protección con marco de solera y rodete de $1/2$ para ventana a beneficiarios 7, 8 y 9.	
05	trabajos	Aplicación de impermeabilizante acrílico, sellado de grietas con cemento plástico a dos manos a beneficiarios 12, 13 y 14.	
06	trabajos	Se inicia la instalación de puerta metálica No 15a de 0.90×2.10 y chapa Pom Gamma No 15a de ventana de aluminio natural Inca de 1.15×1.04 firmada con un fijo y encomendado con maderas a beneficiarios 2 y 3.	

Peloma Alvarado





AYUNTAMIENTO
DE AHOME

MUNICIPIO DE AHOME
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS,
URBANISMO Y ECOLOGÍA
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS



(092AH25PR) CONSTRUCCIÓN DE 14 CUARTOS DORMITORIO (17.95 M2) EN DISTINTAS LOCALIDADES DE LA SINDICATURA CENTRAL, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.		HOJA DE BITACORA No. 08	
CONTRATISTA: STEPHANY PALOMA ALVARADO MACHADO		UBICACIÓN:	SINDICATURA CENTRAL
CONTRATO:		FAISMUN-VIV-092PR-094PR-AH-2025	
No. DE NOTA	FECHA TIPO DE NOTA	NOTAS Y CROQUIS	
	16/12/2025		
01	trabajos	Se continúan con los trabajos de pegado de muro de block pesado de 12x20x40 acabado exterior a los canchales escurrido con mortero, cemento arena a beneficio 1 y 7.	
02	trabajos	Continuación de trabajos de cimentado, molienda y colocación de acero de refuerzo de 3/8, malla electrosoldada para el colado de los cu de azotea, en concreto f'c=200 kg/cm2 acabado plumbado para recibir impermeabilizante a beneficiarios 4, 5 y 6.	
03	trabajos	Instalación de marco metálico para puerta con perfil tubular No 129 pintado y bisagras tornillos de 3" así como protección con marco de solera y redondo de 1/2 para ventana a beneficiarios 12, 13 y 14.	
04	trabajos	Instalación de puerta multipanel lisa de 690x2.0 y chapa pino gamma bajo y ventana de aluminio natural línea de 1 1/2 de L25x1.04 forrada con en fijo y un corredizo con mosquetero a beneficiarios 7, 8 y 9.	
05	trabajos	Se inician los trabajos de cableado e instalación de accesorios eléctricos (apagador, contacto, roseta y tapa ciega a beneficiarios 2 y 3.	

Paloma Alvarado



SECRETARÍA DE OBRAS
PÚBLICAS, URBANISMO Y
ECOLOGÍA
DIRECCIÓN DE
OBRAS PÚBLICAS

MUNICIPIO DE AHOME

AYUNTAMIENTO
DE AHOMESECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS,
URBANISMO Y ECOLOGÍA

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

(092AH25PR) CONSTRUCCIÓN DE 14 CUARTOS
DORMITORIO (17.95 M2) EN DISTINTAS LOCALIDADES DE LA
SINDICATURA CENTRAL, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.

HOJA DE BITACORA No.

09

UBICACIÓN:

SINDICATURA CENTRAL

CONTRATISTA:

STHEPHANY PALOMA ALVARADO
MACHADO

CONTRATO:

FAISMUN-VIV-092PR-094PR-AH-2025

No. DE
NOTAFECHA
TIPO DE NOTA

NOTAS Y CROQUIS

18/12/2024

01

trabajos

con esta fecha se concluyen los trabajos de cableado, nivelado y colocación de acero de refuerzo $\frac{3}{8}$ mallado electrosoldado para el colado de losa preparada con cemento f/c-200 kg/cm² acabado planchado para recibir impermeabilizante a beneficiarios 7

02

trabajos

Aplicación de pintura vinílica en muros interiores y exteriores a los muros, corte de losa, volado, platon así como la aplicación de impermeabilizante finchado a los muros sellado de grietas con cemento plástico en superficie a beneficiarios 7, 8 y 9

03

trabajos

instalación de puerta multipanel lisa de 0.90 x 2.10 y chapa pombo Gamma 1500, ventana de aluminio natural lisa 1 1/2 de 1.25 x 1.04 forrada con un filo y un carenado con mosquitera a beneficiarios 12, 13 y 14

04

trabajos

Se continúa la instalación de marco metálico para puerta con perfil tubular N. 129 pintado y bisagras laterales de 3" así como protección por marco de silica y redonda de 1/2 para ventana a beneficiarios 10 y 11

Paloma Alvarado

SECRETARÍA DE OBRAS
PÚBLICAS, URBANISMO Y
ECOLOGÍADIRECCIÓN DE
OBRAS PÚBLICAS



AYUNTAMIENTO
DE AHOME

MUNICIPIO DE AHOME
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS,
URBANISMO Y ECOLOGÍA
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS



(092AH25PR) CONSTRUCCIÓN DE 14 CUARTOS DORMITORIO (17.95 M2) EN DISTINTAS LOCALIDADES DE LA SINDICATURA CENTRAL, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.		HOJA DE BITACORA No. 10	
CONTRATISTA: STHEPHANY PALOMA ALVARADO MACHADO		UBICACIÓN:	SINDICATURA CENTRAL
CONTRATO:		FAISMUN-VIV-092PR-094PR-AH-2025	
No. DE NOTA	FECHA TIPO DE NOTA	NOTAS Y CROQUIS	
	20/12/2025		
01	trabajos	Se continua la instalacion de puerta multipanel lisa de 0.90x2.10 y chapa como Gamma bruno, ventana de aluminio natural de 1 1/2 de 1.25x1.04 firmada con un fijo y un cerrillo con mosquetero a beneficiarios 10 y 11	
02	trabajos	Aplicacion de pintura unifica en muros interiores y exteriores, moldura de ventana corte de losa, plafon y volado a dos manos a beneficiarios 12, 13 y 14	
	21/12/2025		
01	trabajos	Instalacion de puerta multipanel lisa de 0.90 x 2.10 con chapa, y ventana de aluminio natural de 1 1/2 con un fijo y cerrillo con mosquetero a beneficiarios 4, 5 y 6.	
02	trabajos	Se continua este dia con la aplicacion de pintura unifica en muros interiores y exteriores a dos manos, asi como la aplicacion de impermeabilizante fibrado a dos manos y sellado de grietas con cemento plastico a beneficiarios 10 y 11	
03	trabajos	Cableado e instalacion de accesorios electricos (apagador, contactos, voltajes y tapa agua a beneficiarios 12, 13 y 14)	

Paloma Alvarado



AYUNTAMIENTO
DE AHOME

MUNICIPIO DE AHOME
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS,
URBANISMO Y ECOLOGÍA
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS



(092AH25PR) CONSTRUCCIÓN DE 14 CUARTOS
DORMITORIO (17.95 M2) EN DISTINTAS LOCALIDADES DE LA
SINDICATURA CENTRAL, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.

HOJA DE BITACORA No.

11

UBICACIÓN:

SINDICATURA CENTRAL

CONTRATISTA:

STHEPHANY PALOMA ALVARADO
MACHADO

CONTRATO:

FAISMUN-VIV-092PR-094PR-AH-2025

No. DE NOTA	FECHA TIPO DE NOTA	NOTAS Y CROQUIS
	22/12/2025	
01	trabajos	Aplicacion de pintura unifica en muros interiores y exteriores a dos manos, así como la aplicacion de impermeabilizante finitizado a dos manos, sellado de grietas con cemento plastico a beneficiarios 4, 5 y 6.
02	trabajos	Cableado e instalacion de accesorios electricos (apagador contactos, rosetas y tapa carga a beneficiarios 7, 8 y 9.
03	trabajos.	Instalacion de marco metalico para puerta con perfil tubular N. 129 pintado y bisagras laterales de 3" así como protección con marco de solera y redondo de 1/2 para ventana al beneficiario 7.

Paloma Alvarado



SECRETARÍA DE OBRAS
PÚBLICAS, URBANISMO Y
ECOLOGÍA
DIRECCIÓN DE
OBRAS PÚBLICAS




AYUNTAMIENTO
DE AHOME

MUNICIPIO DE AHOME
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS,
URBANISMO Y ECOLOGÍA
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS



(092AH25PR) CONSTRUCCIÓN DE 14 CUARTOS DORMITORIO (17.95 M2) EN DISTINTAS LOCALIDADES DE LA SINDICATURA CENTRAL, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA		HOJA DE BITACORA No. 12	
		UBICACIÓN:	SINDICATURA CENTRAL
CONTRATISTA:	STHEPHANY PALOMA ALVARADO MACHADO		CONTRATO: FAISMUN-VIV-092PR-094PR-AH-2025
No. DE NOTA	FECHA TIPO DE NOTA	NOTAS Y CROQUIS	
	23/12/2025		
01	trabajos	Se continua con la instalacion de cableado electrico y la instalacion de accesorios electricos, apagador, contactos, rosetas y tapa carga a beneficiarios 4, 5, 6, 10 y 11	
02	trabajos	Instalacion de porta multipanel lisa de 0.90 x 2.10 y chapa pemo hama., ventana de aluminio natural de 1 1/2 de 1.25 x 1.04 formada con en fijo y corredizo con mosquetero a beneficiario 7	
03	trabajos	Aplicacion de pintura vinilica en muros interiores y exteriores a desmognos y la aplicacion de impermeabilizante fibrefuado a des mognos, sellado de grietas con cemento plastico a beneficiario 7.	
		Paloma Alvarado	



SECRETARIA DE OBRAS
PÚBLICAS, URBANISMO Y
ECOLOGIA
DIRECCIÓN DE
OBRAS PÚBLICAS



AYUNTAMIENTO
DE AHOME

MUNICIPIO DE AHOME
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS,
URBANISMO Y ECOLOGÍA
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS



(092AH25PR) CONSTRUCCIÓN DE 14 CUARTOS DORMITORIO (17.95 M2) EN DISTINTAS LOCALIDADES DE LA SINDICATURA CENTRAL, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA		HOJA DE BITACORA No. 13	
CONTRATISTA: STHEPHANY PALOMA ALVARADO MACHADO		UBICACIÓN:	SINDICATURA CENTRAL
CONTRATO:		FAISMUN-VIV-092PR-094PR-AH-2025	
No. DE NOTA	FECHA TIPO DE NOTA	NOTAS Y CROQUIS	
	24/12/2025		
01	trabajos	con esta fecha se concluyen los trabajos de instalación de cableado y accesorios eléctricos, aperturas, contactos, resacas y tapa carga a beneficiarios 1.	
02	trabajos	Se realiza la instalación de placa de 15x30 con banda según programa a todos los beneficiarios.	
03	Estimación.	Se presenta estimación 1 (uno) correspondiente a la obra 092AH25PR con un monto de 1,904,436.66 para su revisión y autorización de pago.	
04	Cierre de bitacora	Se cierra la presente bitacora de la obra 092AH25PR construcción de 14 cuartos dormitorios en distintas localidades de la sindicatura central, municipio de Ahome, Sinaloa.	

Paloma Alvarado




SECRETARÍA DE OBRAS
PÚBLICAS, URBANISMO Y
ECOLOGÍA
DIRECCIÓN DE
OBRAS PÚBLICAS

CROQUIS DE UBICACIÓN

CONTRATISTA:	STHEPHANY PALOMA ALVARADO MACHADO		
NOMBRE DE LA OBRA :	(092AH25PR) CONSTRUCCIÓN DE 14 CUARTOS DORMITORIO (17.95 M2) EN DISTINTAS LOCALIDADES DE LA SINDICATURA CENTRAL, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA		
NUMERO DE CONTRATO :	FAISMUN-VIV-092PR-094PR-AH-2025		
FECHA :	24 DE DICIEMBRE DEL 2025	ESTIMACION NO. :	1 (UNO)

No.	Localidad	Nombre	Dirección
01	BACHOMOBAMPO DOS	ZAMBRANO VALENZUELA ROSARIO	C. 20 DE NOVIEMBRE POSTE 6

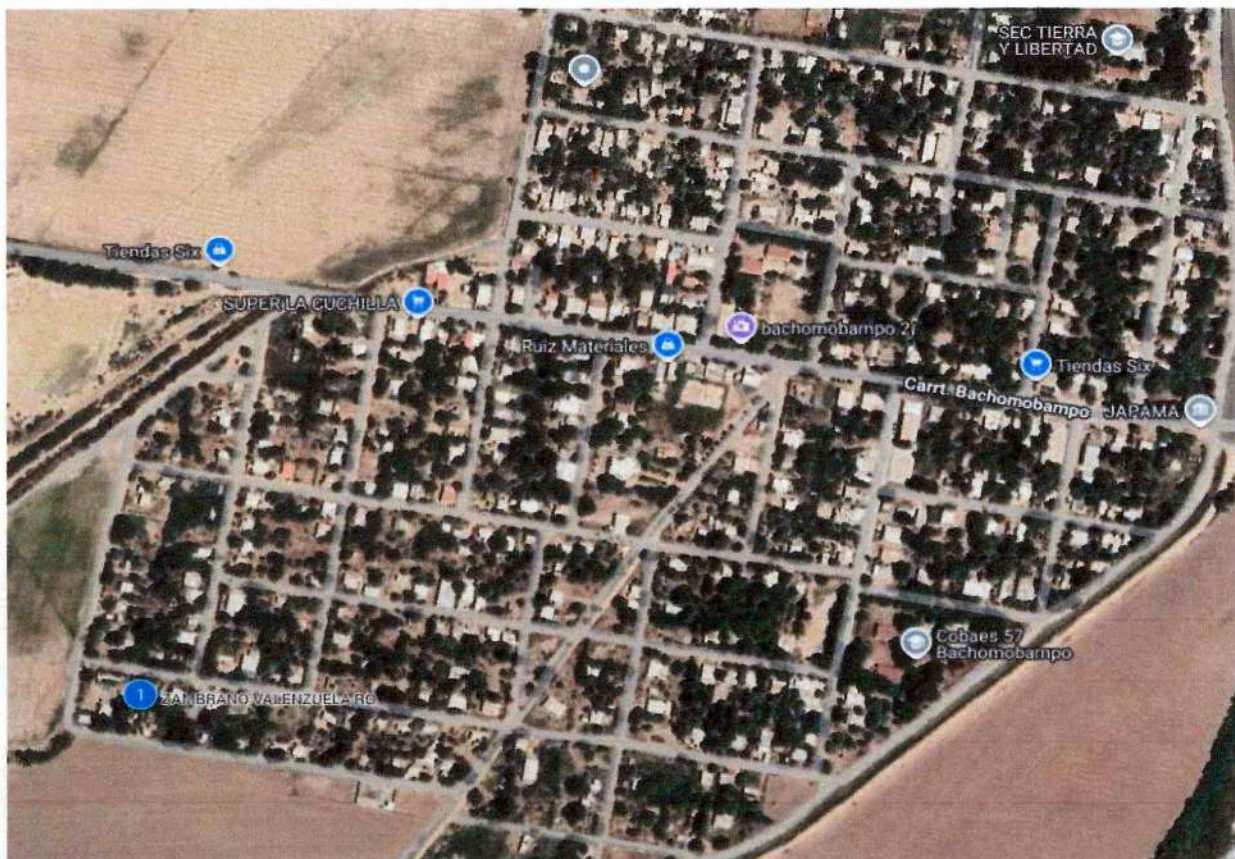

Paloma Alvarado
STHEPHANY PALOMA ALVARADO MACHADO
CONTRATISTA

Arq. Miguel Angel Cabanillas Reyes
ARQ. MIGUEL ANGEL CABANILLAS REYES
RESIDENTE DE OBRA

CROQUIS DE UBICACIÓN

CONTRATISTA:	STHEPHANY PALOMA ALVARADO MACHADO
NOMBRE DE LA OBRA:	(092AH25PR) CONSTRUCCIÓN DE 14 CUARTOS DORMITORIO (17.95 M2) EN DISTINTAS LOCALIDADES DE LA SINDICATURA CENTRAL, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.
NUMERO DE CONTRATO:	FAISMUN-VIV-092PR-094PR-AH-2025
FECHA:	24 DE DICIEMBRE DEL 2025
ESTIMACION NO.:	1 (UNO)

No.	Localidad	Nombre	Dirección
02	COMPUERTAS	ARMENTA VALENZUELA RAMONA	C.ANTONIO ROSALES POSTE 55
03	COMPUERTAS	CRUZ PACHECO EDUARDO ALBERTO	C. ALVARO OBREGON #192 FRENTE AL ESTADIO



Paloma Alvarado
STHEPHANY PALOMA ALVARADO MACHADO
CONTRATISTA

Miguel Angel Cabanillas Reyes
ARQ. MIGUEL ANGEL CABANILLAS REYES
RESIDENTE DE OBRA



SECRETARIA DE OBRAS
PUBLICAS, URBANISMO Y
ECOLOGIA
DIRECCIÓN DE
OBRAS PÚBLICAS

CROQUIS DE UBICACIÓN

CONTRATISTA:	STHEPHANY PALOMA ALVARADO MACHADO		
NOMBRE DE LA OBRA :	(092AH25PR) CONSTRUCCIÓN DE 14 CUARTOS DORMITORIO (17.95 M2) EN DISTINTAS LOCALIDADES DE LA SINDICATURA CENTRAL, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.		
NUMERO DE CONTRATO :	FAISMUN-VIV-092PR-094PR-AH-2025		
FECHA :	24 DE DICIEMBRE DEL 2025	ESTIMACION NO. :	1 (UNO)

No.	Localidad	Nombre	Dirección
04	EL UNO (LA ARROCERA)	TORRES FLORES SELENE	ENFRENTÉ DE LA BODEGA INDAMEX POR ENFRENTÉ DE LAS VIAS
05	EL UNO (LA ARROCERA)	MARISCAL ZUÑIGA MANUELA ARACELY	CALLE UNICA POSTE 24
06	LA ARROCERA	VARGAS QUINTANA DIANA KARELY	POSTE 9 POR LA CALLE PRINCIPAL CERCA DE LOS EXPENDIOS



Paloma Alvarado
STHEPHANY PALOMA ALVARADO MACHADO
CONTRATISTA

Miguel Angel Cabanillas Reyes
ARQ. MIGUEL ANGEL CABANILLAS REYES
RESIDENTE DE OBRA



AYUNTAMIENTO
DE AHOME

MUNICIPIO DE AHOME
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, URBANISMO Y ECOLOGIA
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS



CROQUIS DE UBICACIÓN

CONTRATISTA:	STHEPHANY PALOMA ALVARADO MACHADO		
NOMBRE DE LA OBRA :	(092AH25PR) CONSTRUCCIÓN DE 14 CUARTOS DORMITORIO (17.95 M2) EN DISTINTAS LOCALIDADES DE LA SINDICATURA CENTRAL, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.		
NUMERO DE CONTRATO :	FAISMUN-VIV-092PR-094PR-AH-2025		
FECHA :	24 DE DICIEMBRE DEL 2025	ESTIMACION NO. :	1 (UNO)

No.	Localidad	Nombre	Dirección
07	OHUIRA	BERRELLEZA TORRES JOSE EDUARDO	C. MIGUEL HIDALGO POSTE 9
08	OHUIRA	SANCHEZ ANTONIO ABISAIL	A UN COSTADO DE IGLESIA INDIGENA
09	OHUIRA	CASTAÑEDA JOCOBI MARISOL	C. HILARIO VICAM POSTE 18



Paloma Alvarado

STHEPHANY PALOMA ALVARADO MACHADO
CONTRATISTA

Miguel Ángel Cabanillas Reyes

ARQ. MIGUEL ÁNGEL CABANILLAS REYES
RESIDENTE DE OBRA



CROQUIS DE UBICACIÓN

CONTRATISTA:	STHEPHANY PALOMA ALVARADO MACHADO		
NOMBRE DE LA OBRA :	(092AH25PR) CONSTRUCCIÓN DE 14 CUARTOS DORMITORIO (17.95 M2) EN DISTINTAS LOCALIDADES DE LA SINDICATURA CENTRAL, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.		
NUMERO DE CONTRATO :	FAISMUN-VIV-092PR-094PR-AH-2025		
FECHA :	24 DE DICIEMBRE DEL 2025	ESTIMACION NO. :	1 (UNO)

No.	Localidad	Nombre	Dirección
10	PRIMERO DE MAYO	MOROYOQUI COTA KAREN LIZBETH	BLVD. JESUS GARCIA POSTE 101
11	PRIMERO DE MAYO	REYES CRUZ CLAUDIA PATRICA	CALLE LAZARO CARDENAS AL LADO DE ABARROTE PATY POSTE #91B
12	PRIMERO DE MAYO	VALDEZ SOTO MARIA	C. RAMON IGNACIO RODRIGO CASTRO POSTE 60
13	PRIMERO DE MAYO	ZAMBRANO ROCHA JESSICA JAZMIN	SEGUNDA CALLE ESQUINA
14	PRIMERO DE MAYO	OLIVO BACA GLORIA RUFINA	C. CARLOS RAMON GARCIA SIN NUMERO A DOS CASAS DEL OXXO



Paloma Alvarado
STHEPHANY PALOMA ALVARADO MACHADO
CONTRATISTA

Miguel Angel Caballero Reyes
ARQ. MIGUEL ANGEL CABALLERO REYES
RESIDENTE DE OBRA





INGRA

CONSTRUCCIONES

PLANO DE OBRA TERMINADA:

DESCRIPCION OBRA:

(092AH25PR) CONSTRUCCIÓN DE
14 CUARTOS DORMITORIO (17.95
M2) EN DISTINTAS LOCALIDADES
DE LA SINDICATURA CENTRAL,
MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.

CONTRATO:

FAISMUN-VIV-092PR-094PR-AH-2025

ELABORÓ:

Paloma Alvarado
C. STEPHANY PALOMA ALVARADO MACHADO
CONTRATISTA


REVISÓ:

Miguel Angel Cabanillas Reyes
ARQ. MIGUEL ANGEL CABANILLAS REYES
RESIDENTE DE OBRA

DIRECCIÓN DE
OBRAS PÚBLICAS

DICIEMBRE 2025



PLANO No. 1

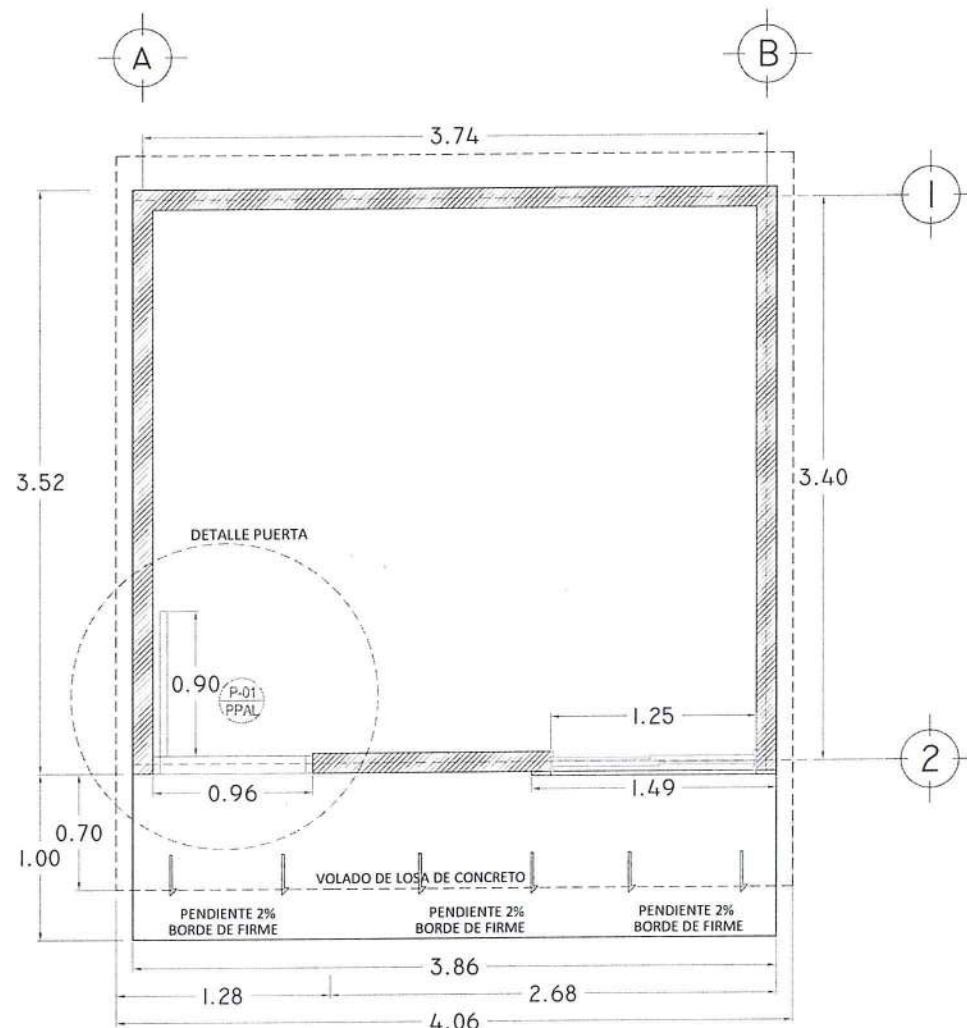

PLANTA ARQUITECTÓNICA

BLOCK DALA

Block tipo dala, relleno con
concreto $f'c=150 \text{ kg/cm}^2$ y
reforzado con 1 varilla de 3/8"

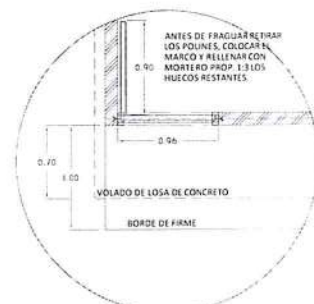

PLANTA DETALLE DE ANCLAJE DE
PUERTA




PLANTA DETALLE DE PREPARACION
PARA ANCLAJE DE PUERTA


ESPECIFICACION:
EMPOTRAR JALADERA A LA
ALTURA DEL BASTIDOR DE LA
PUERTA, NO EMPOTRAR EN LA
LÁMINA DE LA PUERTA.

CHAPA SOBREPONER
FANAL 175 Ó SIMILAR


CASTILLO INTEGRAL




Castillo integral de 12x20x40 cm
relleno en un hueco con
concreto $f'c=150 \text{ kg/cm}^2$ y
reforzado con varilla de 3/8"

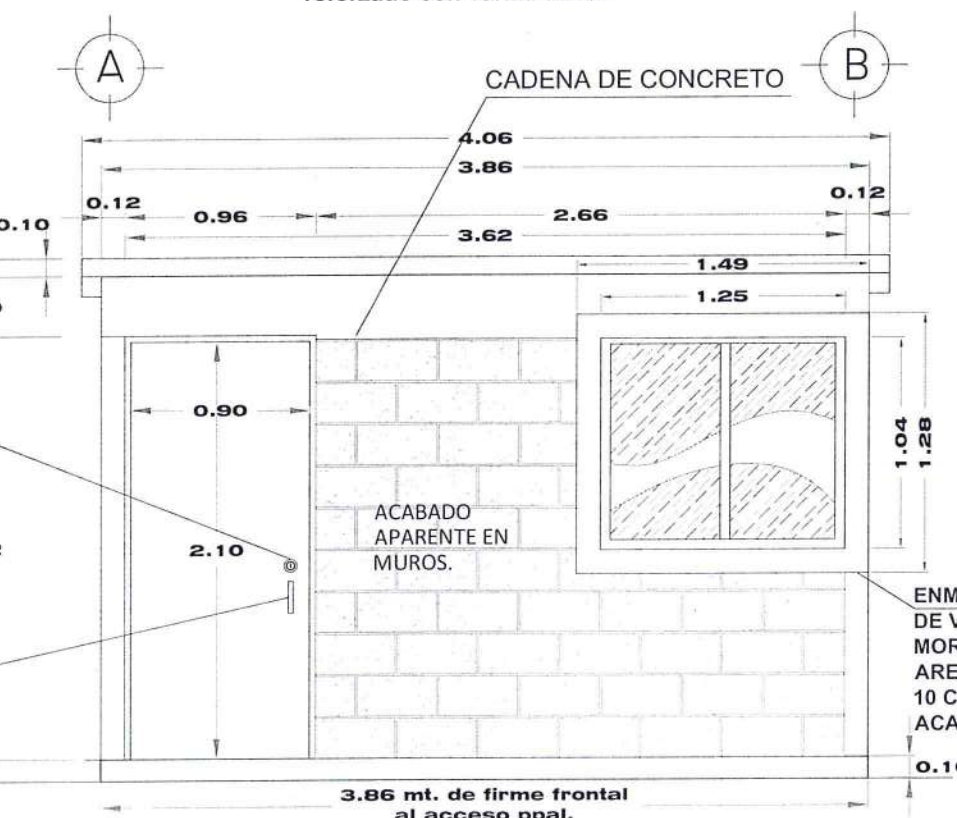


FACHADA PRINCIPAL

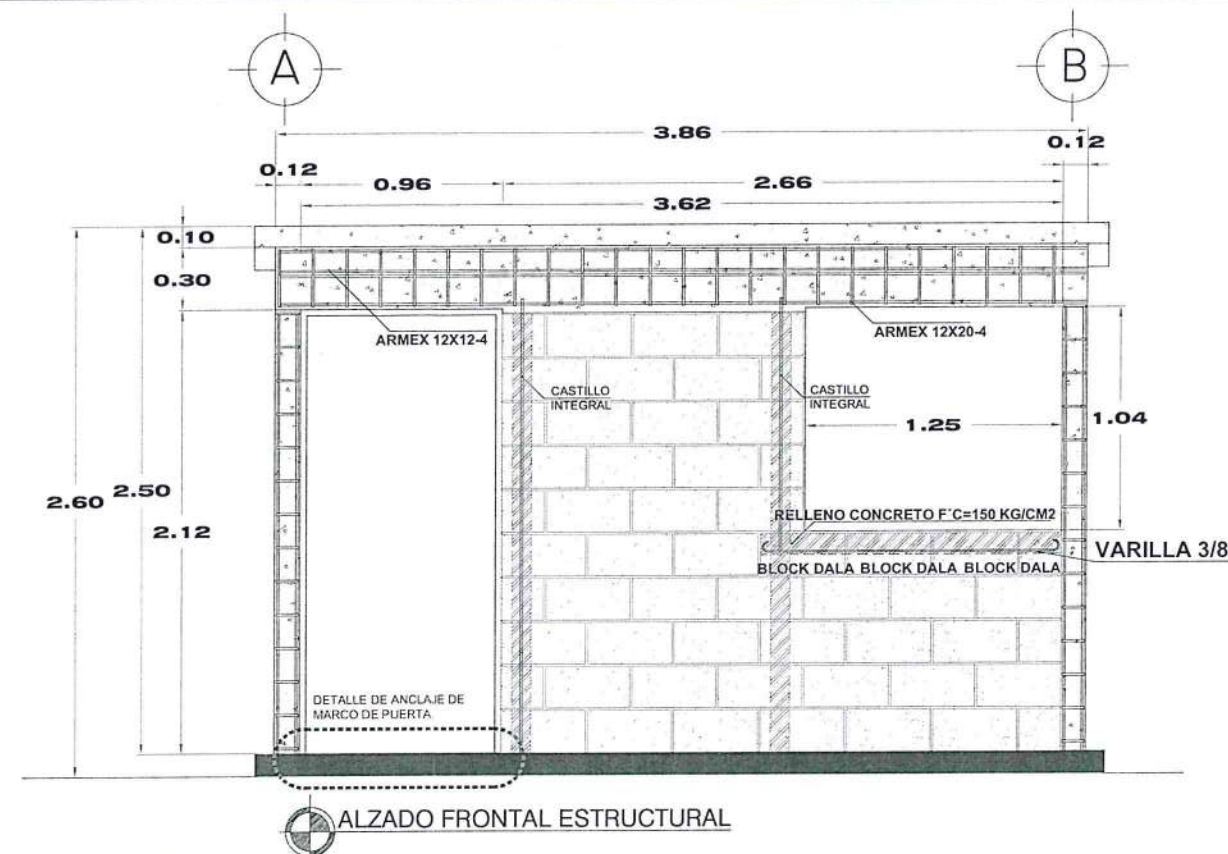


ALZADO FRONTAL ESTRUCTURAL

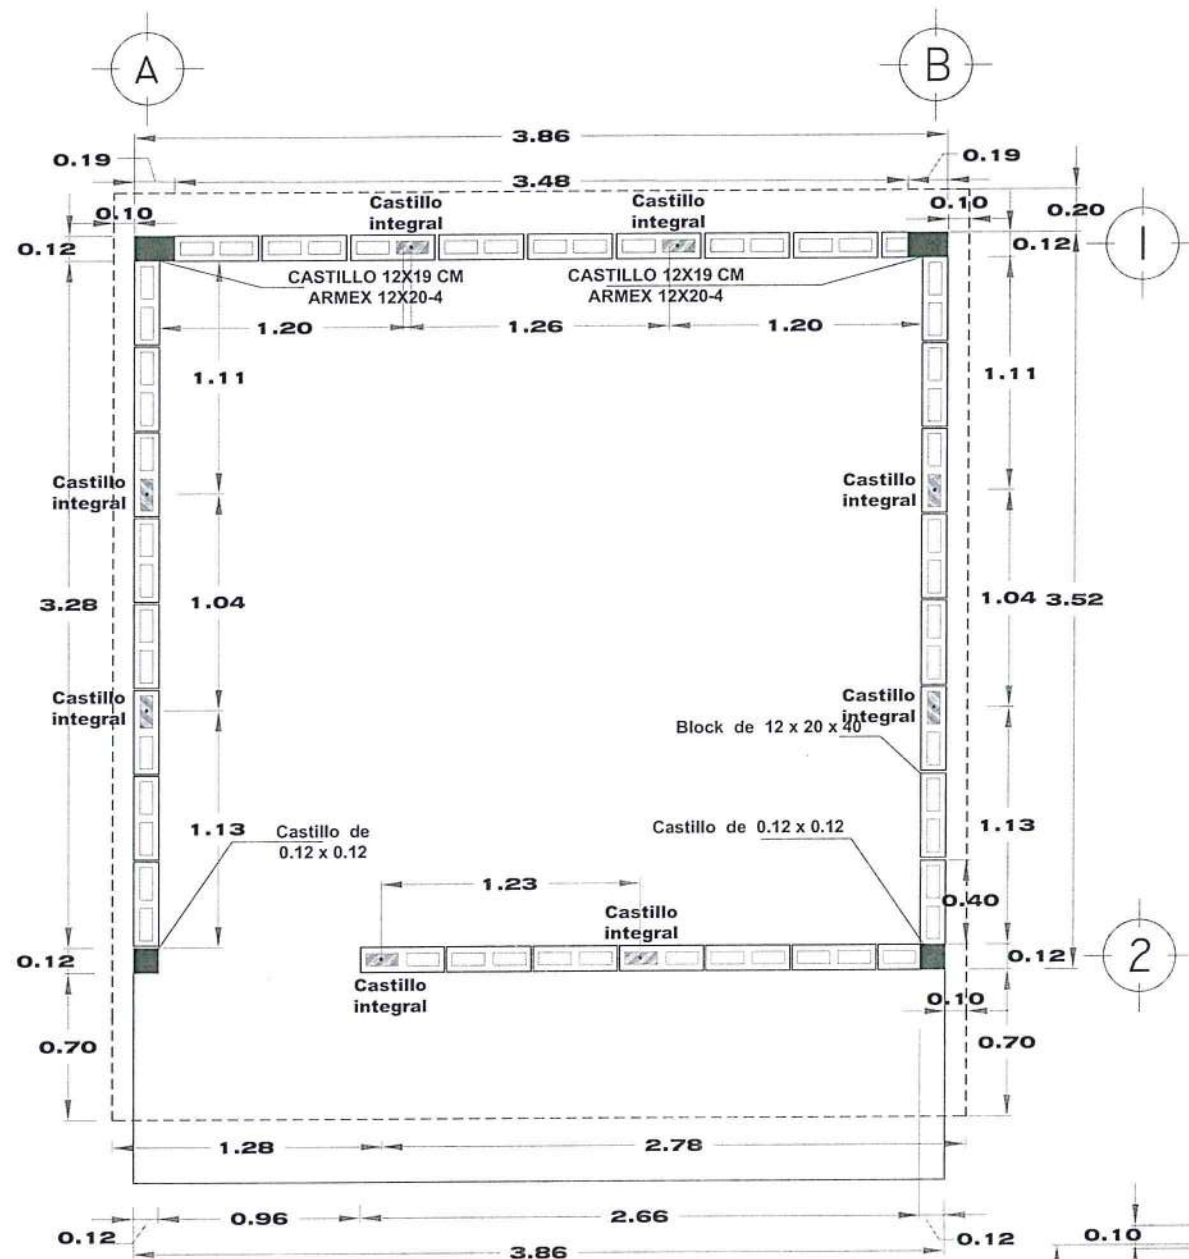

PLANTA DE MODULACIÓN DE BLOQUES EN MUROS

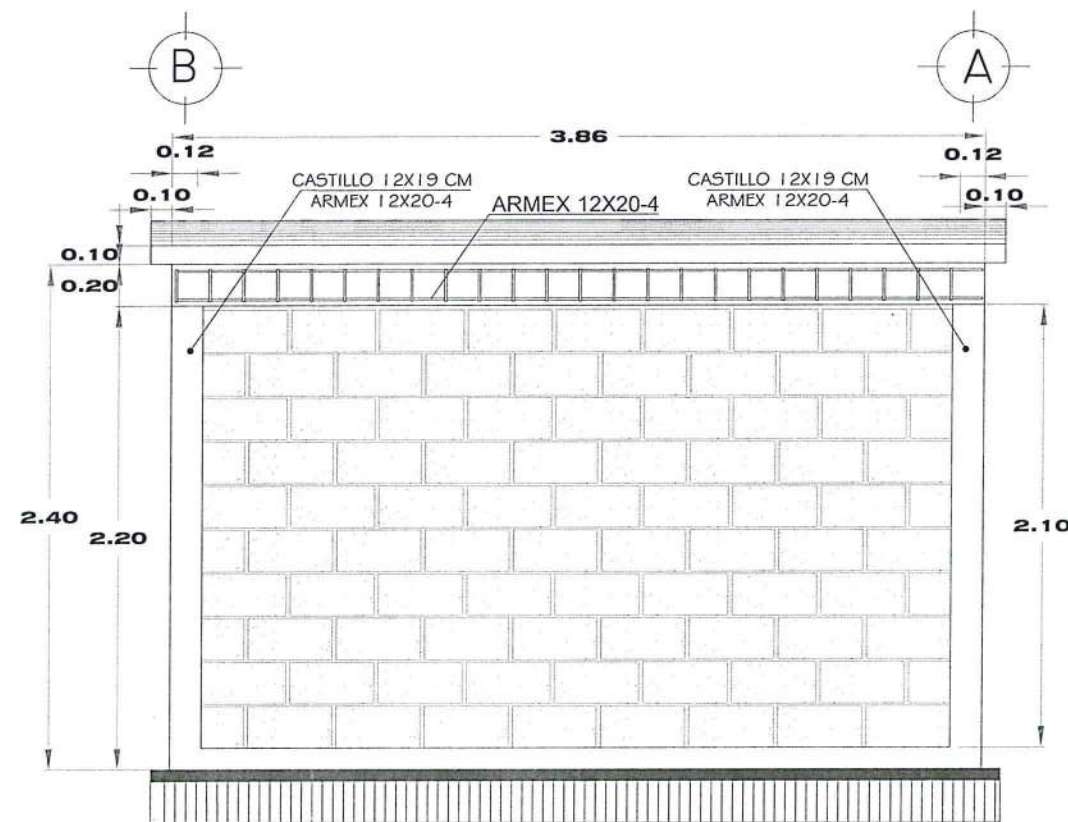

ALZADO POSTERIOR

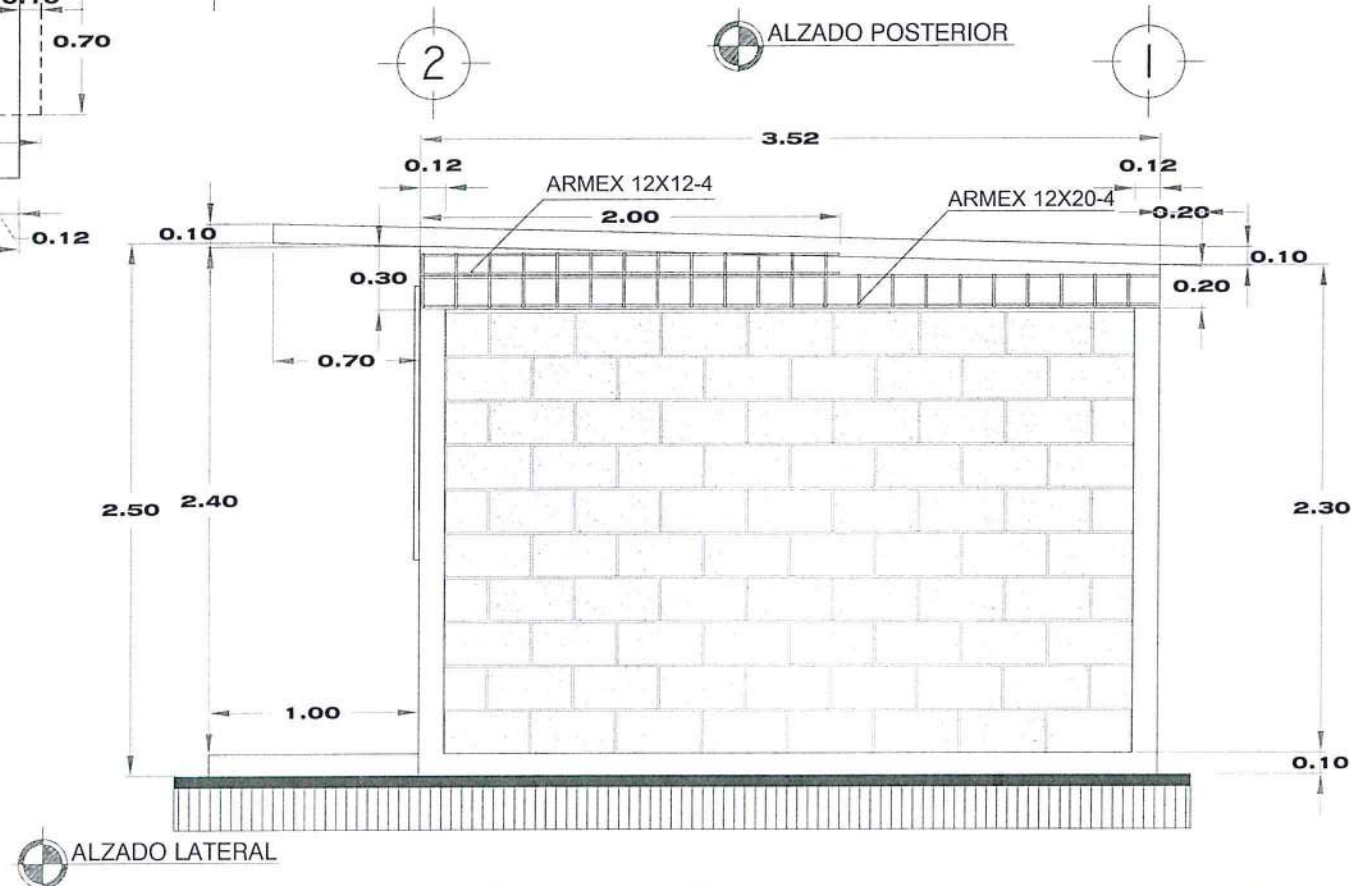

ALZADO LATERAL



PLANO DE OBRA TERMINADA:

DESCRIPCION OBRA:

(092AH25PR) CONSTRUCCIÓN DE 14 CUARTOS DORMITORIO (17.95 M2) EN DISTINTAS LOCALIDADES DE LA SINDICATURA CENTRAL, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.

CONTRATO:

FAISMUN-VIV-092PR-094PR-AH-2025

ELABORÓ:

C. Paloma Alvarado
STHEPHANY PALOMA ALVARADO MACHADO
CONTRATISTA


REVISÓ:

ARQ. MIGUEL ANGEL CABANILLAS
RESIDENTE DE OBRA

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

DICIEMBRE 2025


PLANO No. 2

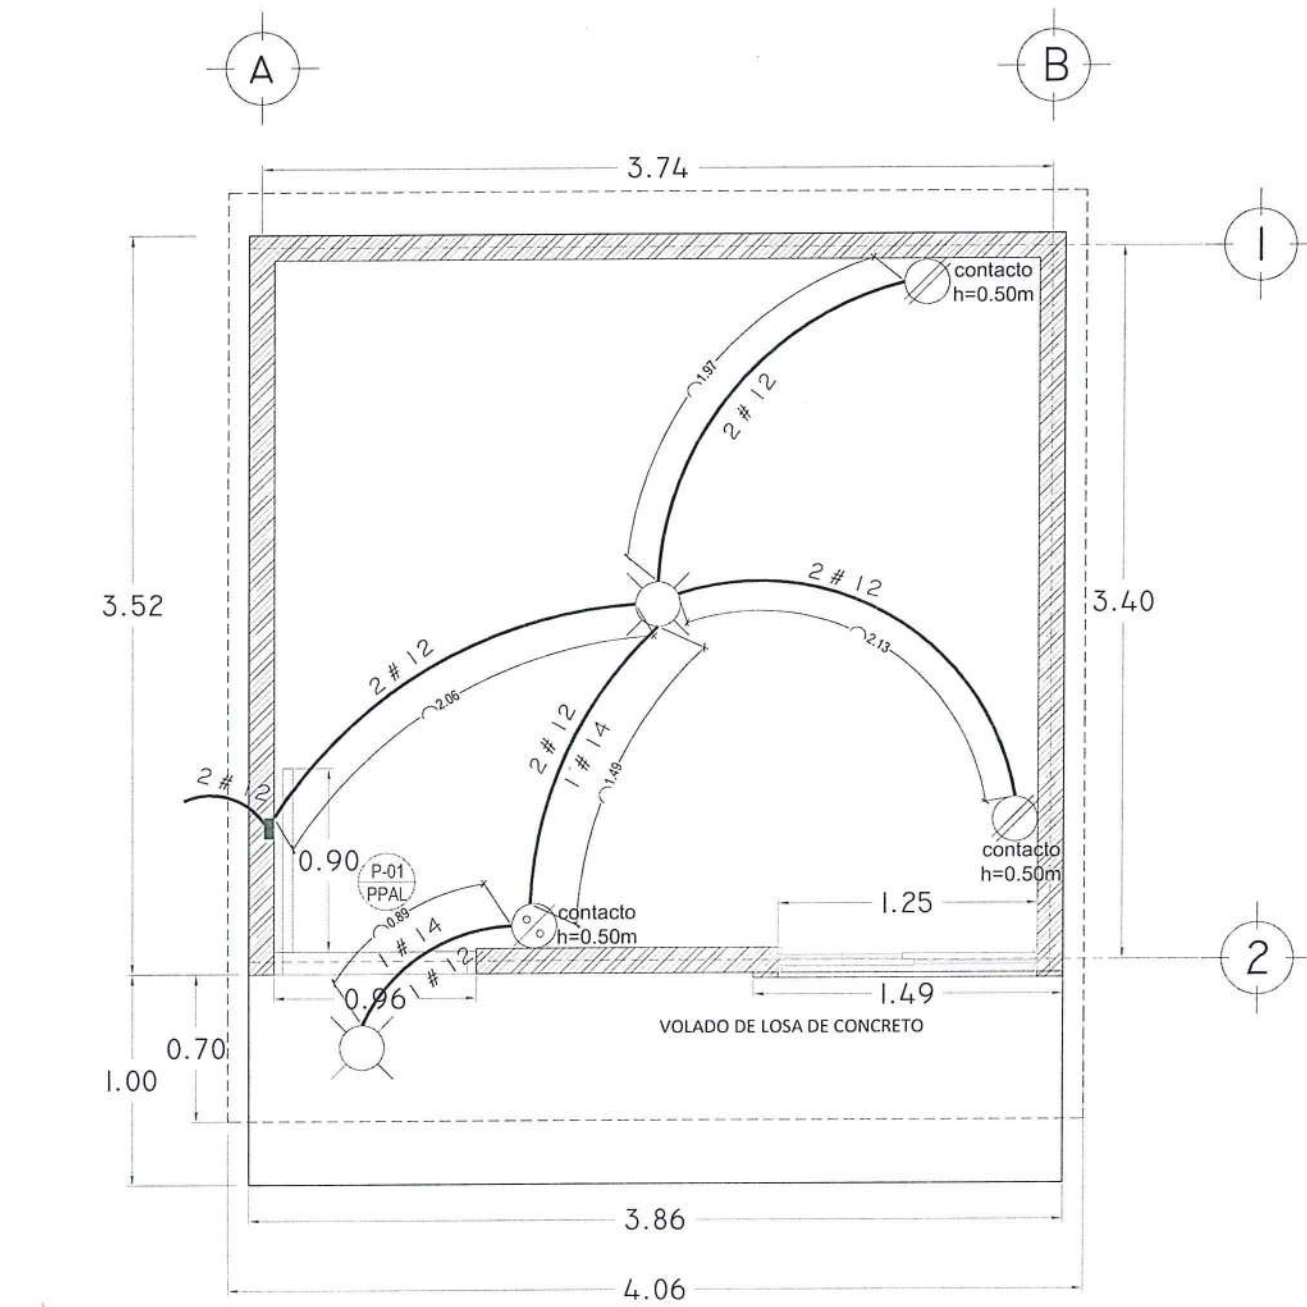

PLANTA DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA

SIMBOLOGIA ELECTRICA	
	SAIDA DE CENTRO
	APAGADOR
	CONTACTO DOBLE 110 V
	CHALUPA 2"x4" TAPA CIEGA AHOGADA EN LOSA

LOTE ELÉCTRICO	
2 CAJAS METÁLICAS 3" X 3"	
4 CHALUPAS	
1 APAGADOR DOBLE	
2 CONTACTOS DUPLEX	
1 TAPA CIEGA	
2 ROSETAS DE PORCELANA 3"	

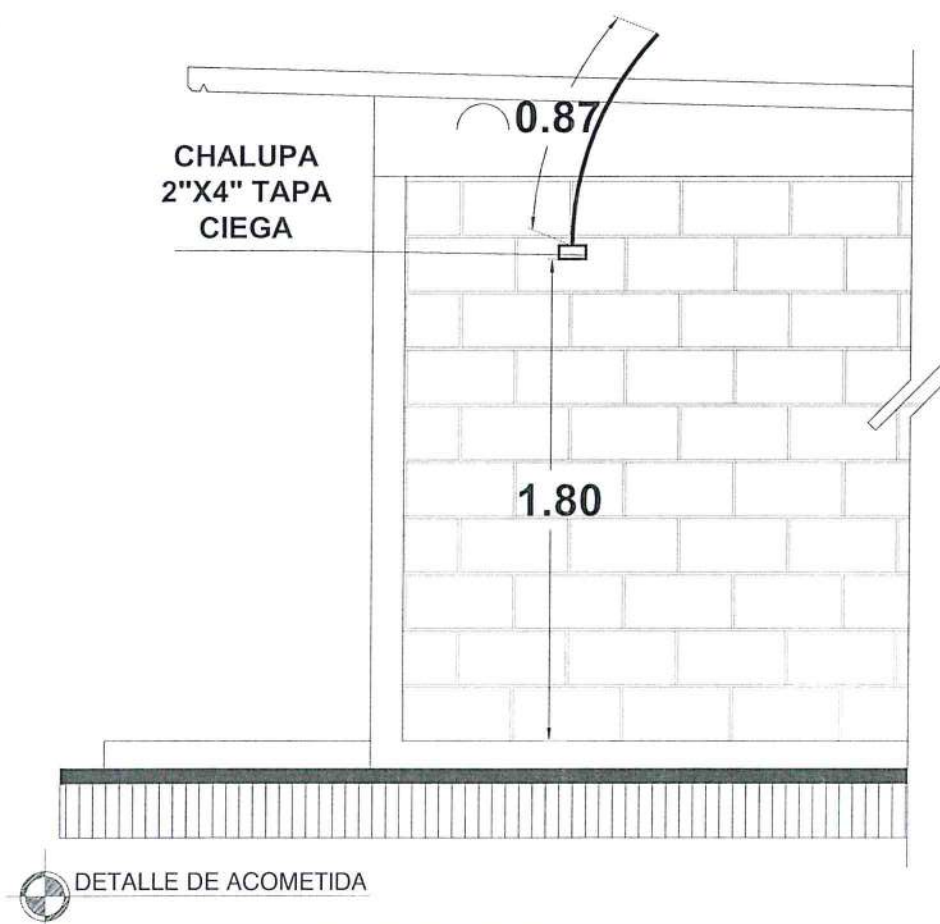

DETALLE DE ACOMETIDA



PLANO DE OBRA TERMINADA:

DESCRIPCION OBRA:

(092AH25PR) CONSTRUCCIÓN DE 14 CUARTOS DORMITORIO (17.95 M2) EN DISTINTAS LOCALIDADES DE LA SINDICATURA CENTRAL, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.

CONTRATO:

FAISMUN-VIV-092PR-094PR-AH-2025

ELABORÓ:

C. Paloma Alvarado
STHEPHANY PALOMA ALVARADO MACHADO
CONTRATISTA

REVISÓ:

ARQ. MIGUEL ANGEL CABANILLAS REYES
RESIDENTE DE OBRA

DICIEMBRE 2025






DETALLE DE FIRME DE CONCRETO EN ACCESO



DETALLES DE SECCIÓN ESTRUCTURALES


TRABE DE CIMENTACIÓN DE 12 CM. DE BASE 20 CM. DE ALTURA CON 10 CM. DENTRO DE LOSA DE CIMENTACIÓN, CONCRETO $f'c=200\text{ KG/CM}^2$ T.M.A. DE 38 MM. REFUERZO HORIZONTAL CON ARMEX 12X20-4 Y BASTONES EN L CON ACERO No. 3 A CADA 40 CM.

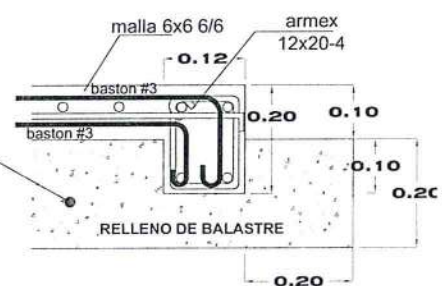

DETALLE DE CIMENTACION CORTE A-A'



CORTE A-A' LONGITUDINAL EN CIMENTACIÓN

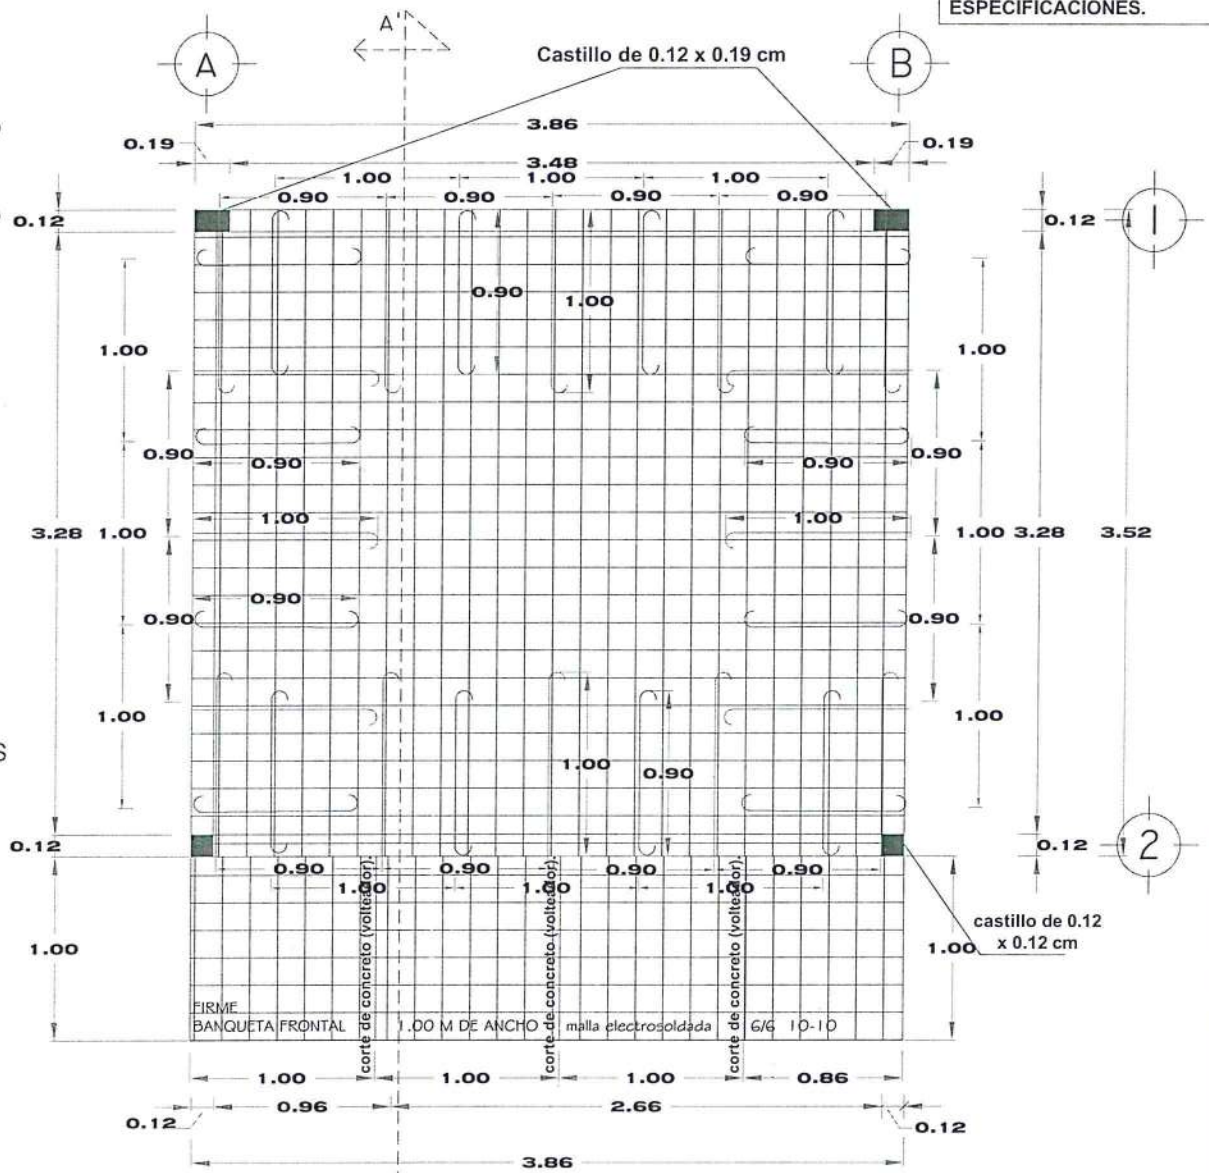

PLANTA DE CIMENTACIÓN

COLOCACION DE SILLETAS SEGUN NORMA Y ESPECIFICACIONES.



PLANO DE OBRA TERMINADA:

DESCRIPCION OBRA:

(092AH25PR) CONSTRUCCIÓN DE 14 CUARTOS DORMITORIO (17.95 M2) EN DISTINTAS LOCALIDADES DE LA SINDICATURA CENTRAL, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.

CONTRATO:

FAISMUN-VIV-092PR-094PR-AH-2025


ELABORÓ:

C. STEPHANY PALOMA ALVARADO MACHADO CONTRATISTA

REVISÓ:


ARQ. MIGUEL ANGEL CABANILLAS REYES RESIDENTE DE OBRA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS, URBANISMO Y ECOLOGÍA PLANO No. 4

DICIEMBRE 2025

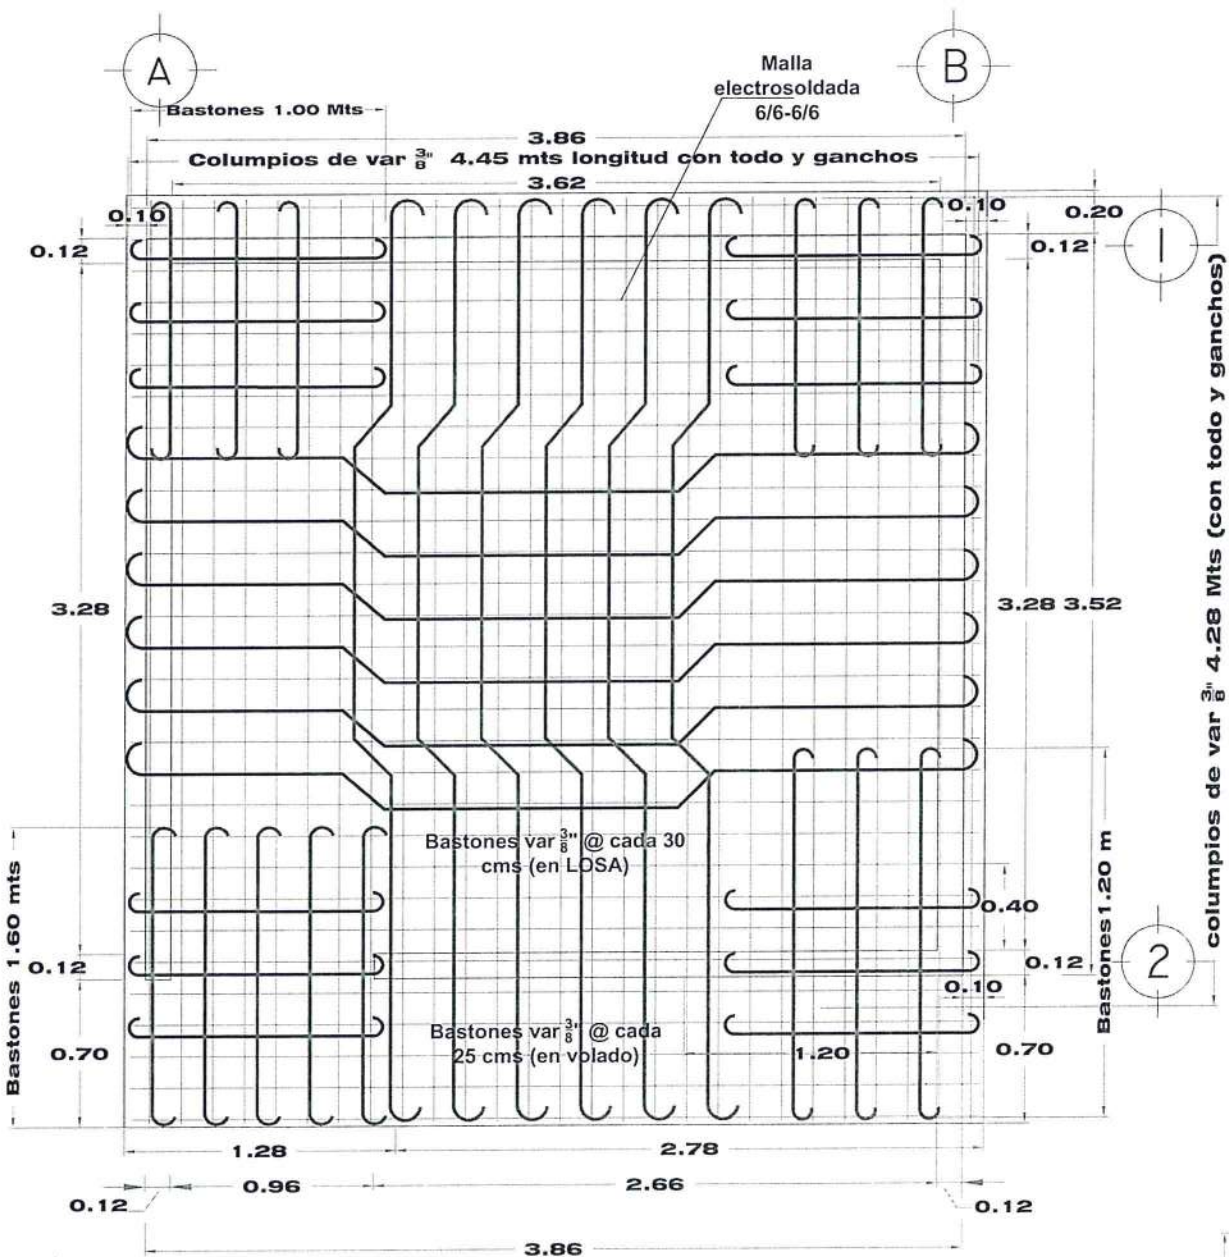


PLANTA DE ARMADO DE LOSA DE AZOTEA


COLOCACION DE SILLETAS SEGUN NORMA Y ESPECIFICACIONES.

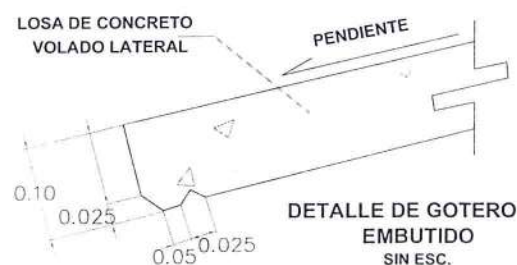


ALZADO FRONTAL ESTRUCTURAL

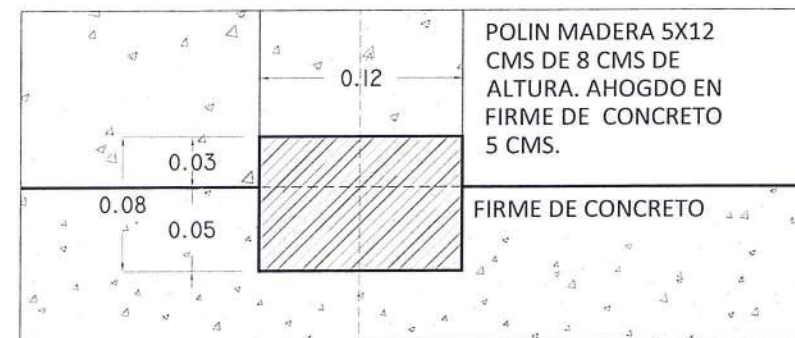

DETALLE EN CORTE ALZADO DE PREPARACION DE FIRME PARA ANCLAJE DE PUERTA PPAL.

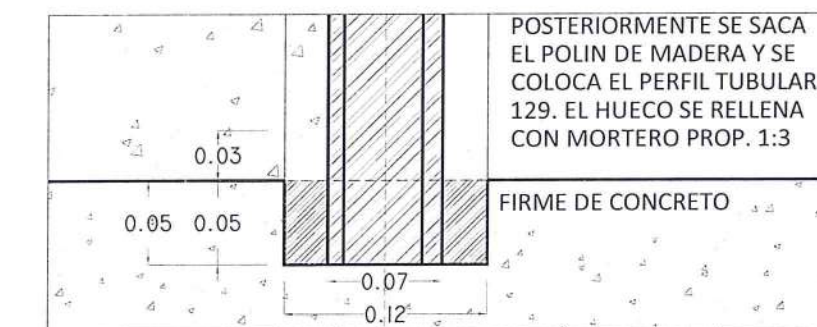

DETALLE EN CORTE ALZADO DE ANCLAJE DE PUERTA PPAL.

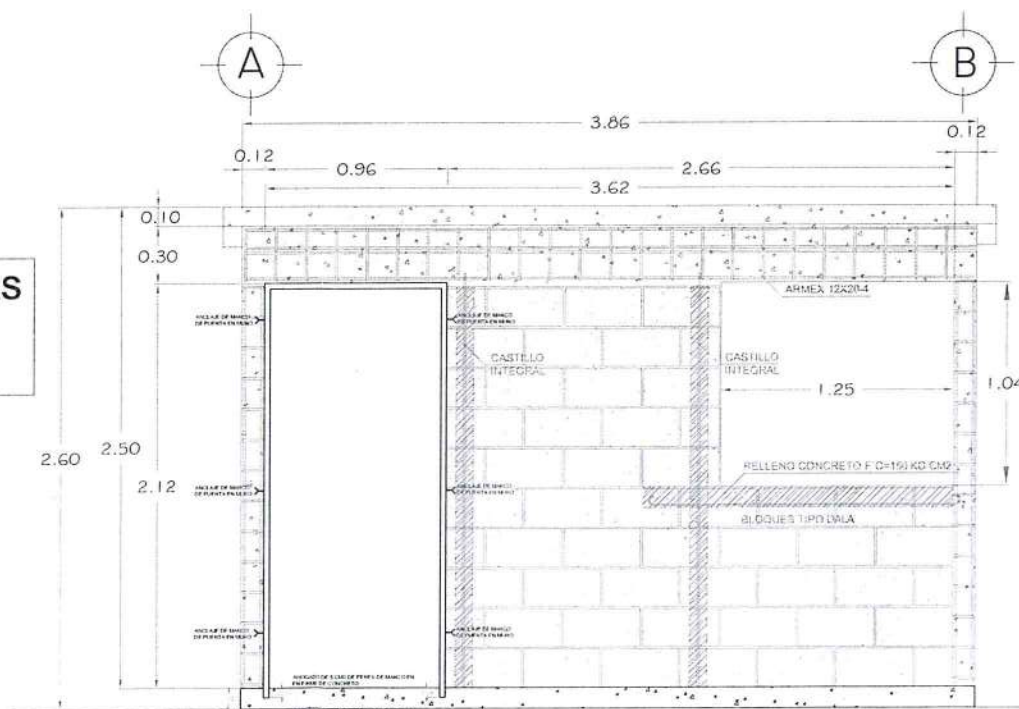

PLANO DE OBRA TERMINADA:

DESCRIPCION OBRA:

(092AH25PR) CONSTRUCCIÓN DE 14 CUARTOS DORMITORIO (17.95 M2) EN DISTINTAS LOCALIDADES DE LA SINDICATURA CENTRAL, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.

CONTRATO:

FAISMUN-VIV-092PR-094PR-AH-2025

ELABORÓ:

C. *Paloma Alvarado*
STHEPHANY PALOMA ALVARADO MACHADO
CONTRATISTA

REVISÓ:

ARQ. MIGUEL ANGEL CABANILLAS REYES
RESIDENTE DE OBRA

DICIEMBRE 2025

SECRETARIA DE OBRAS
PÚBLICAS, URBANISMO Y
ECOLOGIA
DIRECCIÓN DE OBRAS
PÚBLICAS

H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AHOME
SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, URBANISMO Y ECOLOGÍA

JUSTIFICACIÓN

PARA LA CELEBRACIÓN DE CONVENIO MODIFICATORIO DE PLAZO

I.- DATOS GENERALES

LOCALIDADES: DISTINTAS LOCALIDADES DE LA SINDICATURA CENTRAL; y DISTINTAS LOCALIDADES DE LA SINDICATURA TOPOLOBAMPO, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.

OBRAS: (092AH25PR) CONSTRUCCIÓN DE 14 CUARTOS DORMITORIO (17.95 M2) EN DISTINTAS LOCALIDADES DE LA SINDICATURA CENTRAL, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA; y (094AH25PR) CONSTRUCCIÓN DE 08 CUARTOS DORMITORIO (17.95 M2) EN DISTINTAS LOCALIDADES DE LA SINDICATURA TOPOLOBAMPO, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.

No. DE CONTRATO: FAISMUN-VIV-092PR-094PR-AH-2025

No. DE CONVENIO: (FAISMUN-VIV-092PR-094PR-AH-2025)-1

CONTRATISTA: STEPHANY PALOMA ALVARADO MACHADO


IMPORTE DEL CONTRATO ORIGINAL: \$2'992,917.84 (IMPORTE TOTAL)

II.- ANTECEDENTES

CON FECHA 04 DE NOVIEMBRE DE 2025, "EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME" Y LA PERSONA FÍSICA STEPHANY PALOMA ALVARADO MACHADO, CELEBRARON CONTRATO IDENTIFICADO CON EL NUMERO: FAISMUN-VIV-092PR-094PR-AH-2025, PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS MENCIONADAS ANTERIORMENTE.

SE OTORGÓ EL ANTICIPO RESPECTIVO AL QUE POR LEY TIENE DERECHO CON FECHA 03 DE DICIEMBRE DE 2025, Y UNA VEZ QUE "LAS PARTES" SE PUSIERÓN DE ACUERDO, "EL CONTRATISTA" INICIARA LOS TRABAJOS CON FECHA 04 DE DICIEMBRE DE 2025.

JUSTIFCONV-FAISMUN.092PR.094PR.2025



H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AHOME
SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, URBANISMO Y ECOLOGÍA

III.- CONSIDERACIONES

DE ACUERDO AL ARTÍCULO 84, FRACCIÓN II, DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE SINALOA:

ARTÍCULO 84. LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES, DENTRO DE SU PRESUPUESTO AUTORIZADO, BAJO SU RESPONSABILIDAD Y POR RAZONES FUNDADAS Y MOTIVADAS, PODRÁN MODIFICAR LOS CONTRATOS SOBRE LA BASE DE PRECIOS UNITARIOS; LOS MIXTOS EN LA PARTE CORRESPONDIENTE, ASÍ COMO LOS DE AMORTIZACIÓN PROGRAMADA, MEDIANTE CONVENIOS MODIFICATORIOS EN CUANTO A LOS MONTOS Y PLAZOS ORIGINALMENTE PACTADOS MEDIANTE LOS SIGUIENTES CONVENIOS QUE DE MANERA ENUNCIATIVA MÁS NO LIMITATIVA A CONTINUACIÓN SE SEÑALAN:

II. MODIFICATORIO DE PLAZO: CUANDO LA CONTRATANTE AUTORICE UN NUEVO PROGRAMA QUE MODIFIQUE LA DURACIÓN TOTAL DEL PERIODO CONTRATADO DE EJECUCIÓN DE LOS SERVICIOS, PODRÁN CELEBRARSE UNO O MAS CONVENIOS DE ESTE TIPO, SIEMPRE QUE EN CONJUNTO NO SE REBASE EL VEINTICINCO POR CIENTO DEL PLAZO DE EJECUCION PACTADO EN EL CONTRATO;

CONSIDERANDO LO ANTERIOR SE AUTORIZA UN NUEVO PROGRAMA QUE MODIFICA LA DURACIÓN TOTAL DEL PERIODO CONTRATADO, POR ASÍ CONVENIR A LOS INTERESES DE "EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME". POR LO QUE SE DETERMINA PROCEDER A LO SIGUIENTE:

IV.- RESOLUCIÓN

CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 84, FRACCIÓN II, DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE SINALOA, SE CELEBRA CONVENIO MODIFICATORIO DE PLAZO A FIN DE CUBRIR LAS MODIFICACIONES QUE OCASIONARON LAS CIRCUNSTANCIAS REFERIDAS EN LOS ANTECEDENTES Y LAS CONSIDERACIONES RELACIONADAS EN LA PRESENTE JUSTIFICACIÓN.

LOS MOCHIS, SIN. 03 DE DICIEMBRE DE 2025



SECRETARÍA DE
OBRAS PÚBLICAS
URBANISMO
Y ECOLOGÍA

ELABORÓ Y REVISÓ

C. JESÚS ERNESTO TAPIA CASTRO
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

Vo. Bo. Y APROBÓ

C. JORGE ISAAC ISLAS ARREDONDO
SECRETARIO DE OBRAS PÚBLICAS,
URBANISMO Y ECOLOGÍA



SECRETARÍA DE OBRAS
PÚBLICAS, URBANISMO Y
ECOLOGÍA
Hoja 2 de 2
DIRECCIÓN DE
OBRAS PÚBLICAS

CONVENIO MODIFICATORIO DE PLAZO A CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO que celebran, por una parte; el **HONORABLE AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AHOME, ESTADO DE SINALOA**, representado en este acto jurídico por el ciudadano **CARLOS GABRIEL BRECEDA ROMERO**, en su carácter de **DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y APODERADO LEGAL**, a quien en lo sucesivo se le denominará **"EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME"**; y por otra parte la ciudadana **STEPHANY PALOMA ALVARADO MACHADO**, a quien en lo sucesivo se le denominará **"EL CONTRATISTA"**; manifestando **"LAS PARTES"** que es su deseo celebrar el presente instrumento sujetándose a los antecedentes, declaraciones y cláusulas siguientes:

ANTECEDENTES:

I. Que con fecha 04 de noviembre de 2025, **"EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME"** y **"EL CONTRATISTA"**, celebraron el contrato público número **FAISMUN-VIV-092PR-094PR-AH-2025**, siendo este a precios unitarios y tiempo determinado, en virtud de que **"EL CONTRATISTA"** se obligó a realizar para la entidad las obras: **(092AH25PR) CONSTRUCCIÓN DE 14 CUARTOS DORMITORIO (17.95 M2) EN DISTINTAS LOCALIDADES DE LA SINDICATURA CENTRAL, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA;** y **(094AH25PR) CONSTRUCCIÓN DE 08 CUARTOS DORMITORIO (17.95 M2) EN DISTINTAS LOCALIDADES DE LA SINDICATURA TOPOLOBAMPO, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA;** el cual para los efectos del presente instrumento en lo sucesivo se denominará **"EL CONTRATO PRINCIPAL"**.

DECLARACIONES:

I.- DECLARAN "LAS PARTES":

I.1.- Ratifican en todas y cada una de sus partes las declaraciones establecidas en **"EL CONTRATO PRINCIPAL"**, aceptando la formalización del presente convenio.

I.2.- Las facultades que les fueron otorgadas no les han sido modificadas, restringidas, ni revocadas de forma alguna, para los efectos que se deriven del presente instrumento legal.

I.3.- Que **"EL CONTRATO PRINCIPAL"** está regulado por la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Sinaloa, y conforme al artículo 84 fracción II, dice lo siguiente:

Artículo 84. Las dependencias y entidades, dentro de su presupuesto autorizado, bajo su responsabilidad y con justificaciones fundadas, motivadas y transparentadas, podrán poner a consideración del Comité de obra la modificación de los contratos sobre la base de precios unitarios; los mixtos en la parte correspondiente, así como los de amortización programada, mediante convenios modificatorios en cuanto a los montos y plazos originalmente pactados mediante los siguientes convenios que de manera enunciativa más no limitativa a continuación se señalan:

II. Modificadorio de Plazo: Cuando la Contratante autorice un nuevo programa que modifique la duración total del periodo contratado de ejecución de los servicios, podrán celebrarse uno o más convenios de este tipo, siempre que en conjunto no se rebase el veinticinco por ciento del plazo de ejecución pactado en el contrato; (...)

Los convenios señalados en los párrafos anteriores deberán ser autorizados y firmados por el comité de obra de la institución convocante, así como por el titular del órgano interno de control.

I.4.- Que por el presente convenio **"LAS PARTES"** acuerdan la modificación del plazo de ejecución contenido en el primer párrafo de la cláusula **TERCERA** de **"EL CONTRATO PRINCIPAL"**, el cual dice de la siguiente manera:

TERCERA. (PLAZO DE EJECUCIÓN). -

H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AHOME
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, URBANISMO Y ECOLOGÍA
Convenio No. (FAISMUN-VIV-092PR-094PR-AH-2025)-1

"EL CONTRATISTA" se obliga a realizar los trabajos objeto del presente contrato en un plazo de 50 (CINCUENTA) días naturales, iniciando los trabajos el día 05 de noviembre de 2025 y a terminarlos a más tardar el día 24 de diciembre de 2025, de conformidad con el programa de trabajo aprobado.

I.5.- Que el importe total de "EL CONTRATO PRINCIPAL" fue por la suma de:

SUB-TOTAL: \$2'992,917.84 (SON: DOS MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS DIECISIETE PESOS 84/100 M.N.)
I.V.A. (16%): \$0.00 (SON: CERO PESOS 00/100 M.N.)
TOTAL: \$2'992,917.84 (SON: DOS MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS DIECISIETE PESOS 84/100 M.N.)

I.6.- Se otorgo el anticipo a "EL CONTRATISTA" al que por Ley tiene derecho, con fecha 03 de diciembre de 2025.

I.7.- Con base en lo anterior "LAS PARTES" celebran el presente convenio modificatorio de plazo, acordando las siguientes:

CLÁUSULAS:

PRIMERA.- "EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME" autoriza un nuevo programa que modifica la duración total del periodo contratado de ejecución para las obras.

SEGUNDA.- "EL CONTRATISTA" se compromete a entregar las reprogramaciones de las obras, con la fecha que "LAS PARTES" acordaron de ejecución.

TERCERA.- "LAS PARTES" están de acuerdo en modificar la duración total de las obras contratadas, quedando de la siguiente manera:

DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	PLAZO DE EJECUCIÓN ESTABLECIDO EN EL CONTRATO		NUEVO PLAZO DE EJECUCIÓN	
	INICIO	TERMINO	INICIO	TERMINO
(092AH25PR) CONSTRUCCIÓN DE 14 CUARTOS DORMITORIO (17.95 M2) EN DISTINTAS LOCALIDADES DE LA SINDICATURA CENTRAL, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.	(50 DÍAS NATURALES)		(27 DÍAS NATURALES)	
	05/11/2025	24/12/2025	04/12/2025	30/12/2025
(094AH25PR) CONSTRUCCIÓN DE 08 CUARTOS DORMITORIO (17.95 M2) EN DISTINTAS LOCALIDADES DE LA SINDICATURA TOPOLOBAMPO, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.	(50 DÍAS NATURALES)		(27 DÍAS NATURALES)	
	05/11/2025	24/12/2025	04/12/2025	30/12/2025

"EL CONTRATISTA" se obliga a realizar las obras objeto del presente convenio modificatorio de plazo en el nuevo plazo de ejecución establecido, de conformidad con la reprogramación de trabajo autorizado por "EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME".

CUARTA.- Salvo las que resulten modificadas por este convenio modificatorio de plazo, continuaran vigentes todas las estipulaciones de "EL CONTRATO PRINCIPAL".

H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AHOME
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, URBANISMO Y ECOLOGÍA
Convenio No. (FAISMUN-VIV-092PR-094PR-AH-2025)-1

QUINTA.- El presente convenio comenzará a surtir sus efectos legales a partir de la fecha de su firma.

SEXTA.- "LAS PARTES" acuerdan que cualquier controversia que pudiera suscitarse con motivo de la aplicación, interpretación, cumplimiento y ejecución de este convenio, será resuelto en primera instancia en la vía administrativa en las oficinas de "EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME" y en caso de no llegar a un acuerdo satisfactorio, se someten expresamente por la materia (Civil) y naturaleza de este convenio a la jurisdicción de los Juzgados Civiles de Primera Instancia con sede y competencia en la ciudad de Los Mochis, Sinaloa, renunciando al fuero que pudiera corresponderles por razón de su domicilio presente, futuro o por cualquier otra causa.

Leído por "LAS PARTES" que en él intervienen y enteradas de su contenido y alcance legal, se firma el presente convenio al calce y al margen de todas sus fojas útiles, en presencia de cuatro testigos que al final se expresan y dan fe; celebrado en la ciudad de Los Mochis, Ahome, Sinaloa, el día 03 de diciembre de 2025.

Por "EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME"

Por "EL CONTRATISTA"



C. CARLOS GABRIEL BRECEDA ROMERO
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN
Y APODERADO LEGAL


C. STEPHANY PALOMA ALVARADO
MACHADO


TESTIGOS:


C. JORGE ISAAC ISLAS ARREDONDO
SECRETARIO DE OBRAS PÚBLICAS,
URBANISMO Y ECOLOGÍA DEL
H. AYUNTAMIENTO DE AHOME


C. JESÚS ERNESTO TAPIA CASTRO
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS
DEL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME

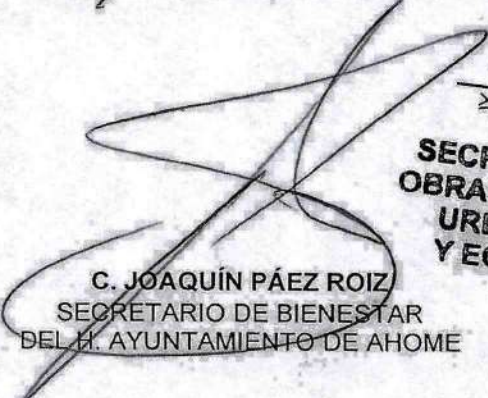
C. JOAQUÍN PÁEZ ROIZ
SECRETARIO DE BIENESTAR
DEL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME


SECRETARÍA DE
OBRAS PÚBLICAS
URBANISMO
Y ECOLOGÍA


C. VLADIMIR HERRERA BLANCAS
DIRECTOR DE ASUNTOS JURÍDICOS
DEL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME

CONVENIO MODIFICATORIO DE PLAZO A CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO que celebran por una parte; el H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AHOME, ESTADO DE SINALOA; y por otra parte la ciudadana STEPHANY PALOMA ALVARADO MACHADO, celebrado con fecha 03 de diciembre de 2025.



Stephany Paloma Alvarado Machado

Calle Ernestina Zazueta #1612 C.P. 81229
Col. Tepeca, Los Mochis, Sinaloa.
Tel.Cel. 668 130 7385 R.F.C. AAMS950703AQ4
e-mail: ritoalvarado09@outlook.com

LOS MOCHIS, SINALOA, A 04 DE DICIEMBRE DEL 2025

C. ARQ. JESUS ERNESTO TAPIA CASTRO
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS.

POR ESTE MEDIO ME REFIERO AL CONTRATO **FAISMUN-VIV-092PR-094PR-AH-2025**

DE LA OBRA: **(092AH25PR) CONSTRUCCIÓN DE 14 CUARTOS DORMITORIO (17.95 M2) EN DISTINTAS LOCALIDADES DE LA SINDICATURA CENTRAL, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.** EL PARTICULAR ME PERMITO INFORMARLE QUE DEBIDO AL RETRASO EN LA ENTREGA DEL ANTICIPO Y UNA VEZ QUE LAS PARTES LOGRARON ACORDAR EL INICIO DE LOS TRABAJOS, EL NUEVO PLAZO DE EJECUCION QUEDA DE LA SIGUIENTE MANERA:

PLAZO DE EJECUCION SEGÚN CONTRATO:

FECHA DE INICIO: 05 DE NOVIEMBRE DEL 2025

FECHA DE TERMINO: 24 DE DICIEMBRE DEL 2025

PLAZO DE EJECUCION: 50 DIAS NATURALES

PLAZO DE EJECUCION POR DIFERIMIENTO A CAUSA DEL RETRASO EN ENTREGA AL ANTICIPO:

FECHA DE INICIO: 04 DE DICIEMBRE DEL 2025

FECHA DE TERMINO: 30 DE DICIEMBRE DEL 2025

PLAZO DE EJECUCION: 27 DIAS NATURALES

SIN MAS POR EL MOMENTO, QUEDAMOS DE USTED CON NUESTRA MÁS ATENTAS CONSIDERACIONES.

ATENTAMENTE

Paloma Alvarado

C. STEPHANY PALOMA ALVARADO MACHADO
REPRESENTANTE LEGAL





Oficio No.: SOP/DOP/2130-25

Asunto: Aviso de inicio de obra

Los Mochis, Ahome, Sinaloa, 08 de diciembre de 2025.

C. DALVINGH ITURRIOS CORRALES

TITULAR DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL

Presente.-

Por medio del presente, reciba un cordial saludo y a su vez le informo que de conformidad con lo establecido en el Artículo 77, Cuarto Párrafo de la Ley de Obras Públicas y Servicios relacionados con las mismas del Estado de Sinaloa, mismo que en su parte medular señala lo siguiente: "...dentro de los diez días hábiles siguientes a la fecha de iniciación de la obra pública contratada, las dependencias o entidades notificarán a la contraloría dicho inicio; así mismo, deberá informar cualquier modificación, suspensión y terminación de las obras."; ahora bien, con el objeto de dar cumplimiento a la disposición antes señalada, le hago de su conocimiento que respecto de los trabajos relativos a las obras que fueron contratadas, según contrato numero: **FAISMUN-VIV-092PR-094PR-AH-2025.**, consistentes específicamente en: **(092AH25PR) CONSTRUCCIÓN DE 14 CUARTOS DORMITORIO (17.95 M2) EN DISTINTAS LOCALIDADES DE LA SINDICATURA CENTRAL, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA. (094AH25PR) CONSTRUCCIÓN DE 08 CUARTOS DORMITORIO (17.95 M2) EN DISTINTAS LOCALIDADES DE LA SINDICATURA TOPOLOBAMPO, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.**; cuyas obras le fueron adjudicadas a **"EL CONTRATISTA" STEPHANY PALOMA ALVARADO MACHADO**, con un importe total de hasta: **\$ 2,992,917.84**, identificandose como origen del recurso el correspondiente a: **FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FAISMUN EJERCICIO 2025).**

Procedo a notificarle e informarle, que el inicio en los plazos de ejecución de los trabajos relativos a las obras antes señaladas, quedaron establecidos como a continuación se indica:

(092AH25PR)(094AH25PR)	
FECHA DE INICIO:	FECHA DE TERMINO:
04/12/2025	30/12/2025
PLAZO DE EJECUCIÓN: 27 días naturales	

Sin más por el momento y agradeciendo de antemano la atención prestada a la presente, me despido de usted.

ATENTAMENTE

ARQ. JESÚS ERNESTO TAPIA CASTRO
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

c.c.p. Joaquín Páez Roiz/Secretario de Bienestar
c.c.p. María Luisa Gómez Lizárraga/Sindica Procuradora
c.c.p. Stephany Paloma Alvarado Machado/Contratista
c.c.p. Archivo
JETC/AARF



FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS
	HORA 02:11 SUC 0432 REF 000000604464 012 0073310 0000 0073312 8790 04320501	182,850.00	
02 DIC	DOMI VW Leasing AUT DOMI 6796122 0064356328 CAJA 0051 AUT 00000000 HORA 02:17 SUC 0859		
02 DIC	PAGO RECIBIDO DE BANORTE POR ORDEN DE RED DEL VALLE DEL FUERTE S DE CTA.ORDENANTE 072743001107186373 REF.0021225 LIQUIDACION DE LA FACTURA A 512 RASTREO: 8846APR1202512024722430331	5,191.06	
	CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 09:57 SUC 0859		
03 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1299 SUC 4323		1,995,978.14
	CAJA 0001 AUT 06145701 HORA 10:26		
03 DIC	PAGO RECIBIDO DE BANORTE POR ORDEN DE SISTEMA PARA EL DESARROLLO INT CTA.ORDENANTE 072743001402274809 REF.0031225 REPARACION ASIST ALIM LIQUIDACION RASTREO: 8846APR2202512034726131380	20,422.60	
	CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 10:59 SUC 0859		
03 DIC	PAGO RECIBIDO DE BANORTE POR ORDEN DE MUNICIPIO DE AHOME CTA.ORDENANTE 072731012982593700 REF.0031225 PAGO ANT 35POR AP 181435 RASTREO: 8846APR1202512034727588050		33,828.41
	CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 17:03 SUC 0859		
04 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1300 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 02:01 SUC 0432 REF 000000604464 072 0515500 0000 0000010 0000 04320501		1,047,521.25
04 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1298 SUC 0320	25,000.00	
	CAJA 0003 AUT 06379567 HORA 11:28		
04 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1304 SUC 4172	91,064.00	
	CAJA 0002 AUT 06573983 HORA 11:48		
04 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1302 SUC 4172	153,875.00	
	CAJA 0002 AUT 06573983 HORA 11:50		
04 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1309 SUC 4172	29,330.54	
	CAJA 0005 AUT 06515398 HORA 14:06		
04 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1300		





Stephany Paloma Alvarado Machado

Calle Ernestina Zazueta #1612 C.P. 81228
Col. Tepeca, Los Mochis, Sinaloa.
Tel. Cel. 668 130 7385R.F.C. AAMS950703AQ4
e-mail: ritoalvarado09@hotmail.com

MUNICIPIO DE AHOME
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, URBANISMO Y ECOLOGIA

Razon Social: STEPHANY PALOMA ALVARADO MACHADO

DESCRIPCION GENERAL DE LA OBRA:

(092AH25PR) CONSTRUCCION DE 14 CUARTOS DORMITORIO (17.95 M2) EN DISTINTAS LOCALIDADES DE LA SINDICATURA CENTRAL, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.
(094AH25PR) CONSTRUCCION DE 08 CUARTOS DORMITORIO (17.95 M2) EN DISTINTAS LOCALIDADES DE LA SINDICATURA TOPOLOBAMPO, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.

ANEXO ECONOMICO AE-10

FECHA:
04 DE DICIEMBRE DEL 2025

LICITACION PUBLICA NACIONAL No.:
AHO-SOP-LPN-FAISMUN-VIV-03-25

PROGRAMA GENERAL DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS CONFORME AL CATÁLOGO DE CONCEPTOS CON SUS EROGACIONES CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO MENSUALMENTE

CLAVE	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	IMPORTE TOTAL PESOS	2025 Diciembre
VIVIENDA (CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO).					
TRABAJOS PRELIMINARES					
1.01	TRAZO Y NIVELACIÓN MANUAL DEL ÁREA POR CONSTRUIR PARA ESTABLECER EJES, BANCOS DE NIVEL Y REFERENCIAS, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M2	244.300	2,035.02	2,035.02
1.02	SUMINISTRO DE MATERIAL INERTE (BALASTRE FINO GRADUADO) CALIDAD SUB-BASE PARA COLOCAR EN RELLENO BAJO PISOS, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M3	46.760	36,613.55	36,613.55
1.03	RELLENO COMPACTADO DE MATERIAL DE BANCO (BALASTRE FINO GRADUADO) POR MEDIOS MECÁNICOS PARA COLOCAR EN RELLENO BAJO PISOS Y BANQUETAS, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M3	46.760	11,034.89	11,034.89
1.04	EXCAVACIÓN A MANO EN TRABES DE CIMENTACIÓN, EN MATERIAL TIPO "B" EN SECO, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M3	2.380	921.61	921.61
CIMENTACION					
2.01	TRABE DE CIMENTACIÓN DE 12 CM. DE BASE, 20 CM. DE ALTURA CON 10 CM. DENTRO DE LOSA DE CIMENTACIÓN CONCRETO F'C=200 KG/CM2 T.M.A. DE 38 MM. REFUERZO HORIZONTAL CON ARMEX 12X20-4 Y BASTONES EN L COM ACERO No. 3 A CADA 40 CM. INCLUYE: CIMBRA, ARMADO, COLADO, MATERIALES NECESARIOS Y MANO DE OBRA.	ML	199.920	76,109.54	76,109.54
2.02	PISO DE CONCRETO CON F'C=200 KG/CM2 ARMADO CON MALLALACK 6/6-6/6 DE 10 CM. DE ESPESOR ACABADO POLIDO INCLUYE: COLOCACIÓN DE SILLETAS SEGÚN NORMA Y ESPECIFICACIÓN, MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M2	190.260	139,669.87	139,669.87
2.03	SUMINISTRO, HABILITADO Y COLOCACIÓN DE VARILLA DE 3/8", F'Y=4200 KG/CM2., EN TRABES Y LOSAS, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.		0.112	4,837.70	4,837.70

ATENTAMENTE:

Paloma Alvarado

C. STEPHANY PALOMA ALVARADO MACHADO

DIRECCIÓN DE
OBRAS PÚBLICAS

FECHA DE INICIO: 04/12/2025
FECHA DE TERM.: 30/12/2025
PLAZO DE EJECUCIÓN: 27 DIAS NAT



Stephany Paloma Alvarado Machado

Calle Ernestina Zazueta #1612 C.P. 81228
Col. Tepeca, Los Mochis, Sinaloa.
Tel. Cel. 668 130 7385R.F.C. AAMS950703AQ4
e-mail: ritoalvarado09@hotmail.com

MUNICIPIO DE AHOME
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, URBANISMO Y ECOLOGIA

Razon Social: STEPHANY PALOMA ALVARADO MACHADO

DESCRIPCION GENERAL DE LA OBRA:

(092AH25PR) CONSTRUCCION DE 14 CUARTOS DORMITORIO (17.95 M2) EN DISTINTAS LOCALIDADES DE LA SINDICATURA CENTRAL, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.

(094AH25PR) CONSTRUCCION DE 08 CUARTOS DORMITORIO (17.95 M2) EN DISTINTAS LOCALIDADES DE LA SINDICATURA TOPOLOBAMPO, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.

ANEXO ECONOMICO AE-10

FECHA:

04 DE DICIEMBRE DEL 2025

LICITACION PUBLICA NACIONAL No.:

AHO-SOP-LPN-FAISMUN-VIV-03-25

PROGRAMA GENERAL DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS CONFORME AL CATÁLOGO DE CONCEPTOS CON SUS EROGACIONES CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO MENSUALMENTE

CLAVE	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	IMPORTE TOTAL PESOS	2025 Diciembre
	HABILITADO, ARMADO, GANCHOS, TRASLAPES, DESPERDICIOS, COLOCACIÓN, Y MANO DE OBRA.				
2.04	ANCLAJE DE CASTILLOS (C-1) DE 12X12 CM. A UNA PROFUNDIDAD DE 20 CM. REFORZADO CON ARMEX 12X12-4. INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	PZA	28.000	3,988.60	3,988.60
2.05	ANCLAJE DE CASTILLOS (C-2) DE 12X19 CM. A UNA PROFUNDIDAD DE 20 CM. REFORZADO CON ARMEX 12X20-4. INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	PZA	28.000	3,988.60	3,988.60
2.06	ANCLAJE DE CASTILLOS INTEGRAL (CI) A UNA PROFUNDIDAD DE 20 CM. CON 1 VARILLA DE 3/8" .	PZA	112.000	10,744.16	10,744.16
2.07	CURADO PARA SUPERFICIE DE CONCRETO A BASE DE CURACRETO BLANCO, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, MANDO INTERMEDIO Y HERRAMIENTA MENOR, DESPERDICIOS.	M2	190.260	6,727.59	6,727.59
	ESTRUCTURA				
3.01	MURO DE BLOCK DE 12X20X40 CM. ACABADO APARENTE A DOS CARAS, ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA PROPORCIÓN 1:4, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M2	351.120	235,338.18	235,338.18
3.02	CASTILLO (C-1) DE 12X12 CM. DE SECCIÓN DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2 REFORZADO CON ACERO ARMEX 12X12-4, INCLUYE: CIMBRA Y ACABADO APARENTE CON TUINO DE 1", ARMADO, COLADO, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA .	ML	59.360	27,433.82	27,433.82
3.03	CASTILLO (C-2) DE 12X19 CM. DE SECCIÓN DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2 REFORZADO CON ACERO ARMEX 12X20-4, INCLUYE: CIMBRA Y ACABADO APARENTE CON TUINO DE 1", ARMADO, COLADO, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA .	ML	58.800	31,586.77	31,586.77
3.04	CASTILLO INTEGRAL (CI) EN BLOCK HUECO DE 12X20X40 CMS. ARMADO CON 1 (UNA) VARILLA DE 3/8" DE DIAMETRO, CONCRETO F'C= 150KG/CM2 INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	ML	235.200	51,163.06	51,163.06

ATENTAMENTE:


C. STEPHANY PALOMA ALVARADO MACHADO
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, URBANISMO Y ECOLOGIA
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

FECHA DE INICIO: 04/12/2025

FECHA DE TERM.: 30/12/2025

PLAZO DE EJECUCIÓN: 27 DIAS NAT



Stephany Paloma Alvarado Machado

Calle Ernestina Zazueta #1612 C.P. 81228
Col. Tepeca, Los Mochis, Sinaloa.
Tel. Cel. 668 130 7385R.F.C. AAMS950703AQ4
e-mail: ritoalvarado09@hotmail.com

MUNICIPIO DE AHOME
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, URBANISMO Y ECOLOGIA

Razon Social: STEPHANY PALOMA ALVARADO MACHADO

DESCRIPCION GENERAL DE LA OBRA:

(092AH25PR) CONSTRUCCION DE 14 CUARTOS DORMITORIO (17.95 M2) EN DISTINTAS LOCALIDADES DE LA SINDICATURA CENTRAL, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.

(094AH25PR) CONSTRUCCION DE 08 CUARTOS DORMITORIO (17.95 M2) EN DISTINTAS LOCALIDADES DE LA SINDICATURA TOPOLOBAMPO, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.

ANEXO ECONOMICO AE-10


FECHA:
04 DE DICIEMBRE DEL 2025

LICITACION PUBLICA NACIONAL No.:
AHO-SOP-LPN-FAISMUN-VIV-03-25

PROGRAMA GENERAL DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS CONFORME AL CATÁLOGO DE CONCEPTOS CON SUS EROGACIONES CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO MENSUALMENTE

CLAVE	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	IMPORTE TOTAL PESOS	2025 Diciembre
3.05	DALA DE CERRAMIENTO DE 12X20 HASTA 12 X 30 CM. PROMEDIO, ACABADO APARENTE ARMADO CON ARMEX 12X12-4 Y 12X20-4 (SEGÚN PLANO DE PROYECTO), CONCRETO F'C=200 KG/CM2, INCLUYE: CIMBRA Y ACABADO APARENTE CON TUINO DE 1", DESCIMBRA, VIBRADO, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTAS.	ML	199.920	154,120.33	154,120.33
3.06	CADENA DE BLOCK "U" DE 12X20X40 CM. REFORZADA CON UNA VARILLA DE 3/8, ACABADO APARENTE ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA PROPORCIÓN 1:4, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA EQUIPO Y HERRAMIENTA.	ML	20.020	6,636.23	6,636.23
LOSAS					
4.01	LOSA DE CONCRETO DE 10 CM. DE ESPESOR, INCLUYE: CIMBRA ACABADO APARENTE CON CIMBRAPLAY DE PINO DE 16 MM. REFORZADA CON VARILLA # 3 Y MALLA ELECTRO SOLDADA 6X6-6-6, COLOCACIÓN DE SILLETAS SEGÚN NORMA Y ESPECIFICACIÓN, CONCRETO F'C=200 KG/CM2 FABRICADO CON REVOLVEDORA Y ACABADO PLANEADO, PARA RECIBIR IMPERMEABILIZANTE, DESCIMBRA, DETALLADO FINO PARTE POSTERIOR CON MORTERO, TUINO DE 1" PARA GOTERO, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M2	251.300	519,117.95	519,117.95
4.02	CURADO PARA SUPERFICIE DE CONCRETO A BASE DE CURACRETO BLANCO, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, MANDO INTERMEDIO Y HERRAMIENTA MENOR, DESPERDICIOS.	M2	251.300	8,885.97	8,885.97
INSTALACIÓN ELÉCTRICA					
5.01	INSTALACIÓN ELÉCTRICA A BASE DE TUBO POLIDUCTO NARANJA DE 1/2", CAJAS DE REGISTRO DE LAMINA GALVANIZADA, ROSETAS DE PORCELANA DE 3" Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS MARCA MODUS Ó SIMILAR EN CALIDAD, INCLUYE: PRUEBA DEL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LA INSTALACIÓN, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, SEGÚN PLANO DE PROYECTO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	LOTE	14.000	36,035.86	36,035.86
CANCELERIA					
6.01	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE VENTANA DE ALUMINIO NATURAL LÍNEA 1 1/2", DE 1.25X1.04 M., FORMADA DE UN FIJO Y UN CORREDIZO, INCLUYE: MOSQUITERO, CRISTAL CLARO DE 3 MM., MATERIALES DE FIJACIÓN, SELLADOR, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	PZA	14.000	32,061.82	32,061.82

ATENTAMENTE:



Paloma Alvarado
C. STEPHANY PALOMA ALVARADO MACHADO
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

FECHA DE INICIO: 04/12/2025
FECHA DE TERM.: 30/12/2025
PLAZO DE EJEC.: 27 DIAS NAT.



Stephany Paloma Alvarado Machado

Calle Ernestina Zazueta #1612 C.P. 81228
Col. Tepeca, Los Mochis, Sinaloa.
Tel. Cel. 668 130 7385R.F.C. AAMS950703AQ4
e-mail: ritoalvarado09@hotmail.com

MUNICIPIO DE AHOME
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, URBANISMO Y ECOLOGIA

Razon Social: STEPHANY PALOMA ALVARADO MACHADO

DESCRIPCION GENERAL DE LA OBRA:

(092AH25PR) CONSTRUCCION DE 14 CUARTOS DORMITORIO (17.95 M2) EN DISTINTAS LOCALIDADES DE LA SINDICATURA CENTRAL, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.

(094AH25PR) CONSTRUCCION DE 08 CUARTOS DORMITORIO (17.95 M2) EN DISTINTAS LOCALIDADES DE LA SINDICATURA TOPOLOBAMPO, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.

ANEXO ECONOMICO AE-10

FECHA:
04 DE DICIEMBRE DEL 2025

LICITACION PUBLICA NACIONAL No.:
AHO-SOP-LPN-FAISMUN-VIV-03-25

PROGRAMA GENERAL DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS CONFORME AL CATÁLOGO DE CONCEPTOS CON SUS EROGACIONES CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO MENSUALMENTE

CLAVE	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	IMPORTE	
				TOTAL	2025
				PESOS	Diciembre
	DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.				
	HERRERIA				
7.01	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PROTECCIÓN PARA VENTANA DE 1.25 X 1.04 MTS. FABRICADA CON MARCO DE SOLERA DE 1 1/2" x 1/8" Y REDONDO DE 1/2", PINTADO CON PRIMARIO ANTICORROSIVO Y TERMINADO CON ESMALTE COLOR BLANCO, INCLUYE: MATERIAL Y MANO DE OBRA NECESARIO, PARA SU FABRICACIÓN Y COLOCACIÓN Y HERRAMIENTA MENOR, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	14.000	34,830.74	34,830.74
7.02	SUMINISTRO, FABRICACIÓN Y COLOCACIÓN DE MARCO EMPOTRADO 5 CM. EN LOSA DE CIMENTACIÓN, DE 97 CM. DE ANCHO X 217 CM. DE ALTURA, CON PERFIL TUBULAR No. 129 CAL. 20, PINTADO CON PRIMARIO ANTICORROSIVO Y TERMINADO CON ESMALTE COLOR BLANCO, INCLUYE: RESANE EN PISO PULIDO CON MORTERO CEMENTO ARENA 1:3, BISAGRAS LATONADAS DE 3" (3 PZAS) SOLDADAS A PERFIL, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	14.000	26,172.44	26,172.44
	CARPINTERIA				
8.01	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PUERTA MULTYPANEL LISA DE 0.90 X 2.10 M. DE ALTURA O SIMILAR, INCLUYE: PHILLIPS POMO GAMMA BAÑO ACERO INOXIDABLE O SIMILAR, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	14.000	45,895.08	45,895.08
	VARIOS				
9.01	IMPERMEABILIZACIÓN DE LOSA DE AZOTEA A BASE DE IMPERMEABILIZANTE AFIBRATADO, INCLUYE: LIMPIEZA DE SUPERFICIE, SELLADO DE GRIETAS CON CEMENTO PLÁSTICO ACRÍLICO, APLICACIÓN DE UNA CAPA DE SELLADOR ACRÍLICO DILUIDO CON AGUA EN PROPORCIÓN 1:3 CON CEPILLO DE IXTLE, UNA CAPA DE THERMOTEK RESIDENCIAL 5 AÑOS O SIMILAR, UNA VEZ SECA LA PRIMERA CAPA SE APLICA UNA SEGUNDA CAPA DE THERMOTEK RESIDENCIAL 5 AÑOS O SIMILAR.	M2	251.300	39,049.51	39,049.51

ATENTAMENTE:

Paloma Alvarado
C. STEPHANY PALOMA ALVARADO MACHADO



FECHA DE INICIO: 04/12/2025
FECHA DE TERM.: 30/12/2025
PLAZO DE EJEC.: 27 DIAS NAT



Stephany Paloma Alvarado Machado

Calle Ernestina Zazueta #1612 C.P. 81228
Col. Tepeca, Los Mochis, Sinaloa.
Tel. Cel. 668 130 7385R.F.C. AAMS950703AQ4
e-mail: ritoalvarado09@hotmail.com

MUNICIPIO DE AHOME
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, URBANISMO Y ECOLOGIA

Razon Social: STEPHANY PALOMA ALVARADO MACHADO

DESCRIPCION GENERAL DE LA OBRA:

(092AH25PR) CONSTRUCCION DE 14 CUARTOS DORMITORIO (17.95 M2) EN DISTINTAS

LOCALIDADES DE LA SINDICATURA CENTRAL, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.

(094AH25PR) CONSTRUCCION DE 08 CUARTOS DORMITORIO (17.95 M2) EN DISTINTAS LOCALIDADES

DE LA SINDICATURA TOPOLOBAMPO, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.

ANEXO ECONOMICO AE-10

FECHA:

04 DE DICIEMBRE DEL 2025

LICITACION PUBLICA NACIONAL No.:

AHO-SOP-LPN-FAISMUN-VIV-03-25

PROGRAMA GENERAL DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS CONFORME AL CATÁLOGO DE CONCEPTOS CON SUS EROGACIONES CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO MENSUALMENTE

CLAVE	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	IMPORTE TOTAL PESOS	2025 Diciembre
9.02	SUMINISTRO É INSTALACIÓN DE PLACA EN MURO AL FRENTE EN UN LUGAR VISIBLE, A BASE DE ACRÍLICO DE 15X30 CM. CON CALCOMANÍA EN VINIL Y LEYENDA SEGÚN PROGRAMA, FIJADA CON PIJAS Y TAQUETES DE PLÁSTICO, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA NECESARIAS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	14.000	2,138.64	2,138.64
9.03	PINTURA VINÍLICA EN MUROS INTERIORES Y PLAFONES A DOS MANOS, CON BROCHA Y/O RODILLO, MARCA BERELINTE DE BEREL O CALIDAD SIMILAR, INCLUYE: PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE PROTEGIENDO PISOS, HERRERÍA Y CANCELERÍA, APLICACIÓN DE SELLADOR, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y ANDAMIOS, COLORES INDICADOS POR OBRAS PÚBLICAS.	M2	573.580	60,248.84	60,248.84
9.04	PINTURA VINÍLICA EN MUROS EN EXTERIORES, BOQUILLAS EN PUERTAS Y VENTANAS Y CORTELOSA, VOLADOS, CON BROCHA Y/O RODILLO, A DOS MANOS, MARCA BERELINTE DE BEREL O CALIDAD SIMILAR, INCLUYE: PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE PROTEGIENDO PISOS, HERRERÍA Y CANCELERÍA, APLICACIÓN DE SELLADOR, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, COLORES INDICADOS POR OBRAS PÚBLICAS.	M2	560.420	58,866.52	58,866.52
9.05	MOLDURA DE APLANADO RESALTADO DE 10 CM. DE ANCHO Y 2.00 CM DE ESPESOR, ACABADO FLOTEADO DE MEZCLA EN PERIMETRO DE VENTANA, CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	ML	69.720	20,410.53	20,410.53
BANQUETA DE ACCESO					
9.06.1	RELLENO CON MATERIAL INERTE (BALASTRE CRIBADO) COMPACTADO AL 90 % PROCTOR, POR MEDIOS MECÁNICOS EN CAPAS DE 15 CM. DE ESPESOR, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIAL Y HERRAMIENTA MENOR.	M3	10.780	10,505.86	10,505.86
9.06.2	EXCAVACIÓN A MANO EN DENTELLÓN DE BANQUETA, EN MATERIAL TIPO "B" EN SECO, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M3	2.520	975.82	975.82
9.06.3	DENTELLÓN TIPO DE 0.20 X 0.15 CON ARMEX 15X20-4 F'C= 150 KG/CM2. INCLUYE: RECORTES, CIMBRA, COLADO DE CONCRETO, ACABADO CON VOLTEADOR, CURADO, DESCIMBRADO Y LIMPIEZA DE FORMAS.	ML	77.840	37,767.19	37,767.19

ATENTAMENTE:

Paloma Alvarado
C. STEPHANY PALOMA ALVARADO MACHADO



FECHA DE INICIO: 04/12/2025

FECHA DE TERM.: 30/12/2025

PLAZO DE EJEC.: 27 DIAS NAT.



Stephany Paloma Alvarado Machado

Calle Ernestina Zazueta #1612 C.P. 81228
Col. Tepeca, Los Mochis, Sinaloa.
Tel. Cel. 668 130 7385R.F.C. AAMS950703AQ4
e-mail: ritoalvarado09@hotmail.com

MUNICIPIO DE AHOME
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, URBANISMO Y ECOLOGIA

Razon Social: STEPHANY PALOMA ALVARADO MACHADO

DESCRIPCION GENERAL DE LA OBRA:

(092AH25PR) CONSTRUCCION DE 14 CUARTOS DORMITORIO (17.95 M2) EN DISTINTAS

LOCALIDADES DE LA SINDICATURA CENTRAL, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.

(094AH25PR) CONSTRUCCION DE 08 CUARTOS DORMITORIO (17.95 M2) EN DISTINTAS LOCALIDADES
DE LA SINDICATURA TOPOLOBAMPO, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.

ANEXO ECONOMICO AE-10

FECHA:

04 DE DICIEMBRE DEL 2025

LICITACION PUBLICA NACIONAL No.:

AHO-SOP-LPN-FAISMUN-VIV-03-25

PROGRAMA GENERAL DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS CONFORME AL CATÁLOGO DE CONCEPTOS CON SUS EROGACIONES CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO MENSUALMENTE

CLAVE	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	IMPORTE TOTAL PESOS	2025 Diciembre
9.06.4	BANQUETA DE CONCRETO DE 10 CM. DE ESPESOR, ARMADO CON MALLA ELECTROSOLDADA 6-6/10-10, CONCRETO F'c=150 KG/CM2 H.O., ACABADO ESCOBILLADO, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, CIMBRA, DESCIMBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M2	54.040	40,848.84	40,848.84
9.06.5	CURADO PARA SUPERFICIE DE CONCRETO A BASE DE CURACRETO BLANCO, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, MANDO INTERMEDIO Y HERRAMIENTA MENOR, DESPERDICIOS.	M2	54.040	1,911.94	1,911.94
9.06.6	MANIOBRA Y MOVIMIENTO DE MATERIALES PARA CONSTRUCCIÓN EN SITIO, ACARREO EN CARRETILLA, CON PERSONAL Y EQUIPO, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	LOTE	14.000	12,391.12	12,391.12
VIVIENDA (CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO).					
TRABAJOS PRELIMINARES					
1.01	TRAZO Y NIVELACIÓN MANUAL DEL ÁREA POR CONSTRUIR PARA ESTABLECER EJES, BANCOS DE NIVEL Y REFERENCIAS, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M2	139.600	1,162.87	1,162.87
1.02	SUMINISTRO DE MATERIAL INERTE (BALASTRE FINO GRADUADO) CALIDAD SUB-BASE PARA COLOCAR EN RELLENO BAJO PISOS, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M3	26.720	20,922.03	20,922.03
1.03	RELLENO COMPACTADO DE MATERIAL DE BANCO (BALASTRE FINO GRADUADO) POR MEDIOS MECÁNICOS PARA COLOCAR EN RELLENO BAJO PISOS Y BANQUETAS, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M3	26.720	6,305.65	6,305.65
1.04	EXCAVACIÓN A MANO EN TRABES DE CIMENTACIÓN, EN MATERIAL TIPO "B" EN SECO, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M3	1.360	526.63	526.63
CIMENTACION					
2.01	TRABE DE CIMENTACIÓN DE 12 CM. DE BASE, 20 CM. DE ALTURA CON 10 CM. DENTRO DE LOSA DE CIMENTACIÓN	ML	114.240	43,491.17	43,491.17

ATENTAMENTE:



SECRETARIA DE OBRAS
PÚBLICAS, URBANISMO Y
ECOLOGIA

C. STEPHANY PALOMA ALVARADO MACHADO

DIRECCIÓN DE
OBRAS PÚBLICAS

FECHA DE INICIO: 04/12/2025

FECHA DE TERM.: 30/12/2025

PLAZO DE EJECUCIÓN: 27 DIAS NAT



Stephany Paloma Alvarado Machado

Calle Ernestina Zazueta #1612 C.P. 81228
Col. Tepeca, Los Mochis, Sinaloa.
Tel. Cel. 668 130 7385 R.F.C. AAMS950703AQ4
e-mail: ritoalvarado09@hotmail.com

MUNICIPIO DE AHOME
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, URBANISMO Y ECOLOGIA

Razon Social: STEPHANY PALOMA ALVARADO MACHADO

DESCRIPCION GENERAL DE LA OBRA:

(092AH25PR) CONSTRUCCION DE 14 CUARTOS DORMITORIO (17.95 M2) EN DISTINTAS LOCALIDADES DE LA SINDICATURA CENTRAL, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.

(094AH25PR) CONSTRUCCION DE 08 CUARTOS DORMITORIO (17.95 M2) EN DISTINTAS LOCALIDADES DE LA SINDICATURA TOPOLOBAMPO, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.

ANEXO ECONOMICO AE-10

FECHA:
04 DE DICIEMBRE DEL 2025

LICITACION PUBLICA NACIONAL No.:
AHO-SOP-LPN-FAISMUN-VIV-03-25

PROGRAMA GENERAL DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS CONFORME AL CATÁLOGO DE CONCEPTOS CON SUS EROGACIONES CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO MENSUALMENTE

CLAVE	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	IMPORTE TOTAL PESOS	2025 Diciembre
	CONCRETO F'C=200 KG/CM2 T.M.A. DE 38 MM. REFUERZO HORIZONTAL CON ARMEX 12X20-4 Y BASTONES EN L CON ACERO No. 3 A CADA 40 CM. INCLUYE: CIMBRA, ARMADO, COLADO, MATERIALES NECESARIOS Y MANO DE OBRA.				
2.02	PISO DE CONCRETO CON F'C=200 KG/CM2 ARMADO CON MALLALACK 6/6-6/6 DE 10 CM. DE ESPESOR ACABADO PULIDO, INCLUYE: COLOCACIÓN DE SILLETAS SEGÚN NORMA Y ESPECIFICACIÓN, MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M2	108.720	79,811.35	79,811.35
2.03	SUMINISTRO, HABILITADO Y COLOCACIÓN DE VARILLA DE 3/8", F'Y=4200 KG/CM2., EN TRABES Y LOSAS, INCLUYE: HABILITADO, ARMADO, GANCHOS, TRASLAPES, DESPERDICIOS, COLOCACIÓN, Y MANO DE OBRA.	TON	0.064	2,764.40	2,764.40
2.04	ANCLAJE DE CASTILLOS (C-1) DE 12X12 CM. A UNA PROFUNDIDAD DE 20 CM. REFORZADO CON ARMEX 12X12-4. INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	PZA	16.000	2,279.20	2,279.20
2.05	ANCLAJE DE CASTILLOS (C-2) DE 12X19 CM. A UNA PROFUNDIDAD DE 20 CM. REFORZADO CON ARMEX 12X20-4. INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	PZA	16.000	2,279.20	2,279.20
2.06	ANCLAJE DE CASTILLOS INTEGRAL (CI) A UNA PROFUNDIDAD DE 20 CM. CON 1 VARILLA DE 3/8" .	PZA	64.000	6,139.52	6,139.52
2.07	CURADO PARA SUPERFICIE DE CONCRETO A BASE DE CURACRETO BLANCO, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, MANDO INTERMEDIO Y HERRAMIENTA MENOR, DESPERDICIOS.	M2	108.720	3,844.34	3,844.34
ESTRUCTURA					
3.01	MURO DE BLOCK DE 12X20X40 CM. ACABADO APARENTE A DOS CARAS, ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA PROPORCIÓN 1:4, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M2	200.640	134,478.96	134,478.96
3.02	CASTILLO (C-1) DE 12X12 CM. DE SECCIÓN DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2 REFORZADO CON ACERO ARMEX 12X12-4, INCLUYE: CIMBRA Y ACABADO APARENTE CON TUINO DE 1", ARMADO, COLADO, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA .	ML	33.920	15,676.47	15,676.47

ATENTAMENTE:

Paloma Alvarado
C. STEPHANY PALOMA ALVARADO MACHADO



FECHA DE INICIO: 04/12/2025
FECHA DE TERM.: 30/12/2025
PLAZO DE EJEC: 27 DIAS NAT



Stephany Paloma Alvarado Machado

Calle Ernestina Zazueta #1612 C.P. 81228
Col. Tepeca, Los Mochis, Sinaloa.
Tel. Cel. 668 130 7385R.F.C. AAMS950703AQ4
e-mail: rifoalvarado09@hotmail.com

MUNICIPIO DE AHOME
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, URBANISMO Y ECOLOGIA

Razon Social: STEPHANY PALOMA ALVARADO MACHADO

ANEXO ECONOMICO AE-10

DESCRIPCION GENERAL DE LA OBRA:

FECHA:

04 DE DICIEMBRE DEL 2025

(092AH25PR) CONSTRUCCION DE 14 CUARTOS DORMITORIO (17.95 M2) EN DISTINTAS LOCALIDADES DE LA SINDICATURA CENTRAL, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.

(094AH25PR) CONSTRUCCION DE 08 CUARTOS DORMITORIO (17.95 M2) EN DISTINTAS LOCALIDADES DE LA SINDICATURA TOPOLOBAMPO, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.

LICITACION PUBLICA NACIONAL No.:
AHO-SOP-LPN-FAISMUN-VIV-03-25

PROGRAMA GENERAL DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS CONFORME AL CATÁLOGO DE CONCEPTOS CON SUS EROGACIONES CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO MENSUALMENTE

CLAVE	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	IMPORTE TOTAL PESOS	2025 Diciembre
3.03	CASTILLO (C-2) DE 12X19 CM. DE SECCIÓN DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2 REFORZADO CON ACERO ARMEX 12X20-4, INCLUYE: CIMBRA Y ACABADO APARENTE CON TUINO DE 1", ARMADO, COLADO, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	ML	33.600	18,049.58	18,049.58
3.04	CASTILLO INTEGRAL (CI) EN BLOCK HUECO DE 12X20X40 CMS. ARMADO CON 1 (UNA) VARILLA DE 3/8" DE DIAMETRO, CONCRETO F'C= 150KG/CM2 INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	ML	134.400	29,236.03	29,236.03
3.05	DALA DE CERRAMIENTO DE 12X20 HASTA 12 X 30 CM. PROMEDIO, ACABADO APARENTE ARMADO CON ARMEX 12X12-4 Y 12X20-4 (SEGÚN PLANO DE PROYECTO), CONCRETO F'C=200 KG/CM2, INCLUYE: CIMBRA Y ACABADO APARENTE CON TUINO DE 1", DESCIMBRA, VIBRADO, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTAS.	ML	114.240	88,068.76	88,068.76
3.06	CADENA DE BLOCK "U" DE 12X20X40 CM. REFORZADA CON UNA VARILLA DE 3/8, ACABADO APARENTE ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA PROPORCIÓN 1:4, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA EQUIPO Y HERRAMIENTA.	ML	11.440	3,792.13	3,792.13
LOSAS					
4.01	LOSA DE CONCRETO DE 10 CM. DE ESPESOR, INCLUYE: CIMBRA ACABADO APARENTE CON CIMBRAPLAY DE PINO DE 16 MM. REFORZADA CON VARILLA # 3 Y MALLA ELECTRO SOLDADA 6X6-6-6, COLOCACIÓN DE SILLETAS SEGÚN NORMA Y ESPECIFICACIÓN, CONCRETO F'C=200 KG/CM2 FABRICADO CON REVOLVEDORA Y ACABADO PLANEADO, PARA RECIBIR IMPERMEABILIZANTE, DESCIMBRA, DETALLADO FINO PARTE POSTERIOR CON MORTERO, TUINO DE 1" PARA GOTERO, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M2	143.600	296,638.83	296,638.83
4.02	CURADO PARA SUPERFICIE DE CONCRETO A BASE DE CURACRETO BLANCO, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, MANDO INTERMEDIO Y HERRAMIENTA MENOR, DESPERDICIOS.	M2	143.600	5,077.70	5,077.70
INSTALACIÓN ELÉCTRICA					
5.01	INSTALACIÓN ELÉCTRICA A BASE DE TUBO POLIDUCTO NARANJA DE 1/2", CAJAS DE REGISTRO DE LAMINA GALVANIZADA,	LOTE	8.000	20,591.92	20,591.92

ATENTAMENTE:

Paloma Alvarado
SECRETARIA DE OBRAS
PUBLICAS, URBANISMO Y
ECOLOGIA
DIRECCIÓN DE
OBRAS PÚBLICAS

FECHA DE INICIO: 04/12/2025

FECHA DE TERM.: 30/12/2025

PLAZO DE EJEC: 27 DIAS NAT



Stephany Paloma Alvarado Machado

Calle Ernestina Zazueta #1612 C.P. 81228
Col. Tepeca, Los Mochis, Sinaloa.
Tel. Cel. 668 130 7385R.F.C. AAMS950703AQ4
e-mail: ritoalvarado09@hotmail.com

MUNICIPIO DE AHOME
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, URBANISMO Y ECOLOGIA

Razon Social: STEPHANY PALOMA ALVARADO MACHADO

DESCRIPCION GENERAL DE LA OBRA:

(092AH25PR) CONSTRUCCION DE 14 CUARTOS DORMITORIO (17.95 M2) EN DISTINTAS LOCALIDADES DE LA SINDICATURA CENTRAL, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.

(094AH25PR) CONSTRUCCION DE 08 CUARTOS DORMITORIO (17.95 M2) EN DISTINTAS LOCALIDADES DE LA SINDICATURA TOPOLOBAMPO, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.

ANEXO ECONOMICO AE-10

FECHA:
04 DE DICIEMBRE DEL 2025

LICITACION PUBLICA NACIONAL No.:
AHO-SOP-LPN-FAISMUN-VIV-03-25

PROGRAMA GENERAL DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS CONFORME AL CATÁLOGO DE CONCEPTOS CON SUS EROGACIONES CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO MENSUALMENTE

CLAVE	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	IMPORTE TOTAL PESOS	2025 Diciembre
	ROSETAS DE PORCELANA DE 3" Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS MARCA MODUS Ó SIMILAR EN CALIDAD, INCLUYE: PRUEBA DEL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LA INSTALACIÓN, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, SEGÚN PLANO DE PROYECTO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.				
	CANCELERIA				
6.01	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE VENTANA DE ALUMINIO NATURAL LÍNEA 1 1/2", DE 1.25X1.04 M., FORMADA DE UN FIJO Y UN CORREDIZO, INCLUYE: MOSQUITERO, CRISTAL CLARO DE 3 MM., MATERIALES DE FIJACIÓN, SELLADOR, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	8.000	18,321.04	18,321.04
	HERRERIA				
7.01	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PROTECCIÓN PARA VENTANA DE 1.25 X 1.04 MTS. FABRICADA CON MARCO DE SOLERA DE 1 1/2" x 1/8" Y REDONDO DE 1/2", PINTADO CON PRIMARIO ANTICORROSIVO Y TERMINADO CON ESMALTE COLOR BLANCO, INCLUYE: MATERIAL Y MANO DE OBRA NECESARIO, PARA SU FABRICACIÓN Y COLOCACIÓN Y HERRAMIENTA MENOR, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	8.000	19,903.28	19,903.28
7.02	SUMINISTRO, FABRICACIÓN Y COLOCACIÓN DE MARCO EMPOTRADO 5 CM. EN LOSA DE CIMENTACIÓN, DE 97 CM. DE ANCHO X 217 CM. DE ALTURA, CON PERFIL TUBULAR No. 129 CAL. 20, PINTADO CON PRIMARIO ANTICORROSIVO Y TERMINADO CON ESMALTE COLOR BLANCO, INCLUYE: RESANE EN PISO PULIDO CON MORTERO CEMENTO ARENA 1:3, BISAGRAS LATONADAS DE 3" (3 PZAS) SOLDADAS A PERFIL, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	8.000	14,955.68	14,955.68
	CARPINTERIA				
8.01	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PUERTA MULTYPANEL LISA DE 0.90 X 2.10 M. DE ALTURA O SIMILAR, INCLUYE: PHILLIPS POMO GAMMA BAÑO ACERO INOXIDABLE O SIMILAR, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	8.000	26,225.76	26,225.76

ATENTAMENTE:

Paloma Alvarado
C. STEPHANY PALOMA ALVARADO MACHADO
SECRETARIA DE OBRAS
PÚBLICAS, URBANISMO Y
ECOLOGIA
DIRECCIÓN DE
OBRAS PÚBLICAS

FECHA DE INICIO: 04/12/2025
FECHA DE TERM.: 30/12/2025
PLAZO DE EJECUCIÓN: 27 DIAS NAT



Stephany Paloma Alvarado Machado

Calle Ernestina Zazueta #1612 C.P. 81228
Col. Tepeca, Los Mochis, Sinaloa.
Tel. Cel. 668 130 7385R.F.C. AAMS950703AQ4
e-mail: ritoalvarado09@hotmail.com

MUNICIPIO DE AHOME
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, URBANISMO Y ECOLOGIA

Razon Social: STEPHANY PALOMA ALVARADO MACHADO

DESCRIPCION GENERAL DE LA OBRA:

(092AH25PR) CONSTRUCCION DE 14 CUARTOS DORMITORIO (17.95 M2) EN DISTINTAS LOCALIDADES DE LA SINDICATURA CENTRAL, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.

(094AH25PR) CONSTRUCCION DE 08 CUARTOS DORMITORIO (17.95 M2) EN DISTINTAS LOCALIDADES DE LA SINDICATURA TOPOLOBAMPO, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.

ANEXO ECONOMICO AE-10

FECHA:
04 DE DICIEMBRE DEL 2025

LICITACION PUBLICA NACIONAL No.:
AHO-SOP-LPN-FAISMUN-VIV-03-25

PROGRAMA GENERAL DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS CONFORME AL CATÁLOGO DE CONCEPTOS CON SUS EROGACIONES CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO MENSUALMENTE

CLAVE	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	IMPORTE TOTAL PESOS	2025 Diciembre
VARIOS					
9.01	IMPERMEABILIZACIÓN DE LOSA DE AZOTEA A BASE DE IMPERMEABILIZANTE AFIBRATADO, INCLUYE: LIMPIEZA DE SUPERFICIE, SELLADO DE GRIETAS CON CEMENTO PLÁSTICO ACRÍLICO, APLICACIÓN DE UNA CAPA DE SELLADOR ACRÍLICO DILUIDO CON AGUA EN PROPORCIÓN 1:3 CON CEPILLO DE IXTLE, UNA CAPA DE THERMOTEK RESIDENCIAL 5 AÑOS O SIMILAR, UNA VEZ SECA LA PRIMERA CAPA SE APLICA UNA SEGUNDA CAPA DE THERMOTEK RESIDENCIAL 5 AÑOS O SIMILAR.	M2	143.600	22,314.00	22,314.00
9.02	SUMINISTRO É INSTALACIÓN DE PLACA EN MURO AL FRENTE EN UN LUGAR VISIBLE, A BASE DE ACRÍLICO DE 15X30 CM. CON CALCOMANÍA EN VINIL Y LEYENDA SEGÚN PROGRAMA, FIJADA CON PIJAS Y TAQUETES DE PLÁSTICO, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA NECESARIAS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	8.000	1,222.08	1,222.08
9.03	PINTURA VINÍLICA EN MUROS INTERIORES Y PLAFONES A DOS MANOS, CON BROCHA Y/O RODILLO, MARCA BERELINTE DE BEREL O CALIDAD SIMILAR, INCLUYE: PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE PROTEGIENDO PISOS, HERRERÍA Y CANCELERÍA, APLICACIÓN DE SELLADOR, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y ANDAMIOS, COLORES INDICADOS POR OBRAS PÚBLICAS.	M2	327.760	34,427.91	34,427.91
9.04	PINTURA VINÍLICA EN MUROS EN EXTERIORES, BOQUILLAS EN PUERTAS Y VENTANAS Y CORTELOSA, VOLADOS, CON BROCHA Y/O RODILLO, A DOS MANOS, MARCA BERELINTE DE BEREL Ó CALIDAD SIMILAR, INCLUYE: PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE PROTEGIENDO PISOS, HERRERÍA Y CANCELERÍA, APLICACIÓN DE SELLADOR, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, COLORES INDICADOS POR OBRAS PÚBLICAS.	M2	320.240	33,638.01	33,638.01
9.05	MOLDURA DE APLANADO RESALTADO DE 10 CM. DE ANCHO Y 2.00 CM DE ESPESOR, ACABADO FLOTEADO DE MEZCLA EN PERIMETRO DE VENTANA, CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA.	ML	39.840	11,663.16	11,663.16
BANQUETA DE ACCESO					
9.06.1	RELLENO CON MATERIAL INERTE (BALASTRE CRIBADO) COMPACTADO AL 90 % PROCTOR, POR MEDIOS MECANICOS EN	M3	6.160	6,003.35	6,003.35

ATENTAMENTE:



SECRETARIA DE OBRAS
PÚBLICAS, URBANISMO Y
ECOLOGIA

Paloma Alvarado
C. STEPHANY PALOMA ALVARADO MACHADO
DIRECCIÓN DE
OBRAS PÚBLICAS

FECHA DE INICIO: 04/12/2025
FECHA DE TERM.: 30/12/2025
PLAZO DE EJECUCIÓN: 27 DIAS NAT



Stephany Paloma Alvarado Machado

Calle Ernestina Zazueta #1612 C.P. 81228
Col. Tepeca, Los Mochis, Sinaloa.
Tel. Cel. 668 130 7385R.F.C. AAMS950703AQ4
e-mail: rifoalvarado09@hotmail.com

MUNICIPIO DE AHOME
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, URBANISMO Y ECOLOGIA

Razon Social: STEPHANY PALOMA ALVARADO MACHADO

DESCRIPCION GENERAL DE LA OBRA:

(092AH25PR) CONSTRUCCION DE 14 CUARTOS DORMITORIO (17.95 M2) EN DISTINTAS LOCALIDADES DE LA SINDICATURA CENTRAL, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.

(094AH25PR) CONSTRUCCION DE 08 CUARTOS DORMITORIO (17.95 M2) EN DISTINTAS LOCALIDADES DE LA SINDICATURA TOPOLOBAMPO, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.


ANEXO ECONOMICO AE-10

FECHA:
04 DE DICIEMBRE DEL 2025

LICITACION PUBLICA NACIONAL No.:
AHO-SOP-LPN-FAISMUN-VIV-03-25

PROGRAMA GENERAL DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS CONFORME AL CATÁLOGO DE CONCEPTOS CON SUS EROGACIONES CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO MENSUALMENTE

CLAVE	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	IMPORTE TOTAL PESOS	2025 Diciembre
	CAPAS DE 15 CM. DE ESPESOR, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIAL Y HERRAMIENTA MENOR.				
9.06.2	EXCAVACIÓN A MANO EN DENTELLÓN DE BANQUETA, EN MATERIAL TIPO "B" EN SECO, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M3	1.440	557.61	557.61
9.06.3	DENTELLÓN TIPO DE 0.20 X 0.15 CON ARMEX 15X20-4 F'C= 150 KG/CM2. INCLUYE: RECORTES, CIMBRA, COLADO DE CONCRETO, ACABADO CON VOLTEADOR, CURADO, DESCIMBRADO Y LIMPIEZA DE FORMAS.	ML	44.480	21,581.25	21,581.25
9.06.4	BANQUETA DE CONCRETO DE 10 CM. DE ESPESOR, ARMADO CON MALLA ELECTROSOLDADA 6-6/10-10, CONCRETO F'C=150 KG/CM2 H.O., ACABADO ESCOBILLADO, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, CIMBRA, DESCIMBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M2	30.880	23,342.19	23,342.19
9.06.5	CURADO PARA SUPERFICIE DE CONCRETO A BASE DE CURACRETO BLANCO, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, MANDO INTERMEDIO Y HERRAMIENTA MENOR, DESPERDICIOS.	M2	30.880	1,092.53	1,092.53
9.06.6	MANIOBRA Y MOVIMIENTO DE MATERIALES PARA CONSTRUCCIÓN EN SITIO, ACARREO EN CARRETILLA, CON PERSONAL Y EQUIPO, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	LOTE	8.000	7,080.64	7,080.64
TOTAL PARCIAL:				2'814,529.42	2'814,529.42
TOTAL ACUMULADO:					2'814,529.42



ATENTAMENTE:

Paloma Alvarado
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
C. STEPHANY PALOMA ALVARADO MACHADO

FECHA DE INICIO: 04/12/2025

FECHA DE TERM.: 30/12/2025

PLAZO DE EJECUCIÓN: 27 DIAS NAT.



Stephany Paloma Alvarado Machado

Calle Ernestina Zazueta #1612 C.P. 81229
Col. Tepeca, Los Mochis, Sinaloa.
Tel.Cel. 668 130 7385 R.F.C. AAMS950703AQ4
e-mail: ritoalvarado09@outlook.com

LOS MOCHIS, SINALOA, 04 DE DICIEMBRE DEL 2025

C. ARQ. JESUS ERNESTO TAPIA CASTRO
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS.

ASIGNACION DEL SUPERINTENDENTE

POR MEDIO DE LA PRESENTE HAGO DE SU CONOCIMIENTO QUE NUESTRO SUPERINTENDENTE SERA SU SERVIDOR C. ING. FAUSTO ANTONIO COTA SOTO MISMO QUE ESTARA A CARGO DE LA OBRA: (092AH25PR) CONSTRUCCIÓN DE 14 CUARTOS DORMITORIO (17.95 M2) EN DISTINTAS LOCALIDADES DE LA SINDICATURA CENTRAL, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.

CONTRATO No. FAISMUN-VIV-092PR-094PR-AH-2025

PROFESIÓN:

LICENCIATURA EN INGENIERIA CIVIL

CEDULA PROFESIONAL:

No. 5871508

ATENTAMENTE

Paloma Alvarado

C. STEPHANY PALOMA ALVARADO MACHADO
REPRESENTANTE LEGAL





Stephany Paloma Alvarado Machado

Calle Ernestina Zazueta #1612 C.P. 81229
Col. Tepeca, Los Mochis, Sinaloa.
Tel.Cel. 668 130 7385 R.F.C. AAMS950703AQ4
e-mail: ritoalvarado09@outlook.com





H. Ayuntamiento de Ahome
Secretaría de Obras Públicas, Urbanismo y Ecología
Dirección de Obras Públicas

Asunto: Asignación de residente de obra.

Los Mochis, Ahome, Sinaloa, 05 de noviembre del 2025.

ARQ. MIGUEL ÁNGEL CABANILLAS REYES
RESIDENTE DE OBRA ADSCRITO A LA
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, URBANISMO Y ECOLOGÍA
P R E S E N T E.

Por medio del presente, le informo a usted que a partir de la presente fecha estará asignado como residente de obra de la siguiente: **(092AH25PR) CONSTRUCCIÓN DE 14 CUARTOS DORMITORIO (17.95M2) EN DISTINTAS LOCALIDADES DE LA SINDICATURA CENTRAL, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.**

Número de contrato: FAISMUN-VIV-092PR-094PR-AH-2025.

Fecha: 04 de noviembre de 2025.

Al mismo tiempo le encomiendo para que de manera coordinada con el contratista respectivo, programen el inicio de los trabajos.

Sin otro asunto en particular y en espera de cualquier aclaración me es grato quedar a sus apreciables órdenes.

ATENTAMENTE

ARQ. JESÚS ERNESTO TAPIA CASTRO
SECRETARÍA DE OBRAS
PÚBLICAS URBANISMO
Y ECOLOGÍA

DIRECCIÓN DE
OBRAS PÚBLICAS

Recibido 05/11/2025

C.c.p.- Stephany Paloma Alvarado Machado/Contratista
C.c.p.- Arq. Miguel Ángel Cabanillas Reyes/Residente de Obra
C.c.p.- Archivo
JETC/AARF



Stephany Paloma Alvarado Machado

Calle Ernestina Zazueta #1612 C.P. 81229
Col. Tepeca, Los Mochis, Sinaloa.
Tel.Cel. 668 130 7385 R.F.C. AAMS950703AQ4
e-mail: ritoalvarado09@outlook.com

LOS MOCHIS, SINALOA, 04 DE DICIEMBRE DEL 2025

C. ARQ. JESUS ERNESTO TAPIA CASTRO
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS.

POR ESTE MEDIO SE LE INFORMA QUE EL INICIO DE OBRA EMPEZÓ A REALIZARSE EN LA FECHA DEL 04 DE DICIEMBRE DEL 2025, EN LOS TRABAJOS CORRESPONDIENTES DE LA OBRA: (092AH25PR) CONSTRUCCIÓN DE 14 CUARTOS DORMITORIO (17.95 M2) EN DISTINTAS LOCALIDADES DE LA SINDICATURA CENTRAL, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.

CONTRATO No. FAISMUN-VIV-092PR-094PR-AH-2025

SIN MAS POR EL MOMENTO, QUEDAMOS DE USTED CON NUESTRA MÁS ATENTAS CONSIDERACIONES.

ATENTAMENTE

Paloma Alvarado

C. STEPHANY PALOMA ALVARADO MACHADO
REPRESENTANTE LEGAL





H. Ayuntamiento de Ahome
Secretaría de Obras Públicas, Urbanismo y Ecología
Dirección de Obras Públicas

Oficio No.: SOP/DOP/2132-25

Asunto: Aviso de Elaboración de Convenio Modificatorio de Plazo.

Los Mochis, Ahome, Sinaloa, 08 de diciembre de 2025.

C. DALVINGH ITURRIOS CORRALES
TITULAR DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL
Presente.-

Por medio del presente, reciba un cordial saludo y a su vez le informo que de conformidad con lo establecido en el Artículo 77, Cuarto Párrafo de la Ley de Obras Públicas y Servicios relacionados con las mismas del Estado de Sinaloa, mismo que en su parte medular señala lo siguiente: "...dentro de los diez días hábiles siguientes a la fecha de iniciación de la obra pública contratada, las dependencias o entidades notificaran a la contraloría dicho inicio; así mismo, deberá informar cualquier modificación, suspensión y terminación de las obras."; ahora bien, con el objeto de dar cumplimiento a la disposición antes señalada, hago de su conocimiento que respecto de los trabajos relativos a la obras que fueron contratadas, según contrato número: **FAISMUN-VIV-092PR-094PR-AH-2025.**, mismas que se detallan a continuación: **(092AH25PR) CONSTRUCCIÓN DE 14 CUARTOS DORMITORIO (17.95 M2) EN DISTINTAS LOCALIDADES DE LA SINDICATURA CENTRAL, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.** **(094AH25PR) CONSTRUCCIÓN DE 08 CUARTOS DORMITORIO (17.95 M2) EN DISTINTAS LOCALIDADES DE LA SINDICATURA TOPOLOBAMPO, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.**

Cuyas obras le fueron adjudicadas al contratista de nombre: **STEPHANY PALOMA ALVARADO MACHADO.**

Procedo a notificarle e informarle de la elaboración del Convenio Modificatorio de Plazo, en base a lo anterior el nuevo plazo de ejecución queda de la siguiente manera:

(092AH25PR)-(094AH25PR)	Contrato:	Convenio Modificatorio de Plazo:
Fecha de inicio:	05/11/2025	04/12/2025
Fecha de termino:	24/12/2025	30/12/2025
Plazo de ejecución:	50 Días naturales.	27 Días naturales.

Sin más por el momento y agradeciendo de antemano la atención prestada a la presente, me despido de usted.

ATENTAMENTE

ARQ. JESÚS ERNESTO TAPIA CASTRO
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS



C.C.P. STEPHANY PALOMA ALVARADO MACHADO/Contratista
C.C.P. Archivo
JETC/AARF



Stephany Paloma Alvarado Machado

Calle Ernestina Zazueta #1612 C.P. 81229
Col. Tepeca, Los Mochis, Sinaloa.
Tel.Cel. 668 130 7385 R.F.C. AAMS950703AQ4
e-mail: ritoalvarado09@outlook.com

LOS MOCHIS, SINALOA, 24 DE DICIEMBRE DEL 2025

C. ARQ. JESUS ERNESTO TAPIA CASTRO
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS.

POR ESTE MEDIO SE LE INFORMA QUE LA TERMINACION DE LA OBRA SE CULMINÓ EN LA FECHA DEL 24 DE DICIEMBRE DEL 2025, EN LOS TRABAJOS CORRESPONDIENTES DE LA OBRA: **(092AH25PR)** CONSTRUCCIÓN DE 14 CUARTOS DORMITORIO (17.95 M2) EN DISTINTAS LOCALIDADES DE LA SINDICATURA CENTRAL, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.

CONTRATO No. FAISMUN-VIV-092PR-094PR-AH-2025

SIN MAS POR EL MOMENTO, QUEDAMOS DE USTED CON NUESTRA MÁS ATENTAS CONSIDERACIONES.

ATENTAMENTE

Paloma Alvarado

C. STEPHANY PALOMA ALVARADO MACHADO
REPRESENTANTE LEGAL





H. AYUNTAMIENTO DE AHOME
SECRETARIA DE BIENESTAR
NUM. DE OBRA: 092AH25PR

CONSTRUCCION DE 14 CUARTOS DORMITORIO PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA
EN DISTINTAS LOCALIDADES DE LA SINDICATURA CENTRAL EN EL MUNICIPIO DE AHOME

NUM	NOMBRE	LOCALIDAD	DOMICILIO	TELÉFONO	COORDENADAS
1	ZAMBRANO VALENZUELA ROSARIO	BACHOMOBAMPO DOS	C. 20 DE NOVIEMBRE POSTE 6	6682741212	25.736794,-109.151592
2	ARMENTA VALENZUELA RAMONA	COMPUERTAS	C. ANTONIO ROSALES POSTE 55	6688638279	25.836898,-109.018749
3	CRUZ PACHECO EDUARDO ALBERTO / PACHECO VALENZUELA CRUZ AIDE	COMPUERTAS	C. ALVARO OBREGON #192 FRENTE AL ESTADIO	6681872812	25.8418972,-109.022471
4	TORRES FLORES SELENE / LLANES BELTRAN JESUS MIGUEL	EL UNO (LA ARROCERA)	ENFRENTE DE LA BODEGA INDAMEX POR ENFRENTE DE LAS VIAS	6731067937 / 6682432581	25.855638,-108.911969
5	MARISCAL ZUÑIGA MANUELA ARACELY	EL UNO (LA ARROCERA)	CALLE UNICA POSTE 24	6682356799	25.85661,-108.911283
6	VARGAS QUINTANA DIANA KARELY / QUINTANA MARCIAL AURORA	LA ARROCERA	POSTE 9 POR LA CALLE PRINCIPAL CERCA DE LOS EXPENDIOS	6681433435	25.852981,-108.914012
7	BERRELLEZA TORRES JOSE EDUARDO	OHUIRA	C. MIGUEL HIDALGO POSTE 9	6682161642 / 6682478607	25.7179819,-108.976271
8	SANCHEZ ANTONIO ABISAIL	OHUIRA	A UN COSTADO DE IGLESIA INDIGENA	6681963153	25.715457,-108.983068
9	CASTAÑEDA JOCOBI MARISOL	OHUIRA	C. HILARIO VICAM POSTE 18	6688612308	25.714431,-108.982567
10	MOROYOQUI COTA KAREN LIZBETH / CERVANTES VALDEZ JESUS ANTONIO	PRIMERO DE MAYO	BLVD. JESUS GARCIA POSTE 101	6681859032 / 6688209034	25.738257,-108.931778
11	REYES CRUZ CLAUDIA PATRICA / REYES OSORIO RAMON	PRIMERO DE MAYO	CALLE LAZARO CARDENAS AL LADO DE ABARROTE PATY, POSTE #918,	6688283775	25.7412663,-108.9375503
12	VALDEZ SOTO MARIA	PRIMERO DE MAYO	C. RAMON IGNACIO RODRIGO CASTRO POSTE 60	6681693023	25.739803,-108.937524
13	ZAMBRANO ROCHA JESSICA JAZMIN	PRIMERO DE MAYO	SEGUNDA CALLE ESQUINA	6681923895	25.737989,-108.938742
14	OLIVO BACA GLORIA RUFINA/ VALENZUELA MOROYOQUI JESUS BERNARDO	PRIMERO DE MAYO	C. CARLOS RAMON GARCIA SIN NUMERO A DOS CASAS DEL OXXO	6688299734 / 6601308884	25.7369587,-108.9365244


SECRETARIA DE OBRAS
PÚBLICAS, URBANISMO Y
ECOLOGÍA
DIRECCIÓN DE
OBRAS PÚBLICAS

Vo.Bo.



Opinión del cumplimiento de obligaciones fiscales

Nombre, denominación o razón social	Sentido
STEPHANY PALOMA ALVARADO MACHADO	POSITIVO

RFC	Folio
AAMS950703AQ4	25NG7440034

Fecha y hora de emisión
03 de diciembre de 2025 a las 17:59 horas

Apreciable contribuyente

Se le informa que en los controles electrónicos institucionales del Servicio de Administración Tributaria, se observa que al momento en que se realiza esta revisión, se encuentra al corriente en los puntos que revisa la opinión del cumplimiento de obligaciones fiscales, contenidos en la Resolución Miscelánea Fiscal vigente; la presente opinión no es una constancia del correcto entero de los impuestos declarados, para lo cual el SAT se reserva sus facultades de verificación previstas en el Código Fiscal de la Federación.

Información importante

MarcaSAT de lunes a viernes de 09:00 a 18:00 hrs, excepto días inhábiles. Atención telefónica: desde cualquier parte del país 55 627 22 728 y para el exterior del país (+52) 55 627 22 728. Vía Chat: <http://chat.sat.gob.mx>

¡Este servicio es gratuito!

Artículos: 17-D, 32-D del CFF; Reglas 2.1.27., 2.1.28., 2.1.36. y 2.1.37. de la RMF.

Cadena Original

||AAMS950703AQ4|25NG7440034|03-12-2025|P||00001088888800000031||

Sello Digital

dN5TeEZbxHXDGArTeMRIRquv7e9IOb5GmpHvdD5WufwTYVovnXsw2lsRq0TKsG3nDmytG29mTJWOp083FdyfSJjce
wEmGregWxp3enIZ8Qvg0EAeEMAgjvXyj2oe1y3+QqG7m01HLVOM82HhZegWWNeKLRKw+RSCuQIEIJX6Ota4Fw63Ex
tZC8+scsBcmva0EelmaTHUo0DCpXYpjRigHsKSi/OvDQP1TiRNxaqAa2fsvWAicO5UTuNGZCR7yZZ0hTXWPB8aMhd
3ckhLvF9XHC7SKT14dl5v60FeFeHXo4LHVpDlmdnpPD+Hewf7a7dR6zSJKpnpPauKRWxru0w==



Contacto:

Av. Hidalgo 77, col. Guerrero, c.p. 06300
Ciudad de México. Atención telefónica
01 55 627 22 728, desde Estados Unidos
y Canadá 01 877 44 88 728.



Gobierno de México

Hacienda
Secretaría de Hacienda y Crédito Público

SAT
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA



Certificado de situación de obligaciones municipales



Folio: 2025-009799

Los Mochis, Sinaloa, 26 de septiembre de 2025

C. ALVARADO MACHADO STEPHANY PALOMA, de la revisión que se realizó en los registros de este H. Ayuntamiento de Ahome, se desprende la información que se detalla a continuación, en la que se puede observar el cumplimiento o incumplimiento de sus obligaciones.


Obligación	Detalles	Aplazamiento
JAPAMA		✓
Transito Municipal		✓
Obras Publicas		✓
Impuesto Predial Urbano		✓
Impuesto Predial Rustico		✓
Licencias de Alcoholes		✓
Anuncios y Publicidad		✓
Por el uso, concesión de casillas y pisos en los mercados		✓
Por el uso de pisos en la vía pública y sitios públicos		✓

ATENTAMENTE

ING. OMAR OSUNA HERNANDEZ
DIRECTOR DE INGRESOS



Cadena de Seguridad
KS+na+mklrVa2uWqP8Qcyi8Q9LM=





SUCANOSA DE C.V.

LABORATORIO PARA LA CONSTRUCCION

C. Ej. Matacahui #357 norte, Fracc. Villa Huites, Los Mochis, Sin. C.P. 81257

Laboratorio: C. J. Félix Serrano #3169, Fracc. Nuevo Horizonte, Los Mochis, Sin. C.P. 81233

PORCENTAJE DE

COMPACTACION EN EL CAMPO

METODO DE PRUEBA: NMX-C-416 ONNCCE-2003

OBRA

(092AH25PR) CONSTRUCCIÓN DE 14 CUARTOS DORMITORIO (17.95 M2) EN DISTINTAS LOCALIDADES DE LA SINDICATURA CENTRAL, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.

LOCALIZACION

COMPUERTAS

CONTRATO: FAISMUN-VIV-092PR-094PR-AH-2025

FECHA 07/12/2025

INFORME: CDC-01/2026

HOJA # 01

ENSAYE No	LOCALIZACION	PROF. DEL SONDEO EN CM	FECHA DE SONDEO	MASA VOL. HUMEDA	HUMEDAD DEL LUGAR	MASA VOL. SECA	MASA VOL. SECA MAXIMA	HUMEDAD OPTIMA	%DE COMPACT	OBSERVACIONES
1	PLATAFORMA ARMENTA VALENZUELA RAMONA #02 RELLENO DE PLATAFORMA	20.0	05-dic-25	1797	24.4	1445	1560	25.0	92.6	SATISFACTORIO



LOS RESULTADOS OBTENIDOS SON SATISFACTORIOS.

OBSERVACIONES

RELLENO DE PLATAFORMA

COMPACTACION ESPECIFICADA

90.00%

COMPACTACION OBTENIDA

92.60%



Vo. Bo.

EL GERENTE DEL LABORATORIO

EL LABORATORISTA

ING. MARINA RODRIGUEZ HERNANDEZ

ING. JOSÉ RAMÓN REYES PORTILLO

TEC. FRANCISCO JAVIER ROMERO ROJO



SUCANOSA DE C.V.

LABORATORIO PARA LA CONSTRUCCION

C. Ej. Matacahui #357 norte, Fracc. Villa Huites, Los Mochis, Sin. C.P. 81257

Laboratorio: C. J. Félix Serrano #3169, Fracc. Nuevo Horizonte, Los Mochis, Sin. C.P. 81233

PORCENTAJE DE

COMPACTACION EN EL CAMPO

METODO DE PRUEBA: NMX-C-416 ONNCE-2003

OBRA

(092AH25PR) CONSTRUCCIÓN DE 14 CUARTOS DORMITORIO (17.95 M2) EN DISTINTAS LOCALIDADES DE LA SINDICATURA CENTRAL, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.

LOCALIZACION

COMPUERTAS

CONTRATO: FAISMUN-VIV-092PR-094PR-AH-2025

FECHA 07/12/2025

INFORME: CDC-01/2026

HOJA # 02

ENSAYE No	LOCALIZACION	PROF. DEL SONDEO EN CM	FECHA DE SONDEO	MASA VOL. HUMEDA	HUMEDAD DEL LUGAR	MASA VOL. SECA	MASA VOL. SECA MAXIMA	HUMEDAD OPTIMA	%DE COMPACT	OBSERVACIONES
1	PLATAFORMA CRUZ PACHECO EDUARDO ALBERTO #03 RELLENO DE PLATAFORMA	20.0	05-dic-25	1808	24.6	1451	1560	25.0	93.0	SATISFACTORIO
LOS RESULTADOS OBTENIDOS SON SATISFACTORIOS.										

OBSERVACIONES

RELLENO DE PLATAFORMA

COMPACTACION ESPECIFICADA

90.00%

COMPACTACION OBTENIDA

93.00%



Vo. Bo.

EL GERENTE DEL LABORATORIO

EL LABORATORISTA

ING. MARINA RODRIGUEZ HERNANDEZ

ING. JOSÉ RAMÓN REYES PORTILLO

TEC. FRANCISCO JAVIER ROMERO ROJO



SUCANOSA DE C.V.

LABORATORIO PARA LA CONSTRUCCION

Oficina: C. Ej. Matacahui #357 norte, Fracc. Villa Huiles, Los Mochis, Sin. C.P. 81257

Laboratorio: C. J. Félix Serrano #3169, Fracc. Nuevo Horizonte, Los Mochis, Sin. C.P. 81233

**CILINDROS DE CONCRETO HIDRÁULICO
INFORME DE RESISTENCIA A COMPRESIÓN**

OBRA	(092AH25PR) CONSTRUCCIÓN DE 14 CUARTOS DORMITORIO (17.95 M2) EN DISTINTAS LOCALIDADES DE LA SINDICATURA CENTRAL, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.	
CONTRATO	FAISMUN-VIV-092PR-094PR-AH-2025	
LOCALIZACIÓN	COMPUERTAS	
INFORME	CDC-02/2026	
ELABORACIÓN	2026-ene-05	HOJA # 01

ESPECIFICACIONES DE PROYECTO

F/c		200	kg/cm²	REVENIMIENTO		10	±	2.5	cm	TIPO DE CONCRETO				NORMAL		T. M. A.		19	mm
MUESTRA No.	CILINDRO No.	FECHA DE MUESTREO	ELEMENTO	UBICACIÓN	CONCRETERA	DIÁMETRO cm	SECCIÓN cm²	FECHA DE ENSAYE	EDAD EN DÍAS	REVENIMIENTO OBTENIDO	CARGA DE RUPTURA		RESISTENCIA		% DE RESISTENCIA				
											N	kgf	MPa	kg/cm²					
1	1	2025-dic-05	CIMENTACIÓN	ARMENTA VALENZUELA RAMONA #02	MEGABLOCK	15.0	176.7	2025-dic-12	7	11	260858	26600	14.8	151	75.3				
	2	2025-dic-05				15.0	176.7	2025-dic-12	7		254974	26000	14.4	147	73.6				
	3	2025-dic-05				15.0	176.7	2026-ene-02	28		376577	38400	21.3	217	108.6				
	4	2025-dic-05				15.0	176.7	2026-ene-02	28		374616	38200	21.2	216	108.1				



OBSERVACIONES:

Ninguna



DATOS DE CALIBRACIÓN

Prensa Marca ALCON. No. Serie 0011.

REFERENCIAS:

NMX-C-155-ONNCCE-2014
NMX-C-161-ONNCCE-2015, NMX-C-156-ONNCCE-2010,
NMX-C-159-ONNCCE-2016, NMX-C-109-ONNCCE-2013,
NMX-C-083-ONNCCE-2014, NMX-C-191-ONNCCE-2015
SCCN-PT01, SCCN-PT02, SCCN-PT03, SCCN-PT04,
SCCN-PT05, SCCN-PT06, SCCN-PT07

GERENTE GENERAL

AUTORIZÓ

ING. JOSE RAMON REYES PORTILLO

JEFE DE LABORATORIO

REALIZÓ

TEC. FRANCISCO JAVIER ROMERO ROJO

CLAVE: SCCN-ITF04

VERSIÓN 01

PÁGINA 1 DE 1

LOS RESULTADOS DEL PRESENTE INFORME SOLO APLICAN A LOS ESPECIMENES ARRIBA INDICADOS.

PROHIBIDA LA REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL DE ESTE DOCUMENTO.



SUCANOSA DE C.V.

LABORATORIO PARA LA CONSTRUCCION

Oficina: C. Ej. Matacahui #357 norte, Fracc. Villa Huiles, Los Mochis, Sin. C.P. 81257

Laboratorio: C. J. Félix Serrano #3169, Fracc. Nuevo Horizonte, Los Mochis, Sin. C.P. 81233

CILINDROS DE CONCRETO HIDRÁULICO INFORME DE RESISTENCIA A COMPRESIÓN

OBRA	(092AH25PR) CONSTRUCCIÓN DE 14 CUARTOS DORMITORIO (17.95 M2) EN DISTINTAS LOCALIDADES DE LA SINDICATURA CENTRAL, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.
CONTRATO	FAISMUN-VIV-092PR-094PR-AH-2025
LOCALIZACIÓN	COMPUERTAS
INFORME	CDC-02/2026
ELABORACIÓN	2026-ene-05
HOJA # 02	

ESPECIFICACIONES DE PROYECTO

F'c 200 kg/cm²		REVENIMIENTO		10 ± 2.5 cm		TIPO DE CONCRETO				NORMAL		T.M.A. 19 mm			
MUESTRA No.	CILINDRO No.	FECHA DE MUESTREO	ELEMENTO	UBICACIÓN	CONCRETERA	DIÁMETRO cm	SECCIÓN cm²	FECHA DE ENSAYE	EDAD EN DÍAS	REVENIMIENTO OBTENIDO	CARGA DE RUPTURA		RESISTENCIA		% DE RESISTENCIA
											N	kgf	MPa	kg/cm²	
1	1	2025-dic-05	CIMENTACIÓN	CRUZ PACHECO EDUARDO ALBERTO #03	MEGABLOCK	15.0	176.7	2025-dic-12	7	10	249090	25400	14.1	144	71.9
	2	2025-dic-05				15.0	176.7	2025-dic-12	7		249090	25400	14.1	144	71.9
	3	2025-dic-05				15.0	176.7	2026-ene-02	28		362848	37000	20.5	209	104.7
	4	2025-dic-05				15.0	176.7	2026-ene-02	28		360887	36800	20.4	208	104.1



SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, URBANISMO Y ECOLOGÍA

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

OBSERVACIONES:

Ninguna



DATOS DE CALIBRACIÓN

Prensa Marca ALCON. No. Serie 0011.

REFERENCIAS:

NMX-C-155-ONNCCE-2014
NMX-C-161-ONNCCE-2015, NMX-C-156-ONNCCE-2010,
NMX-C-153-ONNCCE-2016, NMX-C-109-ONNCCE-2013,
NMX-C-083-ONNCCE-2014, NMX-C-191-ONNCCE-2015
SCCN-PT01, SCCN-PT02, SCCN-PT03, SCCN-PT04,
SCCN-PT05, SCCN-PT06, SCCN-PT07

GERENTE GENERAL

AUTORIZÓ

ING. JOSE RAMON REYES PORTILLO

JEFE DE LABORATORIO

REALIZÓ

TEC. FRANCISCO JAVIER ROMERO ROJO

CLAVE: SCCN-ITF04

VERSIÓN 01

PÁGINA 1 DE 1

LOS RESULTADOS DEL PRESENTE INFORME SOLO APLICAN A LOS ESPÉCIMENES ARRIBA INDICADOS.

PROHIBIDA LA REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL DE ESTE DOCUMENTO.



SUCANOSA DE C.V.

LABORATORIO PARA LA CONSTRUCCION

C. Ej. Matacahui #357 norte, Fracc. Villa Huites, Los Mochis, Sin. C.P. 81257

Laboratorio: C. J. Félix Serrano #3169, Fracc. Nuevo Horizonte, Los Mochis, Sin. C.P. 81233

PORCENTAJE DE
COMPACTACION EN EL CAMPO

METODO DE PRUEBA: NMX-C-416 ONNCE-2003

OBRA

(092AH25PR) CONSTRUCCIÓN DE 14 CUARTOS DORMITORIO (17.95 M2) EN DISTINTAS LOCALIDADES DE LA SINDICATURA CENTRAL, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.

LOCALIZACION

OHUIRA

CONTRATO: FAISMUN-VIV-092PR-094PR-AH-2025

FECHA 07/12/2025

INFORME: CDC-01/2026

HOJA # 03

ENSAYE No	LOCALIZACION	PROF. DEL SONDEO EN CM	FECHA DE SONDEO	MASA VOL. HUMEDA	HUMEDAD DEL LUGAR	MASA VOL. SECA	MASA VOL. SECA MAXIMA	HUMEDAD OPTIMA	% DE COMPACT	OBSERVACIONES
1	PLATAFORMA BERRELLEZA TORRES JOSE EDUARDO #07 RELLENO DE PLATAFORMA	20.0	07-dic-25	1689	13.6	1487	1620	14.0	91.8	SATISFACTORIO
LOS RESULTADOS OBTENIDOS SON SATISFACTORIOS.										



OBSERVACIONES

COMPACTACION ESPECIFICADA
COMPACTACION OBTENIDA

RELLENO DE PLATAFORMA

90.00%

91.80%



Vo. Bo.

EL GERENTE DEL LABORATORIO

EL LABORATORISTA

ING. MARINA RODRIGUEZ HERNANDEZ

ING. JOSÉ RAMÓN REYES PORTILLO

TEC. FRANCISCO JAVIER ROMERO ROJO



SUCANOSA DE C.V.

LABORATORIO PARA LA CONSTRUCCION

C. Ej. Matacahui #357 norte, Fracc. Villa Huites, Los Mochis, Sin. C.P. 81257

Laboratorio: C. J. Félix Serrano #3169, Fracc. Nuevo Horizonte, Los Mochis, Sin. C.P. 81233

PORCENTAJE DE

COMPACTACION EN EL CAMPO

METODO DE PRUEBA: NMX-C-416 ONNCCE-2003

OBRA

(092AH25PR) CONSTRUCCIÓN DE 14 CUARTOS DORMITORIO (17.95 M2) EN DISTINTAS LOCALIDADES DE LA SINDICATURA CENTRAL, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.

LOCALIZACION

OHUIRA

CONTRATO: FAISMUN-VIV-092PR-094PR-AH-2025

FECHA 07/12/2025

INFORME: CDC-01/2026

HOJA # 04

ENSAYE No.	LOCALIZACION	PROF. DEL SONDEO EN CM	FECHA DE SONDEO	MASA VOL. HUMEDA	HUMEDAD DEL LUGAR	MASA VOL. SECA	MASA VOL. SECA MAXIMA	HUMEDAD OPTIMA	%DE COMPACT	OBSERVACIONES
1	PLATAFORMA SANCHEZ ANTONIO ABISAIL #08 RELLENO DE PLATAFORMA	20.0	07-dic-25	1703	13.8	1497	1620	14.0	92.4	SATISFACTORIO
LOS RESULTADOS OBTENIDOS SON SATISFACTORIOS.										
OBSERVACIONES										
RELLENO DE PLATAFORMA										
COMPACTACION ESPECIFICADA 90.00%										
COMPACTACION OBTENIDA 92.40%										
Vo. Bo.			EL GERENTE DEL LABORATORIO				EL LABORATORISTA			
ING. MARINA RODRIGUEZ HERNANDEZ			ING. JOSÉ RAMÓN REYES PORTILLO				TEC. FRANCISCO JAVIER ROMERO ROJO			





SUCANOSA DE C.V.

LABORATORIO PARA LA CONSTRUCCION

C. Ej. Matacahui #357 norte, Fracc. Villa Huites, Los Mochis, Sin. C.P. 81257

Laboratorio: C. J. Félix Serrano #3169, Fracc. Nuevo Horizonte, Los Mochis, Sin. C.P. 81233

PORCENTAJE DE

COMPACTACION EN EL CAMPO

METODO DE PRUEBA: NMX-C-416 ONNCCE-2003

OBRA (092AH25PR) CONSTRUCCIÓN DE 14 CUARTOS DORMITORIO (17.95 M2) EN DISTINTAS LOCALIDADES DE LA SINDICATURA CENTRAL, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.

LOCALIZACION OHUIRA

CONTRATO: FAISMUN-VIV-092PR-094PR-AH-2025

FECHA 07/12/2025

INFORME: CDC-01/2026

HOJA # 05

ENSAYE No	LOCALIZACION	PROF. DEL SONDEO EN CM	FECHA DE SONDEO	MASA VOL. HUMEDA	HUMEDAD DEL LUGAR	MASA VOL. SECA	MASA VOL. SECA MAXIMA	HUMEDAD OPTIMA	%DE COMPACT	OBSERVACIONES
1	PLATAFORMA CASTAÑEDA JOCABI MARISOL #09 RELLENO DE PLATAFORMA	20.0	07-dic-25	1717	14.2	1503	1620	14.0	92.8	SATISFACTORIO
LOS RESULTADOS OBTENIDOS SON SATISFACTORIOS.										

OBSERVACIONES

COMPACTACION ESPECIFICADA
COMPACTACION OBTENIDA

RELLENO DE PLATAFORMA

90.00%

92.80%



Vo. Bo.

EL GERENTE DEL LABORATORIO

EL LABORATORISTA

ING. MARINA RODRIGUEZ HERNANDEZ

ING. JOSÉ RAMÓN REYES PORTILLO

TEC. FRANCISCO JAVIER ROMERO ROJO





SUCANOSA DE C.V.

LABORATORIO PARA LA CONSTRUCCION

Oficina: C. Ej. Matacahui #357 norte, Fracc. Villa Huiles, Los Mochis, Sin. C.P. 81257

Laboratorio: C. J. Félix Serrano #3169, Fracc. Nuevo Horizonte, Los Mochis, Sin. C.P. 81233

CILINDROS DE CONCRETO HIDRÁULICO INFORME DE RESISTENCIA A COMPRESIÓN

OBRA	(092AH25PR) CONSTRUCCIÓN DE 14 CUARTOS DORMITORIO (17.95 M2) EN DISTINTAS LOCALIDADES DE LA SINDICATURA CENTRAL, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.	
CONTRATO	FAISMUN-VIV-092PR-094PR-AH-2025	
LOCALIZACIÓN	OHUIRA	
INFORME	CDC-02/2026	
ELABORACIÓN	2026-ene-05	HOJA # 03

ESPECIFICACIONES DE PROYECTO

F'c		200	Kg/cm²	REVENIMIENTO		10	±	2.5	cm	TIPO DE CONCRETO				NORMAL		T.M.A.		19	mm
MUESTRA No.	CILINDRO No.	FECHA DE MUESTREO	ELEMENTO	UBICACIÓN	CONCRETERA	DIÁMETRO cm	SECCIÓN cm²	FECHA DE ENSAYE	EDAD EN DÍAS	REVENIMIENTO OBTENIDO	CARGA DE RUPTURA		RESISTENCIA		% DE RESISTENCIA				
											N	kgf	MPa	kg/cm²					
1	1	2025-dic-07	CIMENTACIÓN	BERRELLEZA TORRES JOSE EDUARDO #07	MEGABLOCK	15.0	176.7	2025-dic-14	7	10	264781	27000	15.0	153	76.4				
	2	2025-dic-07				15.0	176.7	2025-dic-14	7		256936	26200	14.5	148	74.1				
	3	2025-dic-07				15.0	176.7	2026-ene-04	28		378539	38600	21.4	218	109.2				
	4	2025-dic-07				15.0	176.7	2026-ene-04	28		378539	38600	21.4	218	109.2				



SECRETARÍA DE OBRAS
PÚBLICAS, URBANISMO Y
ECOLOGÍA

DIRECCIÓN DE
OBRAS PÚBLICAS

OBSERVACIONES:

Ninguna



DATOS DE CALIBRACIÓN

Prensa Marca ALCON. No. Serie 0011.

REFERENCIAS:

NMX-C-155-ONNCCE-2014
NMX-C-161-ONNCCE-2015, NMX-C-156-ONNCCE-2010,
NMX-C-159-ONNCCE-2016, NMX-C-109-ONNCCE-2013,
NMX-C-083-ONNCCE-2014, NMX-C-191-ONNCCE-2015
SCCN-PT01, SCCN-PT02, SCCN-PT03, SCCN-PT04,
SCCN-PT05, SCCN-PT06, SCCN-PT07

GERENTE GENERAL
AUTORIZÓ

ING. JOSE RAMON REYES PORTILLO

JEFE DE LABORATORIO
REALIZÓ

TEC. FRANCISCO JAVIER ROMERO ROJO

CLAVE: SCCN-ITF04

VERSIÓN 01

PÁGINA 1 DE 1

LOS RESULTADOS DEL PRESENTE INFORME SOLO APLICAN A LOS ESPÉCIMENES ARRIBA INDICADOS.

PROHIBIDA LA REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL DE ESTE DOCUMENTO.



SUCANOSA DE C.V.

LABORATORIO PARA LA CONSTRUCCION

Oficina: C. Ej. Matacahui #357 norte, Fracc. Villa Huites, Los Mochis, Sin. C.P. 81257

Laboratorio: C. J. Félix Serrano #3169, Fracc. Nuevo Horizonte, Los Mochis, Sin. C.P. 81233

CILINDROS DE CONCRETO HIDRÁULICO INFORME DE RESISTENCIA A COMPRESIÓN

OBRA	(092AH25PR) CONSTRUCCIÓN DE 14 CUARTOS DORMITORIO (17.95 M2) EN DISTINTAS LOCALIDADES DE LA SINDICATURA CENTRAL, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.	
CONTRATO	FAISMUN-VIV-092PR-094PR-AH-2025	
LOCALIZACIÓN	OHUIRA	
INFORME	CDC-02/2026	
ELABORACIÓN	2026-ene-05	HOJA # 04

ESPECIFICACIONES DE PROYECTO

F/c 200		kg/cm²	REVENIMIENTO		10	±	2.5	cm	TIPO DE CONCRETO				NORMAL		T. M. A.		19	mm
MUESTRA No.	CILINDRO No.	FECHA DE MUESTREO	ELEMENTO	UBICACIÓN	CONCRETERA	DIÁMETRO cm	SECCIÓN cm²	FECHA DE ENSAYE	EDAD EN DÍAS	REVENIMIENTO OBTENIDO	CARGA DE RUPTURA		RESISTENCIA		% DE RESISTENCIA			
											N	kgf	MPa	kg/cm²				
1	1	2025-dic-07	CIMENTACIÓN	SANCHEZ ANTONIO ABISAIL #08	MEGABLOCK	15.0	176.7	2025-dic-14	7	9	256936	26200	14.5	148	74.1			
	2	2025-dic-07				15.0	176.7	2025-dic-14	7		260858	26600	14.8	151	75.3			
	3	2025-dic-07				15.0	176.7	2026-ene-04	28		364809	37200	20.6	211	105.3			
	4	2025-dic-07				15.0	176.7	2026-ene-04	28		364809	37200	20.6	211	105.3			



SECRETARÍA DE OBRAS
PÚBLICAS, URBANISMO Y
ECOLOGÍA

DIRECCIÓN DE
OBRAS PÚBLICAS

OBSERVACIONES:

Ninguna



DATOS DE CALIBRACIÓN

Prensa Marca ALCON. No. Serie 0011.

REFERENCIAS:

NMX-C-155-ONNCCE-2014
NMX-C-161-ONNCCE-2015, NMX-C-156-ONNCCE-2010,
NMX-C-159-ONNCCE-2016, NMX-C-109-ONNCCE-2013,
NMX-C-083-ONNCCE-2014, NMX-C-191-ONNCCE-2015
SCCN-PT01, SCCN-PT02, SCCN-PT03, SCCN-PT04,
SCCN-PT05, SCCN-PT06, SCCN-PT07

GERENTE GENERAL
AUTORIZÓ

ING. JOSE RAMON REYES PORTILLO

JEFE DE LABORATORIO
REALIZÓ

TEC. FRANCISCO JAVIER ROMERO ROJO

CLAVE: SCCN-ITF04

VERSIÓN 01

PÁGINA 1 DE 1

LOS RESULTADOS DEL PRESENTE INFORME SOLO APLICAN A LOS ESPÉCIMENES ARRIBA INDICADOS.

PROHIBIDA LA REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL DE ESTE DOCUMENTO.



SUCANOSA DE C.V.

LABORATORIO PARA LA CONSTRUCCION

Oficina: C. Ej. Matacahui #357 norte, Fracc. Villa Huiles, Los Mochis, Sin. C.P. 81257

Laboratorio: C. J. Félix Serrano #3169, Fracc. Nuevo Horizonte, Los Mochis, Sin. C.P. 81233

CILINDROS DE CONCRETO HIDRÁULICO INFORME DE RESISTENCIA A COMPRESIÓN

OBRA	(092AH25PR) CONSTRUCCIÓN DE 14 CUARTOS DORMITORIO (17.95 M2) EN DISTINTAS LOCALIDADES DE LA SINDICATURA CENTRAL, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.
CONTRATO	FAISMUN-VIV-092PR-094PR-AH-2025
LOCALIZACIÓN	OHUIRA
INFORME	CDC-02/2026
ELABORACIÓN	2026-ene-05
HOJA # 05	

ESPECIFICACIONES DE PROYECTO

F'c		200	kg/cm²	REVENIMIENTO		10	±	2.5	cm	TIPO DE CONCRETO				NORMAL		T. M. A.				19	mm
MUESTRA No.	CILINDRO No.	FECHA DE MUESTREO	ELEMENTO	UBICACIÓN	CONCRETERA	DIÁMETRO cm	SECCIÓN cm²	FECHA DE ENSAYE	EDAD EN DÍAS	REVENIMIENTO OBTENIDO	CARGA DE RUPTURA N	kgf	RESISTENCIA MPa	kg/cm²	% DE RESISTENCIA						
1	1	2025-dic-07	CIMENTACIÓN	CASTAÑEDA JOCOBI MARISOL #09	MEGABLOCK	15.0	176.7	2025-dic-14	7	12	251052	25600	14.2	145	72.4						
	2	2025-dic-07				15.0	176.7	2025-dic-14	7		247129	25200	14.0	143	71.3						
	3	2025-dic-07				15.0	176.7	2026-ene-04	28		362848	37000	20.5	209	104.7						
	4	2025-dic-07				15.0	176.7	2026-ene-04	28		364809	37200	20.6	211	105.3						



OBSERVACIONES:

Ninguna



DATOS DE CALIBRACIÓN

Prensa Marca ALCON. No. Serie 0011.

REFERENCIAS:

NMX-C-155-ONNCCE-2014
NMX-C-161-ONNCCE-2015, NMX-C-156-ONNCCE-2010,
NMX-C-159-ONNCCE-2016, NMX-C-109-ONNCCE-2013,
NMX-C-083-ONNCCE-2014, NMX-C-191-ONNCCE-2015
SCCN-PT01, SCCN-PT02, SCCN-PT03, SCCN-PT04,
SCCN-PT05, SCCN-PT06, SCCN-PT07

GERENTE GENERAL
AUTORIZÓ

ING. JOSE RAMON REYES PORTILLO

JEFE DE LABORATORIO
REALIZÓ

TEC. FRANCISCO JAVIER ROMERO ROJO

LOS RESULTADOS DEL PRESENTE INFORME SOLO APLICAN A LOS ESPÉCIMENES ARRIBA INDICADOS.

VERSIÓN 01

PÁGINA 1 DE 1

PROHIBIDA LA REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL DE ESTE DOCUMENTO.



SUCANOSA DE C.V.

LABORATORIO PARA LA CONSTRUCCION

Oficina: C. Ej. Matacahui #357 norte, Fracc. Villa Huites, Los Mochis, Sin. C.P. 81257

Laboratorio: C. J. Félix Serrano #3169, Fracc. Nuevo Horizonte, Los Mochis, Sin. C.P. 81233

CILINDROS DE CONCRETO HIDRÁULICO INFORME DE RESISTENCIA A COMPRESIÓN

OBRA	(092AH25PR) CONSTRUCCIÓN DE 14 CUARTOS DORMITORIO (17.95 M2) EN DISTINTAS LOCALIDADES DE LA SINDICATURA CENTRAL, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.	
CONTRATO	FAISMUN-VIV-092PR-094PR-AH-2025	
LOCALIZACIÓN	COMPUERTAS	
INFORME	CDC-03/2026	
ELABORACIÓN	2026-ene-09	HOJA # 01

ESPECIFICACIONES DE PROYECTO

F/c		200	kg/cm²	REVENIMIENTO	10	±	2.5	cm	TIPO DE CONCRETO		NORMAL	T. M. A.		19	mm
MUESTRA No.	CILINDRO No.	FECHA DE MUESTREO	ELEMENTO	UBICACIÓN	CONCRETERA	DIÁMETRO cm	SECCIÓN cm²	FECHA DE ENSAYE	EDAD EN DÍAS	REVENIMIENTO OBTENIDO	CARGA DE RUPTURA N	kgf	RESISTENCIA MPa	kg/cm²	% DE RESISTENCIA
1	1	2025-dic-09	AZOTEA	ARMENTA VALENZUELA RAMONA #02	MEGABLOCK	15.0	176.7	2025-dic-16	7	10	268704	27400	15.2	155	77.5
	2	2025-dic-09				15.0	176.7	2025-dic-16	7		272626	27800	15.4	157	78.7
	3	2025-dic-09				15.0	176.7	2026-ene-06	28		376577	38400	21.3	217	108.6
	4	2025-dic-09				15.0	176.7	2026-ene-06	28		382461	39000	21.6	221	110.3



SECRETARÍA DE OBRAS
PÚBLICAS, URBANISMO Y
ECOLOGÍA

DIRECCIÓN DE
OBRAS PÚBLICAS

OBSERVACIONES:

Ninguna



DATOS DE CALIBRACIÓN

Prensa Marca ALCON. No. Serie 0011.

REFERENCIAS:

NMX-C-155-ONNCCE-2014
NMX-C-161-ONNCCE-2015, NMX-C-156-ONNCCE-2010,
NMX-C-159-ONNCCE-2016, NMX-C-109-ONNCCE-2013,
NMX-C-083-ONNCCE-2014, NMX-C-191-ONNCCE-2015
SCCN-PT01, SCCN-PT02, SCCN-PT03, SCCN-PT04,
SCCN-PT05, SCCN-PT06, SCCN-PT07

GERENTE GENERAL

AUTORIZÓ

ING. JOSE RAMON REYES PORTILLO

JEFE DE LABORATORIO

REALIZÓ

TEC. FRANCISCO JAVIER ROMERO ROJO

CLAVE: SCCN-ITF04

VERSIÓN 01

PÁGINA 1 DE 1

LOS RESULTADOS DEL PRESENTE INFORME SOLO APLICAN A LOS ESPÉCIMENES ARRIBA INDICADOS.

PROHIBIDA LA REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL DE ESTE DOCUMENTO.



SUCANOSA DE C.V.

LABORATORIO PARA LA CONSTRUCCION

Oficina: C. Ej. Matacahui #357 norte, Fracc. Villa Huites, Los Mochis, Sin. C.P. 81257

Laboratorio: C. J. Félix Serrano #3169, Fracc. Nuevo Horizonte, Los Mochis, Sin. C.P. 81233

CILINDROS DE CONCRETO HIDRÁULICO INFORME DE RESISTENCIA A COMPRESIÓN

OBRA	(092AH25PR) CONSTRUCCIÓN DE 14 CUARTOS DORMITORIO (17.95 M2) EN DISTINTAS LOCALIDADES DE LA SINDICATURA CENTRAL, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.	
CONTRATO	FAISMUN-VIV-092PR-094PR-AH-2025	
LOCALIZACIÓN	COMPUERTAS	
INFORME	CDC-03/2026	
ELABORACIÓN	2026-ene-09	HOJA # 02

ESPECIFICACIONES DE PROYECTO

F'c 200 kg/cm²		REVENIMIENTO		10 ± 2.5 cm		TIPO DE CONCRETO				NORMAL		T.M.A. 19 mm			
MUESTRA No.	CILINDRO No.	FECHA DE MUESTREO	ELEMENTO	UBICACIÓN	CONCRETERA	DIÁMETRO cm	SECCIÓN cm²	FECHA DE ENSAYE	EDAD EN DÍAS	REVENIMIENTO OBTENIDO	CARGA DE RUPTURA		RESISTENCIA		% DE RESISTENCIA
											N	kgf	MPa	kg/cm²	
1	1	2025-dic-09	AZOTEA	CRUZ PACHECO EDUARDO ALBERTO #03	MEGABLOCK	15.0	176.7	2025-dic-16	7	11	251052	25600	14.2	145	72.4
	2	2025-dic-09				15.0	176.7	2025-dic-16	7		253013	25800	14.3	146	73.0
	3	2025-dic-09				15.0	176.7	2026-ene-06	28		355003	36200	20.1	205	102.4
	4	2025-dic-09				15.0	176.7	2026-ene-06	28		356964	36400	20.2	206	103.0



SECRETARÍA DE OBRAS
PÚBLICAS, URBANISMO Y
ECOLOGÍA

DIRECCIÓN DE
OBRAS PÚBLICAS

OBSERVACIONES:

Ninguna



DATOS DE CALIBRACIÓN

Prensa Marca ALCON. No. Serie 0011.

REFERENCIAS:

NMX-C-155-ONNCCE-2014
NMX-C-161-ONNCCE-2015, NMX-C-156-ONNCCE-2010,
NMX-C-159-ONNCCE-2016, NMX-C-109-ONNCCE-2013,
NMX-C-083-ONNCCE-2014, NMX-C-191-ONNCCE-2015
SCCN-PT01, SCCN-PT02, SCCN-PT03, SCCN-PT04,
SCCN-PT05, SCCN-PT06, SCCN-PT07

NORMAS DENTRO DEL
ALCANCE DEL SGC:

PROCEDIMIENTOS

CLAVE: SCCN-ITF04

GERENTE GENERAL
AUTORIZÓ

ING. JOSE RAMON REYES PORTILLO

VERSIÓN 01

JEFE DE LABORATORIO

REALIZÓ

TEC. FRANCISCO JAVIER ROMERO ROJO

PÁGINA 1 DE 1

LOS RESULTADOS DEL PRESENTE INFORME SOLO APLICAN A LOS ESPECÍMENES ARRIBA INDICADOS.

PROHIBIDA LA REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL DE ESTE DOCUMENTO.



SUCANOSA DE C.V.

LABORATORIO PARA LA CONSTRUCCION

Oficina: C. Ej. Matacahui #357 norte, Fracc. Villa Huites, Los Mochis, Sin. C.P. 81257

Laboratorio: C. J. Félix Serrano #3169, Fracc. Nuevo Horizonte, Los Mochis, Sin. C.P. 81233

**CILINDROS DE CONCRETO HIDRÁULICO
INFORME DE RESISTENCIA A COMPRESIÓN**

OBRA	(092AH25PR) CONSTRUCCIÓN DE 14 CUARTOS DORMITORIO (17.95 M2) EN DISTINTAS LOCALIDADES DE LA SINDICATURA CENTRAL, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.	
CONTRATO	FAISMUN-VIV-092PR-094PR-AH-2025	
LOCALIZACIÓN	OHUIRA	
INFORME	CDC-03/2026	
ELABORACIÓN	2026-ene-09	HOJA # 03

ESPECIFICACIONES DE PROYECTO

F'c 200 kg/cm²		REVENIMIENTO		10 ± 2.5 cm		TIPO DE CONCRETO				NORMAL		T. M. A. 19 mm			
MUESTRA No.	CILINDRO No.	FECHA DE MUESTREO	ELEMENTO	UBICACIÓN	CONCRETERA	DIÁMETRO cm	SECCIÓN cm²	FECHA DE ENSAYE	EDAD EN DÍAS	REVENIMIENTO OBTENIDO	CARGA DE RUPTURA		RESISTENCIA		% DE RESISTENCIA
											N	kgf	MPa	kg/cm²	
1	1	2025-dic-11	AZOTEA	BERRELLEZA TORRES JOSE EDUARDO #07	MEGABLOCK	15.0	176.7	2025-dic-18	7	11	272626	27800	15.4	157	78.7
	2	2025-dic-11				15.0	176.7	2025-dic-18	7		276549	28200	15.6	160	79.8
	3	2025-dic-11				15.0	176.7	2026-ene-08	28		380500	38800	21.5	220	109.8
	4	2025-dic-11				15.0	176.7	2026-ene-08	28		384423	39200	21.8	222	110.9



OBSERVACIONES:

Ninguna



DATOS DE CALIBRACIÓN

Prensa Marca ALCON. No. Serie 0011.

REFERENCIAS:

NMX-C-155-ONNCCE-2014
NMX-C-161-ONNCCE-2015, NMX-C-156-ONNCCE-2010,
NMX-C-159-ONNCCE-2016, NMX-C-109-ONNCCE-2013,
NMX-C-083-ONNCCE-2014, NMX-C-191-ONNCCE-2015
SCCN-PT01, SCCN-PT02, SCCN-PT03, SCCN-PT04,
SCCN-PT05, SCCN-PT06, SCCN-PT07

GERENTE GENERAL

AUTORIZÓ

ING. JOSE RAMON REYES PORTILLO

JEFE DE LABORATORIO

REALIZÓ

TEC. FRANCISCO JAVIER ROMERO ROJO

CLAVE: SCCN-ITF04

VERSIÓN 01

PÁGINA 1 DE 1

LOS RESULTADOS DEL PRESENTE INFORME SOLO APLICAN A LOS ESPECIMENES ARRIBA INDICADOS.

PROHIBIDA LA REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL DE ESTE DOCUMENTO.



SUCANOSA DE C.V.

LABORATORIO PARA LA CONSTRUCCION

Oficina: C. Ej. Matacahui #357 norte, Fracc. Villa Huiles, Los Mochis, Sin. C.P. 81257

Laboratorio: C. J. Félix Serrano #3169, Fracc. Nuevo Horizonte, Los Mochis, Sin. C.P. 81233

**CILINDROS DE CONCRETO HIDRÁULICO
INFORME DE RESISTENCIA A COMPRESIÓN**

OBRA	(092AH25PR) CONSTRUCCIÓN DE 14 CUARTOS DORMITORIO (17.95 M2) EN DISTINTAS LOCALIDADES DE LA SINDICATURA CENTRAL, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.	
CONTRATO	FAISMUN-VIV-092PR-094PR-AH-2025	
LOCALIZACIÓN	OHUIRA	
INFORME	CDC-03/2026	
ELABORACIÓN	2026-ene-09	HOJA # 04

ESPECIFICACIONES DE PROYECTO

F'c 200 kg/cm²		REVENIMIENTO 10 ± 2.5 cm		TIPO DE CONCRETO NORMAL				T. M. A. 19 mm							
MUESTRA No.	CILINDRO No.	FECHA DE MUESTREO	ELEMENTO	UBICACIÓN	CONCRETERA	DIÁMETRO cm	SECCIÓN cm²	FECHA DE ENSAYE	EDAD EN DÍAS	REVENIMIENTO OBTENIDO	CARGA DE RUPTURA		RESISTENCIA		% DE RESISTENCIA
											N	kgf	MPa	kg/cm²	
1	1	2025-dic-11	AZOTEA	SANCHEZ ANTONIO ABISAIL #08	MEGABLOCK	15.0	176.7	2025-dic-18	7	10	254974	26000	14.4	147	73.6
	2	2025-dic-11				15.0	176.7	2025-dic-18	7		251052	25600	14.2	145	72.4
	3	2025-dic-11				15.0	176.7	2026-ene-08	28		368732	37600	20.9	213	106.4
	4	2025-dic-11				15.0	176.7	2026-ene-08	28		366771	37400	20.8	212	105.8



OBSERVACIONES:

Ninguna



DATOS DE CALIBRACIÓN

Prensa Marca ALCON No. Serie 0011.

REFERENCIAS:

MX-C-155-ONNCCE-2014
MX-C-161-ONNCCE-2015, MX-C-156-ONNCCE-2010,
MX-C-159-ONNCCE-2016, MX-C-109-ONNCCE-2013,
MX-C-083-ONNCCE-2014, MX-C-191-ONNCCE-2015
SCCN-PT01, SCCN-PT02, SCCN-PT03, SCCN-PT04,
SCCN-PT05, SCCN-PT06, SCCN-PT07

**GERENTE GENERAL
AUTORIZÓ**

ING. JOSE RAMON REYES PORTILLO

**JEFE DE LABORATORIO
REALIZÓ**

TEC. FRANCISCO JAVIER ROMERO ROJO

CLAVE: SCCN-ITF04

VERSIÓN 01

PÁGINA 1 DE 1

LOS RESULTADOS DEL PRESENTE INFORME SOLO APLICAN A LOS ESPÉCIMENES ARRIBA INDICADOS.

PROHIBIDA LA REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL DE ESTE DOCUMENTO.



SUCANOSA DE C.V.

LABORATORIO PARA LA CONSTRUCCION

Oficina: C. Ej. Matacahui #357 norte, Fracc. Villa Huiles, Los Mochis, Sin. C.P. 81257

Laboratorio: C. J. Félix Serrano #3169, Fracc. Nuevo Horizonte, Los Mochis, Sin. C.P. 81233

CILINDROS DE CONCRETO HIDRÁULICO INFORME DE RESISTENCIA A COMPRESIÓN

OBRA	(092AH25PR) CONSTRUCCIÓN DE 14 CUARTOS DORMITORIO (17.95 M2) EN DISTINTAS LOCALIDADES DE LA SINDICATURA CENTRAL, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.	
CONTRATO	FAISMUN-VIV-092PR-094PR-AH-2025	
LOCALIZACIÓN	OHUIRA	
INFORME	CDC-03/2026	
ELABORACIÓN	2026-ene-09	HOJA # 05

ESPECIFICACIONES DE PROYECTO

F'c 200 kg/cm²		REVENIMIENTO		10 ± 2.5 cm		TIPO DE CONCRETO				NORMAL		T. M. A. 19 mm			
MUESTRA No.	CILINDRO No.	FECHA DE MUESTREO	ELEMENTO	UBICACIÓN	CONCRETERA	DIÁMETRO cm	SECCIÓN cm²	FECHA DE ENSAYE	EDAD EN DÍAS	REVENIMIENTO OBTENIDO	CARGA DE RUPTURA		RESISTENCIA		% DE RESISTENCIA
											N	kgf	MPa	kg/cm²	
1	1	2025-dic-11	AZOTEA	CASTAÑEDA JOCOBI MARISOL #09	MEGABLOCK	15.0	176.7	2025-dic-18	7	9	262820	26800	14.9	152	75.8
	2	2025-dic-11				15.0	176.7	2025-dic-18	7		260858	26600	14.8	151	75.3
	3	2025-dic-11				15.0	176.7	2026-ene-08	28		374616	38200	21.2	216	108.1
	4	2025-dic-11				15.0	176.7	2026-ene-08	28		376577	38400	21.3	217	108.6



OBSERVACIONES:

Ninguna



DATOS DE CALIBRACIÓN

Prensa Marca ALCON. No. Serie 0011.

REFERENCIAS:

NMX-C-155-ONNCCE-2014
NMX-C-161-ONNCCE-2015, NMX-C-156-ONNCCE-2010,
NMX-C-159-ONNCCE-2016, NMX-C-109-ONNCCE-2013,
NMX-C-083-ONNCCE-2014, NMX-C-191-ONNCCE-2015
SCCN-PT01, SCCN-PT02, SCCN-PT03, SCCN-PT04,
SCCN-PT05, SCCN-PT06, SCCN-PT07

GERENTE GENERAL
AUTORIZÓ

ING. JOSE RAMON REYES PORTILLO

JEFE DE LABORATORIO
REALIZÓ

TEC. FRANCISCO JAVIER ROMERO ROJO

CLAVE: SCCN-ITF04

VERSIÓN 01

PÁGINA 1 DE 1

LOS RESULTADOS DEL PRESENTE INFORME SOLO APLICAN A LOS ESPÉCIMENES ARRIBA INDICADOS.

PROHIBIDA LA REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL DE ESTE DOCUMENTO.



Oficio No.: SOP/DOP/2382-25

Asunto: El que se indica.

Los Mochis, Ahome, Sinaloa, 31 de diciembre de 2025.

C. DALVINGH ITURRIOS CORRALES
TITULAR DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL
Presente.-

Me refiero a los trabajos relativos a la obra: (092AH25PR) CONSTRUCCIÓN DE 14 CUARTOS DORMITORIO (17.95 M2) EN DISTINTAS LOCALIDADES DE LA SINDICATURA CENTRAL, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.

Que tiene el número de contrato: FAISMUN-VIV-092PR-094PR-AH-2025.

Al respecto le informamos que el término de la obra se dio con fecha del 24 de diciembre de 2025, y al mismo tiempo nos permitimos invitarlo a la entrega recepción de la obra anteriormente mencionada con fundamento del Artículo 86, párrafo tercero de la Ley de Obras Públicas y Servicios relacionados con las mismas del Estado de Sinaloa, dicho acto se llevará a cabo el día jueves 08 de enero de 2026 a las 11:00 a.m. horas.

- Nombre de la Comunidad: Distintas Localidades de la Sindicatura Central, Municipio de Ahome, Sinaloa.
- Beneficiarios: Habitantes de las Distintas Localidades de la Sindicatura Central, Municipio de Ahome, Sinaloa.
- Montos ejecutados de la obra: \$ 1,904,436.66.
- Residente de la obra: Arq. Miguel Ángel Cabanillas Reyes.
- Número de celular de residente: 6671.85.05.75.

Se anexa tabla con coordenadas y direcciones de los beneficiarios

Sin más por el momento y agradeciendo de antemano la atención prestada a la presente, me despido de usted.

ATENTAMENTE

ARQ. JESÚS ERNESTO TAPIA CASTRO
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS



c.c.p. Joaquín Páez Roiz/Secretaría de Bienestar
c.c.p. María Luisa Gómez Lizárraga/ Sindica Procuradora
c.c.p. STEPHANY PALOMA ALVARADO MACHADO/Contratista
c.c.p. Arq. Miguel Ángel Cabanillas Reyes/Residente de Obra
c.c.p. Archivo
JETC/AARF




H. AYUNTAMIENTO DE AHOME

SECRETARIA DE BIENESTAR

NUM. DE OBRA: 092AH25PR

CONSTRUCCION DE 14 CUARTOS DORMITORIO PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA
EN DISTINTAS LOCALIDADES DE LA SINDICATURA CENTRAL EN EL MUNICIPIO DE AHOME

NUM	NOMBRE	LOCALIDAD	DOMICILIO	TELÉFONO	COORDENADAS
1	ZAMBRANO VALENZUELA ROSARIO	BACHOMOBAMPO DOS	C. 20 DE NOVIEMBRE POSTE 6	6682741212	25.736794,-109.151592
2	ARMENTA VALENZUELA RAMONA	COMPUERTAS	C. ANTONIO ROSALES POSTE 55	6688638279	25.836898,-109.018749
3	CRUZ PACHECO EDUARDO ALBERTO / PACHECO VALENZUELA CRUZ AIDE	COMPUERTAS	C. ALVARO OBREGON #192 FRENTE AL ESTADIO	6681872812	25.8418972,-109.022471
4	TORRES FLORES SELENE / LLANES BELTRAN JESUS MIGUEL	EL UNO (LA ARROCERA)	ENFRENTE DE LA BODEGA INDAMEX POR ENFRENTE DE LAS VIAS	6731067937 / 6682432581	25.855638,-108.911969
5	MARISCAL ZUÑIGA MANUELA ARACELY	EL UNO (LA ARROCERA)	CALLE UNICA POSTE 24	6682356799	25.85661,-108.911283
6	VARGAS QUINTANA DIANA KARELY / QUINTANA MARCIAL AURORA	LA ARROCERA	POSTE 9 POR LA CALLE PRINCIPAL CERCA DE LOS EXPENDIOS	6681433435	25.852981,-108.914012
7	BERRELLEZA TORRES JOSE EDUARDO	OHUIRA	C. MIGUEL HIDALGO POSTE 9	6682161642 / 6682478607	25.7179819,-108.976271
8	SANCHEZ ANTONIO ABISAIL	OHUIRA	A UN COSTADO DE IGLESIA INDIGENA	6681963153	25.715457,-108.983068
9	CASTAÑEDA JOCOBI MARISOL	OHUIRA	C. HILARIO VICAM POSTE 18	6688612308	25.714431,-108.982567
10	MOROYOQUI COTA KAREN LIZBETH / CERVANTES VALDEZ JESUS ANTONIO	PRIMERO DE MAYO	BLVD. JESUS GARCIA POSTE 101	6681859032 / 6688209034	25.738257,-108.931778
11	REYES CRUZ CLAUDIA PATRICA / REYES OSORIO RAMON	PRIMERO DE MAYO	CALLE LAZARO CARDENAS AL LADO DE ABARROTE PATY, POSTE #918,	6688283775	25.7412663,-108.9375503
12	VALDEZ SOTO MARIA	PRIMERO DE MAYO	C. RAMON IGNACIO RODRIGO CASTRO POSTE 60	6681693023	25.739803,-108.937524
13	ZAMBRANO ROCHA JESSICA JAZMIN	PRIMERO DE MAYO	SEGUNDA CALLE ESQUINA	6681923895	25.737989,-108.938742
14	OLIVO BACA GLORIA RUFINA/ VALENZUELA MOROYOQUI JESUS BERNARDO	PRIMERO DE MAYO	C. CARLOS RAMON GARCIA SIN NUMERO A DOS CASAS DEL OXXO	6688299734 / 6601308884	25.7369587,-108.9365244



SECRETARIA DE OBRAS
PÚBLICAS, URBANISMO Y
ECOLOGÍA
DIRECCIÓN DE
OBRAS PÚBLICAS

Vo.Bo.



MUNICIPIO DE AHOME

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, URBANISMO Y ECOLOGÍA
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN DE OBRA

Obra :	(092AH25PR) CONSTRUCCIÓN DE 14 CUARTOS DORMITORIO (17.95 M2) EN DISTINTAS LOCALIDADES DE LA SINDICATURA CENTRAL, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.				
Localidad	DISTINTAS LOCALIDADES DE LA SINDICATURA CENTRAL, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.				
Municipio	AHOME				
Num. De contrato	FAISMUN-VIV-092PR-094PR-AH-2025.				
Contratista	STEPHANY PALOMA ALVARADO MACHADO				
Importe de la obra	\$1,904,584.08				
Anticipo entregado	\$666,604.43				
Fianza de anticipo	3087073, SOFIMEX, INSTITUCIÓN DE GARANTIAS, S.A.				
Fianza de cumplimiento	3087076, SOFIMEX, INSTITUCIÓN DE GARANTIAS, S.A.				
Inicio de los trabajos	04 DE DICIEMBRE DE 2025				
Termino de los trabajos	24 DE DICIEMBRE DE 2025				
Plazo de días de ejecución de la obra	21 DIAS				

En Los Mochis sinaloa siendo las: 11:00 horas del día 08 de ENERO del 2026

ARQ. JESÚS ERNESTO TAPIA CASTRO

Director de Obras públicas

ARQ. MIGUEL ANGEL CABANILLAS REYES

Residente de Obra

STEPHANY PALOMA ALVARADO MACHADO

Contratista

Con objeto de llevar a cabo la recepción de los trabajos ejecutados por el contratista de acuerdo con lo indicado en el contrato de referencia y sus documentos complementarios, siendo el importe ejercido como a continuación se enlista:

No. de estimación	Periodo		Estimado		Neto a pagar	
	Inicio	Termino	Estimación	Acumulado	Estimación	Acumulado
ESTIMACIÓN NO. 1 (UNO) (092AH25PR) CUARTOS DORMITORIOS DISTINTAS LOCALIDADES SINDICATURA CENTRAL	04/12/2025	24/12/2025	\$1,904,436.66	\$1,904,436.66	\$1,180,699.13	\$1,180,699.13
Saldo a cancelar			\$147.42			

El Municipio de Ahome recibe los trabajos antes descritos reservándose el derecho de hacer posteriormente las reclamaciones que estime conveniente conforme a ley, declarando las partes de que se cuenta con los planos correspondientes a la construcción final.

Leida la presente acta por las partes y enteradas de su contenido y alcance legal, la ratifican y firman las personas que en ella intervienen:

RECIBE EL MUNICIPIO DE AHOME

ARQ. JESÚS ERNESTO TAPIA CASTRO
Director de Obras públicas

ARQ. MIGUEL ANGEL CABANILLAS REYES
Residente de Obra

ENTREGO EL CONTRATISTA

Paloma Alvarado
STEPHANY PALOMA ALVARADO MACHADO
CONTRATISTA

