



Badiraguato

GENERANDO BUENOS RESULTADOS



OFICIO No. OPDUyE/598/2025

ASUNTO: SOLICITUD PAGO DE ESTIMACION

02 NORMAL

Badiraguato, Sin., a 27 de Noviembre de 2025

MTRO. GONZALO IRINEO CABALLERO TERRAZAS
TESORERO MUNICIPAL
P R E S E N T E.-

POR MEDIO DE LA PRESENTE, LE SOLICITO EL PAGO POR: CONCEPTO DE PAGO DE ESTIMACIÓN 02 NORMAL, DEL IMPORTE DEL CONTRATO, A FAVOR DE LA EMPRESA: SERGIO JOEL PADILLA SOTO, LA CUAL REALIZA LOS TRABAJOS APROBADOS POR EL SUBCOMITE DE BIENESTAR MUNICIPAL, A CONTINUACIÓN, SE DETALLA:

- NOMBRE DE LA OBRA: CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO Y ALUMBRADO PÚBLICO, EN CALLE LOS CEDROS, ENTRE CALLE LOS LAURELES Y CALLE LOS ENCINOS, COLONIA COLINAS DEL CAMICHIN, DE LA CABECERA MUNICIPAL DE BADIRAGUATO, SINALOA.
- No. DE CONTRATO: MBGBR-AD-FAISMUN-016/2025
- IMPORTE DEL CONTRATO: \$1,531,799.07 (UN MILLON QUINIENTOS TREINTA Y UN MIL SETECIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS 07/100 M.N)
- CONCEPTO DEL PAGO: PAGO DE ESTIMACIÓN 02 NORMAL
- IMPORTE A PAGAR: \$ 627,375.63 (SEISCIENTOS VEINTISIETE MIL TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS 63/100 M.N)
- RECURSOS: FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FAISMUN) EJERCICIO 2025.
- EMPRESA: SERGIO JOEL PADILLA SOTO
- R.F.C. PASS971118IR0
- DOMICILIO FISCAL: CALLE ENRIQUE COLUNGA 1962, GUSTAVO DIA ORDAZ, CULIACÁN, SINALOA, C.P. 80180
- No. DE FACTURA: # C204, DE FECHA 26 DE NOVIEMBRE DE 2025.

SE ANEXA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DE SOPORTE, COMO AMPARO DE DICHO PAGO.

AGRADECIENDO DE ANTEMANO LA ATENCIÓN QUE SE SIRVA DAR A LA PRESENTE, ME DESPIDO QUEDANDO A SUS ÓRDENES.



ATENTAMENTE

C. ING. RUBIEL RINCÓN RAMOS
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS,
DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA



MUNICIPIO DE
BADIRAGUATO
TESORERÍA

27 NOV 2025
Adrian G
RECIBIDO
6:33 PM

C.C.P. ARCHIVO.



Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Serie:

Folio: 99

Fecha: 26/Nov/2025 12:25:57

Lugar de expedición (C.P.) 80180

Emisor
SERGIO JOEL PADILLA SOTO

RFC: PASS971118IR0

Régimen Fiscal: 612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

Domicilio: ENRIQUE COLUNGA 1962 Gustavo Díaz Ordaz Culiacán Sinaloa México

Receptor
Cliente: MUNICIPIO DE BADIRAGUATO

RFC: MBA850101214

Uso CFDI: I01 - Construcciones

Exportación: 01 - No aplica

Domicilio Fiscal: 80500

Régimen Fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

Domicilio: GABRIEL LEYVA SOLANO S/N Col Centro Badiraguato Sinaloa México 80500

Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición

Forma de Pago: 03 - Transferencia electrónica de

Tipo de cambio: 1.000000

Moneda: MXN - Peso Mexicano

Información de cancelación

Motivo de cancelación:

Folio relacionado:

Cantidad	Clave Unidad SAT	Clave Prod/Servicio	Descripción	Valor unitario	Impuestos	Importe
1.00	E48 - Unidad de servicio	72141103 - Servicio de pavimentación de calles y carreteras	<p>PAGO DE ESTIMACION 02 NORMAL</p> <p>DE LA OBRA: CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO Y ALUMBRADO PÚBLICO, EN CALLE LOS CEDROS, ENTRE CALLE LOS LAURELES Y CALLES LOS ENCINOS, COLONIA COLINAS DEL CAMICHÍN, DE LA CABECERA MUNICIPAL DE BADIRAGUATO, SINALOA.</p> <p>CONTRATO NO.: MBGBR-AD-FAISMUN-016/2025 MONTO DEL CONTRATO: \$ 1,531,799.07</p> <p>IMPORTE DE LA OBRA EJECUTADA SIN IVA \$ 866,540.92 MÁS I.V.A 16 % \$ 138,646.55 TOTAL DE LA OBRA EJECUTADA CON IVA \$ 1,005,187.47</p> <p>AMORTIZACIÓN ANTICIPO 35% \$ 303,289.32 MÁS I.V.A.: \$ 48,526.29 TOTAL AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO: \$ 351,815.61</p> <p>Importe TOTAL A FACTURAR \$ 563,251.60 MÁS I.V.A \$ 90,120.26 MONTO NETO A FACTURAR \$ 653,371.86</p> <p>RETENCION 3% (S.V.I.F.Y C.) : \$ 25,996.23 TOTAL DEDUCCIONES: \$ 377,811.84</p> <p>MONTO LIQUIDO A RECIBIR: \$ 627,375.63</p>	\$563,251.60	IVA, - Importe: 90120.26	\$563,251.60

CFDI RELACIONADOS

Tipo de relación:

Lista de CFDI's relacionados:

Total con letra:

seiscientos cincuenta y tres mil trescientos setenta y un Pesos 86/100 M.N.

Subtotal: \$563,251.60**I.V.A.:** \$90,120.26**Total:** \$653,371.86**Este documento es una representación impresa de un CFDI****Serie del Certificado del emisor:** 00001000000711829771**Folio Fiscal:** 353F2F6D-0907-4301-A60F-F4858730C204**No. de serie del Certificado del SAT:** 00001000000709182898**Fecha y hora de certificación:** 2025-11-27T13:21:02**Sello digital del CFDI**

FbbhLaPaIG7sBZmoPgbXX+DqdpvqfQNBLYAJEST3GAFqlar3QrNXGB8Kah4eJOIBNkuCQnsprwC+3Jfr4kGyqZAYZHccyi+9sMQ3DT/LI3KHIR8amqA1UU9qwsJIORWEcP8xxipy4b0e
rWJVGAIIFVnbMoeM4dKNJmwyJDrkUB4inezNQhveC5fpb6XY9655Q8mECyD5nbLMyxYKZK6EPOC+KWiekmzMCmvet8/3VP5grgY92pHDmkmix7jGEN6+4iq/LA9VEQ4Lz8D4pApp95
njTxuaPp4biSKBCcrPZICITn5taRs2IBnTIBy3qNyrHWUBz6ZR8yLfkW==

Sello del SAT

G/rPZmTe+UFy9ZMRqIAC3FBdi0eggEgc4gWmWc/BvMTG36qEGjDtwSUI4dEr7O1hdbGIL1HS4Dh11+UJ6RWJfaLpX+eUyyJ5pyUH06hOZNVUr9r7wXe4z6K6TD4z19q9ves1Qa
AYGMeUxIV6rkftx6pm1hwA0pKq5tgClazzbQTP9RmeprmbSY6984tQnpLRH/YD354+Z5qUmQqHwEm4eAzcW1S9ERuvDGGRKhdh8usp0ls2QccuzNFsswrfwZdGo5BUm01CkRrQCk0W
DSUwPk0w8RcRgiyCjvxxLpHr6TQY6jxuyh4+pod7CPhFXbVuqy9/mjWcvBghw==

Cadena original del complemento del certificación digital del SAT

[1.1.1]353F2F6D-0907-4301-A60F-F4858730C204[2025-11-27T13:21:02]MAS0610247C0[FbbhLaPaIG7sBZmoPgbXX+DqdpvqfQNBLYAJEST3GAFqlar3QrNXGB8Kah4eJOIBNkuCQ
nsprwC+3Jfr4kGyqZAYZHccyi+9sMQ3DT/LI3KHIR8amqA1UU9qwsJIORWEcP8xxipy4b0e rWJVGAIIFVnbMoeM4dKNJmwyJDrkUB4inezNQhveC5fpb6XY9655Q8mECyD5nbLMyxYKZK
6EPOC+KWiekmzMCmvet8/3VP5grgY92pHDmkmix7jGEN6+4iq/LA9VEQ4Lz8D4pApp95njTxuaPp4biSKBCcrPZICITn5taRs2IBnTIBy3qNyrHWUBz6ZR8yLfkW==]00001000000709182898

```
<cfdi:Comprobante xmlns:cfdi="http://www.sat.gob.mx/cfd/4" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/cfd/4 http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/4/cfdv40.xsd"
Certificado="MIIGBDCCA+ygAwIBAGIUMDAwMDEwMDAwMDA3MTE4Mjk3NzEwQDQYJkoZIHVhNAQELBQAwggGVMTUwMwYDQDQDcyBgYBERUwUQVSVKIDSU8REUeQURNSU5JU1RSQUJTO4gVFJJQ1VU
Exportacion="01" Fecha="2025-11-26T12:25:57" Folio="99" FormaPago="03" LugarExpedicion="80180" MetodoPago="PUE" Moneda="MXN"
NoCertificado="00001000000711829771"
Sello="FbhhLaPaIG7s8ZmoPgbXX+DqdpvqfQNBlyAJEST3GAFq1ar3QRNXGB8Kah4eJOIBNkuCQnspm/C+3Jfr4kGyqZayZHscyyi+9sMQ3DT/Li3KH1R8arnqA1U9qswSJjORWECp8xxipy4b0erWJV
SubTotal="563251.60" TipoDeComprobante="I" Total="653371.86" Version="4.0">
<cfdi:Emisor Nombre="SERGIO JOEL PADILLA SOTO" RegimenFiscal="612" Rfc="PASS971118TR0"/>
<cfdi:Receptor DomicilioFiscalReceptor="80500" Nombre="MUNICIPIO DE BADIRAGUATO" RegimenFiscalReceptor="603" Rfc="MBA850101214" UsoCFDI="I01"/>
<cfdi:Conceptos>
<cfdi:Concepto Cantidad="1.00" ClaveProdServ="72141103" ClaveUnidad="E48" Descripcion="SERVICIO DE PAVIMENTACION DE CALLES Y CARRETERAS PAGO DE
ESTIMACION 02 NORMAL DE LA OBRA: CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO Y ALUMBRADO PÚBLICO, EN CALLE LOS CEDROS, ENTRE CALLE LOS LAURELES Y CALLES LOS
ENCINOS, COLONIA COLINAS DEL CAMICHÍN, DE LA CABECERA MUNICIPAL DE BADIRAGUATO, SINALOA. CONTRATO NO.: MBGBR-AD-FAISMUN-016/2025 MONTO DEL CONTRATO:
$ 1,531,799.07 IMPORTE DE LA OBRA EJECUTADA SIN IVA $ 866,540.92 MAS I.V.A 16 % $ 138,646.55 TOTAL DE LA OBRA EJECUTADA CON IVA $ 1,005,187.47
AMORTIZACIÓN ANTICIPO 35% $ 303,289.32 MAS I.V.A.: $ 48,526.29 TOTAL AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO: $ 351,815.61 Importe TOTAL A FACTURAR $ 563,251.60 MAS
I.V.A $ 90,120.26 MONTO NETO A FACTURAR $ 653,371.86 RETENCION 3% ( S.V.I.F.Y C.) : $ 25,996.23 TOTAL DEDUCCIONES: $ 377,811.84 MONTO LIQUIDO A
RECIBIR: $ 627,375.63" Importe="563251.60" NoIdentificacion="SER03" ObjetoImp="02" ValorUnitario="563251.60">
<cfdi:Impuestos>
<cfdi:Traslados>
<cfdi:Traslado Base="563251.60" Importe="90120.26" Impuesto="002" TasaOCuota="0.160000" TipoFactor="Tasa"/>
</cfdi:Traslados>
</cfdi:Impuestos>
</cfdi:Concepto>
</cfdi:Conceptos>
<cfdi:Impuestos TotalImpuestosTrasladados="90120.26">
<cfdi:Traslados>
<cfdi:Traslado Base="563251.60" Importe="90120.26" Impuesto="002" TasaOCuota="0.160000" TipoFactor="Tasa"/>
</cfdi:Traslados>
</cfdi:Impuestos>
<cfdi:Complemento>
<cfdi:TimbreFiscalDigital xmlns:tfd="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital" xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital
http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/TimbreFiscalDigital/TimbreFiscalDigitalv11.xsd" Version="1.1" UUID="353F2F6D-0907-4301-A60F-F485873AC204"
FechaTimbrado="2025-11-27T13:21:02" RfcProvCertif="MAS0010247C0"
SelloCFD="FbhhLaPaIG7s8ZmoPgbXX+DqdpvqfQNBlyAJEST3GAFq1ar3QRNXGB8Kah4eJOIBNkuCQnspm/C+3Jfr4kGyqZayZHscyyi+9sMQ3DT/Li3KH1R8arnqA1U9qswSJjORWECp8xxipy4
NoCertificadoSAT="00001000000705182896"
SelloSAT="G/rPZmTe+UFy9ZrMBq1AC3F8DI0eggEgc4gWwC/BvMTG36q1EGjrDtwSu14IdEr701hdbGIL1HS4Dh11+UJ6RWJfalPx+/eUyyJ5pyUH06hOZNVr9r7ivXe4z6K6TD4z19q9vee1G
</cfdi:Complemento>
</cfdi:Comprobante>
```

Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
PASS971118IR0	SERGIO JOEL PADILLA SOTO	MBA850101214	MUNICIPIO DE BADIRAGUATO
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
353F2F6D-0907-4301-A60F-F4858730C204	2025-11-26T12:25:57	2025-11-27T13:21:02	MAS0810247C0
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$653,371.86	Ingreso	Vigente	Cancelable con aceptación

Imprimir



Fecha: 21 de noviembre de 2025

CARATULA DE ESTIMACIÓN

CONTRATISTA:	SERGIO JOEL PADILLA SOTO			ESTIMACIÓN No:	02 NORMAL
DOMICILIO:	CALLE ENRIQUE COLUNGA 1962, GUSTAVO DIAZ ORDAZ, CULIACÁN, SINALOA. C.P. 80180			PERIODO DE ESTIMACION:	
TELÉFONO:	CEL:			DEL	01-nov-25
667-5818434	667-5818434			AL	18-nov-25
R.F.C.				FECHA DE CONTRATO:	
PASS971118IR0.				17-oct-25	
DEPENDENCIA.-	AYUNTAMIENTO DE BADIRAGUATO				
			LOCALIDAD:	MUNICIPIO:	PERIODO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO:
			BADIRAGUATO	BADIRAGUATO	INICIO: 19-oct-25
			TERMINACIÓN: 18-nov-25		
DESCRIPCIÓN:	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRAULICO Y ALUMBRADO PUBLICO, EN CALLE LOS CEDROS, ENTRE CALLE LOS LAURELES Y CALLES LOS ENCINOS, COLONIA COLINAS DEL CAMICHÍN, DE LA CABECERA MUNICIPAL DE BADIRAGUATO, SINALOA.				
CONTRATO No:	MBGBR-AD-FAISMUN-016/2025				
IMPORTE SIN IVA DE LA OBRA	IMPORTE CON IVA DE LA OBRA	35% ANTICIPO DE LA OBRA	IMPORTE TOTAL DE CONTRATO:		
\$1,320,516.44	\$1,531,799.07	\$536,129.67	\$1,531,799.07		
			BUENO POR:	\$ 627,375.63	
RECIBI :	\$ 627,375.63 (SON SEISCIENTOS VEINTISIETE MIL TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS 63/100 M.N.)				
EN PAGO DE ESTIMACIÓN:	02 NORMAL				
DEDUCCIONES:	CALCULO DE ESTIMACIÓN				
AMORTIZACIÓN ANTICIPO 35%	\$ 303,289.32	IMPORTE DE LA OBRA EJECUTADA SIN IVA		\$ 866,540.92	
MAS I.V.A.:	\$ 48,526.29	MAS I.V.A 16 %		\$ 138,646.55	
TOTAL AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO:	\$ 351,815.61	TOTAL DE LA OBRA EJECUTADA CON IVA		\$ 1,005,187.47	
3 % SVIFYC:	\$ 25,996.23	MENOS TOTAL DEDUCCIONES:		\$ 377,811.84	
TOTAL DEDUCCIONES:	\$ 377,811.84	MONTO A FACTURAR MAS IVA		\$ 653,371.86	
			SALDO A PAGAR: \$ 627,375.63		

ELABORO.-

Sergio J. Padilla
C. SERGIO JOEL PADILLA SOTO
REPRESENTANTE LEGAL

REVISOR

ING. JOSE RODOLFO CONTRERAS LOPEZ
COSTOS Y PRESUPUESTOS.

AUTORIZO

C. ING. RUBIEL RINCON RAMOS
DIRECTOR DE O.P.D.U. Y E



SERGIO JOEL PADILLA SOTO

Dependencia:
AYUNTAMIENTO DE BADIRAGUATO
Control de Estimaciones

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO Y ALUMBRADO PÚBLICO, EN CALLE LOS CEDROS, ENTRE CALLE LOS LAURELES Y CALLES LOS ENCINOS, COLONIA COLINAS DEL CAMICHÍN, DE LA CABECERA MUNICIPAL DE BADIRAGUATO, SINALOA.				Fecha:		Estimacion:		
				21 de noviembre de 2025		02 NORMAL		
Periodo de la estimacion:		01/11/202518/11/2025		Localidad:		No. De contrato:		
Periodo de Ejecución:		01/11/202518/11/2025		BADIRAGUATO		MBGBR-AD-FAISMUN-016/2025		
Importe del contrato con I.V.A:			Imp. Contratado sin I.V.A		Anticipo		Importe Anticipo sin I.V.A	% de Avance
\$1,531,799.07			\$1,320,516.44		\$536,129.67		\$462,180.75	66%
								% Avance Total
								98%

Control Del Anticipo	Liquidacion de Estimacion	Control de Estimacion
AMORTIZA ESTA ESTIMACION	Importe de la Estimacion (+) \$ 866,540.92	ESTA ESTIMACION
\$ 351,815.61	16 % I.V.A (+) \$ 138,646.55	\$ 1,005,187.47
	Sub- Total A (=) \$ 1,005,187.47	
	Amortizacion Anticipo 35% \$ 303,289.32	
AMORTIZACION ANTERIOR	16 % I.V.A (+) \$ 48,526.29	ACUMULADO ANTERIOR
\$ 177,360.99	Total (=) \$ 351,815.61	\$ 506,745.68
	Importe TOTAL A FACTURAR \$ 563,251.60	
TOTAL AMORTIZADO	16 % I.V.A (+) \$ 90,120.26	TOTAL ACUMULADO.
\$ 529,176.60	Total (=) \$ 653,371.86	\$ 1,511,933.15
	3 % SVIFYC: \$ 25,996.23	
ANTICIPO OTORGADO	Total Deducciones (=) \$ 377,811.84	CONTRATADO
\$ 536,129.67	Importe TOTAL \$ 627,375.63	\$ 1,531,799.07
	NETO A PAGAR	
SALDO DEL ANTICIPO	\$ 627,375.63	SALDO
\$ 6,953.07	SON:	\$ 19,865.92
	(SON SEISCIENTOS VEINTISIETE MIL TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS 63/100 M.N.)	

ELABORO.-


Sergio J. Padilla
C. SERGIO JOEL PADILLA SOTO
REPRESENTANTE LEGAL

REVISO

ING. JOSE RODOLFO CONTRERAS LOPEZ
COSTOS Y PRESUPUESTOS.

AUTORIZO

C. ING. RUBIEL RINCON RAMOS.
DIRECTOR O.P.D.U. Y E.

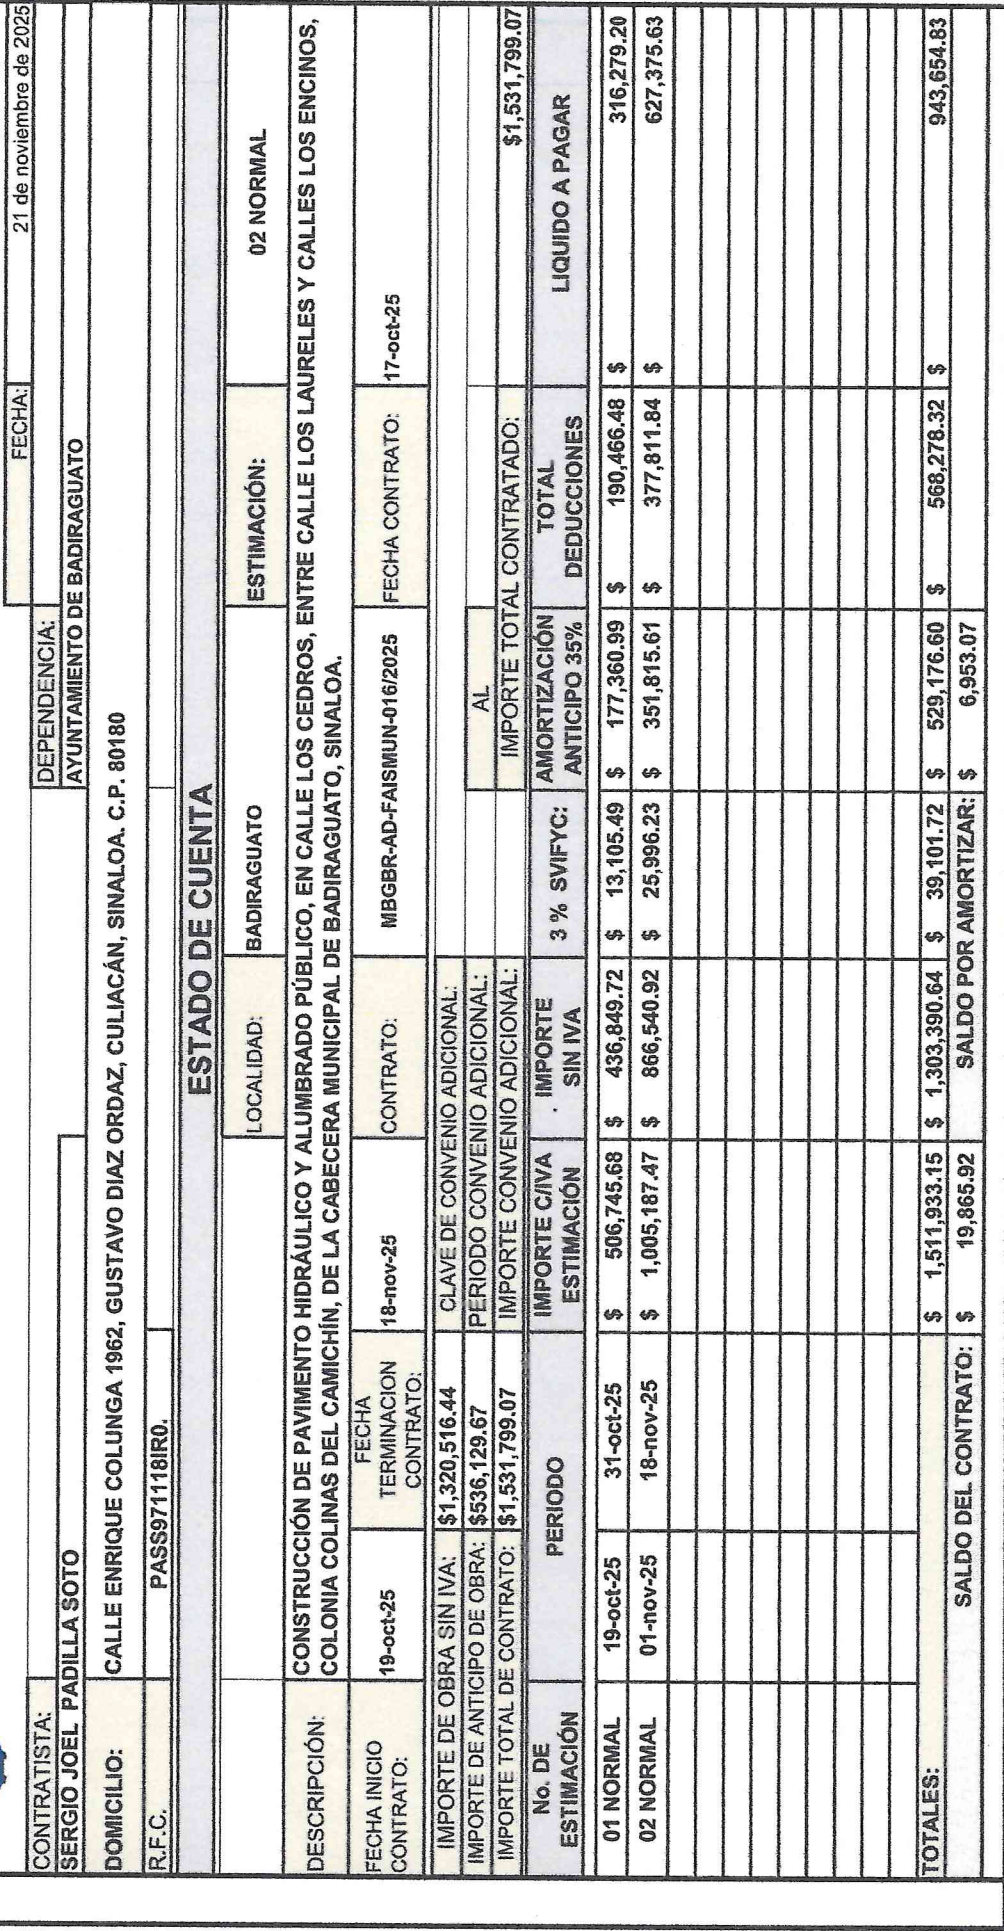

REVISOR.

ING. JOSE ROBERTO CONTRERAS LOPEZ
COSTO Y PRESUPUESTOS

AUTORIZO.-

C. ING. RUBIEL RINCÓN RAMOS
DIRECTOR DE O.P.D.U. Y E.



CONTRATISTA:		FECHA: 21 de noviembre de 2025	
SERGIO JOEL PADILLA SOTO		DEPENDENCIA:	
DOMICILIO: CALLE ENRIQUE COLUNGA 1962, GUSTAVO DIAZ ORDAZ, CULIACÁN, SINALOA. C.P. 80180		AYUNTAMIENTO DE BADIRAGUATO	
R.F.C.	PASS971118IR0.		

RESÚMEN DE ESTIMACIÓN

	LOCALIDAD:	BADIRAGUATO	ESTIMACIÓN:	02 NORMAL
DESCRIPCIÓN:	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO Y ALUMBRADO PÚBLICO, EN CALLE LOS CEDROS, ENTRE CALLE LOS LAURELES Y CALLES LOS ENCINOS, COLONIA COLINAS DEL CAMICHÍN, DE LA CABECERA MUNICIPAL DE BADIRAGUATO, SINALOA.			
IMPORTE DE OBRA SIN IVA:	\$ 1,320,516.44			
IMPORTE DE ANTICIPO DE OBRA:	\$ 536,129.67			
IMPORTE TOTAL DE CONTRATO:	\$ 1,531,799.07			

DESTAJOS		IMPORTE
1	PRELIMINARES	\$ -
2	ESTRUCTURA	\$ 753,701.09
3	INSTALACIONES ESPECIALES	\$ 100,194.87
4	TRABAJOS FINALES	\$ 12,644.96
SUBTOTAL ESTIMACIÓN:		\$ 866,540.92

SUB TOTAL=	\$ 866,540.92
I.V.A AL 16 %	\$ 138,646.55
TOTAL =	\$ 1,005,187.47

ELABORO.-

Sergio J. Padilla
C. SERGIO JOEL PADILLA SOTO
REPRESENTANTE LEGAL

REVISÓ.-

ING. JOSE RODOLFO CONTRERAS LOPEZ
COSTOS Y PRESUPUESTOS.

AUTORIZO.-

[Firma]
C. ING. RUBIEL RINCON RAMOS.
DIRECTOR DE O.P.D.U. Y E.



DESGLOSE

CONTRATISTA: SERGIO JOEL PADILLA SOTO		DEPENDENCIA:		AYUNTAMIENTO DE BADIRAGUATO		FECHA		viernes, 21 de noviembre de 2025	
DOMICILIO: CALLE ENRIQUE COLUNGA 1962, GUSTAVO DIAZ ORDAZ, CULIACÁN, SINALOA. C.P. 80180		R.F.C.		PASS971118IR0.					
DESGLOSE DE CONCEPTOS DE ESTIMACIÓN									
		LOCALIDAD:		BADIRAGUATO		ESTIMACIÓN:		02 NORMAL	
DESCRIPCIÓN: CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO Y ALUMBRADO PÚBLICO, EN CALLE LOS CEDROS, ENTRE CALLE LOS LAURELES Y CALLES LOS ENCINOS, COLONIA COLINAS DEL CAMICHÍN, DE LA CABECERA MUNICIPAL DE BADIRAGUATO, SINALOA.									
IMPORTE DE OBRA SIN IVA: \$1,320,516.44		IMPORTE DE ANTICIPO DE OBRA:		\$536,129.67		IMPORTE TOTAL DE CONTRATO: \$1,531,799.07			
CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	SEGUN PROYECTO		HASTA ESTA ESTIM	HASTA ESTIM ANTERIOR	EXCEDENTE	DE ESTA ESTIMACIÓN	IMPORTE
1	PRELIMINARES		CANT	P.U.	TOTAL				
2	ESTRUCTURA								
GP08	GUARNICIÓN TIPO "L" DE 15X30X60 DE CONCRETO PREMEZCLADO DE F'C= 250 KG/CM2, INCLUYE: CIMBRA Y DESIMBRA, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, MANIOBRAS LOCALES Y TODO LO	ML	142.65	\$ 719.19	\$ 102,592.45	142.65	0.00	142.65	\$ 102,592.45
GP088	PATIN DE 15X80 DE CONCRETO PREMEZCLADO DE F'C= 250 KG/CM2, INCLUYE: CIMBRA Y DESIMBRA, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, MANIOBRAS LOCALES Y TODO LO NECESARIO PARA SU	ML	37.85	\$ 624.05	\$ 23,620.29	19.40	0.00	19.40	\$ 12,106.57
GP109	LOSA DE CONCRETO DE 15 CMS DE ESPESOR CON CONCRETO PREMEZCLADO F'C=300 KG/CM², INCLUYE: MANO DE OBRA, MATERIALES, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	M2	717.51	\$ 839.01	\$ 601,998.07	717.51	0.00	717.51	\$ 601,998.07
GP133	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONTRA JUNTA DE PVC TIPO C-3 PARA LOSAS DE 15 CM. EN PAVIMENTOS, INCLUYE: TRAZO, ALINEACION, HINCADO Y REMOCIÓN DE TAPA.	ML	377.24	\$ 32.67	\$ 12,324.43	247.97	0.00	247.97	\$ 8,101.18
GP13	CALAFATEO EN LOSAS DE CONCRETO HIDRÁULICO CON ASFALTEX 505, INCLUYE: UN RIEGO CON EMULTEX T.P. (PRYMER), UN RIEGO DE ASFALTEX 505 Y BARRIDO DE LA SUPERFICIE.	ML	290.94	\$ 33.75	\$ 9,819.23	290.94	0.00	290.94	\$ 9,819.23
GP15	SUMINISTRO, HABILITADO Y COLOCACIÓN DE ACERO DE REFUERZO LISO EN PASAJUNTAS DE 5/8" DE DIÁMETRO, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	ML	95.98	\$ 77.12	\$ 7,401.98	95.98	0.00	95.98	\$ 7,401.98
GP11	PINTURA EN GUARNICIÓN DE 20 X 15 CM. CON PINTURA TIPO TRAFICO SCT COLOR AMARILLO O BLANCO, CON USO DE MAQUINA PINTARRAYAS, INCLUYE: PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, MATERIAL.	ML	142.70	\$ 81.89	\$ 11,685.70	142.65	0.00	142.65	\$ 11,681.61
3	INSTALACIONES ESPECIALES								
GP20	POLIDUCTO NARANJA REFORZADO DE 1-1/4" DE DIÁMETRO, INCLUYE: EXCAVACIÓN EN ZANJA EN TERRENO TIPO B, RELLENO CON MATERIAL PRODUCTO.	ML	80.00	\$ 160.42	\$ 12,833.60	80.00	0.00	80.00	\$ 12,833.60
GP21	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE XLP DS AL 3 CAL. 6 AWG, 600 VOLTS, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO.	ML	92.00	\$ 117.79	\$ 10,836.68	90.60	0.00	90.60	\$ 10,671.77
GP22	SISTEMA DE TIERRA PARA FINAL DE CIRCUITO, INCLUYE: VARILLA PARA TIERRA 5/8" x 1.50 m, CONECTORES PARA VARILLA DE TIERRA MECANICO.	PZA	1.00	\$ 1,194.74	\$ 1,194.74	1.00	0.00	1.00	\$ 1,194.74
GP23	LUMINARIA VIAL LED TECNOLOGIA FLR MODELO FORLEXA 3, FABRICADA EN ALUMINIO PURO INOXIDABLE, MEDIDAS 220X308X93MM, PROTECCIÓN	PZA	3.00	\$ 23,511.81	\$ 70,535.43	3.00	0.00	3.00	\$ 70,535.43
GP24	REGISTRO PREFABRICADO DE CONCRETO DE 40X40X40 CM CON TAPA DE CONCRETO DE 6 CM DE ESPESOR CON MARCO DE FIERRO GALVANIZADO DE 1	PZA	4.00	\$ 1,219.83	\$ 4,879.32	3.00	0.00	3.00	\$ 3,659.49

ELABORO.-

Sergio J. Padilla
C. SERGIO JOEL PADILLA SOTO
REPRESENTANTE LEGAL

REVISO

INC. JOSE RODOLFO CONTRERAS LOPEZ
COSTOS Y PRESUPUESTOS

AUTORIZO
[Firma]
C. ING. RUBÉN RAMÍREZ RAMOS
PRESIDENTE DEL C. A. P. U. P.



DESGLOSE

CONTRATISTA: SERGIO JOEL PADILLA SOTO		DEPENDENCIA:		AYUNTAMIENTO DE BADIRAGUATO		2 de 2				
DOMICILIO: CALLE ENRIQUE COLUNGA 1962, GUSTAVO DIAZ ORDAZ, CULIACÁN, SINALOA. C.P. 80180		R.F.C.:		PASS971118IR0.						
DESGLOSE DE CONCEPTOS DE ESTIMACIÓN										
LOCALIDAD: BADIRAGUATO		ESTIMACIÓN: 02 NORMAL								
DESCRIPCIÓN: CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO Y ALUMBRADO PÚBLICO, EN CALLE LOS CEDROS, ENTRE CALLE LOS LAURELES Y CALLES LOS ENCINOS, COLONIA COLINAS DEL CAMICHÍN, DE LA CABECERA MUNICIPAL DE BADIRAGUATO, SINALOA.										
IMPORTE DE OBRA SIN IVA: \$1,320,516.44		IMPORTE DE ANTICIPO DE OBRA: \$536,129.67		IMPORTE TOTAL DE CONTRATO:		\$1,531,799.07				
CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANT	P.U.	SEGUN PROYECTO	HASTA ESTA ESTIM	HASTA ESTIM ANTERIOR	EXCEDENTE	DE ESTA ESTIMACIÓN	IMPORTE
GP30	INTERCONEXION A RED ELECTRICA INCLUYE MATERIAL MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	PZA	1.00	\$ 1,299.84	\$ 1,299.84	1.00	0.00	0.00	1.00	\$ 1,299.84
4	TRABAJOS FINALES									
GBR671	LETrero INFORMATIVO ALUSIVO A LA OBRA FABRICADO CON PTR VER PLANO INCLUYE:	PZA	1.00	\$ 4,771.52	\$ 4,771.52	1.00	0.00	0.00	1.00	\$ 4,771.52
GP101	LIMPIEZA DE OBRA. INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	M2	841.18	\$ 9.36	\$ 7,873.44	841.18	0.00	0.00	841.18	\$ 7,873.44
									SUB-TOTAL	\$ 866,540.92
									IVA	\$ 138,646.55
									MONTO TOTAL	\$ 1,005,187.47

ELABORO.-

Sergio J. Padilla
C. SERGIO JOEL PADILLA SOTO
REPRESENTANTE LEGAL

REVISÓ

ING. JOSE RODOLFO CONTRERAS LOPEZ
COSTOS Y PRESUPUESTOS

AUTORIZO

C. ING. RUBEN RINCON RAMOS
PRESUPUESTOS DE OBRAS Y E



CONTRATISTA: SERGIO JOEL PADILLA SOTO		DEPENDENCIA: AYUNTAMIENTO DE BADIRAGUATO	
CONTRATISTA: SERGIO JOEL PADILLA SOTO			
R.F.C.: PASS971118R0.			
OBRA: CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO Y ALUMBRADO PÚBLICO, EN CALLE LOS CEDROS, ENTRE CALLE LOS LAURELES Y CALLES LOS ENCINOS, COLONIA COLINAS DEL CAMICHÍN, DE LA CABECERA MUNICIPAL DE BADIRAGUATO, SINALOA.			
ESTIMACION: 02 NORMAL			

GENERADORES DE ESTIMACION									
CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANT	LARGO	ANCHO	ESPESOR	ACUMULADO		OBSERVACIONES
							PARCIAL	TOTAL	
2	ESTRUCTURA								
GP08	GUARNICIÓN TIPO "L" DE 15X30X60 DE CONCRETO PREMEZCLADO DE FC= 250 KG/CM2. INCLUYE: CIMBRA Y DESIMBRA, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, MANIOBRAS	ML							VER CROQUIS
	LADO IZQUIERDO						83.25		
	LADO DERECHO						59.40		
							TOTAL EJECUTADO	142.65	
GP088	PATIN DE 15X60 DE CONCRETO PREMEZCLADO DE FC= 250 KG/CM2. INCLUYE: CIMBRA Y DESIMBRA, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, MANIOBRAS LOCALES Y TODO LO	ML							VER CROQUIS
	LADO IZQUIERDO						1.40		
	LADO DERECHO						18.00		
							TOTAL EJECUTADO	19.40	
GP109	LOSA DE CONCRETO DE 15 CMS DE ESPESOR CON CONCRETO PREMEZCLADO FC=300 KG/CM2. INCLUYE: MANO DE OBRA, MATERIALES, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	M2							VER CROQUIS
				100.54	7.40		744.00		
							TOTAL EJECUTADO	744.00	
							ESTA ESTIMACION	717.51	
							ESTIMACION ADICIONAL	26.49	
GP133	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONTRA JUNTA DE PVC TIPO C-3 PARA LOSAS DE 15 CM. EN PAVIMENTOS, INCLUYE: TRAZO, ALINEACIÓN,	ML							
				100.54	7.40		33.51	247.97	
							TOTAL EJECUTADO	247.97	
GP13	CALAFATEO EN LOSAS DE CONCRETO HIDRÁULICO CON ASFALTEX 505. INCLUYE: UN RIEGO CON EMULTEX T.P. (PRIMER), UN RIEGO DE ASFALTEX 505 Y BARRIDO DE LA SUPERFICIE.	ML							VER CROQUIS
	LADO IZQUIERDO			100.54			100.54		
	CENTRO			100.54			100.54		
	LADO DERECHO			100.54			100.54		
	PATIN Y GUARNICIÓN			67.03			67.03		
							TOTAL EJECUTADO	388.65	
							ESTA ESTIMACION	296.94	
							ESTIMACION ADICIONAL	77.71	
GP15	SUMINISTRO, HABILITADO Y COLOCACIÓN DE ACERO DE REFUERZO LISO EN PASAJUNTAS DE 5/8" DE DIAMETRO. INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	PZA							VER CROQUIS
				95.98			95.98		
							TOTAL EJECUTADO	95.98	
GP11	PINTURA EN GUARNICIÓN DE 20 X 15 CM. CON PINTURA TIPO TRAFICO SCT COLOR AMARILLO O BLANCO, CON USO DE MAQUINA PINTARRAYAS, INCLUYE: PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE.	PZA							VER CROQUIS
	LADO IZQUIERDO						83.25		
	LADO DERECHO						59.40		
							TOTAL EJECUTADO	142.65	
3	INSTALACIONES ESPECIALES								
GP20	POLIDUCTO NARANJA REFORZADO DE 1-1/4" DE DIAMETRO, INCLUYE: EXCAVACIÓN EN ZANJA EN TERRENO TIPO B, RELLENO CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN, MANO DE OBRA,	PZA							VER CROQUIS
	DE ALIMENTACIÓN AL POSTE 1			27.00			27.00		
	POSTE 1 AL POSTE 2			31.80			31.80		
	POSTE 2 AL POSTE 3			30.30			30.30		
							TOTAL EJECUTADO	89.10	
							ESTA ESTIMACION	80.00	
							ESTIMACION ADICIONAL	9.10	
GP21	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE XLP DS AL 3 CAL. 6 AWG, 600 VOLTS, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA							VER CROQUIS
	DE ALIMENTACIÓN AL POSTE 1			27.00			27.00		
	POSTE 1 AL POSTE 2			31.80			31.80		
	POSTE 2 AL POSTE 3			30.30			30.30		
	COCA EN REGISTRO			3.00	0.50		1.50		
							TOTAL EJECUTADO	90.60	

ELABORO:-
Sergio J. Padilla
C. SERGIO JOEL PADILLA SOTO
REPRESENTANTE LEGAL

REVISO:-
[Firma]
SUPERVISOR DE OBRA

AUTORIZO:-
[Firma]
ING. RUBEN RAMOS
DIRECTOR DE O.P.D.U. Y E.



CONTRATISTA:		SERGIO JOEL PADILLA SOTO		DEPENDENCIA:		AYUNTAMIENTO DE BADIRAGUATO	
R.F.C.:		PASS971118IR0.					
OBRA:		CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO Y ALUMBRADO PÚBLICO, EN CALLE LOS CEDROS, ENTRE CALLE LOS LAURELES Y CALLES LOS ENCINOS, COLONIA COLINAS DEL CAMICHÍN, DE LA CABECERA MUNICIPAL DE BADIRAGUATO, SINALOA.					
ESTIMACIÓN		02 NORMAL					
GENERADORES DE ESTIMACION							
GP22	SISTEMA DE TIERRA PARA FINAL DE CIRCUITO, INCLUYE: VARILLA PARA TIERRA 5/8" x 1.50 m, CONECTOR PARA VARILLA DE TIERRA MECANICO, SOLDADURA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y	ML					VER CROQUIS
						1.00	
						TOTAL EJECUTADO	1.00
GP23	LUMINARIA VIAL LED TECNOLOGIA FLR MODELO FORLEXA 3, FABRICADA EN ALUMINIO PURO INYECTADO MEDIDAS 720X300X93 MM, PROTECCIÓN IP66/IK08, CON TRES MÓDULOS (48	ML					VER CROQUIS
						3.00	
						TOTAL EJECUTADO	3.00
GP24	REGISTRO PREFABRICADO DE CONCRETO DE 40X40X40 CM CON TAPA DE CONCRETO DE 6 CM DE ESPESOR, CON MARCO DE FIERRO GALVANIZADO DE 1 1/2"X1 1/2"X1/8"	PZA					VER CROQUIS
						3.00	
						TOTAL EJECUTADO	3.00
GP30	INTERCONEXIÓN A RED ELECTRICA INCLUYE MATERIAL MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	ML					VER CROQUIS
						1.00	
						TOTAL EJECUTADO	1.00
4	TRABAJOS FINALES	ML					
GBR571	LETRERO INFORMATIVO ALUSIVO A LA OBRA FABRICADO CON PTR VER PLANO, INCLUYE: INFORMACIÓN DE LA OBRA, PATAS DE METAL COLADA CON CONCRETO HECHO EN OBRA DE	PZA					VER CROQUIS
						1.00	
						TOTAL EJECUTADO	1.00
GP101	LIMPIEZA DE OBRA, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	M2					VER CROQUIS
				100.54	8.40	844.54	
						TOTAL EJECUTADO	844.54
						ESTA ESTIMACION	841.18
						ESTIMACION ADICIONAL	3.36

ELABORO.-
Sergio J. Padilla
C. SERGIO JOEL PADILLA SOTO
REPRESENTANTE LEGAL

REVISO.-
[Firma]
SUPERVISOR DE OBRA

AUTORIZO.-
[Firma]
ING. RUBIEL RINCÓN RAMOS
DIRECTOR DE O.P.D.U. Y E.



CONTRATISTA:
SERGIO JOEL PADILLA SOTO

DEPENDENCIA:
AYUNTAMIENTO DE BADIRAGUATO


DOMICILIO: CALLE ENRIQUE COLUNGA 1962, GUSTAVO DIAZ ORDAZ, CULIACÁN, SINALOA. C.P. 80180

R.F.C. PASS971118IR0.

OBRA: CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO Y ALUMBRADO PÚBLICO, EN CALLE LOS CEDROS, ENTRE CALLE LOS LAURELES Y CALLES LOS ENCINOS, COLONIA COLINAS DEL CAMICHÍN, DE LA CABECERA MUNICIPAL DE BADIRAGUATO, SINALOA.

CROQUIS ESTIMACION:

CLAVE	CONCEPTO
2	ESTRUCTURA
GP08	GUARNICIÓN TIPO "L" DE 15X30X60 DE CONCRETO PREMEZCLADO DE FC= 250 KG/CM2, INCLUYE: CIMBRA Y DESIMBRA, MATERIALES, MANO DE
GP088	PATIN DE 15X60 DE CONCRETO PREMEZCLADO DE FC= 250 KG/CM2, INCLUYE: CIMBRA Y DESIMBRA, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA,
GP109	LOSA DE CONCRETO DE 15 CMS DE ESPESOR CON CONCRETO PREMEZCLADO FC=300 KG/CM", INCLUYE: MANO DE OBRA, MATERIALES,
GP133	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONTRA JUNTA DE PVC TIPO C-3 PARA LOSAS DE 15 CM. EN PAVIMENTOS, INCLUYE: TRAZO, ALINEACIÓN,
GP13	CALAFATEO EN LOSAS DE CONCRETO HIDRÁULICO CON ASFALTEX 505, INCLUYE: UN RIEGO CON EMULTEX T.P. (PRIMER), UN RIEGO DE ASFALTEX
GP15	SUMINISTRO, HABILITADO Y COLOCACIÓN DE ACERO DE REFUERZO LISO EN PASAJUNTAS DE 5/8" DE DIAMETRO, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE
GP11	PINTURA EN GUARNICIÓN DE 20 X 15 CM. CON PINTURA TIPO TRAFICO SCT COLOR AMARILLO O BLANCO, CON USO DE MAQUINA PINTARRAYAS,

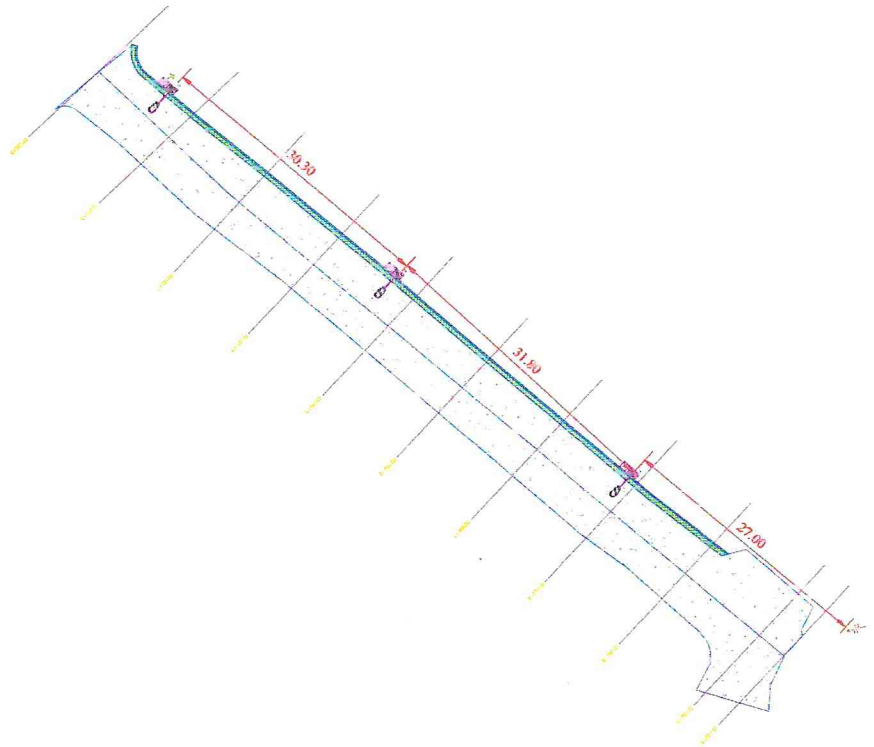

ELABORO.-

Sergio J. Padilla
CC. SERGIO JOEL PADILLA SOTO
REPRESENTANTE LEGAL

REVISO.-

SUPERVISOR DE OBRA

AUTORIZO.-

C. ING. RUBIEL RINCON RAMOS,
DIRECTOR DE O.P.D.U. Y E.



CONTRATISTA:
SERGIO JOEL PADILLA SOTO

DEPENDENCIA:
AYUNTAMIENTO DE BADIRAGUATO


DOMICILIO: CALLE ENRIQUE COLUNGA 1962, GUSTAVO DIAZ ORDAZ, CULIACÁN, SINALOA. C.P. 80180

R.F.C. PASS971118IR0.

OBRA: CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO Y ALUMBRADO PÚBLICO, EN CALLE LOS CEDROS, ENTRE CALLE LOS LAURELES Y CALLES LOS ENCINOS, COLONIA COLINAS DEL CAMICHÍN, DE LA CABECERA MUNICIPAL DE BADIRAGUATO, SINALOA.

CROQUIS ESTIMACION:

3	INSTALACIONES ESPECIALES
GP20	POLIDUCTO NARANJA REFORZADO DE 1-1/4" DE DIÁMETRO, INCLUYE: EXCAVACIÓN EN ZANJA EN TERRENO TIPO B, RELLENO CON MATERIAL
GP21	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE XLP DS AL 3 CAL. 6 AWG, 600 VOLTS, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO
GP22	SISTEMA DE TIERRA PARA FINAL DE CIRCUITO, INCLUYE: VARILLA PARA TIERRA 5/8" x 1.50 m. CONECTOR PARA VARILLA DE TIERRA MECANICO,
GP23	LUMINARIA VIAL LED TECNOLOGIA FLR MODELO FORLEXA 3, FABRICADA EN ALUMINIO PURO INYECTADO MEDIDAS 720X308X93 MM. PROTECCIÓN
GP24	REGISTRO PREFABRICADO DE CONCRETO DE 40X40X40 CM CON TAPA DE CONCRETO DE 6 CM DE ESPESOR, CON MARCO DE FIERRO
GP30	INTERCONEXIÓN A RED ELÉCTRICA INCLUYE MATERIAL MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.

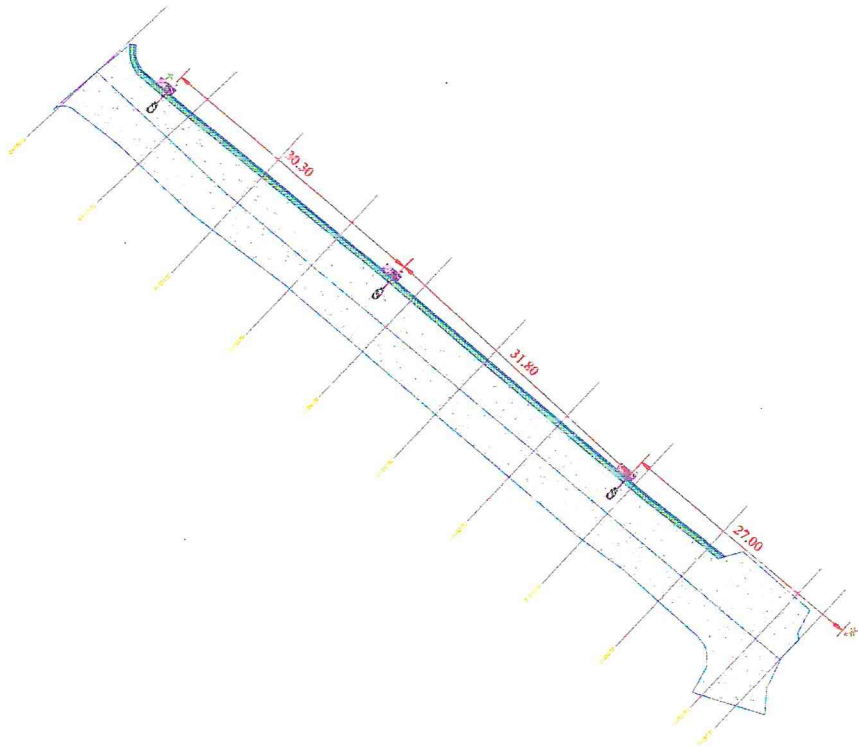

ELABORO.-

Sergio J. Padilla
CC. SERGIO JOEL PADILLA SOTO
REPRESENTANTE LEGAL

REVISO.-

SUPERVISOR DE OBRA

AUTORIZO.-

C. ING. RUBIEL RINCON RAMOS.
DIRECTOR DE O.P.D.U. Y E.



CONTRATISTA:
SERGIO JOEL PADILLA SOTO

DEPENDENCIA:
AYUNTAMIENTO DE BADIRAGUATO


DOMICILIO: CALLE ENRIQUE COLUNGA 1962, GUSTAVO DIAZ ORDAZ, CULIACÁN, SINALOA, C.P. 80180

R.F.C. PASS971118IR0.

OBRA: CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO Y ALUMBRADO PÚBLICO, EN CALLE LOS CEDROS, ENTRE CALLE LOS LAURELES Y CALLES LOS ENCINOS, COLONIA COLINAS DEL CAMICHÍN, DE LA CABECERA MUNICIPAL DE BADIRAGUATO, SINALOA.

CROQUIS ESTIMACION:

4	TRABAJOS FINALES
GBR671	LETRERO INFORMATIVO ALUSIVO A LA OBRA FABRICADO CON PTR VER PLANO, INCLUYE: INFORMACIÓN DE LA OBRA, PATAS DE METAL COLADA
GP101	LIMPIEZA DE OBRA, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.

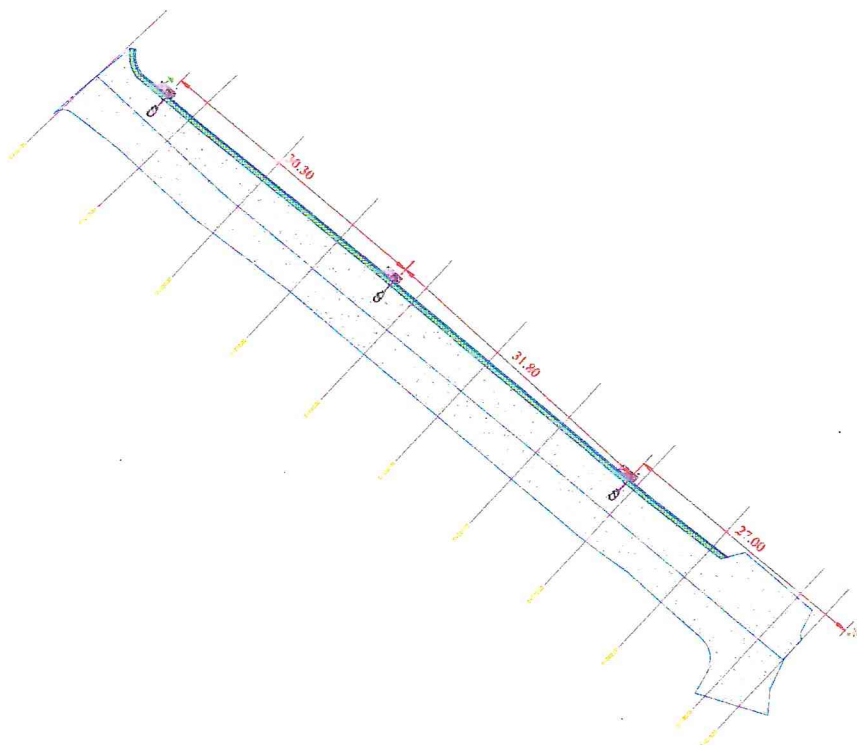

ELABORÓ.-

Sergio J. Padilla
CC. SERGIO JOEL PADILLA SOTO
REPRESENTANTE LEGAL

REVISÓ.-

[Signature]
SUPERVISOR DE OBRA

AUTORIZO.-

[Signature]
C. ING. RUBIEL RINCON RAMOS.
DIRECTOR DE O.P.D.U. Y E.



CONTRATISTA:

DEPENDENCIA:

SERGIO JOEL PADILLA SOTO

AYUNTAMIENTO DE BADIRAGUATO

DOMICILIO:

CALLE ENRIQUE COLUNGA 1962, GUSTAVO DIAZ ORDAZ, CULIACÁN, SINALOA. C.P. 80180

R.F.C.

PASS971118IR0.

OBRA:

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO Y ALUMBRADO PÚBLICO, EN CALLE LOS CEDROS, ENTRE CALLE LOS LAURELES Y CALLES LOS ENCINOS, COLONIA COLINAS DEL CAMICHÍN, DE LA CABECERA MUNICIPAL DE BADIRAGUATO, SINALOA.

FOTOS DE ESTIMACION:

CONCEPTO

ESTRUCTURA

CVE	2
GP08	GUARNICIÓN TIPO "L" DE 15X30X60 DE CONCRETO PREMEZCLADO DE F'C= 250 KG/CM2, INCLUYE: CIMBRA Y DESIMBRA, MATERIALES, MANO DE OBRA,
GP088	PATIN DE 15X60 DE CONCRETO PREMEZCLADO DE F'C= 250 KG/CM2, INCLUYE: CIMBRA Y DESIMBRA, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA,
GP109	LOSA DE CONCRETO DE 15 CMS DE ESPESOR CON CONCRETO PREMEZCLADO F'C=300 KG/CM", INCLUYE: MANO DE OBRA, MATERIALES, HERRAMIENTA
GP133	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONTRA JUNTA DE PVC TIPO C-3 PARA LOSAS DE 15 CM. EN PAVIMENTOS, INCLUYE: TRAZO, ALINEACIÓN, HINCADO Y
GP13	CALAFATEO EN LOSAS DE CONCRETO HIDRÁULICO CON ASFALTEX 505, INCLUYE: UN RIEGO CON EMULTEX T.P. (PRYMER), UN RIEGO DE ASFALTEX 505
GP15	SUMINISTRO, HABILITADO Y COLOCACIÓN DE ACERO DE REFUERZO LISO EN PASAJUNTAS DE 5/8" DE DIAMETRO, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y
GP11	PINTURA EN GUARNICIÓN DE 20 X 15 CM. CON PINTURA TIPO TRAFICO SCT COLOR AMARILLO O BLANCO, CON USO DE MAQUINA PINTARRAYAS,



ELABORO.-

Sergio J. Padilla
C. SERGIO JOEL PADILLA SOTO

REVISO.-

AUTORIZO.-

C. ING. RUBIEL RINCON RAMOS



CONTRATISTA:

SERGIO JOEL PADILLA SOTO

DEPENDENCIA:

AYUNTAMIENTO DE BADIRAGUATO

DOMICILIO:

CALLE ENRIQUE COLUNGA 1962, GUSTAVO DIAZ ORDAZ, CULIACÁN, SINALOA. C.P. 80180

R.F.C.

PASS971118IRO.

OBRA:

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO Y ALUMBRADO PÚBLICO, EN CALLE LOS CEDROS, ENTRE CALLE LOS LAURELES Y CALLES LOS ENCINOS, COLONIA COLINAS DEL CAMICHIN, DE LA CABECERA MUNICIPAL DE BADIRAGUATO, SINALOA.

FOTOS DE ESTIMACION:

CVE

4.

CONCEPTO

TRABAJOS FINALES

GBR67 LETRERO INFORMATIVO ALUSIVO A LA OBRA FABRICADO CON PTR VER PLANO, INCLUYE: INFORMACIÓN DE LA OBRA, PATAS DE METAL COLADA CON
GP101 LIMPIEZA DE OBRA. INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.



ELABORO.-

Sergio J. Padilla
C. SERGIO JOEL PADILLA SOTO
REPRESENTANTE LEGAL

REVISO.-

[Signature]
SUPERVISOR DE OBRA

AUTORIZO.-

[Signature]
C. ING. RUBIEL RINCON RAMOS
DIRECTOR DE O P D I I Y F



Fecha y hora de consulta02/12/2025 4:25:32 PM

Contrato00798320

Nombre del ClienteMUNICIPIO DE BADIRAGUATO

BBVA Net Cash - Pagos Interbancarios

Operación autorizada

Transferencia en proceso de validación y aplicación.

Datos del firmante

Usuario:ADMIN1

Poder:100%

Datos de la operación

Tipo de operación: Pago Interbancario

Descripción:EST 02 NORM AD 16

Importe de la operación:627,375.63 MXP

Cuenta de retiro:0124174836

Cuenta de depósito:072730012837223485

Divisa de la cuenta: MXP

Divisa de la cuenta: MXP

Titular de la cuenta:MUNICIPIO DE BADIRAGUATO

Titular de la cuenta:SERGIO JOEL PADILLA SOTO

Nombre banco destino: BANORTE

Fecha de creación:02/12/2025

Fecha de aplicación:02/12/2025

Concepto de pago:EST 02 NORM AD 16

Referencia numérica:

Instrumento de seguridad:ASD 6551749382

Hora de captura en el canal:16:25:30

Datos de confirmación de la transferencia

Folio interbancario:0000473311

Clave de rastreo:002601002512020000473311

Folio de firma:0043518230

Folio único:I401202512021625300043518236

Estado operación

Porcentaje Firmado:100%

Estado:Operado

Detalle de firmas

Acción	Usuario	Porcentaje aportado	Fecha
CREO	ADMIN1	--- %	02/12/2025
FIRMO	ADMIN1	100 %	02/12/2025
