



Badiraguato

GENERANDO BUENOS RESULTADOS



OFICIO No. OPDUyE/603/2025
ASUNTO: SOLICITUD PAGO DE ESTIMACIÓN
01 ADICIONAL FINIQUITO
Badiraguato, Sin., a 05 de Noviembre de 2025

MTRO. GONZALO IRINEO CABALLERO TERRAZAS
TESORERO MUNICIPAL
P R E S E N T E.-

POR MEDIO DE LA PRESENTE, LE SOLICITO EL PAGO POR CONCEPTO DE ESTIMACIÓN 01 ADICIONAL FINIQUITO, DEL IMPORTE DEL CONTRATO, A FAVOR DE LA EMPRESA: SERGIO URIAS RUBIO, LA CUAL REALIZARÁ LOS TRABAJOS APROBADOS POR EL CABILDO MUNICIPAL, CON EL ACTA DE CABILDO SESIÓN EXTRAORDINARIA PÚBLICA DE CABILDO NÚMERO 02 (DOS) DE FECHA 18 DE ABRIL DE 2025, A CONTINUACIÓN, SE DETALLA:

- NOMBRE DE LA OBRA: CONSTRUCCIÓN DE SEGUNDA ETAPA DE "ARENA BADIRAGUATO" EN INSTALACIONES DE UNIDAD DEPORTIVA 20 DE NOVIEMBRE, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE BADIRAGUATO, SINALOA.
- No. DE CONTRATO: MBGBR-LP-GC-002/2025
- IMPORTE DEL CONTRATO: \$9,385,424.73 (NUEVE MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS VEINTICUATRO PESOS 73/100 M.N)
- CONCEPTO DEL PAGO: PAGO DE ESTIMACIÓN 01 ADICIONAL FINIQUITO
- IMPORTE A PAGAR: \$436,891.48 (CUATROCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y UN PESOS 48/100 M.N)
- RECURSOS: FONDO DEL GASTO CORRIENTE MUNICIPAL, EJERCICIO 2025
- EMPRESA: SERGIO URIAS RUBIO
- R.F.C. UIRS-830403-HH7
- DOMICILIO FISCAL: CALLE MAYO # 1593 OTE, ENTRE CEIBA Y AMAPAS, FRACC. UAS 94, LOS MOCHIS, SINALOA, C.P. 81285
- FACTURA: # 414, DE FECHA 05 DE NOVIEMBRE DE 2025

SE ANEXA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DE SOPORTE, COMO AMPARO DE DICHO PAGO.

AGRADECIENDO DE ANTEMANO LA ATENCIÓN QUE SE SIRVA DAR A LA PRESENTE, ME DESPIDO ENVIÁNDOLE UN CORDIAL SALUDO.



DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS,
DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA.
BADIRAGUATO, SINALOA.


C.C.P. ARCHIVO.

ATENTAMENTE


C. ING. RUBIEL RINCÓN RAMOS
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS,
DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA



MUNICIPIO DE
BADIRAGUATO
TESORERÍA

2:38 pm
06 NOV 2025

RECIBIDO

SERGIO URIAS RUBIO
UIRS830403HH7
MAYO ORIENTE No. 1593 Universitario,
Los Mochis C.P. 81285Ahome
Sinaloa México
Régimen Fiscal: 612 - Personas Físicas con Actividades
Empresariales y Profesionales

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

FOLIO: 414

FECHA: 5/11/2025 14:22:37

CLIENTE:	MUNICIPIO DE BADIRAGUATO	R.F.C.:	MBA850101214
DOMICILIO:	GABRIEL LEYVA SOLANO No. S/N COLONIA: Badiraguato Uso CFDI: 101 - Construcciones.		
CIUDAD:	, Badiraguato, Sinaloa, México C.P. 80500		

CANTIDAD	Unidad Clave SAT	Clave sat Descripción	Valor Unitario Impuesto	Importe
1.00	E48	72101500-SERVICIO DE CONSTRUCCIÓN ESTIMACION 01 (ADICIONAL) FINQUITO OBRA: CONSTRUCCIÓN DE SEGUNDA ETAPA DE "ARENA BADIRAGUATO" EN INSTALACIONES DE UNIDAD DEPORTIVA 20 DE NOVIEMBRE, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE BADIRAGUATO, SINALOA. CONTRATO No.: MBGBR-LP-GC-002/2025 MONTO DEL CONTRATO NETO: \$ 9,385,424.73 IMPORTE DE ESTA ESTIMACION: \$ 603,441.28 (-) MENOS AMORTIZACION: \$ 211,204.45 TOTAL: \$ 392,236.83 (+) MAS 16% IVA: \$ 62,757.89 TOTAL: \$ 454,994.72 DEDUCCIONES 3% SVIFYC: \$ 18,103.24 SALDO LIQUIDO: \$ 436,891.48	392,236.83 002 - IVA - 62,757.89	392,236.83

CANTIDAD CON LETRA: (CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL
NOVECIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS 72/100 M.N.)

"EFECTOS FISCALES AL PAGO"

FORMA DE PAGO: 03 - Transferencia electrónica de fondos
Método de PAGO: PUE - Pago en una sola exhibición

COMPLEMENTO DE IMPUESTOS LOCALES (V1.0)
Monto total retenido

Impuesto local retenido	Tasa de Retención	Importe
AUD. SUP. EST.	2 %	0.00
ORG. DE CONTROL	1 %	0.00
SUP. MUN.	2 %	0.00

CFDI Relacionado:

Tipo Relación:

CFDI Relacionado:

Este documento es una representación impresa de un CFDI Lugar de Expedición: 81285 Moneda: MXN - Peso Mexicano



FOLIO FISCAL	No. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT
DEAD0F16-F515-46A8-B15C-D3222A4463FF	00001000000709182898
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION	SERIE DEL CERTIFICADO
Noviembre 5 2025 - 15:22:39	00001000000511952375
SELLO DIGITAL DEL CFDI	
d/rMIV4ruQwZ7X9KaolI4kY77Jn3htDnbWJHSXVRDhJwdR/KDUEU99ZlqDX1s8gIR685Pb7Cygida7VUNelC6BfgH6GYWqXii XdOc7vN2g7zmV9/Yld+LofISLDdbEHXmX3gRivKqGwmwSVLJultKJTCXlweS+fpb3QNC3/o9NThfr8i5Hejbd4GofdvwwYBIDP qJNuKEJQhntRsMYcZIOeFPHLh6il1eNfbG37dyVOd6ACjAudROGN+IOXbgP9KMIU1PMCNE6QAVC2nblUrLhbxUuYvnh9aOyMrth dJNjvYiIRdIlfnzC3KPE8LzpyZgEqDPc2D+JAKag==	
CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT	
[1.1]DEAD0F16-F515-46A8-B15C-D3222A4463FF[2025-11-05T15:22:39]MAS0810247C0[d/rMIV4ruQwZ7X9KaolI4kY77Jn3htDnbWJHSXVRDhJwdR/KDUEU99ZlqDX1s8gIR685Pb7Cygida7VUNelC6BfgH6GYWqXiiXdOc7vN2g7zmV9/Yld+LofISLDdbEHXmX3gRivKqGwmwSVLJultKJTCXlweS+fpb3QNC3/o9NThfr8i5Hejbd4GofdvwwYBIDPqJNuKEJQhntRsMYcZIOeFPHLh6il1eNfbG37dyVOd6ACjAudROGN+IOXbgP9KMIU1PMCNE6QAVC2nblUrLhbxUuYvnh9aOyMrthdJNjvYiIRdIlfnzC3KPE8LzpyZgEqDPc2D+JAKag==][00001000000709182898]	
SELLO DEL SAT	
Zig1Gf0+3GxzwRANQINcU+Jf5QJK+G3HAqFllwU8pKy4E1Bf1mRvr2VwoAHhL2RPQjehlYrIBwGVnMun6zDc8oVmCB7/QOh 9RqgTX8HJod6UAaj/GGmW3tk8s2Vj++dGks3NePr/3vplR5ChSjWO39v4FIFAdmhPbFNeKGwF4SegfNgABCJ2luEEOkoHSQl.r ZEJp2hYqRwK3IEc86s2CJqE1+JO+AMaizN3Mbs88A5AInGG9Ronb4dUzs8IwXXwJPwwBj56b/qcwbMii0TD1gCjH8YERvUzF7 g+yo4dN0X5bbQ2vEz5wyA3HAsM4bxQ3pkKzVNr==	

Debo (emos) y pagaré (mos) a la orden de **SERGIO URIAS RUBIO**. En esta ciudad de **LOS MOCHIS, SINALOA**, la cantidad **CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS 72/100 M.N. (454,994.72 M.N.)** Valor de las mercancías arriba detalladas y que recibí (mos) de conformidad, este pagaré es mercantil y está regido por la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito en su Artículo 173 parte final y demás artículos correlativos por no ser pagaré domiciliado. Si este pagaré no fuera cubierto a su vencimiento me obligo a pagar intereses moratorios de 5% mensual hasta la fecha de su total liquidación.

Nombre y Firma

This XML file does not appear to have any style information associated with it. The document tree is shown below.

```
<cfdi:Comprobante xmlns:cfdi="http://www.sat.gob.mx/cfd/4" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/cfd/4 http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/4/cfdv40.xsd" Version="4.0" Folio="414" Fecha="2025-11-
05T14:22:37"
Sello="c1/rMtV4ruQwZ7X9KaolLt14kY77Jn3htDnbWJHSXVRDhJwdR/KDUEU99ZiQDX1s8glR685Pb7Cygida7VUNelC6BfgH6GYWqXiiXdc7vN2g7zm/v9/Yid+LolfSLDbdEHXmX3gRivKqGwmwS
FormaPago="03" NoCertificado="00001000000511952375"
Certificado="MIIFzzCCA7egAwIBAgIUMDAwMDEwMDAwMDA1MTE5NTIzNzUwDQYJKoZIhvcNAQELBQAwggGEMSAwHgYDVQDDbD8VVRPUk1EQUUgQ0VSVElGSUNBRE9SQTEuMCwGA1UECgw1U0VSVk1C
SubTotal="392236.83" Moneda="MXN" Total="454994.72" TipoDeComprobante="I" Exportacion="01" MetodoPago="PUE" LugarExpedicion="81285">
<cfdi:Emisor RegimenFiscal="612" Rfc="UIRS830403HH7" Nombre="SERGIO URIAS RUBIO"/>
<cfdi:Receptor Rfc="MBA850101214" Nombre="MUNICIPIO DE BADIRAGUATO" DomicilioFiscalReceptor="80500" RegimenFiscalReceptor="603" UsoCFDI="I01"/>
<cfdi:Conceptos>
<cfdi:Concepto ClaveProdServ="72101500" ClaveUnidad="E48" Cantidad="1.00" NoIdentificacion="01" Descripcion="SERVICIO DE CONSTRUCCIÓN ESTIMACION 01
(ADICIONAL) FINIQUITO OBRA: CONSTRUCCIÓN DE SEGUNDA ETAPA DE "ARENA BADIRAGUATO" EN INSTALACIONES DE UNIDAD DEPORTIVA 20 DE NOVIEMBRE, UBICADA EN LA
CABECERA MUNICIPAL DE BADIRAGUATO, SINALOA. CONTRATO No.: MBGBR-LP-GC-002/2025 MONTO DEL CONTRATO NETO: $ 9,385,424.73 IMPORTE DE ESTA ESTIMACION: $
603,441.28 (-) MENOS AMORTIZACION: $ 211,204.45 TOTAL: $ 392,236.83 (+) MAS 16% IVA: $ 62,757.89 TOTAL: $ 454,994.72 DEDUCCIONES 3% SVIFYC: $
18,103.24 SALDO LIQUIDO: $ 436,891.48" ValorUnitario="392236.83" Importe="392236.83" ObjetoImp="02">
<cfdi:Impuestos>
<cfdi:Traslados>
<cfdi:Traslado Base="392236.83" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.160000" Importe="62757.89"/>
</cfdi:Traslados>
</cfdi:Impuestos>
</cfdi:Concepto>
</cfdi:Conceptos>
<cfdi:Impuestos TotalImpuestosTrasladados="62757.89">
<cfdi:Traslados>
<cfdi:Traslado Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.160000" Importe="62757.89" Base="392236.83"/>
</cfdi:Traslados>
</cfdi:Impuestos>
<cfdi:Complemento>
<tfd:TimbreFiscalDigital xmlns:tfd="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital
http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/TimbreFiscalDigital/TimbreFiscalDigitalv11.xsd" Version="1.1" UUID="DEAD0F16-F515-46A8-B15C-D3222A4463FF"
FechaTimbrado="2025-11-05T15:22:39" RfcProvCertif="MAS0810247C0"
SelloCFD="c1/rMtV4ruQwZ7X9KaolLt14kY77Jn3htDnbWJHSXVRDhJwdR/KDUEU99ZiQDX1s8glR685Pb7Cygida7VUNelC6BfgH6GYWqXiiXdc7vN2g7zm/v9/Yid+LolfSLDbdEHXmX3gRiv
NoCertificadoSAT="00001000000709182898"
SelloSAT="Zig1Gf0+3GxZwRANQ1Ncu+J15QJK+G3HAqFllwiU8pKy4E1Bf1m1Rvr2VwoAHhFL2RPQjehtIyrIBwGVfnMun6zDc8oVmCB7/Q0h9RqTX8HJo6dUAajGGmW3tK8s2Vj+i+dGks3NeP
</cfdi:Complemento>
</cfdi:Comprobante>
```

Fecha: 20-ago-25

CARATULA DE ESTIMACIÓN

CONTRATISTA: SERGIO URIAS RUBIO DOMICILIO: C. MAYO ENTRE CEIBA Y AMAPA #1593 OTE. FRACC. UAS 94 C.P. 81285, LOS MOCHIS, SINALOA. TELÉFONO: 0 R.F.C. UIRS830403HH7 CEL: 6688569126		ESTIMACIÓN No: 01 (ADICIONAL) FINIQUITO PERIODO DE ESTIMACION: DEL 01-ago-25 AL 19-ago-25 FECHA DE CONTRATO: 12-jun-25	
DEPENDENCIA: MUNICIPIO DE BADIRAGUATO DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA.		LOCALIDAD: BADIRAGUATO MUNICIPIO: BADIRAGUATO	
DESCRIPCIÓN: CONSTRUCCIÓN DE SEGUNDA ETAPA DE "ARENA BADIRAGUATO" EN INSTALACIONES DE UNIDAD DEPORTIVA 20 DE NOVIEMBRE, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE BADIRAGUATO, SINALOA.		PERIODO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO: INICIO: 16-jun-25 TERMINACIÓN: 19-ago-25	
CONTRATO No: MBGBR-LP-GC-002/2025			
IMPORTE SIN IVA DE LA OBRA \$8,090,883.39	IMPORTE CON IVA DE LA OBRA \$9,385,424.73	35% ANTICIPO DE LA OBRA \$3,284,898.66	IMPORTE TOTAL DE CONTRATO: \$9,385,424.73
RECIBI DEL MUNICIPIO DE BADIRAGUATO: \$ 436,891.48 (SON CUATROCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y UN PESOS 48/100 M.N.)			BUENO POR: \$ 436,891.48
EN PAGO DE ESTIMACIÓN: 01 (ADICIONAL) FINIQUITO			
DEDUCCIONES: AMORTIZACIÓN ANTICIPO 35% \$ 211,204.45 MAS I.V.A.: \$ 33,792.71 TOTAL AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO: \$ 244,997.16 3 % SVIFYC: \$ 18,103.24 TOTAL DEDUCCIONES: \$ 263,100.40		CALCULO DE ESTIMACIÓN IMPORTE DE LA OBRA EJECUTADA SIN IVA \$ 603,441.28 MAS I.V.A 16 % \$ 96,550.60 TOTAL DE LA OBRA EJECUTADA CON IVA \$ 699,991.88 MENOS TOTAL DEDUCCIONES: \$ 263,100.40 SALDO A PAGAR: \$ 436,891.48	

ELABORO


 ING. SERGIO URIAS RUBIO
 SERGIO URIAS RUBIO

REVISÓ


 ING. JOSÉ R. CONTRERAS LÓPEZ
 COORDINADOR DE PRESUPUESTOS Y COSTOS

AUTORIZO


 ING. RUBIEL RINCON RAMOS
 DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS
 DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA.



Control de Estimaciones

SERGIO URIAS RUBIO

CONSTRUCCIÓN DE SEGUNDA ETAPA DE "ARENA BADIRAGUATO" EN INSTALACIONES DE UNIDAD DEPORTIVA 20 DE NOVIEMBRE, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE BADIRAGUATO, SINALOA.			MUNICIPIO DE BADIRAGUATO DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA		Estimacion: 01 (ADICIONAL) FINIQUITO	
			Fecha: 20 de agosto de 2025			
Periodo de la estimacion: 01/08/2025 al 19/08/2025			Localidad:		No. De contrato:	
Periodo de Ejecución: 16/06/2025 al 19/08/2025			BADIRAGUATO		MBGBR-LP-GC-002/2025	
Importe del contrato con I.V.A:		Imp. Contratado sin I.V.A		Anticipo	Importe Anticipo sin I.V.A	% de Avance
\$ 9,385,424.73		\$ 8,090,883.39		\$ 3,284,898.66	\$ 2,831,809.19	7%
						% Avance Total
						100%

Control Del Anticipo	Liquidacion de Estimacion	Control de Estimacion
AMORTIZA ESTA ESTIMACION	Importe de la Estimacion (+) \$ 603,441.28	ESTA ESTIMACION
\$ 244,997.16	16 % I.V.A (+) \$ 96,550.60	\$ 699,991.88
	Sub- Total A (=) \$ 699,991.88	
AMORTIZACION ANTERIOR	Amortizacion Anticipo 35% \$ 211,204.45	ACUMULADO ANTERIOR
\$ 3,039,901.50	16 % I.V.A (+) \$ 33,792.71	\$ 8,685,432.85
	Total (=) \$ 244,997.16	
TOTAL AMORTIZADO	Importe TOTAL \$ 392,236.83	TOTAL ACUMULADO.
\$ 3,284,898.66	16 % I.V.A (+) \$ 62,757.89	\$ 9,385,424.73
ANTICIPO OTORGADO	Total (=) \$ 454,994.72	CONTRATADO
\$ 3,284,898.66	3 % SVIFYC: \$ 18,103.24	\$ 9,385,424.73
	Total Deducciones (=) \$ 263,100.40	
SALDO DEL ANTICIPO	Importe T O T A L \$ 436,891.48	SALDO
\$ -	NETO A PAGAR \$ 436,891.48	\$ -
	Son: (SON CUATROCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y UN PESOS 48/100 M.N.)	

ELABORO

Sergio Urias Rubio
ING. SERGIO URIAS RUBIO
SERGIO URIAS RUBIO

REVISÓ

José R. Contreras López
ING. JOSÉ R. CONTRERAS LÓPEZ
COORDINADOR DE PRESUPUESTOS Y COSTOS

AUTORIZO

Rubiel Rincon Ramos
ING. RUBIEL RINCON RAMOS
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS
DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA.



FECHA: 20/08/2025

CONTRATISTA: **SERGIO URIAS RUBIO**
 DOMICILIO: C. MAYO ENTRE CEIBA Y AMAPA #1593 OTE. FRACC. UAS 94 C.P. 81285, LOS MOCHIS, SINALOA.
 R.F.C. UIRS830403HH7

DEPENDENCIA: **MUNICIPIO DE BADIRAGUATO**
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA.

ESTADO DE CUENTA

				LOCALIDAD:	BADIRAGUATO	ESTIMACIÓN:	01 (ADICIONAL) FINIQUITO	
DESCRIPCIÓN:	CONSTRUCCIÓN DE SEGUNDA ETAPA DE "ARENA BADIRAGUATO" EN INSTALACIONES DE UNIDAD DEPORTIVA 20 DE NOVIEMBRE, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE BADIRAGUATO, SINALOA.							
FECHA INICIO CONTRATO:	16-jun-25	FECHA TERMINACION CONTRATO:	19-ago-25	CONTRATO:	MBGBR-LP-GC-002/2025		FECHA CONTRATO:	12-jun-25
IMPORTE DE OBRA SIN IVA:		\$8,090,883.39		CLAVE DE CONVENIO ADICIONAL:				
IMPORTE DE ANTICIPO DE OBRA:		\$3,284,898.66		PERIODO CONVENIO ADICIONAL:		AL		
IMPORTE TOTAL DE CONTRATO		\$9,385,424.73		IMPORTE CONVENIO ADICIONAL:		IMPORTE TOTAL CONTRATADO:		\$9,385,424.73
No. DE ESTIMACIÓN	PERIODO		IMPORTE C/IVA ESTIMACIÓN	IMPORTE SIN IVA	3 % SVIFYC:	AMORTIZACIÓN ANTICIPO 35%	TOTAL DEDUCCIONES	LIQUIDO A PAGAR
01 (NORMAL)	16-jun-25	16-jul-25	\$ 2,677,482.55	\$ 2,308,174.61	\$ 69,245.24	\$ 937,118.89	\$ 1,006,364.13	\$ 1,671,118.42
02 (NORMAL)	17-jul-25	31-jul-25	\$ 4,800,529.50	\$ 4,138,387.50	\$ 124,151.63	\$ 1,680,185.33	\$ 1,804,336.96	\$ 2,996,192.54
03 (NORMAL)	01-ago-25	19-ago-25	\$ 1,207,420.80	\$ 1,040,880.00	\$ 31,226.40	\$ 422,597.28	\$ 453,823.68	\$ 753,597.12
01 (ADICIONAL) FINIQUITO	01-ago-25	19-ago-25	\$ 699,991.88	\$ 603,441.28	\$ 18,103.24	\$ 244,997.16	\$ 263,100.40	\$ 436,891.48
TOTALES:			\$ 9,385,424.73	\$ 8,090,883.39	\$ 242,726.51	\$ 3,284,898.66	\$ 3,527,625.17	\$ 5,857,799.56
SALDO DEL CONTRATO:			\$0.00	SALDO POR AMORTIZAR:		\$0.00		

ELABORO

Sergio Urias Rubio
 ING. SERGIO URIAS RUBIO
 SERGIO URIAS RUBIO

REVISÓ

José R. Contreras López
 ING. JOSÉ R. CONTRERAS LÓPEZ
 COORDINADOR DE PRESUPUESTOS Y COSTOS

AUTORIZO

Rubiel Rincon Ramos
 ING. RUBIEL RINCON RAMOS
 DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS
 DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA.

FECHA

20/08/2025

CONTRATISTA:

DEPENDENCIA:

SERGIO URIAS RUBIO

MUNICIPIO DE BADIRAGUATO

DOMICILIO: C. MAYO ENTRE CEIBA Y AMAPA #1593 OTE. FRACC. UAS 94 C.P.
81285, LOS MOCHIS, SINALOA.

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO
URBANO Y ECOLOGÍA.

R.F.C.
UIRS830403HH7

RESÚMEN DE ESTIMACIÓN

LOCALIDAD:

BADIRAGUATO

ESTIMACIÓN:

(ADICIONAL) FINIQUITO

DESCRIPCIÓN:

CONSTRUCCIÓN DE SEGUNDA ETAPA DE "ARENA BADIRAGUATO" EN INSTALACIONES DE UNIDAD DEPORTIVA 20 DE NOVIEMBRE, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE BADIRAGUATO, SINALOA.

IMPORTE DE OBRA SIN IVA:	\$8,090,883.39
IMPORTE DE ANTICIPO DE OBRA:	\$3,284,898.66
IMPORTE TOTAL DE CONTRATO:	\$9,385,424.73

OBRA

IMPORTE


ESTACIONAMIENTO

MOVIMIENTO DE TIERRAS	\$	195,978.76
ESTRUCTURAS METALICAS	\$	73,325.58
ALBAÑILERIAS	\$	108,111.40
ACABADOS	\$	12,524.21
GRADAS	\$	213,501.33

SUBTOTAL ESTIMACIÓN: \$ 603,441.28

SUB TOTAL= \$ 603,441.28
I.V.A AL 16 % \$ 96,550.60
TOTAL = \$ 699,991.88

ELABORO


ING. SERGIO URIAS RUBIO
SERGIO URIAS RUBIO

REVISO


ING. JOSÉ R. CONTRERAS LÓPEZ
COORDINADOR DE PRESUPUESTOS Y COSTOS

AUTORIZO


ING. RUBIEL RINCON RAMOS
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS
DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA.

CONTRATISTA:
SERGIO URIAS RUBIO

DOMICILIO: C. MAYO ENTRE CEIBA Y AMAPA #1593 OTE. FRACC. UAS 94 C.P. 81285,
LOS MOCHIS, SINALOA.

R.F.C.
UIRS830403HH7

DEPENDENCIA:
MUNICIPIO DE BADIRAGUATO

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA.

DESGLASE DE CONCEPTOS DE ESTIMACIÓN

		LOCALIDAD	BADIRAGUATO	ESTIMACIÓN:	01 (ADICIONAL) FINIQUITO
DESCRIPCIÓN:	CONSTRUCCIÓN DE SEGUNDA ETAPA DE "ARENA BADIRAGUATO" EN INSTALACIONES DE UNIDAD DEPORTIVA 20 DE NOVIEMBRE, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE BADIRAGUATO, SINALOA.				

IMPORTE DE OBRA SIN IVA:	\$8,090,883.39
IMPORTE DE ANTICIPO DE OBRA:	\$3,284,898.66
IMPORTE TOTAL DE CONTRATO:	\$9,385,424.73

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	SEGUN PROYECTO			HASTA ESTA ESTIM	HASTA ESTIM ANT	EXCEDENTE	DE ESTA ESTIMACIÓN	IMPORTE
			CANT	P.U.	TOTAL					
	ESTACIONAMIENTO									
	MOVIMIENTO DE TIERRAS									
GP01	TRAZO Y NIVELACIÓN DEL TERRENO ESTABLECIENDO EJES Y NIVELETAS DE REFERENCIA, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M2	2,500.50	\$ 13.25	\$ 33,131.63	3,541.51	2500.50	0.00	1,041.01	\$ 13,793.38
GP25	MATERIAL BASE DE COMPACTADA AL 100 % DE SU PESO VOLUMÉTRICO, INCLUYE: SUMINISTRO DEL AGREGADO, ACARREO, COMPACTACIÓN, PRUEBA DE LABORATORIO Y TODO LO NECESARIO PARA SU TERMINACIÓN.	M2	2,500.50	\$ 123.59	\$ 309,036.79	3,527.07	2500.50	0.00	1,026.57	\$ 126,873.79
GP06	RIEGO DE IMPREGNACIÓN CON EMULSIÓN CATIONICA ECI-80, A RAZÓN DE 1.50 A 1.8 LT/M2, INCLUYE: ARENEO, APLICACIÓN, ALMACENAMIENTO, CALENTAMIENTO, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	2,500.50	\$ 53.88	\$ 134,726.94	3,527.07	2500.50	0.00	1,026.57	\$ 55,311.59
</										

ELABORO

ING. SERGIO URIAS RUBIO
SERGIO URIAS RUBIO

REVISÓ

ING. JOSÉ CONTRERAS LÓPEZ
COORDINADOR DE PRESUPUESTOS Y COSTOS

AUTORIZO

ING. RUBIEL RINCON RAMOS
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS
DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA.

CONTRATISTA:
SERGIO URIAS RUBIO

DOMICILIO: C. MAYO ENTRE CEIBA Y AMAPA #1593 OTE. FRACC. UAS 94 C.P. 81285,
LOS MOCHIS, SINALOA.

R.F.C.
UIRS830403HH7

DEPENDENCIA:
MUNICIPIO DE BADIRAGUATO

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA.

DESGLASE DE CONCEPTOS DE ESTIMACIÓN

		LOCALIDAD	BADIRAGUATO	ESTIMACIÓN:	01 (ADICIONAL) FINQUITO
DESCRIPCIÓN:	CONSTRUCCIÓN DE SEGUNDA ETAPA DE "ARENA BADIRAGUATO" EN INSTALACIONES DE UNIDAD DEPORTIVA 20 DE NOVIEMBRE, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE BADIRAGUATO, SINALOA.				

IMPORTE DE OBRA SIN IVA:	\$8,090,883.39
IMPORTE DE ANTICIPO DE OBRA:	\$3,284,898.66
IMPORTE TOTAL DE CONTRATO:	\$9,385,424.73

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	SEGUN PROYECTO			HASTA ESTA ESTIM	HASTA ESTIM ANT	EXCEDENTE	DE ESTA ESTIMACIÓN	IMPORTE
			CANT	P.U.	TOTAL					
	ACABADOS									TOTAL DE ALBAÑILERÍAS: \$ 108,111.40
GP235	MURO DOBLE DE TABLAROCA TIPO LISO EN INTERIOR A DOS CARAS SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BASTIDOR METÁLICO GALV. HECHO A BASE DE CANALETA DE CARGA CAL.22 Y CANAL LISTÓN CAL.26 ANCLAJE A PIEZO Y/O PARED EXISTENTE CON CARGA HILTI ROJA, CLAVO PARA CONCRETO Y ÁNGULO, TABLAROCA FIJADA CON TORNILLO S-1 DE 1", TRATAMIENTO DE JUNTAS CON PERFACINTA Y COMPUESTO REDIMIX, ÁNGULO REBORDE "J", Y ÁNGULO ESQUINERO, TABLAROCA MARCA USG O' PANEL REY DE 13MM. INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, ANDAMIAJES, DESPERDICIO, ACARREOS, ELEVACIONES, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	173.40	\$ 1,184.76	\$ 205,437.38	160.11	173.40	0.00	-13.29	\$ 15,745.46
GP510	APLANADO FINO CON MORTERO CEMENTO ARENA, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	M2	58.90	\$ 253.79	\$ 14,948.23	170.29	58.90	0.00	111.39	\$ 28,269.67
	GRADAS									TOTAL DE ACABADOS: \$ 12,524.21
GBR090	FABRICACIÓN Y COLOCACIÓN DE CADENA DE DESPLANTE DE 15x20 CM, ARMADA CON ARMEX 15X20 REFORZADO CON DOS VARILLAS DE 3/8", COLADA CON CONCRETO HECHO EN OBRA DE F'C=200 KG/CM2, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	ML	150.30	\$ 605.15	\$ 90,954.04	196.50	150.30	0.00	46.20	\$ 27,957.93
GP505	MURO DE BLOCK 15x20x40 CMS, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M2	191.00	\$ 577.51	\$ 110,304.41	198.17	191.00	0.00	7.17	\$ 4,140.75
GP237	LOSA DE 10 CM DE ESPESOR CON CONCRETO F'C= DE 200 KG/CM HECHO EN OBRA, ARMADO CON VARILLA DE 3/8" @ 20 CMS EN AMBOS SENTIDOS, INCLUYE: CIMBRA, MANO DE OBRA, MATERIALES, EQUIPO Y HERRAMIENTAS.	M2	483.00	\$ 704.75	\$ 340,394.25	740.40	483.00	0.00	257.40	\$ 181,402.65
										TOTAL DE OTROS: \$ 213,501.33

TOTAL ESTIMACION	\$ 603,441.28
I.V.A.	\$ 96,550.60
TOTAL	\$ 699,991.88

ELABORO

ING. SERGIO URIAS RUBIO
SERGIO URIAS RUBIO

REVIÓ

ING. JOSÉ R. CONTRERAS LÓPEZ
COORDINADOR DE PRESUPUESTOS Y COSTOS

AUTORIZO

ING. RUBIEL RINCON RAMOS
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS
DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA.



NUMEROS GENERADORES DE VOLUMENES DE OBRA

OBRA: CONSTRUCCIÓN DE SEGUNDA ETAPA DE "ARENA BADIRAGUATO" EN INSTALACIONES DE UNIDAD DEPORTIVA 20 DE NOVIEMBRE, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE BADIRAGUATO, SINALOA.

GENERADORES ESTIMACION:

01 (ADICIONAL) FINIQUITO

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	LARGO	ANCHO	ALTO	PIEZA	ACUMULADO		OBSERVACIONES
							PARCIAL	TOTAL	
	ESTACIONAMIENTO								
	MOVIMIENTO DE TIERRAS								
GP01	TRAZO Y NIVELACIÓN DEL TERRENO ESTABLECIENDO EJES Y NIVELETAS DE REFERENCIA, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M2	18.32	6.40		1.00	117.25		LADO "D" TAQUILLA-TEBACA SHOP
			14.65	5.00		1.00	73.25		LADO "D" ARCOS DE ACCESO
			13.23	5.36		1.00	70.91		LADO "D" CAFETERIA
			6.35	6.00		1.00	38.10		ACCESO PEATONAL
			35.79	1.00		1.00	35.79		BANQUETA EN BORDA PERIMETRAL
			12.30	1.00		1.00	12.30		BANQUETA EN BORDA PERIMETRAL
			6.57	1.00		1.00	6.57		
			2.31	1.00		1.00	2.31		
						AREA CISTERNA	36.79		PERIMETRAL CISTERNA
			1.84	6.77		1.00	12.46		
			29.03	1.50		1.00	43.55		LADO "C"
			3.90	1.50		1.00	5.85		
			15.61	3.00		1.00	46.83		
			15.55	1.00		1.00	15.55		BANQUETA LATERAL BODEGA
						AREA	52.84		
			23.72	5.00		1.00	118.60		LADO "A"
			2.00	5.00		1.00	10.00		RAMPA
			9.91	1.50		1.00	14.87		
			37.91	0.60		1.00	22.75		GUARNICIÓN
			22.78	0.60		1.00	13.67		
			6.16	0.60		1.00	3.70		
			5.36	0.60		1.00	3.22		
			31.74	0.60		1.00	19.04		

ELABORO

ING. VIANEY ESCARREGA RIVERA
SUPERINTENDENTE DE OBRA

REVISÓ

ARQ. BRIGIDA GUADALUPE NIEBLAS MARTINEZ
SUPERVISOR

AUTORIZO

ING. RUBIEL RINCON RAMOS
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS
DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA.



NUMEROS GENERADORES DE VOLUMENES DE OBRA

OBRA: CONSTRUCCIÓN DE SEGUNDA ETAPA DE "ARENA BADIRAGUATO" EN INSTALACIONES DE UNIDAD DEPORTIVA 20 DE NOVIEMBRE, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE BADIRAGUATO, SINALOA.

GENERADORES ESTIMACION:

01 (ADICIONAL) FINIQUITO

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	LARGO	ANCHO	ALTO	PIEZA	ACUMULADO		OBSERVACIONES
							PARCIAL	TOTAL	
			12.17	0.60		1.00	7.30		
			15.00	0.60		1.00	9.00		
			42.00	0.60		1.00	25.20		
			5.40	0.60		1.00	3.24		
			1.90	0.60		1.00	1.14		
			6.14	0.60		1.00	3.68		
			4.00	0.60		1.00	2.40		
			42.70	0.60		1.00	25.62		
			9.50	0.60		1.00	5.70		
			28.58	0.60		1.00	17.15		LADO "C"
			5.85	0.60		1.00	3.51		
			18.88	0.60		1.00	11.33		
			12.21	0.60		1.00	7.33		
			6.15	0.60		1.00	3.69		
			6.15	0.60		1.00	3.69		
			5.53	0.60		1.00	3.32		
			2.15	0.60		1.00	1.29		
			6.14	0.60		1.00	3.68		
							1,028.18		LOSA DE CONCRETO
							1,499.68		LADO "C"
							92.37		ACCESO PEATONAL
							6.81		ACCESO PEATONAL
							TOTAL	3,541.51	
							EN ESTIMACIÓN 02 (NORMAL)	2,500.50	
							EN ESTIMACIÓN 03 (NORMAL)	0.00	
							EN ESTA ESTIMACIÓN	1,041.01	

ELABORO

ING. VIANEY ESCARREGA RIVERA
SUPERINTENDENTE DE OBRA

REVISÓ

ARQ. BRICEIDA GUADALUPE NIEBLAS MARTINEZ
SUPERVISOR

AUTORIZO

ING. RUBIEL RINCON RAMOS
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS
DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA.



NUMEROS GENERADORES DE VOLUMENES DE OBRA

OBRA: CONSTRUCCIÓN DE SEGUNDA ETAPA DE "ARENA BADIRAGUATO" EN INSTALACIONES DE UNIDAD DEPORTIVA 20 DE NOVIEMBRE, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE BADIRAGUATO, SINALOA.

GENERADORES ESTIMACION:

01 (ADICIONAL) FINIQUITO

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	LARGO	ANCHO	ALTO	PIEZA	ACUMULADO		OBSERVACIONES
							PARCIAL	TOTAL	
GP25	MATERIAL BASE DE COMPACTADA AL 100 % DE SU PESO VOLUMÉTRICO, INCLUYE: SUMINISTRO DEL AGREGADO, ACARREO, COMPACTACIÓN, PRUEBA DE LABORATORIO Y TODO LO NECESARIO PARA SU TERMINACIÓN.	M2				IGUAL AL CONCEPTO GP01:	3,541.51		
			3.87	3.73		-1.00	-14.44		CISTERNA
							TOTAL	3,527.07	
							EN ESTIMACIÓN 02 (NORMAL)	2,500.50	
							EN ESTIMACIÓN 03 (NORMAL)	0.00	
							EN ESTA ESTIMACIÓN	1,026.57	
GP06	RIEGO DE IMPREGNACIÓN CON EMULSIÓN CATIONICA ECI-60, A RAZÓN DE 1.50 A 1.8 LT/M2, INCLUYE: ARENEO, APLICACIÓN, ALMACENAMIENTO, CALENTAMIENTO, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M2				IGUAL AL CONCEPTO GP01	3,541.51		
			3.87	3.73		-1.00	-14.44		CISTERNA
							TOTAL	3,527.07	
							EN ESTIMACIÓN 02 (NORMAL)	2,500.50	
							EN ESTIMACIÓN 03 (NORMAL)	0.00	
							EN ESTA ESTIMACIÓN	1,026.57	

ELABORO

ING. WANEY ESCARREGA RIVERA
SUPERINTENDENTE DE OBRA

REVISÓ

ARQ. BRICEIDA GUADALUPE NIEBLAS MARTINEZ
SUPERVISOR

AUTORIZO

ING. RUBIEL RINCON RAMOS
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS
DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA.



NUMEROS GENERADORES DE VOLUMENES DE OBRA

OBRA: CONSTRUCCIÓN DE SEGUNDA ETAPA DE "ARENA BADIRAGUATO" EN INSTALACIONES DE UNIDAD DEPORTIVA 20 DE NOVIEMBRE, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE BADIRAGUATO, SINALOA.

GENERADORES ESTIMACION:

01 (ADICIONAL) FINIQUITO

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	LARGO	ANCHO	ALTO	PIEZA	ACUMULADO		OBSERVACIONES
							PARCIAL	TOTAL	
	ESTRUCTURAS METALICAS								
GBR36	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PLACA DE ACERO DE 30X22.5 CM DE 3/4" DE ESPESOR PARA UNION DE VIGA A VIGA, SOLDADA AL ALMA DE CADA PERFIL CON SOLDADURA 7018 EN CORDON DE 8MM DE ESPESOR, DE ACUERDO A DETALLE EN PLANO DE PROYECTO. INCLUYE: PRIMARIO DE FONDO ANTICORROSIVO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	PZA				72.00	72.00		UNION VIGA-VIGA T-2
							TOTAL	72.00	
							EN ESTIMACIÓN 02 (NORMAL)	36.00	
							EN ESTIMACIÓN 03 (NORMAL)	10.00	
							EN ESTA ESTIMACIÓN	26.00	
GBR42	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PTR DE 16X16 EN 3/8" PARA FORMACIÓN DE COLUMNA, INCLUYE: PLACA DE ACERO DE 35X35 CM DE 3/4" DE ESPESOR, FONDO ANTICORROSIVO GRIS, PINTURA ESMALTE, SOLDADURA E-7018 6MM DE 1/4", ACARREOS, NIVELACIÓN, ANDAMIOS, HERRAMIENTA, MENOR, GRÚA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA TERMINACIÓN.	ML	9.89			1.00	9.89		ACCESO LADO "D"
			9.33			1.00	9.33		ACCESO LADO "D"
							TOTAL	19.22	
							EN ESTIMACIÓN 02 (NORMAL)	14.00	
							EN ESTA ESTIMACIÓN	5.22	

ELABORO:

ING. WANEE ESCARREGA RIVERA
SUPERINTENDENTE DE OBRA

REVISÓ

ARQ. BRICEIDA GUADALUPE NIEBLAS MARTINEZ
SUPERVISOR

AUTORIZO

ING. RUBIEL RINCON RAMOS
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS
DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA.



NUMEROS GENERADORES DE VOLUMENES DE OBRA

OBRA: CONSTRUCCIÓN DE SEGUNDA ETAPA DE "ARENA BADIRAGUATO" EN INSTALACIONES DE UNIDAD DEPORTIVA 20 DE NOVIEMBRE, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE BADIRAGUATO, SINALOA.

GENERADORES ESTIMACION:

01 (ADICIONAL) FINIQUITO

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	LARGO	ANCHO	ALTO	PIEZA	ACUMULADO		OBSERVACIONES
							PARCIAL	TOTAL	
	ALBAÑILERIAS								
GP109	BANQUETA DE 10 CMS DE ESPESOR CON CONCRETO HECHO EN OBRA CON UN F'C=250 KG/CM", INCLUYE: MANO DE OBRA, MATERIALES, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	M2	18.32	6.40		1.00	117.25		LADO "D" TAQUILLA-TEBACA SHOP
			14.65	5.00		1.00	73.25		LADO "D" ARCOS DE ACCESO
			13.23	5.36		1.00	70.91		LADO "D" CAFETERIA
			6.35	6.00		1.00	38.10		ACCESO PEATONAL
			35.79	1.00		1.00	35.79		BANQUETA EN BARDA PERIMETRAL
			12.30	1.00		1.00	12.30		BANQUETA EN BARDA PERIMETRAL
			0.40	0.40		-1.00	-0.16		BASE DE LUMINARIA
			6.57	1.00		1.00	6.57		
			2.31	1.00		1.00	2.31		
						AREA CISTERNA	36.79		PERIMETRAL CISTERNA
			9.91	1.50		1.00	14.87		
			29.03	1.50		1.00	43.55		LADO "C"
			3.90	1.50		1.00	5.85		
			15.61	3.00		1.00	46.83		
			15.55	1.00		1.00	15.55		BANQUETA LATERAL BODEGA
						AREA	52.84		
			23.72	5.00		1.00	118.60		LADO "A"
			1.84	6.77		1.00	12.46		
							TOTAL	703.66	
							EN ESTIMACIÓN 02 (NORMAL)	541.03	
							EN ESTIMACIÓN 03 (NORMAL)	98.77	
							EN ESTA ESTIMACIÓN	63.86	

ELABORO

ING. VIANEY ESCARREGA RIVERA
SUPERINTENDENTE DE OBRA

REVISÓ

ARQ. BRICIDA GUADALUPE NIEBLAS MARTINEZ
SUPERVISOR

AUTORIZO

ING. RUBIEL RINCON RAMOS
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS
DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA.



NUMEROS GENERADORES DE VOLUMENES DE OBRA

OBRA: CONSTRUCCIÓN DE SEGUNDA ETAPA DE "ARENA BADIRAGUATO" EN INSTALACIONES DE UNIDAD DEPORTIVA 20 DE NOVIEMBRE, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE BADIRAGUATO, SINALOA.

GENERADORES ESTIMACION:

01 (ADICIONAL) FINIQUITO

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	LARGO	ANCHO	ALTO	PIEZA	ACUMULADO		OBSERVACIONES
							PARCIAL	TOTAL	
GP52	MURO DE BLOCK 15x20x40 CMS, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M2							
			2.70		3.00	2.00	16.20		PLANTA BAJA (MUROS BAÑOS)
			2.70		0.20	-1.00	-0.54		CERRAMIENTO
			1.55		3.00	2.00	9.30		T DE VESTIDORES
			1.55		0.20	-1.00	-0.31		CERRAMIENTO
			1.70		3.00	2.00	10.20		
			1.70		0.20	-1.00	-0.34		CERRAMIENTO
			1.70		3.00	1.00	5.10		BAÑO CAFETERIA
			1.70		0.20	-1.00	-0.34		CERRAMIENTO
			1.50		3.00	1.00	4.50		
			1.50		0.20	-1.00	-0.30		CERRAMIENTO
			0.80		2.40	-1.00	-1.92		PUERTA
			3.44		3.22	1.00	11.08		MURO DIVISORIO EN BODEGA
			3.22		0.20	-1.00	-0.64		CERRAMIENTO
			6.75		3.00	1.00	20.25		PLANTA ALTA
			6.75		0.20	-1.00	-1.35		CERRAMIENTO
			34.15		3.00	1.00	102.45		
			3.00		0.15	-10.00	-4.50		CASTILLOS 15x15
			34.15		0.20	-1.00	-6.83		CERRAMIENTO
			3.00		1.45	-2.00	-8.70		VENTANAS
			2.02		1.45	-2.00	-5.86		
			2.00		1.45	-1.00	-2.90		
			3.12		1.45	-1.00	-4.52		
			2.46		1.45	-1.00	-3.57		
			7.05		3.00	1.00	21.15		
			3.00		0.15	-3.00	-1.35		CASTILLOS 15x15
			7.05		0.20	-1.00	-1.41		CERRAMIENTO
			2.92		1.65	-1.00	-4.82		VENTANAS
			2.50		0.62	-1.00	-1.55		

ELABORO

ING. VIANEY ESCARREGA RIVERA
SUPERINTENDENTE DE OBRA

REVISÓ

ARQ. BRICEIDA GUADALUPE NIEBLAS MARTINEZ
SUPERVISOR

AUTORIZO

ING. RUBIEL RINCON RAMOS
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS
DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA.



NUMEROS GENERADORES DE VOLUMENES DE OBRA

OBRA: CONSTRUCCIÓN DE SEGUNDA ETAPA DE "ARENA BADIRAGUATO" EN INSTALACIONES DE UNIDAD DEPORTIVA 20 DE NOVIEMBRE, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE BADIRAGUATO, SINALOA.

GENERADORES ESTIMACION:

01 (ADICIONAL) FINIQUITO

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	LARGO	ANCHO	ALTO	PIEZA	ACUMULADO		OBSERVACIONES
							PARCIAL	TOTAL	
			33.70		3.00	1.00	101.10		
			3.00		0.15	-5.00	-2.25		CASTILLOS 15x15
			33.70		0.20	-1.00	-6.74		CERRAMIENTO
			3.00		0.30	-3.00	-2.70		COLUMNAS 30x30
			3.00		0.40	-3.00	-3.60		COLUMNA DE ACERO 40X40
			13.40		2.59	-1.00	-34.71		VENTANAS
			3.00		1.45	-1.00	-4.35		
			5.22		1.40	-1.00	-7.31		MURO COCINA
			3.21		3.00	1.00	9.63		CERRAMIENTO
			3.21		0.20	-1.00	-0.64		
			3.63		3.00	1.00	10.89		CERRAMIENTO
			3.63		0.20	-1.00	-0.73		
			2.19		3.00	1.00	6.57		CERRAMIENTO
			2.19		0.20	-1.00	-0.44		
			1.48		3.00	1.00	4.44		CERRAMIENTO
			1.48		0.20	-1.00	-0.30		PUERTA
			0.97		2.10	-1.00	-2.04		CUBO ESCALERA
			5.70		3.00	2.00	34.20		CASTILLOS 15x15
			3.00		0.15	4.00	1.80		CERRAMIENTO
			5.70		0.20	-2.00	-2.28		MURO DIVISORIO VIP-GIMNASI
			2.90		3.00	1.00	8.70		CERRAMIENTO
			2.90		0.20	-1.00	-0.58		
			1.50		3.00	1.00	4.50		CERRAMIENTO
			1.50		0.20	-1.00	-0.30		
			1.19		3.00	1.00	3.57		CERRAMIENTO
			1.19		0.20	-1.00	-0.24		
			2.75		3.00	1.00	8.25		CERRAMIENTO
			2.75		0.20	-1.00	-0.55		
			2.80		3.00	1.00	8.40		CERRAMIENTO
			2.80		0.20	-1.00	-0.56		

ELABORO

ING. VIANEY ESCARREGA RIVERA
SUPERINTENDENTE DE OBRA

REVISÓ

ARQ. BRICEIDA GUADALUPE NIEBLAS MARTINEZ
SUPERVISOR

AUTORIZO

ING. RUBIEL RINCON RAMOS
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS
DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA.



NUMEROS GENERADORES DE VOLUMENES DE OBRA

OBRA: CONSTRUCCIÓN DE SEGUNDA ETAPA DE "ARENA BADIRAGUATO" EN INSTALACIONES DE UNIDAD DEPORTIVA 20 DE NOVIEMBRE, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE BADIRAGUATO, SINALOA.

GENERADORES ESTIMACION:

01 (ADICIONAL) FINIQUITO

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	LARGO	ANCHO	ALTO	PIEZA	ACUMULADO		OBSERVACIONES
							PARCIAL	TOTAL	
			2.73		3.00	1.00	8.19		CERRAMIENTO
			2.73		0.20	-1.00	-0.55		
			2.12		3.00	1.00	6.36		CERRAMIENTO
			2.12		0.20	-1.00	-0.42		
			3.90		3.00	1.00	11.70		CERRAMIENTO
			3.90		0.20	-1.00	-0.78		BAÑO
			2.16		3.00	1.00	6.48		CERRAMIENTO
			2.16		0.20	-1.00	-0.43		
			2.50		3.00	1.00	7.50		CERRAMIENTO
			2.50		0.20	-1.00	-0.50		PUERTA
			0.90		2.10	-1.00	-1.89		MURO INTERMEDIO TEBACA S
			13.17		1.45	1.00	19.10		PRETIL
			6.75		1.26	1.00	8.51		CASTILLOS 15x15
			0.15		1.26	-1.00	-0.19		
			34.15		1.26	1.00	43.03		CASTILLOS 15x15
			0.15		1.26	-10.00	-1.89		
			6.75		1.26	1.00	8.51		CASTILLOS 15x15
			0.15		1.26	-1.00	-0.19		
			33.70		1.26	1.00	42.46		CASTILLOS 15x15
			0.15		1.26	-5.00	-0.95		CAFETERIA
			0.30		1.26	-3.00	-1.13		CERRAMIENTO
			0.40		1.26	-3.00	-1.51		CASTILLOS 15x15
			4.92		3.00	1.00	14.76		ACCESO PEATONAL
			4.92		0.20	-1.00	-0.98		
			0.15		3.00	-1.00	-0.45		
				AREA	4.37	3.00	13.11		
							TOTAL	458.06	
							EN ESTIMACIÓN 02 (NORMAL)	300.00	
							EN ESTIMACIÓN 03 (NORMAL)	0.00	
							EN ESTA ESTIMACIÓN	125.3209	
							PENDIENTE POR COBRAR	32.74	

ELABORO

ING. VANEY ESCARREGA RIVERA
SUPERINTENDENTE DE OBRA

REVISÓ

ARQ. BRICEIDA GUADALUPE NIEBLAS MARTINEZ
SUPERVISOR

AUTORIZO

ING. RUBIEL RINCON RAMOS
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS
DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA.



NUMEROS GENERADORES DE VOLUMENES DE OBRA

OBRA: CONSTRUCCIÓN DE SEGUNDA ETAPA DE "ARENA BADIRAGUATO" EN INSTALACIONES DE UNIDAD DEPORTIVA 20 DE NOVIEMBRE, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE BADIRAGUATO, SINALOA.

GENERADORES ESTIMACION:

01 (ADICIONAL) FINIQUITO

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	LARGO	ANCHO	ALTO	PIEZA	ACUMULADO		OBSERVACIONES
							PARCIAL	TOTAL	
	ACABADOS								
GP235	MURO DOBLE DE TABLAROCA TIPO LISO EN INTERIOR A DOS CARAS SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BASTIDOR METÁLICO GALV. HECHO A BASE DE CANALETA DE CARGA CAL.22 Y CANAL LISTÓN CAL.26 ANCLAJE A PIEO Y/O PARED EXISTENTE CON CARGA HILTI ROJA, CLAVO PARA CONCRETO Y ÁNGULO, TABLAROCA FIJADA CON TORNILLO S-1 DE 1", TRATAMIENTO DE JUNTAS CON PERFACINTA Y COMPUESTO REDIMIX, ÁNGULO REBORDE "J", Y ÁNGULO ESQUINERO, TABLAROCA MARCA USG O' PANEL REY DE 13MM. INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, ANDAMIAJES, DESPERDICIO, ACARREOS, ELEVACIONES, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	2.10		3.00	1.00	6.30		CAFETERIA
			1.00		2.10	-1.00	-2.10		MENOS PUERTA
			3.70		3.00	1.00	11.10		
			3.00		3.00	1.00	9.00		
			2.10		0.90	-1.00	-1.89		MENOS PUERTA
			2.10		3.00	1.00	6.30		TEBACAS SHOP
			4.70		3.00	1.00	14.10		
			1.80		3.00	1.00	5.40		
			2.10		0.90	-2.00	-3.78		MENOS PUERTAS
			0.46		7.00	2.00	6.44		CUBIERTA DE COLUMNAS MEZZANINE
			0.48		7.00	2.00	6.72		CUBIERTA DE COLUMNAS MEZZANINE
			0.48		7.00	2.00	6.72		CUBIERTA DE COLUMNAS MEZZANINE

ELABORO

 ING. VIANEY ESCARREGA RIVERA
 SUPERINTENDENTE DE OBRA

REVISÓ

 ARQ. BRICEIDA GUADALUPE NIEBLAS MARTINEZ
 SUPERVISOR

AUTORIZO

 ING. RUBIEL RINCON RAMOS
 DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS
 DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA.



NUMEROS GENERADORES DE VOLUMENES DE OBRA

OBRA: CONSTRUCCIÓN DE SEGUNDA ETAPA DE "ARENA BADIRAGUATO" EN INSTALACIONES DE UNIDAD DEPORTIVA 20 DE NOVIEMBRE, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE BADIRAGUATO, SINALOA.

GENERADORES ESTIMACION:

01 (ADICIONAL) FINIQUITO

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	LARGO	ANCHO	ALTO	PIEZA	ACUMULADO		OBSERVACIONES
							PARCIAL	TOTAL	
			0.52		7.00	2.00	7.28		CUBIERTA DE COLUMNAS MEZZANINE
			0.48		7.00	2.00	6.72		CUBIERTA DE COLUMNAS MEZZANINE
			0.50		7.00	2.00	7.00		CUBIERTA DE COLUMNAS MEZZANINE
			0.49		7.00	2.00	6.86		CUBIERTA DE COLUMNAS MEZZANINE
			0.45		7.00	2.00	6.30		CUBIERTA DE COLUMNAS MEZZANINE
	TRIANGULOS INICIO:		0.63		7.00	1.00	4.41		CUBIERTA DE COLUMNAS MEZZANINE (FINAL)
	ANTEPECHO PUERTAS:		3.95		2.26	1.00	8.93		ESCALERAS MEZZANINE
	SECCION TRAPEZOIDAL DE ESCALERAS:		2.26		0.20	2.00	0.90		ESCALERAS MEZZANINE
					(((3.35+2.26) X 4.31) / 2) X 2 PZAS		24.18		ESCALERAS MEZZANINE
	SECCION RECTA:		0.40		4.31	2.00	3.45		ESCALERAS MEZZANINE
	SECCION RECTA:		3.50		1.81	1.00	6.34		ESCALERAS MEZZANINE
	SECCION RECTA:		3.72		1.81	1.00	6.73		ESCALERAS MEZZANINE
			3.70		1.81	1.00	6.70		ESCALERAS MEZZANINE
							TOTAL	180.11	
							EN ESTIMACIÓN 03 (NORMAL)	173.40	
							EN ESTA ESTIMACIÓN	-13.29	
GP510	APLANADO FINO CON MORTERO CEMENTO ARENA, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	M2	9.95		2.97	1.00	29.55		CAFETERIA
			4.95		2.97	1.00	14.70		
			1.73		2.18	-1.00	-3.77		MENOS VENTANA
			13.48		3.62	1.00	48.80		TEBACA SHOP
			4.05		3.62	1.00	14.66		
			1.30		1.85	-1.00	-2.41		
			1.30		7.55	-1.00	-9.82		MENOS VENTANAS

ELABORO

ING. MANUEL ESCARREGA RIVERA
SUPERINTENDENTE DE OBRA

REVISÓ

ARQ. BRICEIDA GUADALUPE NIEBLAS MARTINEZ
SUPERVISOR

AUTORIZO

ING. RUBIEL RINCON RAMOS
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS
DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA.



NUMEROS GENERADORES DE VOLUMENES DE OBRA

OBRA: CONSTRUCCIÓN DE SEGUNDA ETAPA DE "ARENA BADIRAGUATO" EN INSTALACIONES DE UNIDAD DEPORTIVA 20 DE NOVIEMBRE, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE BADIRAGUATO, SINALOA.

GENERADORES ESTIMACION:

01 (ADICIONAL) FINIQUITO

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	LARGO	ANCHO	ALTO	PIEZA	ACUMULADO		OBSERVACIONES
							PARCIAL	TOTAL	
			10.20		4.72	1.00	48.14		BODEGA EN ACCESO "B"
			6.45		4.72	1.00	30.44		BODEGA EN ACCESO "B"
							TOTAL	170.29	
							EN ESTIMACIÓN 03 (NORMAL)	58.90	
							EN ESTA ESTIMACIÓN	111.39	
	GRADAS								
GBR090	FABRICACIÓN Y COLOCACIÓN DE CADENA DE DESPLANTE DE 15x20 CM, ARMADA CON ARMEX 15X20 REFORZADO CON DOS VARILLAS DE 3/8", COLADA CON CONCRETO HECHO EN OBRA DE F'C=200 KG/CM2, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	ML	7.15			10.00	71.50		MUROS GRADAS "A"
			12.50			10.00	125.00		MUROS GRADAS "B"
							TOTAL	196.50	
							EN ESTIMACIÓN 01 (NORMAL)	150.30	
							EN ESTIMACIÓN 02 (NORMAL)	0.00	
							EN ESTA ESTIMACIÓN	46.20	
GP505	MURO DE BLOCK 15x20x40 CMS, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M2	0.90		1.35	10.00	12.15		MUROS GRADAS "A"
			0.85		1.05	10.00	8.93		
			1.00		0.75	10.00	7.50		
			0.85		0.45	10.00	3.83		
			3.00		0.15	10.00	4.50		
			1.10		2.98	2.00	6.56		MUROS GRADAS "B"
			1.25		2.98	8.00	29.80		
			1.00		2.68	10.00	26.80		
			0.85		2.38	10.00	20.23		
			1.00		2.08	10.00	20.80		
			0.85		1.78	10.00	15.13		

ELABORO

ING. XIAINEY ESCARREGA RIVERA
SUPERINTENDENTE DE OBRA

REVISÓ

ARQ. BRICEIDA GUADALUPE NIEBLAS MARTINEZ
SUPERVISOR

AUTORIZO

ING. RUBIEL RINCON RAMOS
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS
DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA.



NUMEROS GENERADORES DE VOLUMENES DE OBRA

OBRA: CONSTRUCCIÓN DE SEGUNDA ETAPA DE "ARENA BADIRAGUATO" EN INSTALACIONES DE UNIDAD DEPORTIVA 20 DE NOVIEMBRE, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE BADIRAGUATO, SINALOA.

GENERADORES ESTIMACION:

01 (ADICIONAL) FINIQUITO

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	LARGO	ANCHO	ALTO	PIEZA	ACUMULADO		OBSERVACIONES
							PARCIAL	TOTAL	
			1.00		1.48	10.00	14.80		
			0.85		1.18	10.00	10.03		
			1.00		0.88	10.00	8.80		
			0.85		0.58	10.00	4.93		
			2.85		0.28	10.00	7.98		
			1.00		2.30	-2.00	-4.60		MENOS PUERTAS
							TOTAL	198.17	
							EN ESTIMACIÓN 01 (NORMAL)	191.00	
							EN ESTIMACIÓN 02 (NORMAL)	0.00	
							EN ESTA ESTIMACIÓN	7.17	
GP237	LOSA DE 10 CM DE ESPESOR CON CONCRETO F'C= DE 200 KG/CM HECHO EN OBRA, ARMADO CON VARILLA DE 3/8" @ 20 CMS EN AMBOS SENTIDOS, INCLUYE: CIMBRA, MANO DE OBRA, MATERIALES,EQUIPÓ Y HERRAMIENTAS.	M2	32.50	1.00		4.00	130.00		GRADAS "A"
			32.50	3.00		1.00	97.50		
			32.50	0.20		4.00	26.00		TAPONES VERTICALES DE ESCALONES
			32.50	0.25		1.00	8.13		
			32.50	1.00		8.00	260.00		GRADAS "B"
			32.50	1.50		1.00	48.75		
			34.00	3.00		1.00	102.00		
			32.50	0.20		9.00	58.50		TAPONES VERTICALES DE ESCALONES
			34.00	0.28		1.00	9.52		
							TOTAL	740.40	
							EN ESTIMACIÓN 01 (NORMAL)	483.00	
							EN ESTIMACIÓN 02 (NORMAL)	0.00	
							EN ESTA ESTIMACIÓN	257.40	

ELABORÓ

ING. VIANEY ESCARREGA RIVERA
SUPERINTENDENTE DE OBRA

REVISÓ

ARQ. BRICEIDA GUADALUPE NIEBLAS MARTINEZ
SUPERVISOR

AUTORIZO

ING. RUBIEL RINCON RAMOS
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS
DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA.



FECHA: 20/08/2025

DEPENDENCIA: **MUNICIPIO DE BADIRAGUATO**
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA

CROQUIS


CONSTRUCCIÓN DE SEGUNDA ETAPA DE "ARENA BADIRAGUATO" EN INSTALACIONES DE UNIDAD DEPORTIVA 20 DE NOVIEMBRE, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE BADIRAGUATO, SINALOA.

CONTRATISTA: **SERGIO URIAS RUBIO**

OBRA:

ESTIMACION: **01 (ADICIONAL) FINIQUITO****ESTACIONAMIENTO****MOVIMIENTO DE TIERRAS**

- GP01 TRAZO Y NIVELACIÓN DEL TERRENO ESTABLECIENDO EJES Y NIVELETAS DE REFERENCIA, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.
- GP25 MATERIAL BASE DE COMPACTADA AL 100 % DE SU PESO VOLUMÉTRICO, INCLUYE: SUMINISTRO DEL AGREGADO, ACARREO, COMPACTACIÓN, PRUEBA DE LABORATORIO Y TODO LO NECESARIO PARA SU TERMINACIÓN.
- GP06 RIEGO DE IMPREGNACIÓN CON EMULSIÓN CATIONICA ECI-60, A RAZÓN DE 1.50 A 1.8 LT/M2, INCLUYE: ARENEO, APLICACIÓN, ALMACENAMIENTO, CALENTAMIENTO, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.

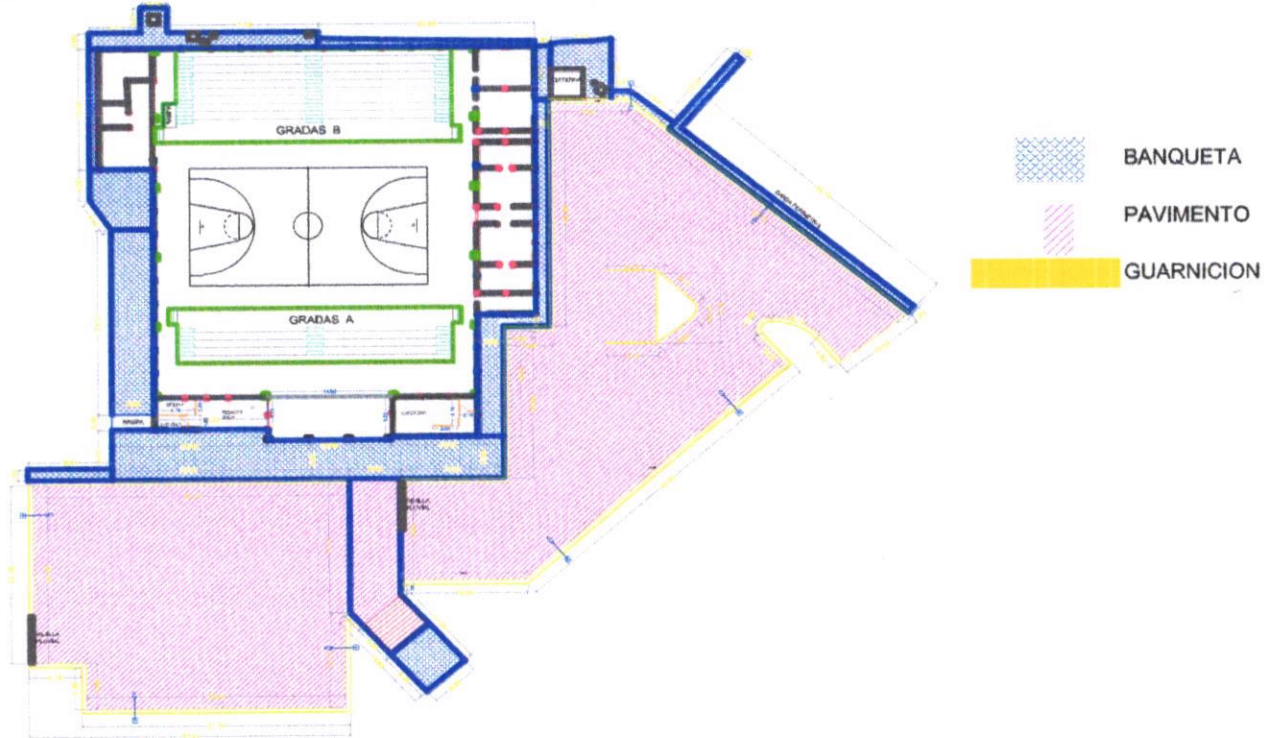

ELABORÓ

ING. VIANEY ESCARREGA RIVERA
 SUPERINTENDENTE DE OBRA

REVISÓ

ARQ. BRICEIDA GUADALUPE NIEBLAS MARTINEZ
 SUPERVISOR

AUTORIZO

ING. RUBIEL RINCON RAMOS
 DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS
 DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA.



FECHA: 20/08/2025

DEPENDENCIA: **MUNICIPIO DE BADIRAGUATO**
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA

CROQUIS

CONSTRUCCIÓN DE SEGUNDA ETAPA DE "ARENA BADIRAGUATO" EN INSTALACIONES DE UNIDAD DEPORTIVA 20 DE NOVIEMBRE, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE BADIRAGUATO, SINALOA.


CONTRATISTA: **SERGIO URIAS RUBIO**

OBRA:

ESTIMACION: **01 (ADICIONAL) FINIQUITO****ESTRUCTURAS METALICAS**

GBR36 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PLACA DE ACERO DE 30X22.5 CM DE 3/4" DE ESPESOR PARA UNION DE VIGA A VIGA, SOLDADA AL ALMA DE CADA PERFIL CON SOLDADURA 7018 EN CORDON DE 8MM DE ESPESOR, DE ACUERDO A DETALLE EN PLANO DE PROYECTO. INCLUYE: PRIMARIO DE FONDO ANTICORROSIVO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.

GBR42 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PTR DE 16X16 EN 3/8" PARA FORMACIÓN DE COLUMNA, INCLUYE: PLACA DE ACERO DE 35X35 CM DE 3/4" DE ESPESOR, FONDO ANTICORROSIVO GRIS, PINTURA ESMALTE, SOLDADURA E-7018 6MM DE 1/4", ACARREOS, NIVELACIÓN, ANDAMIOS, HERRAMIENTA, MENOR, GRÚA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA TERMINACIÓN.

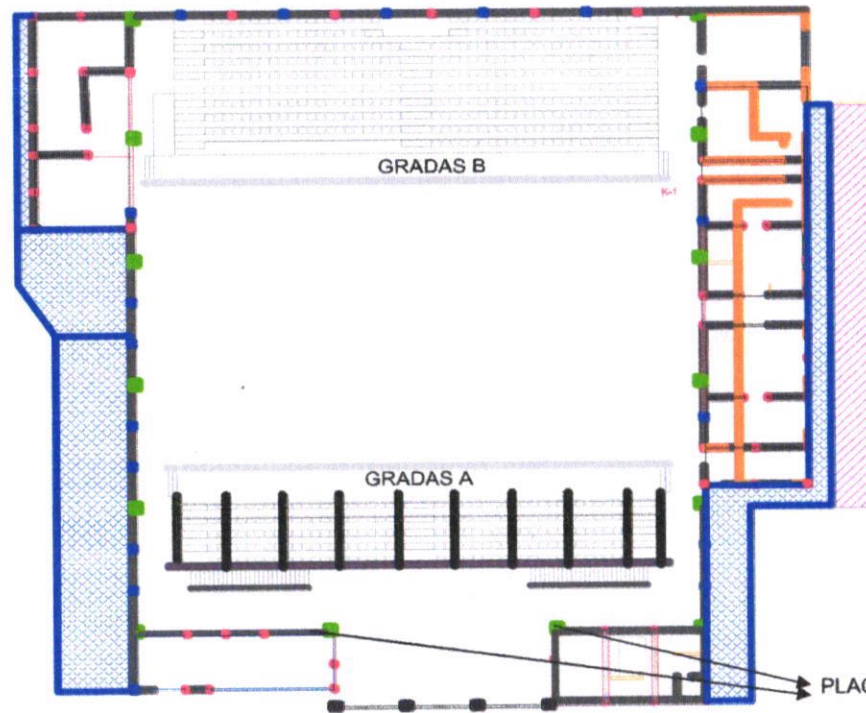

PLACA DE ACERO DE 50X50 CM DE 1" DE ESPESOR
 PTR DE 16X16 EN 3/8"

ELABORO

ING. VIANEY ESCOBAR RIVERA
 SUPERINTENDENTE DE OBRA

REVISÓ

ARQ. BRICEIDA GUADALUPE NIEBLAS MARTINEZ
 SUPERVISOR

AUTORIZO

ING. RUBIEL RINCON RAMOS
 DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS
 DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA.



FECHA: 20/08/2025

DEPENDENCIA: **MUNICIPIO DE BADIRAGUATO**
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA

CROQUIS

CONSTRUCCIÓN DE SEGUNDA ETAPA DE "ARENA BADIRAGUATO" EN INSTALACIONES DE UNIDAD DEPORTIVA 20 DE NOVIEMBRE, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE BADIRAGUATO, SINALOA.


CONTRATISTA: **SERGIO URIAS RUBIO**

OBRA:

ESTIMACION: **01 (ADICIONAL) FINIQUITO****ALBAÑILERIAS**

GP109

BANQUETA DE 10 CMS DE ESPESOR CON CONCRETO HECHO EN OBRA CON UN F'C=250 KG/CM", INCLUYE: MANO DE OBRA, MATERIALES, HERRAMIENTA Y EQUIPO.

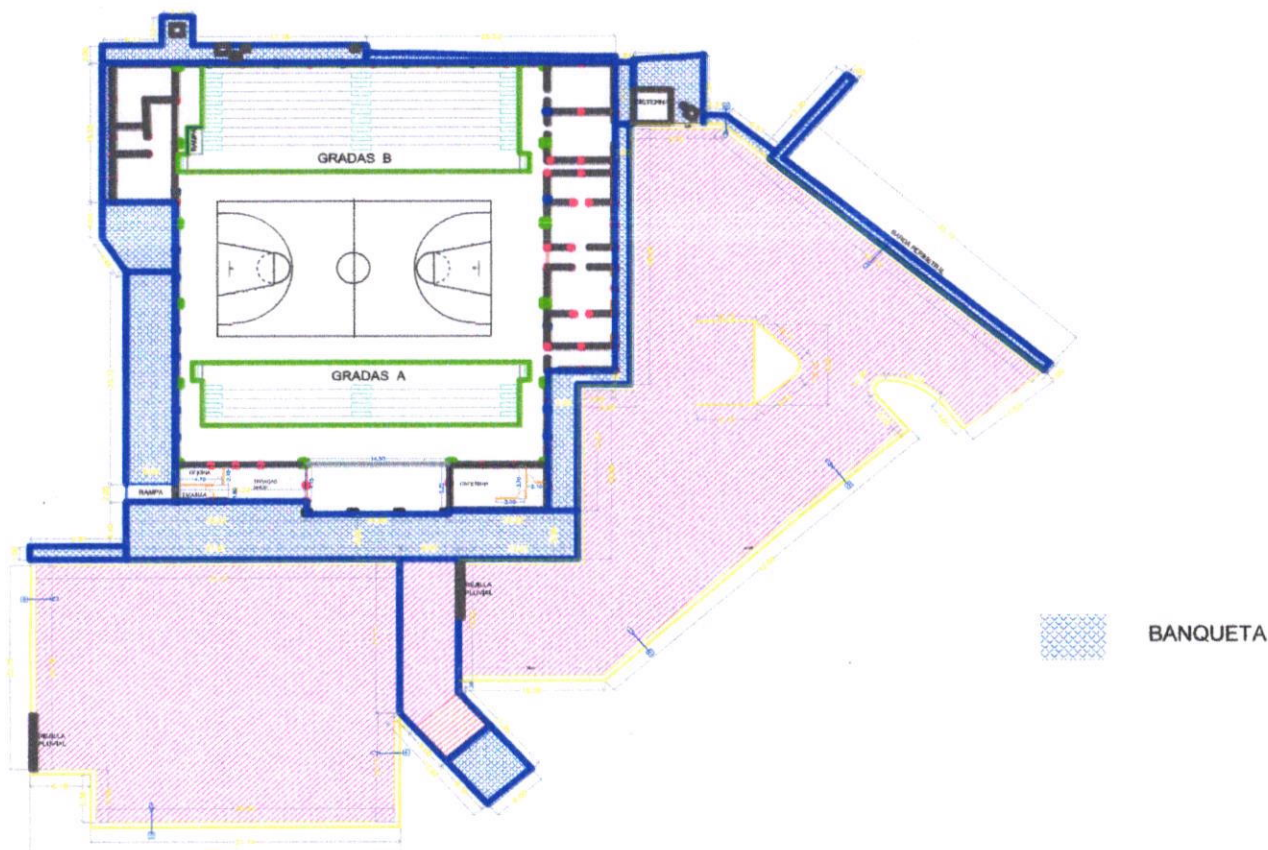

ELABORO

ING. VIANEY ESCARREGA RIVERA
 SUPERINTENDENTE DE OBRA

REVISÓ

ARQ. BRICEIDA GUADALUPE NIEBLAS MARTINEZ
 SUPERVISOR

AUTORIZO

ING. RUBIEL RINCON RAMOS
 DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS
 DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA.



FECHA: 20/08/2025

DEPENDENCIA:

MUNICIPIO DE BADIRAGUATO
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA

CROQUIS

CONSTRUCCIÓN DE SEGUNDA ETAPA DE "ARENA BADIRAGUATO" EN INSTALACIONES DE UNIDAD DEPORTIVA 20 DE NOVIEMBRE, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE BADIRAGUATO, SINALOA.

CONTRATISTA: **SERGIO URIAS RUBIO**

OBRA:

ESTIMACION: **01 (ADICIONAL) FINIQUITO**

GP52



MURO DE BLOCK 15x20x40 CMS, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.

PLANTA BAJA
LADO B



LADO D

MEZZANINE

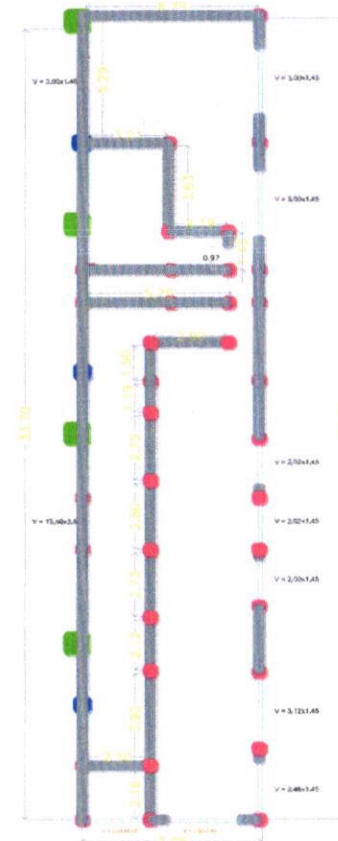

PLANTA ALTA

ELABORO

ING. VIANEY ESCARREGA RIVERA
SUPERINTENDENTE DE OBRA

REVISÓ

ARQ. BRICEIDA GUADALUPE NIEBLAS MARTINEZ
SUPERVISOR

AUTORIZO

ING. RUBIEL RINCON RAMOS
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS
DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA.



FECHA: 20/08/2025

MUNICIPIO DE BADIRAGUATO
DEPENDENCIA: DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA

CROQUIS

CONSTRUCCIÓN DE SEGUNDA ETAPA DE "ARENA BADIRAGUATO" EN INSTALACIONES DE UNIDAD DEPORTIVA 20 DE NOVIEMBRE, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE BADIRAGUATO, SINALOA.



CONTRATISTA: **SERGIO URIAS RUBIO**

OBRA:

ESTIMACION: **01 (ADICIONAL) FINIQUITO****ACABADOS**

GP235

MURO DOBLE DE TABLAROCA TIPO LISO EN INTERIOR A DOS CARAS SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BASTIDOR METÁLICO GALV. HECHO A BASE DE CANALETA DE CARGA CAL.22 Y CANAL LISTÓN CAL.26 ANCLAJE A PIEZO Y/O PARED EXISTENTE CON CARGA HILTI ROJA, CLAVO PARA CONCRETO Y ÁNGULO, TABLAROCA FIJADA CON TORNILLO S-1 DE 1", TRATAMIENTO DE JUNTAS CON PERFACINTA Y COMPUESTO REDIMIX, ÁNGULO REBORDE "J", Y ÁNGULO ESQUINERO, TABLAROCA MARCA USG O' PANEL REY DE 13MM. INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, ANDAMIAJES, DESPERDICIO, ACARREOS, ELEVACIONES, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.

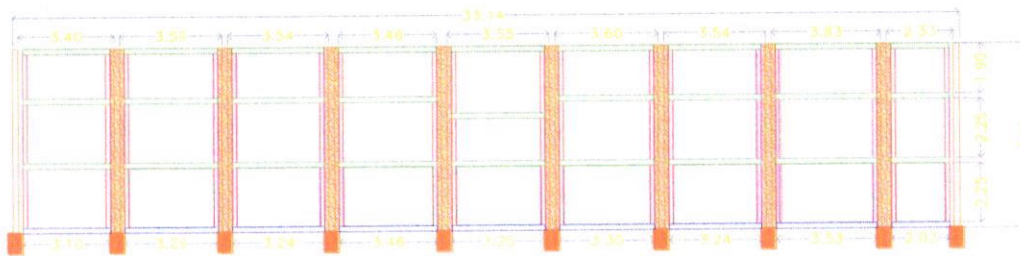**LADO D****TABLAROCA MEZZANINE****TABLAROCA ESCALERAS**

ELABORO

ING. VIANEY ESCARREGA RIVERA
SUPERINTENDENTE DE OBRA

REVISÓ

ARQ. BRICEIDA GUADALUPE NIEBLAS MARTINEZ
SUPERVISOR

AUTORIZO

ING. RUBIEL RINCON RAMOS
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS
DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA.



FECHA: 20/08/2025

DEPENDENCIA: **MUNICIPIO DE BADIRAGUATO**
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA

CROQUIS

CONSTRUCCIÓN DE SEGUNDA ETAPA DE "ARENA BADIRAGUATO" EN INSTALACIONES DE UNIDAD DEPORTIVA 20 DE NOVIEMBRE,
 UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE BADIRAGUATO, SINALOA.

CONTRATISTA: **SERGIO URIAS RUBIO**


OBRA:

ESTIMACION: **01 (ADICIONAL) FINIQUITO**

GP510

APLANADO FINO CON MORTERO CEMENTO ARENA, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.

LADO B

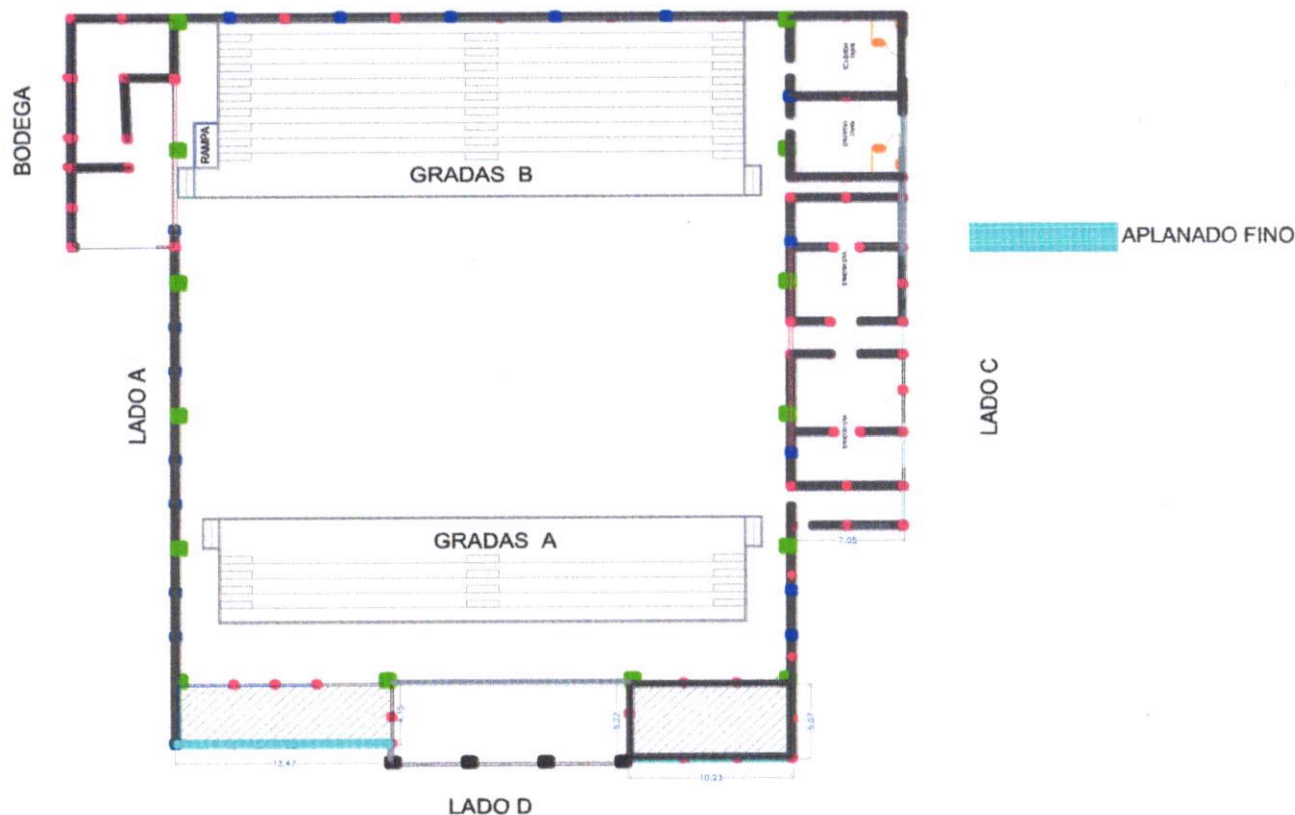

ELABORO

ING. VIANEY ESCARREGA RIVERA
 SUPERINTENDENTE DE OBRA

REVISÓ

ARQ. BRICEIDA GUADALUPE NIEBLAS MARTINEZ
 SUPERVISOR

AUTORIZO

ING. RUBIEL RINCON RAMOS
 DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS
 DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA.



FECHA: 20/08/2025

MUNICIPIO DE BADIRAGUATO
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA

CROQUIS



CONSTRUCCIÓN DE SEGUNDA ETAPA DE "ARENA BADIRAGUATO" EN INSTALACIONES DE UNIDAD DEPORTIVA 20 DE NOVIEMBRE,
UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE BADIRAGUATO, SINALOA.

CONTRATISTA: **SERGIO URIAS RUBIO**

OBRA:

ESTIMACION: **01 (ADICIONAL) FINIQUITO****GRADAS**

- GBR090 FABRICACIÓN Y COLOCACIÓN DE CADENA DE DESPLANTE DE 15x20 CM, ARMADA CON ARMEX 15X20 REFORZADO CON DOS VARILLAS DE 3/8", COLADA CON CONCRETO HECHO EN OBRA DE F'C=200 KG/CM2, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.
- GP505 MURO DE BLOCK 15x20x40 CMS, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.
- GP237 LOSA DE 10 CM DE ESPESOR CON CONCRETO F'C= DE 200 KG/CM HECHO EN OBRA, ARMADO CON VARILLA DE 3/8" @ 20 CMS EN AMBOS SENTIDOS, INCLUYE: CIMBRA, MANO DE OBRA, MATERIALES,EQUIPO Y HERRAMIENTAS.

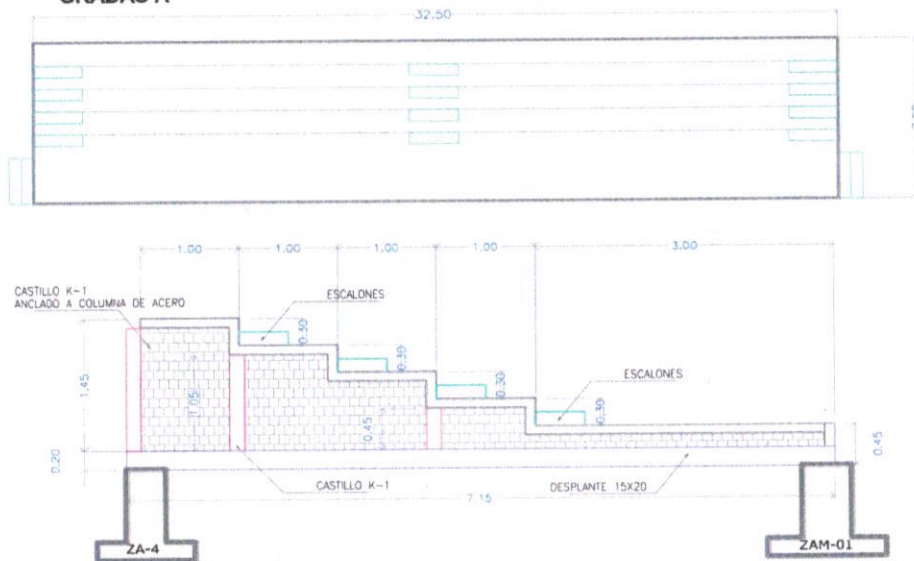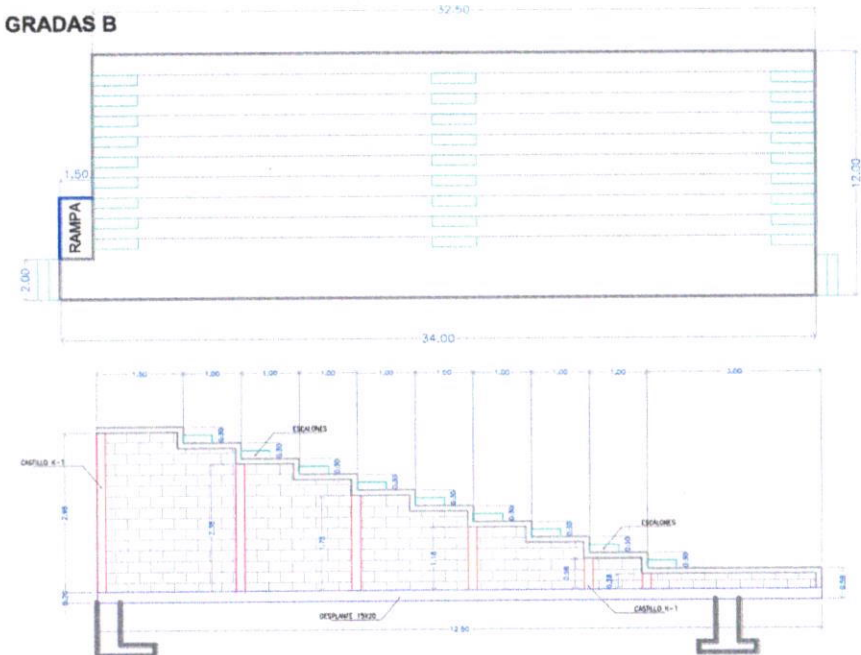GRADAS A**GRADAS B**

ELABORO

ING. VIANEY ESCARREGA RIVERA
SUPERINTENDENTE DE OBRA

REVISÓ

ARQ. BRICEIDA GUADALUPE NIEBLAS MARTINEZ
SUPERVISOR

AUTORIZO

ING. RUBIEL RINCON RAMOS
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS
DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA.



FECHA: 20/08/2025

DEPENDENCIA: **MUNICIPIO DE BADIRAGUATO**
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA

REPORTE FOTOGRAFICO

CONSTRUCCIÓN DE SEGUNDA ETAPA DE "ARENA BADIRAGUATO" EN INSTALACIONES DE UNIDAD DEPORTIVA 20 DE NOVIEMBRE, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE BADIRAGUATO, SINALOA.

CONTRATISTA: **SERGIO URIAS RUBIO**

OBRA:

ESTIMACION: **01 (ADICIONAL) FINIQUITO****ESTACIONAMIENTO****MOVIMIENTO DE TIERRAS**

- GP01 TRAZO Y NIVELACIÓN DEL TERRENO ESTABLECIENDO EJES Y NIVELETAS DE REFERENCIA, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.
- GP25 MATERIAL BASE DE COMPACTADA AL 100 % DE SU PESO VOLUMÉTRICO, INCLUYE: SUMINISTRO DEL AGREGADO, ACARREO, COMPACTACIÓN, PRUEBA DE LABORATORIO Y TODO LO NECESARIO PARA SU TERMINACIÓN.
- GP06 RIEGO DE IMPREGNACIÓN CON EMULSIÓN CATIONICA ECI-60, A RAZÓN DE 1.50 A 1.8 LT/M2, INCLUYE: ARENEO, APLICACIÓN, ALMACENAMIENTO, CALENTAMIENTO, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.

PAVIMENTOS

- GP08 GUARNICIÓN TIPO "L" DE 15X30X60 DE CONCRETO PREMEZCLADO DE F'C= 250 KG/CM2, INCLUYE: CIMBRA Y DESIMBRA, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, MANIOBRAS LOCALES Y TODO LO NECESARIO PARA SU TERMINACIÓN.



ELABORO

ING. VIANEY ESCOBAR RIVERA
 SUPERINTENDENTE DE OBRA

REVISÓ

ARQ. BRICEIDA GUADALUPE NIEBLAS MARTINEZ
 SUPERVISOR

AUTORIZO

ING. RUBIEL RINCON RAMOS
 DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS
 DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA.



FECHA: 20/08/2025

DEPENDENCIA: **MUNICIPIO DE BADIRAGUATO
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA**

REPORTE FOTOGRAFICO

CONSTRUCCIÓN DE SEGUNDA ETAPA DE "ARENA BADIRAGUATO" EN INSTALACIONES DE UNIDAD DEPORTIVA 20 DE NOVIEMBRE, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE BADIRAGUATO, SINALOA.


CONTRATISTA: **SERGIO URIAS RUBIO**

OBRA:

ESTIMACION: **01 (ADICIONAL) FINIQUITO
ESTRUCTURAS METALICAS**

GBR42

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PTR DE 16X16 EN 3/8" PARA FORMACIÓN DE COLUMNA, INCLUYE: PLACA DE ACERO DE 35X35 CM DE 3/4" DE ESPESOR, FONDO ANTICORROSIVO GRIS, PINTURA ESMALTE, SOLDADURA E-7018 6MM DE 1/4", ACARREOS, NIVELACIÓN, ANDAMIOS, HERRAMIENTA, MENOR, GRÚA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA TERMINACIÓN.

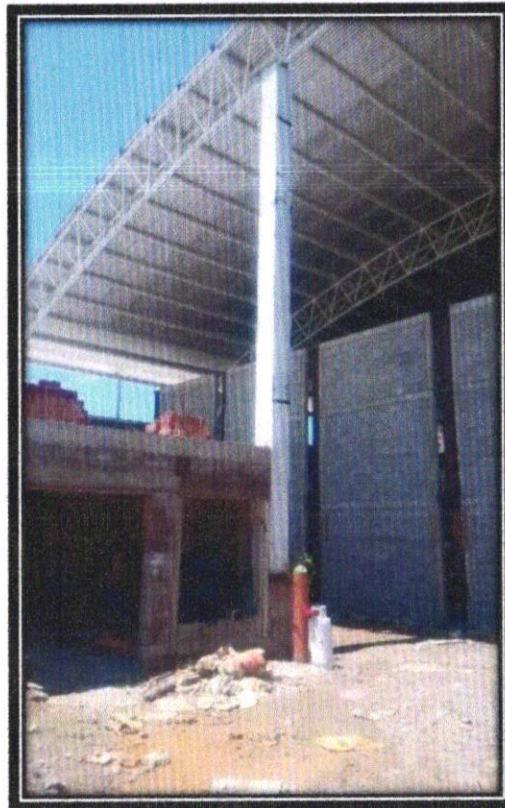

ELABORÓ

ING. VIANEY ESCARREGA RIVERA
SUPERINTENDENTE DE OBRA

REVISÓ

ARQ. BRICEIDA GUADALUPE NIEBLAS MARTINEZ
SUPERVISOR

AUTORIZO

ING. RUBIEL RINCON RAMOS
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS
DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA.



FECHA: 20/08/2025
MUNICIPIO DE BADIRAGUATO
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA

REPORTE FOTOGRAFICO




CONSTRUCCIÓN DE SEGUNDA ETAPA DE "ARENA BADIRAGUATO" EN INSTALACIONES DE UNIDAD DEPORTIVA 20 DE NOVIEMBRE, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE BADIRAGUATO, SINALOA.

CONTRATISTA: **SERGIO URIAS RUBIO**

OBRA:

ESTIMACION: **01 (ADICIONAL) FINIQUITO**
ALBAÑILERIAS

GP109 **BANQUETA DE 10 CMS DE ESPESOR CON CONCRETO HECHO EN OBRA CON UN F'C=250 KG/CM", INCLUYE: MANO DE OBRA, MATERIALES, HERRAMIENTA Y EQUIPO.**

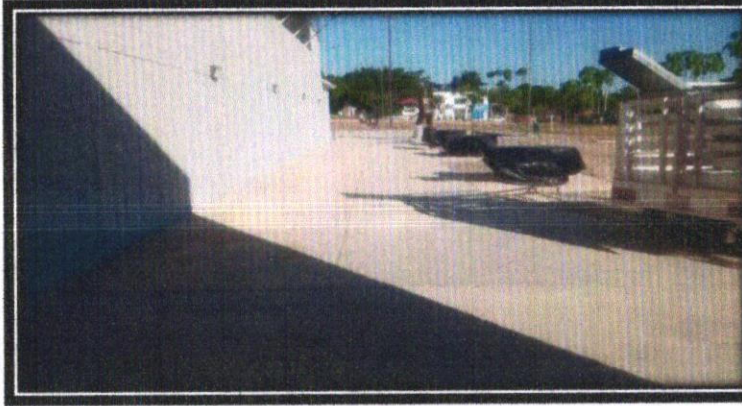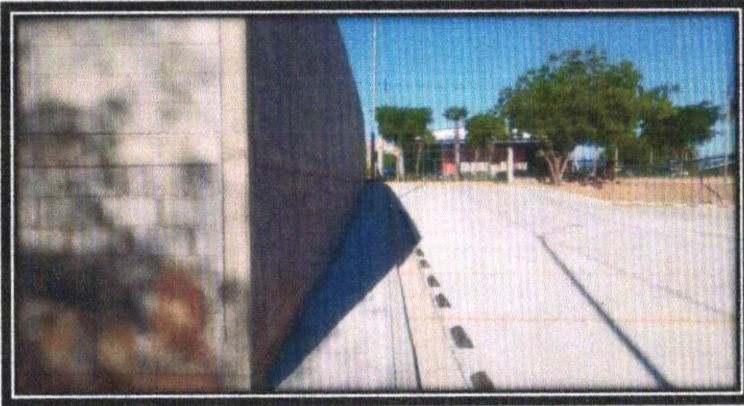

ELABORO

ING. VIANEY ESCARREGA RIVERA
 SUPERINTENDENTE DE OBRA

REVISÓ

ARQ. BRICEIDA GUADALUPE NIEBLAS MARTINEZ
 SUPERVISOR

AUTORIZO

ING. RUBIEL RINCON RAMOS
 DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS
 DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA.



FECHA: 20/08/2025

DEPENDENCIA: MUNICIPIO DE BADIRAGUATO
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA

REPORTE FOTOGRAFICO

CONSTRUCCIÓN DE SEGUNDA ETAPA DE "ARENA BADIRAGUATO" EN INSTALACIONES DE UNIDAD DEPORTIVA 20 DE NOVIEMBRE, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE BADIRAGUATO, SINALOA.




CONTRATISTA: **SERGIO URIAS RUBIO**

OBRA:

ESTIMACION: **01 (ADICIONAL) FINIQUITO**

GP52

MURO DE BLOCK 15x20x40 CMS, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.

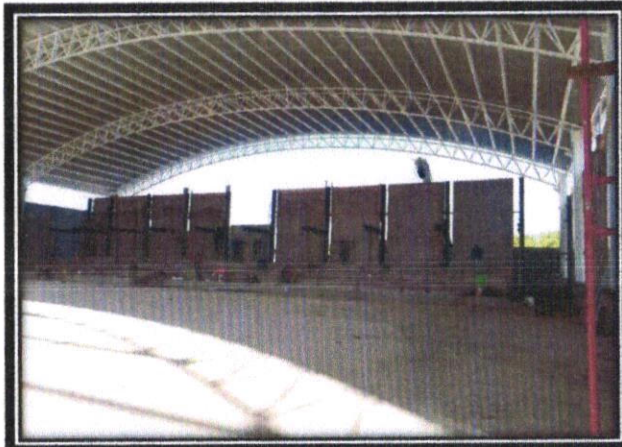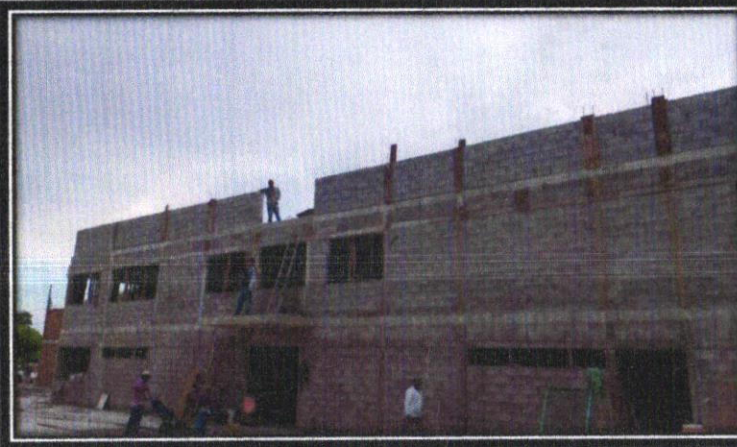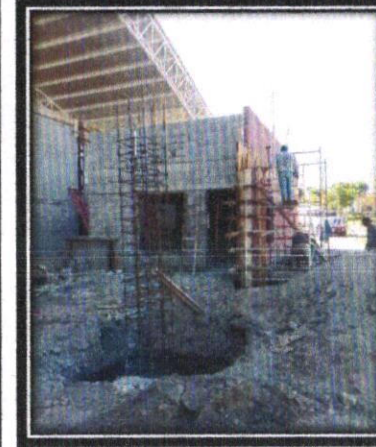

ELABORO

ING. VIANEY ESCOBAR RIVERA
SUPERINTENDENTE DE OBRA

REVISÓ

ARQ. BRICEIDA GUADALUPE NIEBLAS MARTINEZ
SUPERVISOR

AUTORIZO

ING. RUBIEL RINCON RAMOS
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS
DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA.



FECHA: 20/08/2025
MUNICIPIO DE BADIRAGUATO
 DEPENDENCIA: **DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS**
DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA

REPORTE FOTOGRAFICO

CONSTRUCCIÓN DE SEGUNDA ETAPA DE "ARENA BADIRAGUATO" EN INSTALACIONES DE UNIDAD DEPORTIVA 20 DE NOVIEMBRE, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE BADIRAGUATO, SINALOA.

CONTRATISTA: **SERGIO URIAS RUBIO**



OBRA:

ESTIMACION: **01 (ADICIONAL) FINIQUITO**

ACABADOS

GP510

APLANADO FINO CON MORTERO CEMENTO ARENA, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.

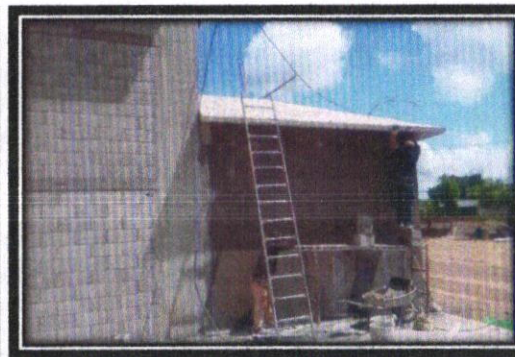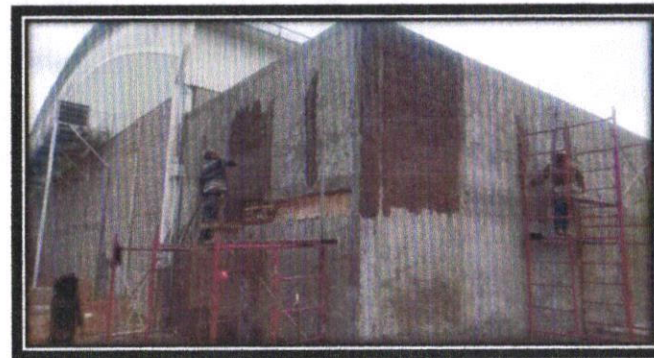

ELABORO

ING. VIANEY ESCÁRREGA RIVERA
 SUPERINTENDENTE DE OBRA

REVISÓ

ARQ. BRICEIDA GUADALUPE NIEBLAS MARTINEZ
 SUPERVISOR

AUTORIZO

ING. RUBIEL RINCON RAMOS
 DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS
 DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA.



FECHA: 20/08/2025

DEPENDENCIA: **MUNICIPIO DE BADIRAGUATO**
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA


REPORTE FOTOGRAFICOCONTRATISTA: **SERGIO URIAS RUBIO**

OBRA:

CONSTRUCCIÓN DE SEGUNDA ETAPA DE "ARENA BADIRAGUATO" EN INSTALACIONES DE UNIDAD DEPORTIVA 20 DE NOVIEMBRE,
 UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE BADIRAGUATO, SINALOA.

ESTIMACION: **01 (ADICIONAL) FINIQUITO****GRADAS**

- GBR090 FABRICACIÓN Y COLOCACIÓN DE CADENA DE DESPLANTE DE 15x20 CM, ARMADA CON ARMEX 15X20 REFORZADO CON DOS VARILLAS DE 3/8", COLADA CON CONCRETO HECHO EN OBRA DE F'C=200 KG/CM2, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.
- GP505 MURO DE BLOCK 15x20x40 CMS. INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.
- GP237 LOSA DE 10 CM DE ESPESOR CON CONCRETO F'C= DE 200 KG/CM HECHO EN OBRA, ARMADO CON VARILLA DE 3/8" @ 20 CMS EN AMBOS SENTIDOS, INCLUYE: CIMBRA, MANO DE OBRA, MATERIALES, EQUIPO Y HERRAMIENTAS.

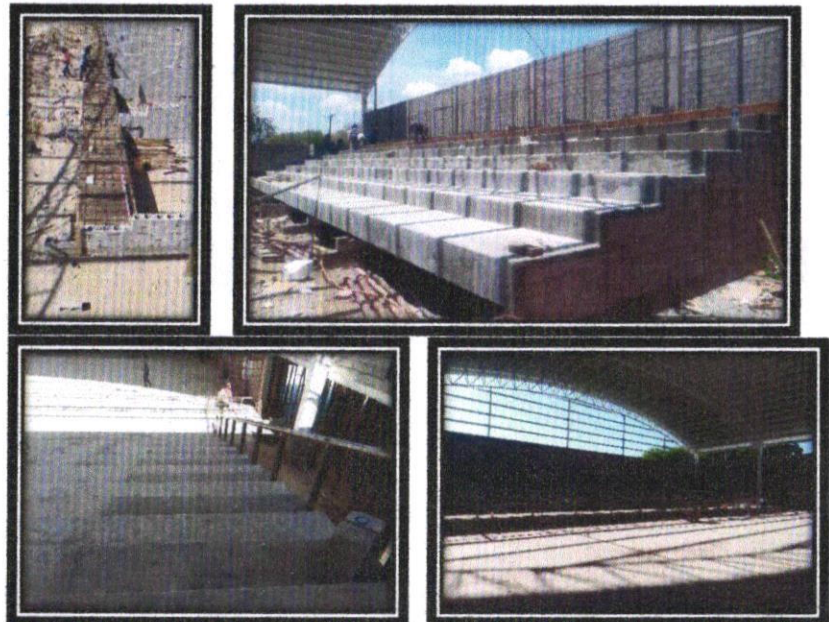GRADAS A**GRADAS B**

ELABORO

ING. MANEX ESCARREGA RIVERA
 SUPERINTENDENTE DE OBRA

REVISÓ

ARQ. BRICEIDA GUADALUPE NIEBLAS MARTINEZ
 SUPERVISOR

AUTORIZO

ING. RUBIEL RINCON RAMOS
 DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS
 DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA.



Fecha y hora de consulta14/11/2025 1:27:04 PM

Contrato00798320

Nombre del ClienteMUNICIPIO DE BADIRAGUATO

BBVA Net Cash - Pagos Interbancarios

Operación autorizada

Transferencia en proceso de validación y aplicación.

Datos del firmante

Usuario:ADMIN1

Poder:100%

Datos de la operación

Tipo de operación: Pago Interbancario	
Descripción: EST 01 AD FIN LP 002	Importe de la operación: 436,891.48 MXP
Cuenta de retiro: 0117899181	Cuenta de depósito: 072743011836273107
Divisa de la cuenta: MXP	Divisa de la cuenta: MXP
Titular de la cuenta: MUNICIPIO DE BADIRAGUATO	Titular de la cuenta: SERGIO URIAS RUBIO
Nombre banco destino: BANORTE	
Fecha de creación: 14/11/2025	Fecha de aplicación: 14/11/2025
Concepto de pago: EST 01 AD FIN LP 002	Referencia numérica:
Instrumento de seguridad: ASD 6551749382	Hora de captura en el canal: 13:26:57

Datos de confirmación de la transferencia

Folio interbancario: 0000922580	Clave de rastreo: 002601002511140000922580
Folio de firma: 0074774021	Folio único: I401202511141326570074774027

Estado operación

Porcentaje Firmado: 100%

Estado: Operado

Detalle de firmas

Acción	Usuario	Porcentaje aportado	Fecha
CREO	ADMIN1	— %	14/11/2025
FIRMO	ADMIN1	100 %	14/11/2025
