

OPPU-EST-LP-PEST-UIAL-2005-2022.
NOTA NO. 1 30/MAY/2022.

CON ESTA FECHA SE APERIURA ESTE LIBRO DE BITACORA PARA DAR SEGUIMIENTO A LOS TRABAJOS DEL SIGUIENTE CONTRATO DE OBRA:

OPPU-EST-LP-PEST-UIAL-2005-2022.

OBJETO DEL CONTRATO:

LA "SECRETARIA" ENCOMIENDA A "LA CONTRATISTA" LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS DE LA OBRA: PAVIMENTACION CAMINO BATEQUITAS - LA HIQUERITA - PRIMERA ETAPA - EN EL MUNICIPIO DE BODIRQUITO, ESTADO DE SONORA.

CONTRATISTA: CRIBAS Y EDIFICACIONES LAS FLORES, S. DE C.V.

REPRESENTANTE LEGAL: C. BALDOMERO GARCIA BELTRAN.

MONTO DEL CONTRATO: \$ 20'520,707.55

PLAZO DE EJECUCION:

INICIO: 30 MAYO 2022.

TERMINO: 30 OCTUBRE 2022.

LA "SECRETARIA" ASIGNA AL C. ING. MARIO ENRIQUE ASTORGA YANEZ, MEDIANTE OFICIO SEP-DIR-SEP-SEO-A-2022, COMO PRESIDENTE DE OBRA. A CONTINUACION SE REGISTRA SU FIRMA.

LA CONTRATISTA ASIGNA COMO SUPERINTENDENTE DE OBRA AL C. ING. DANIEL SOSA SUIZ, CON PODER AMPARO Y SUFICIENTE PARA DIRIGIR LOS TRABAJOS DEL PRESENTE CONTRATO. A CONTINUACION SE REGISTRA SU FIRMA:

NOTA NO. 2 30/MAYO/2022.

LA SECRETARIA PONE A DISPOSICION EL INMUEBLE DONDE SE EJECUTARAN LOS TRABAJOS, MEDIANTE OFICIO ~~DE~~ SOP-DIR-SOP-DI-ECO-2022.

NOTA NO. 3 30/MAYO/2022.

LA CONTRATISTA NOTIFICA MEDIANTE OFICIO QUE HA INICIADO LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO.

NOTA NO. 4 10/JUNIO/2022.

PARA ESTA FECHA SE TIENE EJECUTADA LA EXCAVACION DEL Km 4+600 AL Km 5+600.71, LA COMPACTACION DEL TERRENO MATERIAL,

NOTA NO.5 17/JUNIO/2022.

PARA ESTA FECHA SE TIENE EJECUTADA LA CAPA DE
TIERRAS PLANES Y SUBRASANTE AL 95%.

TIERRAS PLANES AL 95%. Km 4+600 AL Km 5+608.71
SUBRASANTE AL 95%. Km 5+00 AL Km 5+608.71

NOTA NO.6 20/JUNIO/2022.

CON ESTA FECHA SE ADOPTA LA ESTIMACION NUMERO
UNO - NORMAL, LA CUAL TIENE UN PERIODO DE
EJECUCION DEL 30/MAYO/2022 AL 18/JUNIO/22
Y PRESENTA EL SIGUIENTE DESGLOSE:

IMPORTE TOTAL \$ 823,164.65

AMORT. ANTICIPO \$ 288,107.63

DEDUCC. D'CONTRATO \$ 21,288.74

LÍQUIDO A PAGAR \$ 513,768.28.

NO. 7 30/JUN/2022.

PARA ESTA FECHA SE TIENE EFECTUADO EL SIGUIENTE AVANCE DE OBRA:

EXCAVACION Km 2+900 AL Km 4+600
COMPACTACION DEL TERRENO NATURAL Km 2+900 AL -
Km 4+600.
Y AVANCE EN CAPA SOBRESANTE Y TEMPLEN.

NOTA NO. 8 08/JULIO/2022.

PARA ESTA FECHA TENEMOS EFECTUADO LOS TRABAJOS DEL TRAMO Km 4+100 AL Km 5+100 HASTA EL NIVEL DE CAPA SOBRESANTE, Y TRABAJOS PARCIALES DE OBRAS DE DRENAJE.

NOTA NO. 9 11/ JULIO/ 2022.
 CON ESTA FECHA SE AUTORIZA LA ESTIMACION NORMAL DE LOS DGS NORMAL, CON UN PERIODO DE EJECUCION 19/JUNIO/2022 AL 08/JULIO/2022, LA CUAL PRESENTA EL SIGUIENTE DESGLOSE:

IMPORTE TOTAL	\$ 1'736,513.43
AMORTIZACION	\$ 607,779.70
DEDUC. CONTRATO	\$ 44,909.83
LICUADO O PAGAR	\$ 1'083,823.90.

NOTA NO. 10 15/ JULIO/ 2022.

PARA ESTA FECHA SE TIENE TERMINADA LA EJECUCION Y LA COMPACTACION DEL TERRENO NATURAL EN EL TRAMO Km 2+760 AL Km 2+900.

DIVERSOS FRENTES DE OBRA TRABAJAN EN LAS OBRAS DE DRENAJE, QUE SE EJECUTAN DE ACUERDO AL PROYECTO LOCALIZADAS EN LOS SIGUIENTES KILOMETRAJES, Y QUE LLEGAN UN AVANCE DEL 50% PONDERADO.

Km : 2+796 ; 3+052 ; 3+267.20 ; 3+460 ;
 3+629.4 ; 3+760 ; 4+152 ; 4+328 ;
 4+710 ; 5+522 ; 5+570.40

NOTA NO. 11 22/ JUNIO/ 2022.
PARA ESTA FECHA SE TIENE EJECUTADA LA COTA
SUPERFICIE DE 30 CMS. ESPESOR, MATERIAL DE BANCO
COMPACTADA AL 95%.
LAS OBRAS DE DRENAJE CONTENIDAS EN EL PROYECTO
Y MENCIONADOS LOS COTENAMIENTOS EN LA NOTA NO. 10
TUEEN UN AVANCE DEL 75%.

NOTA NO. 12 31/ JULIO/ 2022.

PARA ESTA FECHA LAS OBRAS DE DRENAJE EN SUS
DIVERSAS MODALIDADES, ESTAN EJECUTADAS AL 100%.
CUYOS COTENAMIENTOS SE MENCIONAN A CONTINUACION:

Kms: 2+796

3+052

3+267.20

3+480

3+629.90

3+780

4+152

4+328

4+710

5+522

5+570.46

NOTA NO. 13 02/AGO/2022.

CON ESTA FECHA SE AUTORIZA LA ESTIMACION NUMERO TRES - NORMAL, CON UN PERIODO DE EJECUCION DEL 09/JUNIO/2022 AL 31/JULIO/2022. LA CUAL PRESENTA EL SIGUIENTE DESGLOSE:

IMPORTE TOTAL	\$ 4'470,672.27.
AMORT. ANTICIPO	\$ 1'581,735.30
DEDUCC. CONTRATO	\$ 116,138.08
LÍQUIDO A PAGAR	\$ 2'802,798.89.

NOTA NO. 14 09/AGO/2022.

PARA ESTA FECHA TENEMOS TERMINADA LA CAPA DE SOBRESCANTE COMPACTADA AL 95% FORMADA CON MATERIAL DE BANCO DEL KM 2+760 AL KM 3+307 Y CON ESTE TRAMO TERMINADO, TENEMOS COMPLETA DICHA CAPA DEL KM 2+760 AL KM 5+608.71, LO CUAL REPRESENTA EL 100% DEL TRAMO DE PROYECTO.

CONT-2405-2022.

NOTA NO. 15 19/AGOSTO/2022.

PARA ESTA FECHA SE TIENE EJECUTADA LA CAPA DE BASE HIDRÁULICA PARCIALMENTE TRITURADA, COMPACTADA AL 100%, CON UN ESPESOR DE 20 CMS. DEL PUNTO KM 5+08.71 AL KM 4+780.

NOTA NO. 16 22/AGOSTO/2022.

CON ESTA FECHA SE AUTORIZA LA ESTIMACIÓN NÚMERO CUATRO NORMAL CON UN PERÍODO DE EJECUCIÓN DEL 01/AGO/2022 AL 19/AGO/2022, LA CUAL PRESENTA EL SIGUIENTE DESGLOSE:

IMPORTE TOTAL	\$ 1'832,611.46.
IMPORTE ANTICIPA	\$ 641,414.15
DEDUCC. CONTRATO	\$ 47,395.13
LÍQUIDO A PAGAR	\$ 1'143,802.58

NOTA NO. 17 15/SEPT/2022.

PARA ESTA FECHA SE TIENE EJECUTADO UN AVANCE EN LA CAPA DE BASE HIDRAULICA PARCIALMENTE TRITONADA, ESPESOR DE 20 CMS. EN EL TRAMO: Km 4+000 AL Km 4+760. CABE SEÑALAR QUE EL AVANCE DE OBRA SE HA VIS TO PALENTIZADO CON MOTIVO DE LAS CONSTANTES Y COPIOSAS LLUVIAS.

NOTA NO. 18 17/SEPT/2022.

CON ESTA FECHA SE AUTORIZA LA ESTIMACION NUM. CINCO NORMAL, CON UN PERIODO DE EJECUCION DEL 20/AGO/2022 AL 15/SEPT/2022, LA CUAL PRESENTA EL SIGUIENTE DESGLOSE:

Importe TOTAL	\$ 1'380,185.27
AMORT. ANTICIPADO	\$ 483,064.84
DERUCE CONTRATO	\$ 35,694.45
LÍQUIDO A PAGAR	\$ 861,425.98

NOTA NO. 19 30/SEPT/ 2022.
 PARA ESTA FECHA TENEMOS UN AVANCE CONSECUTIVO DE
 LA CAPA DE BASE HOMOLICA PARCIALMENTE TRITURADA
 DA DE 20 CMS. ESPESOR. TRAMO: 3+320-Km —
 Y TODO.
 RIEGO DE IMPREGNACION Y ARRENO Km 4+000 - Km 5+000

NOTA NO. 20 03/OCT/ 2022.

CON ESTA FECHA SE AUTORIZA LA ESTIMACION NUMERO
 0015 NORMAL, CON UN PERIODO DE EJECUCION DEL —
 16/09/2022 AL 30/09/2022. LA COSI PRESENTA
 EL SIGUIENTE DESGLOSE:

Importe TOTAL	\$ 1'793,159.85
AMORT. ANTICIPO	\$ 627,605.94
DEDUCC. CONTRATO	\$ 46,374.82
Líquido a pagar	\$ 1'119,179.09

NOTA NO. 21 10/OCT/2022.

PARA ESTA FECHA SE TIENE EL SIGUIENTE ANQUE DE OBRA, CONSECUTIVO A LO ULTIMO ESTIMADO?

BASE TRITUNADA Km 2+760 - Km 3+320.

RIEGO DE IMPREGNACION ^{INCL. ARENEO} : Km 2+760 - Km 4+000

RIEGO DE LIGA : Km 4+420 - Km 5+608.71

CARPETA ASFALTICA, CALIENTE : Km 4+420 - Km 5,608.71

NOTA NO. 22 12/OCT/2022.

CON ESTA FECHA SE AUTORIZA LA ESTIM. NUM. SIETE NORMAL, CON UN PERIODO DE EJECUCION DEL 01/OCT/22 AL 11/OCT/22, LA CUAL PRESENTA EL SIGUIENTE DESGLOSE:

IMPORTE TOTAL \$ 3'421,597.03

AMORT. ANTICIPA \$ 1'197,558.96

DEDUCC. CONTRATO \$ 88,489.58

LIQUIDO A PAGAR \$ 2'135,548.49

NOTA NO. 23 19/OCT/2022.

CON ESTA FECHA TENEMOS EL SIGUIENTE AVANCE DE OBRA:

COLOCACION DE CARPETA ASFALTICA ESPESOR DE 5CMS CON UN ANCHO DE 7mts. DEL Km 2+920 - AL Km 2+420; Incl. PISO DE LIGA, SUMINISTRO Y TENDIDO.

NOTA NO. 24 19/OCT/2022.

CON ESTA FECHA SE AUTORIZA LA ESTIMACION NUMERO NO OCHO NORMAL, CON UN PERIODO DE ESTIMACION DEL 12/OCT/2022 AL 19/OCT/2022, LA CUAL PRESENTA EL SIGUIENTE DESGLOSE:

IMPORTE TOTAL	\$ 2'507,796.37
AMORT. ANTICIPA	\$ 877,728.73
DEDUC. ANTICIPA	\$ 64,856.80
LIQUIDO A PAGAR	\$ 1'565,210.84

NOTA NO. 25 22/OCT/2022.

PARA ESTA FECHA TENEMOS COLOCADA LA CARPETA
SALTICA DE 5.0 CMS. ESPESOR DEL KM 24+760
AL KM 2+920; SEÑALAMIENTO VERTICAL DE ACUERDO
AL PROYECTO AUTORIZADO.

NOTA NO. 26 24/OCT/2022.

CON ESTA FECHA SE AUTORIZA LA ESTIMACION NUMERO
NUEVE NORMAL, CON UN PERIODO DE EJECUCION DEL
20/OCT/2022 AL 22/OCT/2022, LA CUAL PRESENTA
EL SIGUIENTE DESGLOSE:

IMPORTE TOTAL	\$ 1'082,771.45
AMORT. ANTICIPA	\$ 378,976.01
DEDUC. CONTRATO	\$ 28,002.71
LÍQUIDO A PAGAR	\$ 675,792.73

NOTA NO. 27 26/OCT/2022.

PARA ESTA FECHA TENDRAN EJECUTADOS TODOS LOS
CONCEPTOS DE OBRAS COMPLEMENTARIAS TALES
COMO:

LUJADEROS, CUNETA DE CONCRETO, BORDILLO TRAPEZOIDAL,
MAYA CENTRAL, UNILETAS, -SEÑALAMIENTO VERTICAL,
BARRERAS-

NOTA NO. 28 26/OCT/2022.

CON ESTA FECHA SE AUTORIZA LA ESTIMACION NÚMERO
DIEZ NORMAL CON UN PERIODO DE EJECUCION DEL
23 AL 26/OCTUBRE/2022, LA CUAL PRESENTA
EL SIGUIENTE DESGLOSE:

IMPORTE TOTAL	\$ 624,010.68
EMONT. ANTICIPO	\$ 239,403.74
DEDUCC. CONTRATO	\$ 17,609.93
LIQUIDO A PAGAR	\$ 426,917.01

NOTA NO. 29 30/OCT/2022. CONT-2005-2022.

PARA ESTA FECHA TENEMOS EJECUTADAS TODAS LAS CANTIDADES ADICIONALES QUE FUERON FORMALIZADAS EN EL CONVENIO NUMERO 3 CON-01-2022-MI-C2005-2022, DE FECHA 12 DE OCTUBRE 2022.

NOTA NO. 30 03/NOVIEMBRE/2022.

CON ESTA FECHA SE AUTORIZA LA ESTIMACION NO MENOS ONCE ADICIONAL DEFINITIVO, CON CON PERIODO DE EJECUCION DEL 29/OCT/2022 AL 30/OCT/2022. LA CUAL PRESENTA EL SIGUIENTE DESGLOSE:

IMPORTE TOTAL \$ 674,511.09

AMORT. ANTICIPO \$ 268,878.64

DEDUCC. CONTRATO \$ 17,444.25

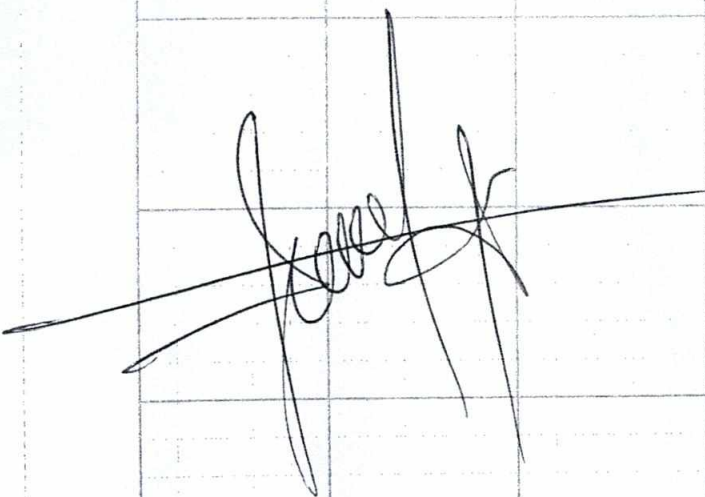

LIQUIDO A PAGAR \$ 388,188.20

SALDO A PAGAR \$ 388,188.20

NOTA NO. 31 03/NOVIEMBRE/2022. CONT 2005-2022.

NOTA DE CIERRE DE BITACORA.

CON ESTA FECHA SE CIERRA LA PRESENTE
BITACORA, HABIENDOSE CUMPLIDO CON LAS ME-
TAS DE CONTRATO CON EL PRESUPUESTO
ASIGNADO. POR OTRA PARTE, SE HA COMPLI-
DO CON EL FINQUITO DE LEY.

A large, stylized handwritten signature in black ink, written across the first two columns of the grid.A smaller, stylized handwritten signature in black ink, written across the third and fourth columns of the grid.
