

OPPU-EST-ADJ-PEST-APDA-0703F-2022

NOTA NO. 1 14/MARZO/2022
CON ESTA FECHA SE ABRETIEN ESTE LIBRO DE BITACORA
PARA DAR SEGUIMIENTO A LOS TRABAJOS DEL SIGUIENTE
CONTRATO DE OBRA:

OPPU-EST-ADJ-PEST-APDA-0703F-2022.

OBJETO DE CONTRATO:

"LA SECRETARIA" ENCOMIENDA A "LA CONTRATISTA" LA EJECUCION DE
LOS TRABAJOS DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE EQUIPAMIENTO, LI-
NEA DE CONDUCCION Y ARRIVOS HIDRAULICOS EN LA LOCALIDAD
DE RANCHO VIEJO, SINDICATO DE SAN JAVIER, MUNICIPIO
DE BADIRAGUATO, ESTADO DE SINALOA.


MONTO DE CONTRATO: \$ 726,700.15 (INCL. IVA)
CONTRATISTA: DARRECO, S.A. DE C.V.

PAZO DE EJECUCION:

INICIO: 14 MARZO 2022

TERMINO: 22 ABRIL 2022.

LA SECRETARIA ASIGNA AL C. ING. MANO ENRIQUE ALONSO
GARCIA, MEDIANTE OFICIO NO. SOP-DIR-SOP-0441-A-
2022, COMO PRESIDENTE DE OBRA. A CONTINUACION SE
REGISTRA SU FIRMA:



LA CONTRATISTA ASIGNA COMO SUPERINTENDENTE DE OBRA
AL C. ING. FEDERICO DIAZ DIAZ, CON PODER AMPLO Y SU-
FICIENTE PARA DIRIGIR LOS TRABAJOS DEL PRESENTE
CONTRATO. A CONTINUACION SE REGISTRA SU FIRMA:

Federico Diaz

CONT-0703F-2022

NOTA NO. 2 13/marzo/2022


LA SECRETARIA PONE A DISPOSICION EL INMUEBLE DONDE SE EJECUTARAN LOS TRABAJOS, MEDIANTE OFICIO SOP-DIR-SOP-DI-0441-2022.



Fedena Díaz

NOTA NO. 3 14/marzo/2022.


NOTIFICA LA CONTRATISTA, QUE DADA INICIO A LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO, EN LA FECHA QUE SEA DEPOSITADO EL PAGO DEL ANTICIPO CORRESPONDIENTE.



Fedena Díaz

NOTA NO. 4 02/abril/2022.

NOTIFICA LA CONTRATISTA, QUE DA INICIO FORMAL DE LOS TRABAJOS OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO EN VIRTUD DE QUE CON ESTA FECHA LE FUE PAGADO EL ANTICIPO.



Fedena Díaz

NOTA NO. 5 8/ABR/2022

PARA ESTA FECHA SE TIENE EJECUTADA LA LIMPIEZA Y TUBERIA EN EL AREA DE TRABAJO SE HA COLOCADO EL 50% DE LA TUBERIA TO.TG. CED. 40 2" ϕ DIAM.

Federico Díaz

NOTA NO. 6 15/ABR/2022

PARA ESTA FECHA SE TIENE COLOCADA TODA LA TUBERIA GALVANIZADA DE 2" ϕ DIAM. CED. 40. INCL. COPLES, Codos, y PIEZAS ESPECIALES. LA CASETA DE OPERACION DE 1.95x0.80x2.00MTS ALTURA SE ENCUENTRA EN SU BASE FINAL.

Federico Díaz

NOTA NO. 7 22/ABR/2022.


PARA ESTA FECHA SE TIENE TERMINADA LA CASETA DE OPERACION, INCL. LA CONEXION ELECTRICA EL ARREGLO HIDRAULICO DEL POTE, COMO SON DOS VALVULAS COMPUESTAS TO.TG. 2" ϕ DIAM. UNA VALVULA CERRA TO.TG. 2" ϕ DIAM. y VALVULA ELIMINADORA DE AIRE 3" ϕ DIAM. MAS PIEZAS ESPECIALES PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.

Federico Díaz

NOTA NO. 8 30/ABR/2022.

PARA ESTA FECHA SE HA COLOCADO EL EQUIPO DE BOMBEO TIPO SUBMERSIBLE PARA UN GASTO DE 1.74 LPS. Y DEMAS ACCESORIOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.

TAMBIEN SE HA COLOCADO EL AMPLIFICADOR A TENSION PLENA PARA UN EQUIPO DE 3.00 HP.

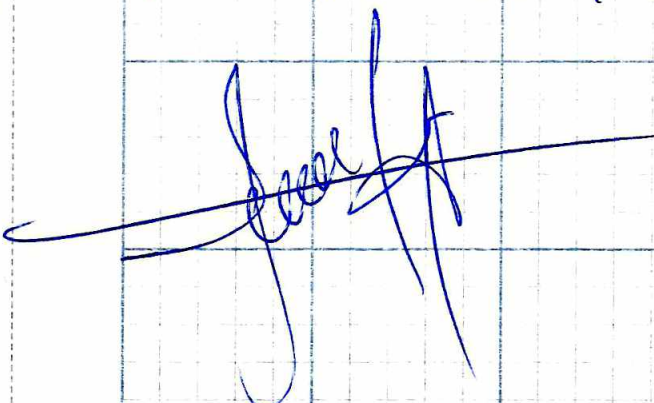


Federico Díaz

NOTA NO. 9 03/MAYO/2022.

CON ESTA FECHA SE AUTORIZA LA ESTIM. NUMERARIO NORMAL, CON UN PERIODO DE EJECUCION 02/ABR/2022 AL 30/ABR/2022, LA CUAL PRESENTA EL SIGUIENTE DESGLOSE:

IMPORTE TOTAL	\$ 604,828.23	INCL. IVA.
AMORT. ANTICIPO	\$ 21,689.88	
DEDOCC CONTRATO	\$ 15,642.11	
LIQUIDO A PAGAR	\$ 377,496.24	

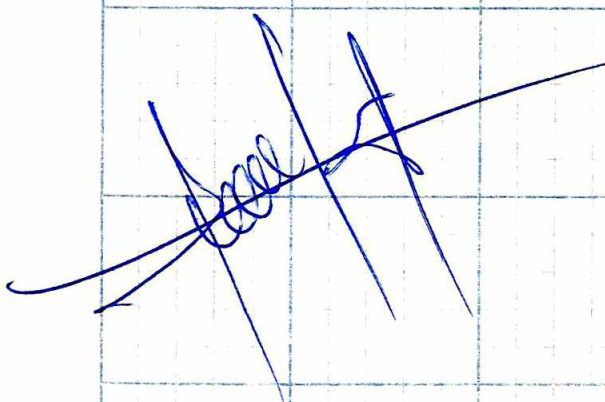

Federico Díaz

NOTA NO. 10 6/MAYO/2022.

PARA ESTA FECHA SE TIENE EJECUTADO EL COMINO DE ACCESO PARA LA COLOCACION DEL TINACO DE 10,000.00 LTS.

POR OTRA PARTE SE TIENE AUTORIZADO UN CONVENIO DE DIFERIMIENTO DE PLAZO NO. CONV-01-2022-D-0703F-2022. CON UN PERIODO 02/ABR/2022 AL 11/MAYO/2022.




Federico Díaz

NOTA NO. 11 11/MAYO/2022.

PARA ESTA FECHA SE TIENE COLOCADO Y CONECTADO EL TINACO DE 10,000.00 LTS. EJECUTADA LA LOSA DE CONCRETO DE 10 CMS. ESPESOR.

SE TIENE COLOCADA UN ARREGLO HIDRAULICO DE SALIDA DE TANQUE (FLAUTA) QUE INCLUYE 20 VALVULAS DE 1/2" ϕ DIAM.

ADEMAS SE HA PUESTO EN MARCHA EL EQUIPO Y YA PRESTA EL SERVICIO, OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO.



Federico Díaz

NOTA NO. 12 12/MAYO/2022.

CON ESTA FECHA SE AUTORIZA LA ESTIMACION NUMERO DOS TINIQUITO, CON UN PERIODO DE TERCERA DEL 01/MAYO/2022 AL 11/MAYO/2022, LA CUAL PRESENTA EL SIGUIENTE DESGLOSE:


IMPORTE TOTAL \$ 118,797.87

AMONT. ANTICIPA \$ 42,683.17

DEDUCC. CONTRATO \$ 3,072.36

LIQUIDO A PAGAR \$ 73,042.34.


SALDO A CANCELAR \$ 3,154.05



Federico Díaz

NOTA NO. 13 12/MAYO/2022.

CON ESTA FECHA SE CIERRA LA PRESENTE BITACORA, HABIENDOSE CUMPLIDO LOS OBJETIVOS DEL CONTRATO Y DEL PROYECTO, QUEDANDO EN OPERACION Y SERVICIO LOS EQUIPOS INSTALADOS.



Federico Díaz
