

BITÁCORA DE OBRA

FECHA 10 / JUN / 2022

Nº 1

EL DIA DE HOY VIERNES 10 DE JUNIO DEL 2022, SE ABERTURA LA BITACORA DE OBRA CORRESPONDIENTE A LOS TRABAJOS A REALIZAR EN EL INMUEBLE HOSPITAL DE LA MUJER, CULIACAN, SINALOA BAJO EL CONTRATO NUMERO SSS/SO/AD/006/2022 "CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE HOSPITAL DE LA MUJER, CULIACAN, SINALOA"; EL CUAL LO EJECUTARÁ EL CONTRATISTA: GRUPO ARIAS CONSTRUCTORES S.A. DE C.V.; ASIGNANDO A SU SUPERINTENDENTE: ING. GONZALO SANDOVAL YAÑEZ.


EL SUPERVISOR POR PARTE DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA ES LA ARQ. MARIA ESTHER MEDINA LOPEZ.

* MONTO DE CONTRATO CON IVA : \$ 687,515.10


* ANTICIPO CON IVA : \$ 279,131.14

LOS TRABAJOS CONSISTIRÁN EN:

- | | |
|-----------------------------|--------------------------|
| - PRELIMINARES | - AIRE ACONDICIONADO |
| - ALBAÑILERIAS | - INSTALACION ELECTRICA |
| - RECUBRIMIENTOS Y ACABADOS | - INSTALACION HIDRAULICA |
| - CANCELERIA | - VARIOS. |


SUPERINTENDENTE CONTRATISTA

ING. GONZALO SANDOVAL YAÑEZ


SUPERVISOR SSS

ARQ. MARIA ESTHER MEDINA L.


BITÁCORA DE OBRA

FECHA 13 / JUN / 2022

Nº 2


EL DIA DE HOY SE VISITÓ EL LUGAR DE LA OBRA CON EL SUPERINTENDENTE PARA ACLARAR DETALLES DE LOS CONCEPTOS ASÍ COMO EL PONERNOS DE ACUERDO CON EL PERSONAL QUE LABORA EN EL HOSPITAL PARA LLEVAR UNA LOGISTICA DE COMO LLEVAR A CABO LOS TRABAJOS.

SE ACORDÓ QUE SE EMPEZARÁ POR EL DESMONTAJE DE PAF-FOA DE TABUARROCA EN TERAPIA INTERMEDIA PARA UBICAR DONDE SE HARÁ LA DEMOLICION DE LOSA PARA PASO DE RUCO DE EXTRACCION.




SUPERINTENDENTE CONTRATISTA

ING. GONZALO SANDOVAL YAÑEZ.



SUPERVISOR SSS

ARQ. MARIA ESTHER MEDINA LOPEZ.

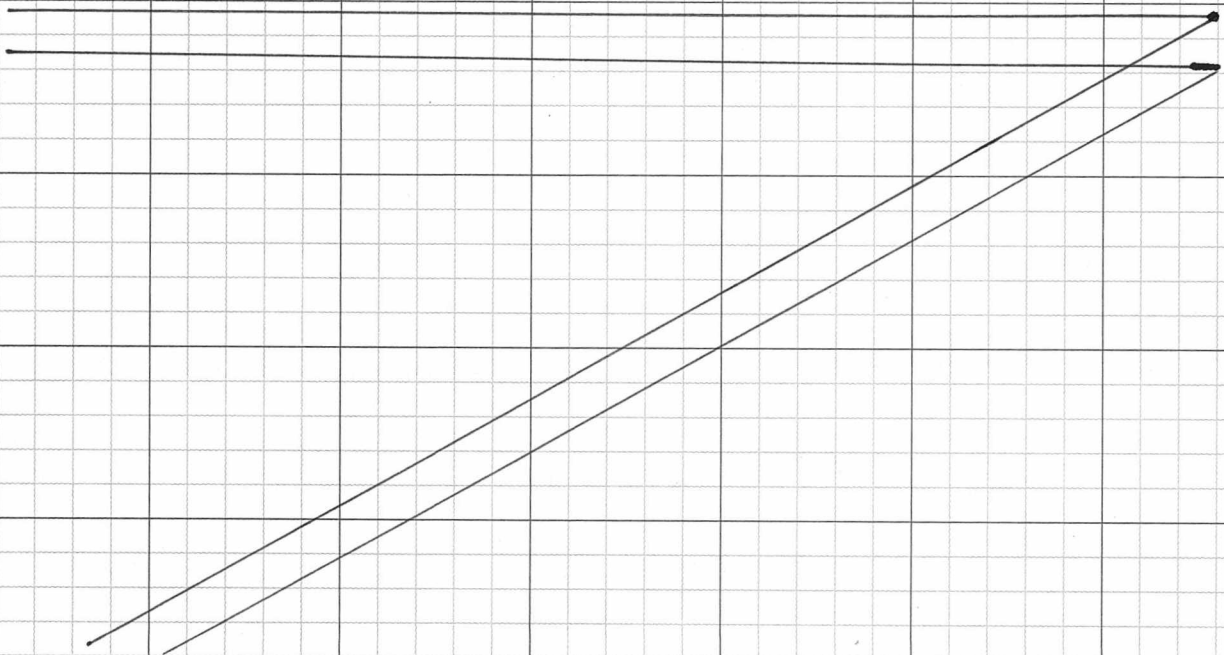


BITÁCORA DE OBRA

FECHA 20 / JUN / 2022

N° 3


SE VERIFICÓ QUE LA JALADERA TUBULAR FUERA LA QUE SE ESTÁ PIDIENDO EN CATALOGO DE CONCEPTOS PARA INSTALARLAS (10 JUEGOS DE JALADERAS); Y TAMBIEN SE CORROBORÓ COMO IBA A SER LA CANCELERIA QUE TRAEMOS (PUERTA Y FIJO) PARA QUE CONTRATISTA NO TENGA DUDA.

TAMBIEN SE DEFINIÓ EL MODELO Y COLOR DE DOSIFICADOR DE JABON LIQUIDO ASÍ COMO TAMBIEN LA UBICACION DE LOS LETREROS DE SEÑALIZACION.



SUPERINTENDENTE CONTRATISTA

ING. GONZALO SANDOVAL YÁÑEZ



SUPERVISOR SSS

ARR. MARIA ESTHER MEDINA LOPEZ

BITÁCORA DE OBRA


FECHA 1 / JUL / 2022

Nº 4


SE VERIFICÓ EL SIGUIENTE EQUIPO, QUE SEA LO QUE SE ESTÁ REQUIRIENDO:

- CONTROLADOR CENTRAL MARCA HONEYWELL, MODELO HZ311K
- DAMPER PARA FUJO DE AIRE MARCA HONEYWELL, MODELO ZD12X8TZ
- TERMOSTATO MARCA HONEYWELL
- SENSOR DE TEMPERATURA C7735A1000
- DAMPER REGULADOR DE PRESION MODELO CPRD8

TODOS LOS EQUIPOS SI CORRESPONDEN POR LO QUE SE LE DIÓ VISTO BUENO A CONTRATISTA PARA SU INSTALACION.


SUPERINTENDENTE CONTRATISTA

ING. GONZALO SANDOVAL YAÑEZ.


SUPERVISOR SSS

ARQ. MARIA ESTHER MEDINA LOPEZ.


BITÁCORA DE OBRA

FECHA 9 / JUL / 2022

N° 5


EL DIA DE HOY SABADO 9 DE JULIO DEL 2022, EL SUPERINTENDENTE, ING. GONZALO SANDOVAL ME HACE ENTREGA DE LOS TRABAJOS REALIZADOS, HICIMOS UN RECORRIDO POR LAS AREAS DONDE SE TRABAJÓ Y SI ES DE NUESTRA ENTERA SATISFACCION TANTO EN CALIDAD COMO EN CANTIDAD LA TERMINACION DE LOS MISMOS.

PROCEDEREMOS A DAR POR TERMINADO EL CONTRATO:
SSS/SO/AD/006/2022



SUPERINTENDENTE CONTRATISTA

ING. GONZALO SANDOVAL YAÑEZ



SUPERVISOR SSS

ARR. MARIA ESTHER MEDINA LOPEZ
