

CONT-3101B-2023.

NOTA NO. 1 01/FEB/2023

CON ESTA FECHA SE ABERTURA ESTE LIBRO DE
BITACORA PARA DAR SEGUIMIENTO A LOS TRABAJOS
DEL SIGUIENTE CONTRATO DE OBRA:
OPPU-EST-ADJ-PEST-INAD-3101B-2023

OBJETO DEL CONTRATO:

"LA SECRETARIA" ENCOMIENDA A "EL CONTRATISTA" LA
EJECUCION DE LOS TRABAJOS DE LA OBRA:
REHABILITACION DE CASA CONA DIF, UBICADA EN LA
CIUDAD DE COLIACAN ROSALES, MUNICIPIO DE COLIACAN
ESTADO DE SINALOA.


MONTO DEL CONTRATO: \$ 227,580.00 INCL. IVA.

CONTRATISTA: C. MIGUEL DIAZ CAMPOS.

PLAZO DE EJECUCION:

INICIO: 01/FEBRERO/2023
TERMINO: 20/FEBRERO/2023.

LA "SECRETARIA" ASIGNA AL C. ING. MANO ENRIQUE
ASTORGA YANEZ, MEDIANTE OFICIO NO. SOP-DIR-SUP-
0216-A-2023, COMO PRESIDENTE OBRA. A CONTI-
NUACION SE REGISTRA SU FIRMA:




CONTINUA NOTA NO. 2
SIGUIENTE HOJA.

CONTINUA NOTA NO. 1 01/FEB/2023.

LA CONTRATISTA ASIGNA COMO SUPERINTENDENTE DE OBRA AL C. ING. JOSE ALEJANDRO GONZALEZ GONZALEZ, CON PODER AMPLIO Y SUFICIENTE PARA DIRIGIR LOS TRABAJOS DEL PRESENTE CONTRATO. A CONTINUACIÓN SE REGISTRA SU FIRMA:

NOTA NO. 2 01/FEB/2023.

LA SECRETARIA PONE A DISPOSICIÓN DEL CONTRATISTA EL INMUEBLE SOBRE EL CUAL SE LLEVARAN A CABO LOS TRABAJOS RELATIVOS AL PRESENTE CONTRATO, MEDIANTE OFICIO NO. SOP-DIR-SOP-0216-DI-2023.

NOTA NO. 3 01/FEB/2023.

NOTIFICA EL CONTRATISTA QUE CON ESTA FECHA SE INICIARON LOS TRABAJOS OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO.

NOTA NO. 4 09/FEBRERO/2023.

PARA ESTA FECHA SE TIENE EFECTUADO LA DESINSTALACION DEL HIDRONEUMATICO EN MAL ESTADO, CONTE DE ARBOL TIPO GUINCHIL, DE COLOCACIONES TUBERIA CPVC 25mm PARA HIDRONEUMATICO.


NOTA NO. 5 16/FEBRERO/2023.

PARA ESTA FECHA SE TIENE COLOCADO EL HIDRONEUMATICO DE 130 LTS. CON BOMBA DE $3/4$ H.P., ASI COMO TAMBIEN UN CALENTADOR DE AGUA TIPO INDUSTRIAL 100-83 CX DE 360 LTS.

NOTA NO. 6 20/FEBRERO/2023.

PARA ESTA FECHA SE TIENEN COLOCADAS LAS 6 LAMPARAS DE TRES TIPO, SEGUN PROYECTO, ASI COMO TRES FOTOCELDAS.


SE TIENE TERMINADA LA CANALIZACION DE TUBO CONDUIT PVC $\frac{1}{2}$ " ϕ Y TUBO GALVANIZADO $\frac{1}{2}$ " ϕ CON SU RESPECTIVO CABLEADO.

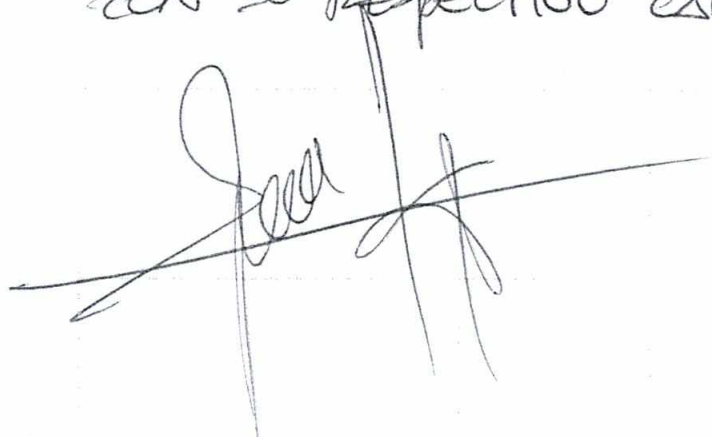


NOTA NO. 7 21/FEB/2023.

CON ESTA FECHA SE AUTORIZA LA ESTIMACION NUMERO NORMAL FINALIZADO, CON UN PERIODO DE EFECTIVIDAD DEL 01/FEB/2023 AL 20/FEB 2023, LA CUAL PRESENTA EL SIGUIENTE RES GLOSAS:

Importe total	\$	227,580.11
AMORT. ANTICIPO	\$	0.00
DEUCC. CONTRATO	\$	5,885.69
Liquid a pagar	\$	221,694.42



NOTA NO. 8 21/FEB/2023 CONT-3101B-2023
CON ESTA FECHA SE CIERRA LA PRESENTE
BITACORA EN VIRTUD DE HABER COMPLEDO
CON LAS METAS DE CONTRATO.

A large, stylized handwritten signature in black ink, appearing to be a cursive representation of a name, possibly 'Jorge'.A smaller, stylized handwritten signature in black ink, appearing to be a cursive representation of a name, possibly 'Jorge'.
