

BITÁCORA DE OBRA

DATOS DE LA OBRA

DELEGACIÓN _____ FOLIO No. _____
ALINEAMIENTO No. _____ FECHA _____
LICENCIA No. _____ FECHA _____
VIGENCIA DE _____ A _____
REGISTRO CATASTRAL _____ FECHA _____

I.M.S.S.

REGISTRO PATRONAL _____
REGISTRO DE OBRA _____

UBICACION

CALLE _____ No. OFICIAL _____
COLONIA _____ SECTOR _____

DATOS DEL PROPIETARIO

NOMBRE COMISION DE VIVIENDA DEL EDO. DE SINALOA 667-714-42-40
CALLE AV. INSURGENTES SUR No. 198
COLONIA CENTRO SINALOA SECTOR _____

DATOS DEL PERITO

NOMBRE _____ TEL. _____
CALLE _____ No. _____
REG. No. _____ FIRMA _____

REGISTRO DE FIRMAS

COORDINACION

ARQ. YONATHAN LOYA FLORES
DIRECTOR DE PLANEACION Y PROYECTOS



COORDINACION

ARQ. JESÚS HUMBERTO VERUGO HERNÁNDEZ
SUPERVISOR DE OBRA



CONTRATISTAS

COMERCIALIZADORA Y SOLUCIONES MICHON S.A. DE C.V.
LIC. ALFREDO MILLAN CONTRERAS
REPRESENTANTE LEGAL



Vo. Bo. COORDINACION


Vo. Bo. SUPERVISION

Vo. Bo. PATRON

NOTA #1

22/09/2025

CON ESTA NOTA SE ABRENTURA LA PRESENTE BITACORA DE OBRA PARA
ASENTAR LOS EVENTOS IMPORTANTES QUE SE EJECUTEN EN EL
DESARROLLO DEL CONTRATO: CV-DS-CO-PTXT24-002/2025
CELEBRADO ENTRE EL CONTRATANTE, COMISION DE VIVIENDA DEL
ESTADO DE SINALOA Y LA EMPRESA COMERCIALIZADORA Y SOLUCIONES
MICON S.A. DE C.V. CONSISTENTE EN LA EJECUCION DE 23
(VEINTITRES) ACCIONES DE MEJORAMIENTO DE UNIDADES
HABITACIONALES (TECHO FIRME DE CONCRETO-TECHO METALICO)
ELCOTA (06 ACC.), MPCORITO (01 ACC.), EVASAVE (01 ACC.)
CULIACAN (12 ACC.), ELDORADO (01 ACC.), BAHUATAGUATO
(01 ACC.), NAVIATO (01 ACC.), EN VARIAS LOCALIDADES DE
ESTOS MUNICIPIOS.



ARQ. JESÚS HUMBERTO VERDUGO H.
SUPERVISOR DE OBRA
(CVIVE)




ING. ROBERTO ARIAS TORRES
SUPERVISOR DE OBRA
COMERCIALIZADORA Y SOLUCIONES MICON
S.A. DE C.V.

NOTA #2

07/10/2025

CON ESTA FECHA SE INICIAN LOS TRABAJOS DE COLOCACIÓN DE PLACAS DE ACERO Y PUNTA MONTEN EN EL DOMICILIO:

(16).- WENCESLAO NUÑEZ FRAGOZA (NUEVO CENTRO DE POBLACIÓN CULIACÁN, SINALOA)




NOTA #3

08/10/2025

SE REALIZARON LOS TRABAJOS DE TRALO, NIVELACIÓN, RELLENO, COMPACTACIÓN Y COLADO DE PISO FIRME DE CONCRETO, SEMIPULIDO DE 10 CM DE ESPESOR, CON MALLA ELECTROSOLDADA 6X6-10/10 DE REFUERZO Y CUBADO CON CONCRETO F'c = 200 KG/CM² EN CASA DEL BENEFICIARIO:

(19).- MICHEL MANSE SANCHEZ (LOC. EL OIER, CULIACÁN, SINALOA)



NOTA #4


13/10/2025

SE LLEVARON A CABO LOS TRABAJOS CORRESPONDIENTES A COLOCACIÓN DE PLACAS Y MONTAJE DE PUNTES DE ACERO EN LOS DOMICILIOS DE LOS SIG. BENEFICIARIOS:

(17).- ROSARIO SOTO MEZA

(22).- NORA CELENE MECHENDREZ L.

} LOC. BACHIVALTITO, CULIACÁN, SINALOA



NOTA #5

15/10/2025

SE TRABAJÓ EN ACTIVIDADES DE ENRASES Y ARMAZO Y COLADO DE CASTILLOS, EN EL DOMICILIO DEL BENEFICIARIO:

(14).- JESUS ANTONIO LOPEZ ROBLES (Loc. LAS ARENITAS, EL DORADO, SIH.)

NOTA #6

15/10/2025

SE CERRARON A CABO LOS TRABAJOS DE MONTAJE DE TECHUMBRE METALICA A BASE DE PERCHIN DE 4" Y LAMINA GALVANIZADA CAL. 26 EN EL SIG. DOMICILIO:

(16).- WENCESLAO NUÑEZ FRAGATA (NUEVO CENTRO DE POBACION CULIACAN, SIH.)

NOTA #7.

18/10/2025

SE TRABAJÓ EN LA INSTALACION Y MONTAJE DE TECHUMBRE METALICA A BASE DE PERCHIN DE 4" Y LAMINA GALVANIZADA CAL. 26 EN CASA DE LOS BENEFICIARIOS:

(17).- ROSARIO SOTO MEZA

(22).- NORA CECENHE MECENDREZ L.

} Loc. BACH/KUALATITO, CULIACAN
SIH.

NOTA #8

20/10/2025

SE OBSERVA EL CIMBRADO DE LOSA DE AZOTEA Y EN PROCESO DE ARMADO CON ACERO DE REFUERZO SEGUN INDICA PROYECTO Y A LA PAR SE INSTALAN MANGUERAS Y CAJAS DE SALIDA PARA LA INST. ELECTRICA, EN EL DOMICILIO DE:

(14).- JESUS ANTONIO LOPEZ ROBLES (LOC. LAS ARENITAS, EL DORADO, SIN.)

NOTA #9

21/10/2025

SE REALIZO TRABAJO DE COCADO DE LOSA MACIZA DE 10CM DE ESPESOR ARMADA CON VAR. 3/8" @ 20 CM EN AMBOS SENTIDOS, REFORZADA CON BASTONES DE 3/8" Y CONCRETO FIC = 200 KG/CM² EN CASA DE BENEFICIARIO:

(14).- JESUS ANTONIO LOPEZ ROBLES (LOC. LAS ARENITAS, EL DORADO, SIN.)

NOTA #10

22/10/2025

SE OBSERVARON FINALIZADOS LOS TRABAJOS DE CULANTAMIENTO DE EMPASES Y COCADO DE CASTILLOS EN LOS SIG. DOMICILIOS:

(10).- SUJEY ADRIANA VARELA Z. (COL. 22 DE DIC.)

(11).- MARIA DOLORES FELIX T. (COL. IND. PALMITO)

(12).- ROSA CELYA ROJAS (COL. ATAPL. L. CARDENAS)

} CUICACAN/
SINALOA


NOTA #11

23/10/2025

SE CANCELA APOYO DESTINADO A:

(18).- ZAIDA APOLINAR VILALBA (COL. LOTA BICENTENARIO CULIACAN, SIN.)

POR MOTIVO DE QUE LA SEÑORA YA HABIA RECIBIDO UN APOYO DE RECAMARA CON BAÑO POR PARTE DEL AYUNTAMIENTO DE CULIACAN Y NO HABIA INFORMADO A LA COMISION DE VIVIENDA.




NOTA #12

24/10/2025

SE REALIZARON TRABAJOS DE INSTALACION Y MONTAJE DE TECHUMBRE METALICA A BASE DE POLIN DE 4" Y LAMINA GALVANIZADA CAL. 26 EN CASA DE:

(19).- MARIA DOLORES FELIX TORRES (COL. IND. PALMITO, CULIACAN SINALOA)




NOTA #13

25/10/2025

SE REALIZARON LOS TRABAJOS CORRESPONDIENTES A EMPASES Y ARMADO Y COLADO DE CASTILLOS EN DOMICILIO DE:

(23).- SILVIA OJEDA AISPURO (COL. BICENTENARIO, CULIACAN, SIN.)



NOTA #14

28/10/2025

SE OBSERVARON FINIQUITADOS LOS TRABAJOS DE INSTALACION ELECTRICA, CON SUS RESPECTIVOS ACCESARIOS, ASI COMO TAMBIEN LAS LABORES DE LIMPIEZA EN LOS DOMICILIOS DE:

- (11)- MARIA DIORES FELIX TORRES (COL. IND. PALMITO, CULIACAN, SIN.)
- (16)- WENCESLAO NUÑEZ FRAGOLA (COL. NUEVO CENTRO, CULIACAN, SIN.)
- (17)- ROSARIO SOTO MATEA
- (22)- XARA CELENNE MELENDEZ L. } (COL. BACHIGUALITO, CULIACAN, SIN.)

NOTA #15

29/10/2025

SE TRABAJÓ EN ARMADO DE DALA PERIMETRAL CON ARMEX 12X20-4 Y CUBA CON CONCRETO $F'C = 200 \text{ KG/CM}^2$, INCLUYE CUBRA, Y VIBRADO EN EL DOMICILIO DE:

- (21)- ZEFERINO CARDENAS RIVAS (COL. BENTENARIO, CULIACAN SINALOA)

NOTA #16

30/10/2025

SE REALIZÓ EL CUBRADO EN CASA DE AZOTEA Y SU RESPECTIVO ARMADO CON ACERO DE REFUERZO SEGUN PROYECTO, COLOCANDOSE MANIGUERAS Y Cajas DE SALIDA DE INST. ELECTRICA, EN CASA DE:

- (10)- SUJEY ADRIANA UREA ZARVETA (COL. 22 DE DIC. CULIACAN, SIN.).

NOTA #17

31/10/2025

SE LLEVABON A CABO LOS TRABAJOS DE MONTAJE DE TECHUMBRE METALICA A BASE DE DOLLY DE 4" Y LAMINA GALVANIZADA CAL. 26 EN EL DOMICILIO DE:

(21)- ZEFERINO CARDENAS RIVAS (COL. BICENTENARIO CULIACAN, SIN.).

NOTA #18

01/11/2025

SE FINIQUITO COLADO DE CLOSA MACIZA DE 10 CM DE ESPESOR, ARMADA CON VAR. 3/8" @ 20 CM EN AMBOS SENTIDOS, CON BASTONES DE 3/8" Y CON 4 VAR. 3/8" COMO REFUERZO EN PARTE CENTRAL, COLADA CON CONCRETO F'c = 200 KG/CM², EN DOMICILIO DE:

(10)- SUJEY ADOVANA VARELA ZARATEA (COL. 22 DE DICIEMBRE CULIACAN, SIN.).

NOTA #19

03/11/2025

EN SUSTITUCION DE LA CANCELACION DEL BENEFICIARIO #18 (NOTA 11) SE AGREGAN AL CONTRATO 2 BENEFICIARIOS MAS, CUIDANDO DE NO SOBREPASAR EL PUNTO DEL CONTRATO ORIGINAL, LOS BENEFICIARIOS AGREGADOS SON:

(18)- ROSALINA PARDO CRUZ (13.55 M²) TECHO DE CONCRETO Loc. LIMON DE LOS RAMOS, CULIACAN, SIN.


(24)- LUZ DEL ALBA VALENZUELA QUINTERO (18.06 M²) TECHO DE CONCRETO COL. LOMA DE RODRIGUEZ, CULIACAN, SIN.

NOTA #20

SE REALIZARON LOS TRABAJOS DE LEVANTAMIENTO DE ENRASES Y COLADO DE CASTILLOS EN CASA DE:

03/11/2025

(15) - MARTINA GUADALUPE MEDINA SANCHEZ (COL. EL CASTILLO NAVOLATO, SIN.)





NOTA #21

03/11/2025

SE CONCLUYERON TRABAJOS DE CIMBRA EN LOSA DE AZOTEA, Y TAMBIEN EL ARMADO CON ACERO DE REFUERZO SEGUN INDICA PROYECTO, A LA PAR SE INSTALARON MANGUERAS Y CAJAS DE SALIDA PARA INST. ELECTRICA EN LOS SIGS. DOMICILIOS:

(12) ROSA CELYA ROJAS (COL. AMPL. L. CARDENAS, CUIACAN, SIN.)
 (20) ANDRES MONARREZ LOPEZ (COL. BICENTENARIO,
 (23) SILVIA OJEDA AISQURO } CUIACAN, SIN.)





NOTA #22

04/11/2025

SE TRABAJÓ EN EL COLADO DE LOSA MACIZA DE 10 CM DE ESPESOR ARMADA CON VAR. $3/8"$ @ 20 CM EN AMBOS SENTIDOS, REFORZADA CON BASTONES DE $3/8"$ Y COLADA CON CONCRETO $F'c = 200 \text{ KG/CM}^2$ EN DOMICILIO DE:

(12) ROSA CELYA ROJAS (COL. AMPL. L. CARDENAS, CUIACAN, SIN.)




NOTA #23

05/11/2025

CON ESTA FECHA SE RECIBE DEL CONTRATISTA PARA SU REVISIÓN Y TRAMITE, LA ESTIMACIÓN OT NORMAL, CON PERIODO DE EJECUCIÓN DEL 22/07/2025 AL 05/11/2025, POR UN IMPORTE DE \$477,964.88 MAS IVA MENOS DEDUCCIONES (35% AMORTILACION Y 3% FISCALIZACION) POR UN VALOR DE \$208,392.69, CON UN LIQUIDO A PAGAR DE \$346,046.57. A LA FECHA EL AVANCE DE OBRA ES DEL 35.94%.





NOTA #24

06/11/2025

SE CLEVARON X CABO LABORES DE INSTALACION ELECTRICA, INCLUIDOS ACCESORIOS, TAMBIEN SE TRABAJO EN LA LIMPIEZA EN EL DOMICILIO DE:

(21). ZEFERINO CARDENAS RIVAS (COL. BICENTENARIO, CULIACAN, SIN.)




NOTA # 25

07/11/2025

SE FINIENDO COLADO DE LOSA MACIZA DE 10 CM DE ESPESOR ARMADA CON VAR $3/8"$ @ 20 CM EN AMBOS SENTIDOS, REFORZADA CON BASTONES $3/8"$, Y COLADA CON CONCRETO $F'c = 200 \text{ KG}/\text{CM}^2$ CON VIBRADO INCLUIDO, EN LOS DOMICILIOS DE:

(20). ANDRES MONARREZ LOPEZ } (COL. BICENTENARIO, CULIACAN,
(23). SILVIA OJEDA AISPURO } SINALOA



NOTA # 26

08/11/2025

SE TRABAJO EN LEVANTAMIENTO DE ENRASES Y ARMADO Y COLADO DE CASTILLOS EN EL DOMICILIO DE:

(9). JUAN MARTIN OROÑEZ RODRIGUEZ (COL. LOS PINOS, CULIACAN, SIN.).





NOTA # 27

10/11/2025

SE TRABAJO EN LABORES DE MONTAJE DE TECHUMBRE METALICA A BASE DE PLIN CAJON DE 4", CON CUBIERTA DE LAMINA GALVA-NIZADA CAL. 26, EN EL DOMICILIO DE:

(15). MARTINA GUADALUPE MEDINA SANCHEZ (COL. EL CASTILLO, XAVOLADO, SIN.).



NOTA #28

10/11/2025

SE TRABAJÓ EN IMPERMEABILIZACIÓN DE LOSA DE AZOTEA, CON IMPERMEABILIZANTE ELASTOMÉRICO COLOR BLANCO A 2 MANOS, INCLUIDO USO DE MEMBRANA DE REFORZO EN LOS DOMICILIOS DE:

- (10)- SUJEY ADRIANA URRUTIA Z. (COL. 22 DE DIC. CULIACAN, SIN.)
- (12)- ROSA CRYVA ROJAS (COL. AMPL. L. CARDENAS, CULIACAN, SIN.)
- (14)- JESUS ANTONIO LOPEZ R. (LOC. LAS ARENITAS, EL DORADO, SIN.)

NOTA #29

11/11/2025

SE TRABAJÓ EN EL CIMENTADO DE LOSA DE AZOTEA, ARMADA CON ACERO DE REFORZO SEGUN PROYECTO, TAMBIEN SE COLOCARON MANGUERA Y SALIDAS (CANAS) PARA INST. ELÉCTRICA EN CASA DE:

- (9)- JUAN MARTIN ORDOÑEZ RODRIGUEZ (COL. LOS PINOS, CULIACAN, SIN.)

NOTA #30

12/11/2025

SE FINALIZÓ COCADO DE LOSA MACIZA DE 10 CM. DE ESPESOR, ARMADA CON VAR. 3/8" @ 20 CM EN AMBOS SENTIDOS, CON BASTONES DE REFORZO DE 3/8", COCADA CON CONCRETO $f'c = 200 \text{ Kg/cm}^2$ EN:

- (9)- JUAN MARTIN ORDOÑEZ RODRIGUEZ (COL. LOS PINOS, CULIACAN, SIN.)

NOTA #31

13/11/2025

SE REALIZARON TRABAJOS DE APLANADO CON YESO, EN PLATONES / INTERIORES EN LOS SIG. DOMICILIOS:

- (10)- SUJEY ADRIANA URRUTIA Z. (COL. 22 DE DIC. CULIACAN, SIN.)
- (14)- JESUS ANTONIO LOPEZ ROBLES (LOC. LAS ARENITAS, EL DORADO, SIN.)

NOTA #32

13/11/2025

SE FINALIZARON LOS TRABAJOS DE INST. ELÉCTRICA, CON ACCESORIOS INCLUIDOS, ASÍ COMO TAMBIÉN LAS LABORES DE LIMPIEZA EN:

- (10)- SUJEY AORMAHU URREA Z. (COL. 22 DE DICIEMBRE, CULIACÁN, SINALOA)
- (14)- JESUS ANTONIO LOPEZ ROBLES (COL. LAS ARENITAS, EL DORADO, SINALOA)
- (15)- MARTINA GUADALUPE MEDINA S. (COL. EL CASTILLO, NAVOLATO, SINALOA)

NOTA #33

13/11/2025

SE OBSERVARON LOS TRABAJOS DE LEVANTAMIENTO DE EMBASES, ARMADO Y COLADO DE CASTILLOS DE CONCRETO EN LOS DOMICILIOS DE:

- (18)- ROSALINA PARDO CRUZ (LOC. LIMÓN DE RAMOS, CULIACÁN, SINALOA)
- (24)- LUZ DEL ALBA VALENZUELA R. (COL. LOMA DE RODRIGUEZ, CULIACÁN, SINALOA)

NOTA #34

14/11/2025

SE LABORÓ EN IMPERMEABILIZACIÓN DE LOSA DE AZOTEA, USANDO IMPERMEABILIZANTE ELASTOMÉRICO COLOR BLANCO A 2 CAPAS, CON MEMBRANA DE REFUERZO INCLUIDA, EN CASA DE:

- (20)- ANDRÉS MONARREZ LOPEZ } (COL. BICENTENARIO, CULIACÁN, SINALOA)
- (23)- SILVIA OJEDA AISPURO }

NOTA #35

17/11/2025

SE OBSERVARON LOS TRABAJOS DE YESO, EN PLATONES INTERIORES, INST. ELÉCTRICA, Y SUS ACCESORIOS, ASÍ COMO LAS LIMPIEZAS DE LAS ÁREAS, EN LOS DOMICILIOS DE:

- (20)- ANDRÉS MONARREZ LOPEZ } (COL. BICENTENARIO, CULIACÁN, SINALOA)
- (23)- SILVIA OJEDA AISPURO }

NOTA #36

18/11/2025

SE OBSERVARON TRABAJOS DE CIMENTADO DE LOSA DE AZOTEA, ARMADA CON ACERO DE REFUERZO SEGUN PROYECTO; TAMBIEN SE COLGARON MANGUERAS Y CAJAS DE SALIDA PARA INST. ELECTRICA EN:


- (18) - ROSALINA PARDO CRUZ (LOC. LIMON DE RAMOS, CULIACAN, SINALOA)
 (19) - LUZ DEL ALBA VALENZUELA D. (COL. LOMA DE RODRIGUEZ, CULIACAN, SINALOA)




NOTA #37

18/11/2025

CON FECHA DE HOY, SE RECIBE DEL CONTRATISTA, PARA SUPERVISION Y TRAMITE, LA ESTIMACION 02 NORMAL, CON PERIODO DE EJECUCION DEL 06/11/2025 AL 18/11/2025, POR UN IMPORTE DE \$337,012.34 MAS IVA, MENOS DEDUCCIONES (35% AMORTIZACION Y 3% FISCALIZACION) POR UN VALOR DE \$146,937.38, Y CON UN LIQUIDO A PAGAR DE \$243,926.93. EL AVANCE DE OBRA A LA FECHA ES DEL 56.88%.






NOTA #38

20/11/2025

SE TRABAJO EN COLADO DE LOSA MACIZA DE 10 CM. DE ESPESOR, ARMADO CON VAR 3/8" @ 20 CM. EN AMBOS SENTIDOS, CON BASTONES DE REFUERZO DE 3/8" Y COLADA CON CONCRETO $f'c = 200 \text{ Kg/cm}^2$ EN CASA DE:

- (20) - LUZ DEL ALBA VALENZUELA D. (COL. LOMA DE RODRIGUEZ, CULIACAN, SINALOA)

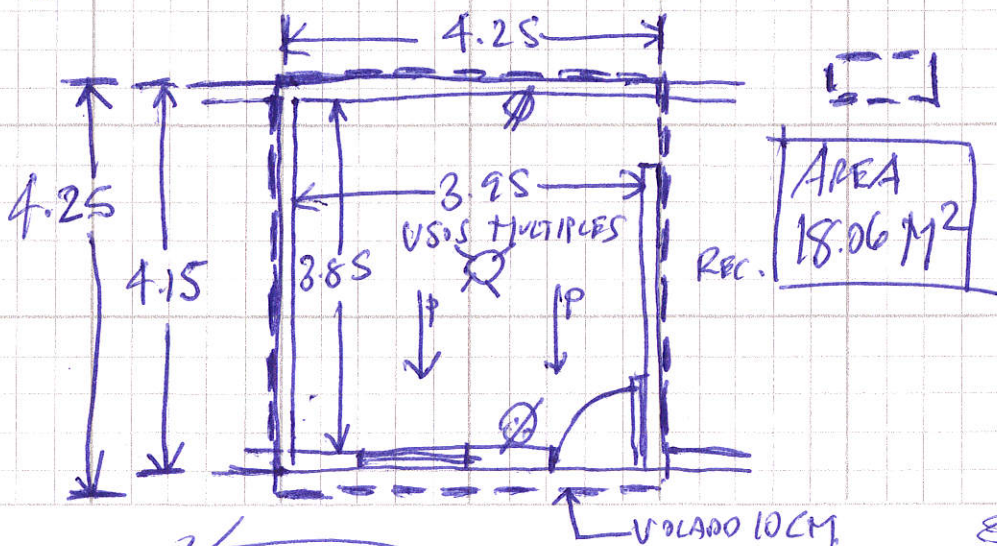



Nota #39

21/11/2025

SE REALIZARON TRABAJOS DE DEMOLICION DE LOSA DE CONCRETO, INCLUYE ACOPIO, Y RETIRO DE MATERIAL, EN DOMICILIO DE:

(2)- GABINO CASTAÑEDA (LOC. EL SALADO, ELOTA, SIN.)

[Signature]

[Signature]

Nota #40

21/11/2025

SE TRABAJO EN IMPERMEABILIZACION DE LOSA DE AZOTEA, CON IMPERMEABILIZANTE ELASTOMERICO COLOR BLANCO A 2 CAPAS, INCLUYE MEMBRANA DE REFUERZO, EN CASA DE:

(1)- JUAN MARTIN PRODRON R. (COL. LOS PINOS, CULIACAN, SIN.)

[Signature]


[Signature]

Nota #41

24/11/2025

SE FINIQUITO COCADO DE LOSA MACIZA DE 10 CM DE ESPESOR, ARMADA CON VAR. 3/8" @ 20 CM EN AMBOS SENTIDOS, REFORZADA CON BASTONES DE VAR. 3/8" Y COLADA CON CONCRETO $f'c = 200 \text{ Kg/cm}^2$, CON VIBRADO DE CONCRETO INCLUIDO EN EL DOMICILIO DE:

(8)- ROSALINA PARDO CRUZ (LOC. LIMON DE RAMOS, CULIACAN, SIN.)

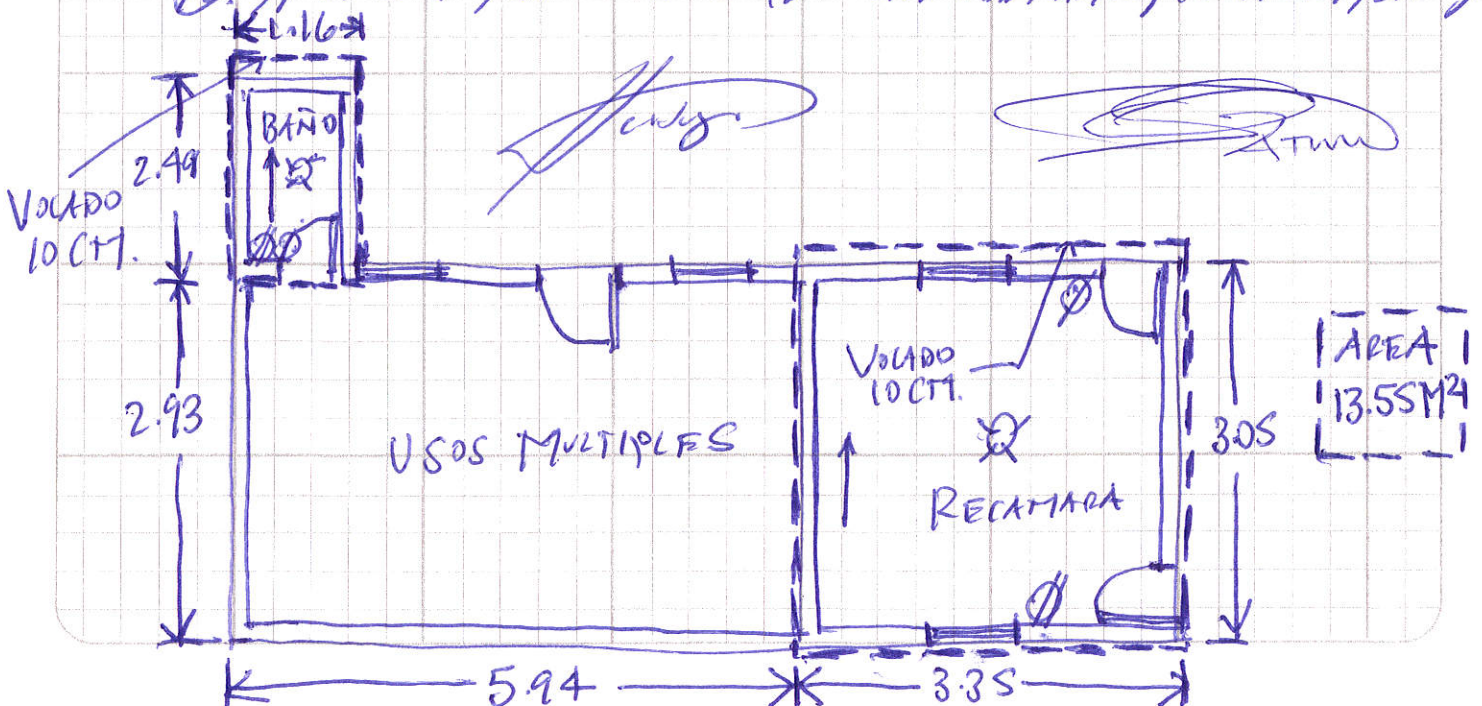



NOTA # 42

25/11/2025

SE LABORO EN LEVANTAMIENTO DE ENRASES Y EN EL ARMADO Y COLADO DE CASTILLOS DE CONCRETO, EN CASA DE:

(2)- GABINO CASTAÑEDA (LOC. EL SALADO, ELOTA, SIN.)







NOTA # 43

25/11/2025

SE TRABAJO EN APLANADOS DE YESO EN PLATONES INTERIORES, TAMBIEN EN LA INST. ELECTRICA, Y ACCESORIOS ELECTRICOS, ASÍ COMO LAS LABORES DE LIMPIEZA DE LAS AREAS, EN CASA DE:

(1)- JUAN MARTIN ORDÓÑEZ R. (LOC. LOS PINOS, CULIACÁN, SIN.)
(12)- ROSA CEYNA ROJAS (LOC. ATPL L. ARDENAS, CULIACÁN, SIN.)







NOTA # 44

26/11/2025

SE REALIZARON LABORES DE DEMOLICIÓN DE COSAS DE CONCRETO, INCLUYENDO ALCIDO Y ACARreo DE MATERIAL, EN LAS CASAS DE:

(1)- MA. DOLORES BERNAL C. (LOC. EL SALADO, ELOTA, SIN.)
(11)- REYNA HERNÁNDEZ A.
(13)- ROSA MELINDA BELTRÁN L. (LOC. BADIAGUATO, BADIAGUATO, SIN.)






NOTA # 45

27/11/2025

SE OBSERVÓ EL CIMBRADO DE LOSA DE ACOTEA, CON ARMADO DE ACERO DE REFUERZO ALICORDE A PROYECTO, SE COLOCARON MANGUERAS Y CAJAS DE SALIDA PARA INST. ELECTRICA EN DOMICILIOS DE:

(2)- GABINO CASTAÑEDA (LOC. EL SALADO, ELOTA, SIN.)
(13)- ROSA MELINDA BELTRÁN L. (BADIAGUATO, BADIAGUATO, SIN.)





NOTA #46

28/11/2025

SE FINALIZÓ COCADO DE LOSA MACIZA DE 10 CM DE ESPESOR, ARMADA CON VAR. $3/8"$ @ 20 CM EN AMBOS SENTIDOS, CON BASTONES DE $3/8"$ Y CON 4 VAR $3/8"$ COMO REVERZO CENTRAL COCADO CON CONCRETO $F'c = 200 \text{ Kg/cm}^2$, EN CASA DE:

(2)- GABRILO CASTAÑEDA (LOC. EL SALADO, ELOTA, SIN.)

[Signature]


[Signature]

NOTA # 47

01/12/2025

SE TRABAJÓ EN COCADO DE LOSA MACIZA DE 10 CM DE ESPESOR, ARMADA CON VAR $3/8"$ @ 20 CM EN AMBOS SENTIDOS, REFORZADA CON BASTONES DE $3/8"$, Y CON 4 VAR $3/8"$ AL CENTRO, COCADA CON CONCRETO $F'c = 200 \text{ Kg/cm}^2$, EN EL DOMICILIO DE:

(3)- ROSA MACIDA BELTRAN L. (BADIRAGUATO, BADIRAGUATO, SIN.)

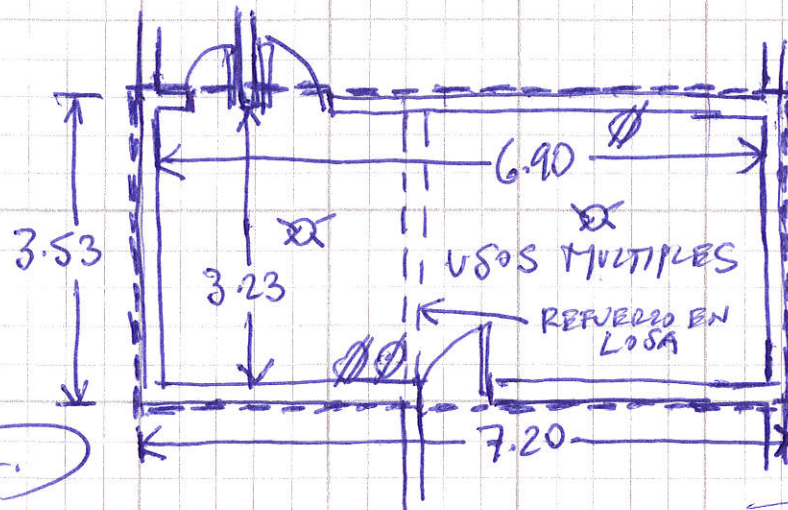

AREA
25.42 M²

[Signature]

[Signature]

NOTA # 48.

01/12/2025

SE LABORÓ EN LEVANTAMIENTO DE ENRISES, ARMADO DE COCADO DE CASTILLOS Y DALAS DE CERRAMIENTO DE CONCRETO EN CASA DE:

(2)- GLADIS JUDITH PARENTE N. (LOC. EL SALADO, ELOTA, SIN.)

[Signature]

[Signature]

NOTA #49

02/12/2025

SE TRABAJÓ EN IMPERMEABILIZACIÓN DE LOSA DE AZOTEA, CON IMPERMEABILIZANTE ELASTOMÉRICO COLOR BLANCO A 2 CAPAS, CON MEMBRANA DE REFORZO INCLUIDA, EN DOMICILIO DE:

- (18) - ROSALINA PARDO, CRUZ (LOC. LIMÓN DE RAYOS, CUICACÁN, SIN.)
 (29) - LUZ DEL ALBA VACAMZUECA Q. (COL. LOMA DE RODRIGUEZ, CLAY. SINALOA)

NOTA #50

02/12/2025

SE REALIZARON LABORES DE LEVANTAMIENTO DE EMPASES Y ARMADO Y COCADO DE CASTILLOS DE CONCRETO, EN CASA DE:

- (1) - MA. DOLORES BERNAL C. } (LOC. EL SALADO, ELOTA SINALOA)
 (3) - JUDITH CADELLARIA CARRASCO C. }
 (5) - MA. DEL CARMEN HERRERA A.
 (6) - MA. GUADALUPE JUAREZ M. (LOC. LAS JUNTAS, MOCORITO, SIN.)

NOTA #51

03/12/2025

SE OBSERVÓ LA CIMENTACIÓN DE LOSA DE AZOTEA, CON ARMADO DE ACERO DE REFORZO COMO INDICA PROYECTO, TAMBIÉN SE COLOCARON MANIGUERAS Y CAJAS DE SALIDA DE INST. ELÉCTRICA EN CASA DE:

- (6) - GLADIS JUDITH PARENTI NAVA (LOC. EL SALADO, ELOTA, SIN.)

NOTA #52

04/12/2025

SE LABORÓ EN COCADO DE LOSA MACIZA DE 10 CM DE ESPESOR, ARMADA CON VAR. 3/8" @ 20 CM EN AMBOS SENTIDOS, CON BASTONES DE REFORZO DE 3/8", Y COLADA CON CONCRETO $F'c = 200 \text{ Kg/cm}^2$ EN CASA DE:

- (6) - GLADIS JUDITH PARENTI NAVA (LOC. EL SALADO, ELOTA, SIN.)

NOTA # 53

05/12/2025

SE TRABAJÓ EN APUNTAOS DE YESO EN PLATONES INTERIORES, TAMBIEN EN LA INST. ELECTRICA Y SUS ACCESORIOS, AL FINAL SE REALIZARON LAS LABORES DE LIMPIEZA DE AREAS EN CASA DE:

- (18)- ROSALINA PARDO CRUZ (Loc. LIMON DE RAMOS, CULIACAN, SIN.)
 (24)- LUZ DEL ALBA VALENZUELA Q. (Col. LOMA DE RODRIGUEZ, CULIACAN SIN.)

NOTA # 54

05/12/2025

SE FINALIZÓ EL CUBRADO DE LOSA DE AJOTEA, CON ARMADO DE ACERO DE REFORZO CONFORME A PROYECTO, INCLUYENDO LA COLOCACION DE MANIGUERAS Y CAJAS DE SALIDA PARA INST. ELECTRICA EN CASA DE:

- (3)- J. CANDENCIA CARRASCO C. } (Loc. EL SALADO,
 (5)- MA. DEL CARMEN HERRERA A. } ECOTA, SIN.)
 (8)- MA. GUADALUPE NAREZ H. (Loc. LAS JUNTAS, MOLORITO, SIN.)

NOTA # 55

06/12/2025

SE OBSERVO LA IMPERMEABILIZACION EN LOSA DE AJOTEA, USANDO IMPERMEABILIZANTE ELASTOMERICO BLANCO A 2 MANOS, INCLUYE MEMBRANA DE REFORZO, EN DOMICILIO SIS:

- (13)- ROSA MARIELA BELTRAN C. (BADIRAGUATO, BADIRAGUATO, SIN.)

NOTA # 56

06/12/2025

SE OBSERVÓ EL COCADO DE LOSA MACIZA DE 10 CM DE ESPESOR, ARMADA CON VAR. 3/8" @ 20 CM. EN AMBOS SENTIDOS, REFORZADA CON BASTONES 3/8", COCADA CON CONCRETO $f'c = 200 \text{ Kg/cm}^2$. EN:


- (3)- JUDITH. CANDENCIA CARRASCO C. (Loc. EL SALADO, ECOTA, SIN.)

NOTA # 57

08/12/2025

SE TRABAJO EN EL COCADO DE LOSA MACIZA DE 10CM. DE ESPESOR ARMADA CON VAR. $3/8"$ @ 20 CM EN AMBOS SENTIDOS CON BASTONES DE $3/8"$ DE REFUERZO Y COLADA CON CONCRETO FIC-200 KG/CM² EN:

(8).- MA. GUADALUPE JUANES MORA (COL. LAS JUNTAS, MOLARITO, SINAL.)




NOTA # 58

08/12/2025

SE OBSERVO EL APUNADO DE YESO EN PLATONES INTERIORES, Y LA INSTALACION ELECTRICA CON ACCESORIOS, TAMBIEN LA LIMPIEZA DE AREAS EN DOMICILIO DE:


(13).- ROSA MEJIDA BECTRAN C. (BADIAGUATO, BADIAGUATO, SINAL.)



NOTA # 59

08/12/2025

CON ESTA FECHA SE RECIBE DEL CONTRATISTA, PARA SU REVISION Y TRAMITE, LA ESTIMACION 03 NORMAL, CON PERIODO DE EJECUCION DEL 19/11/2025 AL 08/12/2025, POR UN IMPORTE DE \$361,895.42 MAS IVA, MENOS DEDUCCIONES (35% AMORTILACION Y 3% FISCALIZACION) POR UN MONTO DE \$157,786.40 Y CON UN LIQUIDO A PAGAR DE \$202,012.28 CON UN AVANCE DE OBRA A LA FECHA DEL: 78.82%.




NOTA #60

9/12/2025

SE TRABAJÓ EN COLADO DE LOSA MACIZA DE 10 CM. DE ESPESOR, ARMADA CON VAR. $3/8"$ @ 20 CM EN AMBOS SENTIDOS, REFORzada CON BASTONES DE $3/8"$ Y CON 4 VAR. $3/8"$ AL CENTRO, COLADO CON CONCRETO $f'c = 200 \text{ Kg/cm}^2$, EN DOMICILIO DE:

⑤- MA. DEL CARMEN HERRERA A. (LOC. EL SALADO, FLOTA, SIM.)

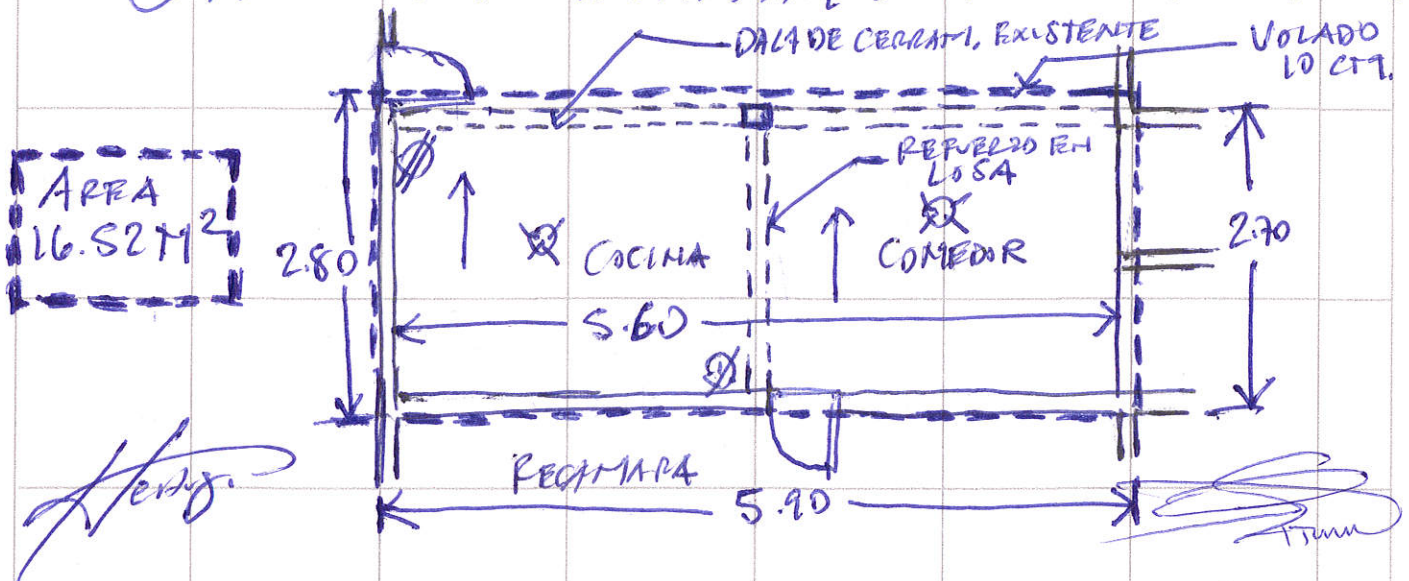

NOTA #61

10/12/2025

SE FINALIZÓ EL CUBRADO DE LOSA DE AZOTEA, CON ARMADO DE ACERO DE REFUERZO, SEGUN PROYECTO, SE COLOCARON XANQUERAS Y CAJAS DE SALIDA DE INST. ELECTRICAS EN LOS SIGS. DOMICILIOS:

①- MA. DOLORES BERNAL C. } (LOC. EL SALADO,
②- REYNIA HERNANDEZ AGUILAR } FLOTA, SIM.)

Herrera


Simón

NOTA #62

11/12/2025

SE OBSERVO' COCADO DE LOSA MACIZA DE AZOTEA DE 10 CM. DE ESPESOR, ARMADA CON VAR. $3/8"$ @ 20 CM EN AMBOS SENTIDOS, CON BASTONES DE REFUERZO DE $3/8"$ Y COLADA CON CONCRETO $f'c = 200 \text{ KG/CM}^2$, EN DOMICILIO DE:

④. REYNA HERNANDEZ AGUILAR (Loc. EL SALADO, ELOTA, SIM.)

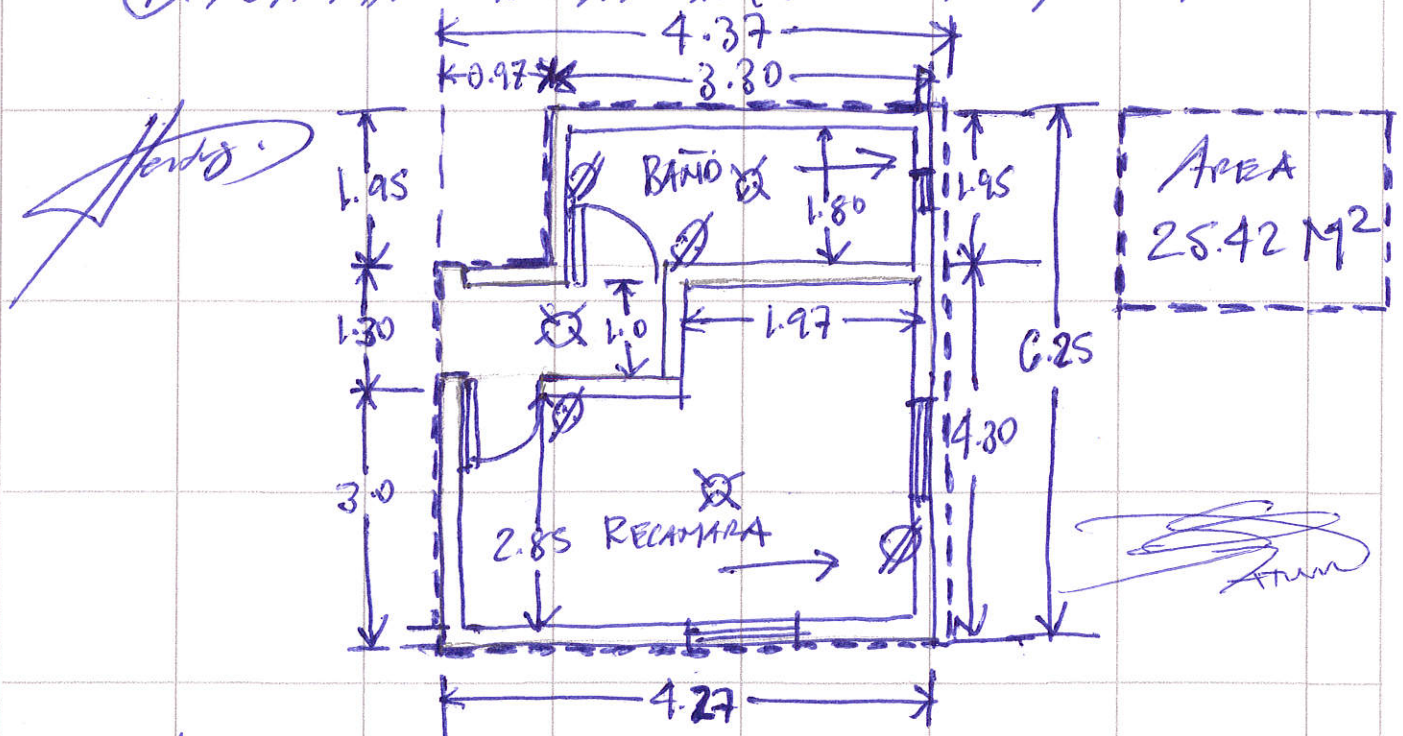


NOTA #63

13/12/2025

SE FINALIZO' COCADO DE LOSA MACIZA DE 10 CM DE ESPESOR, ARMADA CON VAR. $3/8"$ @ 20 CM EN AMBOS SENTIDOS, REFORZADA CON BASTONES DE $3/8"$ Y COLADA CON CONCRETO $f'c = 200 \text{ KG/CM}^2$ EN CASA DE:

④. - MA. DOLORES BERNAL C. (Loc. EL SALADO, ELOTA, SIM.)

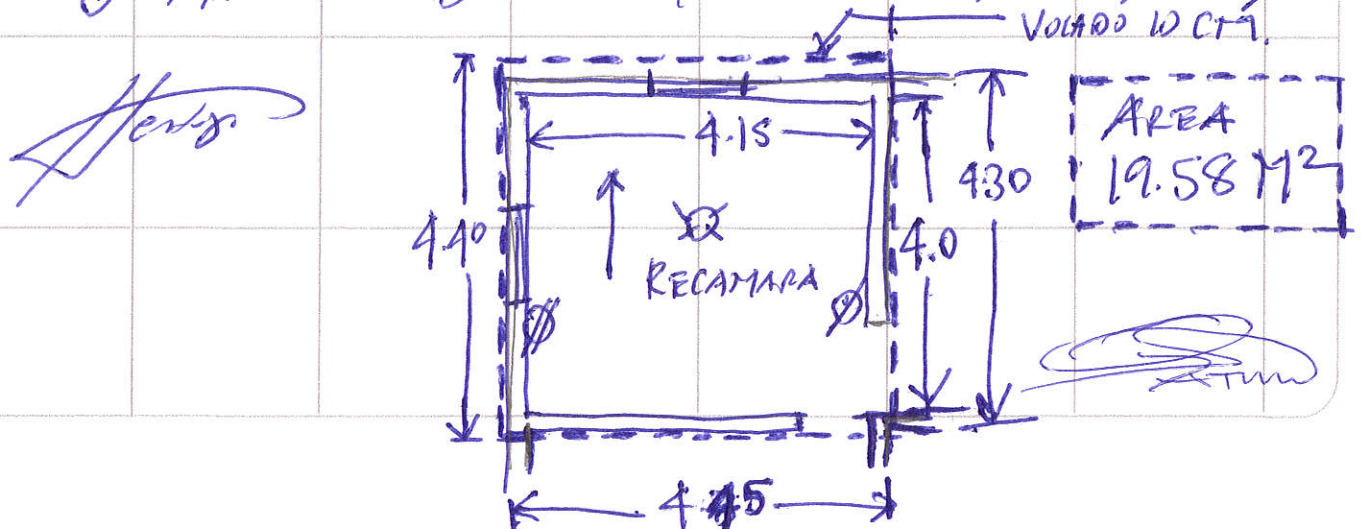

NOTA #64


15/12/2025

SE TRABAJÓ EN IMPERMEABILIZACIÓN EN CASA DE AZOTEA, USANDO IMPERMEABILIZANTE ELASTOMERICO COLOR BLANCO, A 2 MANOS, CON MEMBRANA DE REFUERZO INCLUIDA, EN CASA DE:

- (2)- GABINO CASTAÑEDA
 (3)- J. CADELARIA CARRASCO C.
 (6)- GLADIS JUDITH PARELITE H.
 (8)- MA. GUADALUPE JUAREZ MERA

(Loc. EL SALADO,
ELOTA, SINALOA)

(Loc. LAS JUNTAS, HOCORITO, SIN.)





NOTA #65

17/12/2025

SE LABORÓ EN APLAMADOS DE YESO EN PLATONES INTERIORES, EN LA INST. ELÉCTRICA CON ACCESORIOS INCLUIDOS, TAMBIÉN SE TRABAJÓ EN ACTIVIDADES DE LIMPIEZA DE ÁREAS EN CASA DE:

- (2)- GABINO CASTAÑEDA (Loc. EL SALADO, ELOTA, SIN.)
 (8)- MA. GUADALUPE JUAREZ MERA (Loc. LAS JUNTAS, HOCORITO, SIN.)





NOTA #66

26/12/2025

SE FINICITARON APLAMADOS DE YESO EN PLATONES INTERIORES TAMBIÉN EN LA INST. ELÉCTRICA Y SUS ACCESORIOS, ASÍ COMO LAS LABORES DE LIMPIEZA DE ÁREAS, EN LOS DOMICILIOS DE:

- (3)- J. CADELARIA CARRASCO C.
 (6)- GLADIS JUDITH PARELITE H.

(Loc. EL SALADO,
ELOTA, SIN.)




NOTA # 67

27/12/2025

SE OBSERVARON LOS TRABAJOS DE IMPERMEABILIZACION EN LOSA DE AZOTEA, CON IMPERMEABILIZANTE ELASTOMERICO COLOR BLANCO, A 2 CAPAS, INCLUYE MEMBRANA DE REVERCO EN:

- ①- MA. DOLORES BERNAL C. } (Loc. EL SALADO,
②- REYNA HERNANDEZ AGUILAR } ELOTA, SINALOA)
③- MA. DEL CARMEN HERRERA A.

NOTA # 68

05/01/2026

SE TRABAJO EN LEVANTAMIENTO DE XIVROS Y ENRASES DE TABIQUE ROJO, Y EN ARRIADO Y COLADO DE CASTILLOS DE CONCRETO, EN EL DOMICILIO DE:

- ⑦- JESUS VICTORIA ESCARRETA Y1 (Loc. GUSAVITO, GUSAVE, SIN.)

NOTA # 69

07/01/2026

SE FINIQUITARON ACABADOS DE YESO EN PLATONES INTERIORES, TAMBIEN LA INSTALACION ELECTRICA CON ACCESORIOS INCLUIDOS Y POR ULTIMO LA LIMPIEZA DE AREAS EN LOS DOMICILIOS SIGS:

- ①- MA. DOLORES BARNAL C. } (Loc. EL SALADO,
②- REYNA HERNANDEZ A. } ELOTA, SINALOA)
③- MA. DEL CARMEN HERRERA A.

NOTA #70

08/01/2026

SE LABORÓ EN CIMBRADO DE LOSA, CON ARMADO DE ACERO DE REFORZO, SEGUN PROYECTO, COLOCANDOSE MANGUERAS Y Cajas DE SALIDA DE INST. ELÉCTRICA, EN CASA DE:

⑦.- JESÚS VICTORIA ESCARREGA M. (Loc. GUASAVITO, GUASAVE, SIN.)

NOTA #71

07/01/2026

SE TRABAJÓ EN COLADO DE LOSA MACIZA DE 10CM DE ESPESOR ARMADA CON VAR. 3/8" @ 20 CM EN AMBOS SENTIDOS, REFORZADA CON BASTONES 3/8" Y CON 4 VAR. 3/8" AL CENTRO, COLADA CON CONCRETO $f'c = 200 \text{ Kg/cm}^2$ EN CASA DE:

⑦.- JESÚS VICTORIA ESCARREGA M. (Loc. GUASAVITO, GUASAVE, SIN.)

NOTA #72

16/01/2026

SE OBSERVARON TRABAJOS DE IMPERMEABILIZACION EN LOSA DE AZOTEA CON IMPERMEABILIZANTE ELASTOMERICO A 2 CAPAS (COLOR BLANCO) INCLUYE MEMBRANA DE REFORZO, EN DOMICILIO DE:

⑦.- JESÚS VICTORIA ESCARREGA M. (Loc. GUASAVITO, GUASAVE, SIN.)

NOTA #73

19/01/2026

SE TRABAJÓ EN LOS APLANADOS DE YESO EN PLAFONES INTERIORES. EN LA INST. ELECTRICA Y SUS ACCESORIOS, TAMBIEN SE LLEVARON A CABO LABORES DE LIMPIEZA DE AREAS EN DOMICILIO DE:

① JESÚS VICTORIA ESCARREGA M (COT. GUASAVITO, GUASAVE, S.M.)

NOTA #74

22/01/2026

CON FECHA DE HOY, SE RECIBE DEL CONTRATISTA, PARA SU REVISIÓN Y TRAMITE, LA ESTIMACIÓN 04 FINALIZADO, CON PERIODO DE EJECUCIÓN DEL 09/12/2025 AL 22/01/2026, POR UN IMPORTE DE \$323,803.41 MAS IVA, MENOS DEDUCCIONES (35% AMORTIZACIÓN Y 3% FISCALIZACIÓN) POR UN MONTO DE \$141,179.12 Y CON UN LIQUIDO A PAGAR DE \$284,432.83. CERRANDO CON UN AVANCE DE OBRA DE 100%.

NOTA #75

22/01/2026

CON ESTA FECHA DATOS SON CONCLUIDOS TODOS LOS TRABAJOS Y CERRAMOS BITACORA, CORRESPONDIENTE A CONTRATO:

CV-06-CO-PTXT24-002/2025, CELEBRADO ENTRE LA COMISION DE VIVIENDA DEL ESTADO DE SINALOA Y LA CONSTRUCTORA, COMERCIALIZADORA Y SOLUCIONES MICON S.A. DE C.V. HACIENDO ENTREGA A LOS BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA PISOS Y TECHOS EN LAS UBICACIONES ENLISTADAS EN LA NOTA DE APERTURA.
