

OFICIO No. OPDUyE/508/2025
ASUNTO: SOLICITUD PAGO DE
ESTIMACIÓN 01 NORMAL
Badiraguato, Sin., a 22 de Septiembre de 2025


MTRO. GONZALO IRINEO CABALLERO TERRAZAS
TESORERO MUNICIPAL
P R E S E N T E.-

POR MEDIO DE LA PRESENTE, LE SOLICITO EL PAGO POR: CONCEPTO DE PAGO DE ESTIMACIÓN 01 NORMAL, DEL IMPORTE DEL CONTRATO, A FAVOR DE LA EMPRESA: DENISSE MACHADO OROZCO, LA CUAL REALIZA LOS TRABAJOS APROBADOS POR EL SUBCOMITE DE BIENESTAR MUNICIPAL, A CONTINUACIÓN, SE DETALLA:

- NOMBRE DE LA OBRA: REHABILITACIÓN DE COMEDOR PÚBLICO EN LA COMUNIDAD DE LA SOLEDAD, PERTENECIENTE A LA SINDICATURA DE SANTIAGO DE LOS CABALLEROS, DEL MUNICIPIO DE BADIRAGUATO, SINALOA.
- No. DE CONTRATO: MBGBR-AD-FAISMUN-013/2025
- IMPORTE DEL CONTRATO: \$864,259.65 (OCHOCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS 65/100 M.N)
- CONCEPTO DEL PAGO: PAGO DE ESTIMACIÓN 01 NORMAL
- IMPORTE A PAGAR REAL: (DISMINUIDO POR EL IMPORTE RETENIDO DE RESICO): \$314,139.18 (TRESCIENTOS CATORCE MIL CIENTO TREINTA Y NUEVE PESOS 18/100 M.N)
- RECURSOS: FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FAISMUN) EJERCICIO 2025.
- EMPRESA: DENISSE MACHACO OROZCO
- R.F.C. MAOD870924MZ9
- DOMICILIO FISCAL: CALLE CONST. HERIBERTO JARA N. 1961, COLONIA: LOC. LIBERTAD, C.P. 80180, CULIACÁN, SINALOA
- No. DE FACTURA: # E82F, DE FECHA 22 DE SEPTIEMBRE DE 2025.

SE ANEXA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DE SOPORTE, COMO AMPARO DE DICHO PAGO.

AGRADECIENDO DE ANTEMANO LA ATENCIÓN QUE SE SIRVA DAR A LA PRESENTE, ME DESPIDO QUEDANDO A SUS ÓRDENES.



C.C.P. DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS,
DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA,
BADIRAGUATO, SINALOA.

ATENTAMENTE

C. ING. RUBIEL RINCÓN RAMOS
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS,
DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA



MUNICIPIO DE
BADIRAGUATO
TESORERÍA

Alexis
22 SEP 2025
1:09 PM

RECIBIDO

RFC emisor:MAOD870924MZ9

Nombre emisor: DENISSE MACHADO OROZCO

RFC receptor:MBA850101214

Nombre receptor: MUNICIPIO DE BADIRAGUATO

Código postal del receptor: 80500

Régimen fiscal receptor: Personas Morales con Fines no Lucrativos

Uso CFDi: Gastos en general.

Folio fiscal:0531BF55-57C8-471A-91EC-F5A10EEFE82F

No. de serie del CSD:00001000000712949676

Código postal, fecha y hora de emisión:80180 2025-09-22 11:27:53

Efecto de comprobante: Ingreso

Régimen fiscal: Régimen Simplificado de Confianza

Exportación: No aplica

Conceptos

Clave del producto y/o servicio	No. identificación	Cantidad	Clave de unidad	Unidad	Valor unitario	Importe	Descuento	Objeto impuesto		
80111618		1	E48	Unidad de servicio	285,232.01	285,232.010000		Si objeto de impuesto.		
Descripción	PAGO DE ESTIMACION 01 NORMAL DE LA OBRA: REHABILITACION DE COMEDOR PUBLICO EN LA COMUNIDAD DE LA SOLEDAD PERTENECIENTE A LA SINDICATURA DE SANTIAGO DE LOS CABALLEROS DEL MUNICIPIO DE BADIRAGUATO SINALOA CONTRATO: No.MBGBR-AD-FAISMUN-013120 25 MONTO DEL CONTRATO: \$864259.65 IMPORTE DE LA OBRA EJECUTADA SIN IVA: \$438818.48 MAS IVA 16% \$70210.96 TOTAL DE LA OBRA EJECUTADA CON IVA \$509029.44 AMORTIZACION ANTICIPO 35% \$153586.47 MAS IVA \$24073.84 TOTAL AMORTIZACION DE ANTICIPO \$178100.31 IMPORTE TOTAL A FACTURAR \$285232.01 MAS IVA \$45637.12 MONTO NETO A FACTURAR \$330869.13 RETENCION 3% (S.V.I.F. Y C.) \$13164.55 TOTAL DEDUCCIONES \$191324.86 MONTO LIQUIDO A RECIBIR \$317704.58				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	285,232.010000	Tasa	16.00%	45,637.121600
					ISR	Retención	285,232.010000	Tasa	1.25%	3,565.400125
Número de pedimento		Número de cuenta predial								

Moneda: Peso Mexicano

Forma de pago: Transferencia electrónica de fondos (incluye SPEI)

Método de pago: Pago en una sola exhibición

Subtotal

Impuestos trasladados IVA 16.00%

Impuestos retenidos ISR

Total

\$ 285,232.01

\$ 45,637.12

\$ 3,565.40

\$ 327,303.73

Sello digital del CFDI:
QoJ2LTk9ldFGgf7a45w89AzZpHpUZEbXs10sHSxsBcC58xDJ3ir22S6ssNeywKPFBO3BCi48Fi9JVFFJlpPVYscBL2Gjys3G21d/RohXHIV8MG05TPruzQFQLLOOuWrdujMakrEL6xWLX2JQgCbwtQLdBWlppUti5IXo1ZSZcrl25+LsrAEJ6sQwWGarsPF/HZgdjKAsixroYOpC+m2p9HN0fC4RdAxVzwXcOhThJhG3EkOEa4mjc+kwdKJEzHwefbfwO1UqAFG4zTPYtIBZp6IUwG/ZRsT0pIops2gedf0oioNwpdL6cHkN9vmnOLnTF2CGe+5xSGgBnY3fzpmEw==

Sello digital del SAT:
UQyrhl/iy2loh5RDz243fY65gFpILkAKgFvh2bbZorksJZk9pNcAU/4SvyYyWeq3oSJ4MWXwM4MX8ytpZvijZhVvyOC7wNlipt5A3mgkptz80E7s0tmbWaTyPNpxu94offnxJIE2VhTp9FJyZcQEGTulpLnWy3rpldQmJF/np0UuDTRa5eiS+EuY8IXozuEoIjXittrOc5ymmnShAiSnEj9asr9CocW2h9KpRDhLHYc4HzZagOboRa6iZ5aFD3nDeTB+rSD9Vm2vTww4QOuULwSm5v/cY7AtWEhqXrP43EfORH4h4NGib8uu6j65VyQRAo7zSu+sQU21+QvqQ==



Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:
[1.1]0531BF55-57C8-471A-91EC-F5A10EEFE82F[2025-09-22T11:26:47][SAT970701NN3]QoJ2LTk9ldFGgf7a45w89AzZpHpUZEbXs10sHSxsBcC58xDJ3ir22S6ssNeywKPFBO3BCi48Fi9JVFFJlpPVYscBL2Gjys3G21d/RohXHIV8MG05TPruzQFQLLOOuWrdujMakrEL6xWLX2JQgCbwtQLdBWlppUti5IXo1ZSZcrl25+LsrAEJ6sQwWGarsPF/HZgdjKAsixroYOpC+m2p9HN0fC4RdAxVzwXcOhThJhG3EkOEa4mjc+kwdKJEzHwefbfwO1UqAFG4zTPYtIBZp6IUwG/ZRsT0pIops2gedf0oioNwpdL6cHkN9vmnOLnTF2CGe+5xSGgBnY3fzpmEw=][00001000000705250068][
RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3 Fecha y hora de certificación: 2025-09-22 11:26:47
No. de serie del certificado SAT 00001000000705250068

This XML file does not appear to have any style information associated with it. The document tree is shown below.

```
<cfdi:Comprobante xmlns:cfdi="http://www.sat.gob.mx/cfd/4" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/cfd/4 http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/4/cfdv40.xsd" Version="4.0" Fecha="2025-09-22T11:27:53"
Sello="Qoj2LTK9IdFGg7a45w89AzZpHpUZEbYs10sH5xsBcC58xDJ3ir22S6ssNeywKPF03BCI48F19JVFFjlpPVYscBL2Gjys3G21d/RohXHIV8MG05TPruzQFQLLO0uWrdujMakrEL6xWLX2JQgC
FormaPago="03" NoCertificado="00001000000712949676"
Certificado="MIIGRjCCBC6gAwIBAgIUMDAwMDEwMDAwMDA3MTISNDk2NzYwQVY3KoZihvcNAQELBQAwggVMTUwMwYDVQQDCx8yQyBERUwgu0VSVk1DSU8gREUgQUJRNUSU5JU1RSQUJ04gVFJJQ1VU
SubTotal="285232.01" Moneda="MXN" Total="327303.73" TipoDeComprobante="I" Exportacion="01" MetodoPago="PUE" LugarExpedicion="80100">
  <cfdi:Emisor Rfc="MA00870924MZ9" Nombre="DENISSE MACHADO OROZCO" RegimenFiscal="626"/>
  <cfdi:Receptor Rfc="MBA050101214" Nombre="MUNICIPIO DE BADIAGUATO" DomicilioFiscalReceptor="80500" RegimenFiscalReceptor="603" UsoCFDI="G03"/>
  <cfdi:Conceptos>
    <cfdi:Concepto ClaveProdServ="80111618" Cantidad="1" ClaveUnidad="E48" Unidad="Unidad de servicio" Descripcion="PAGO DE ESTIMACION 01 NORMAL DE LA
    OBRA: REHABILITACION DE COMEDOR PUBLICO EN LA COMUNIDAD DE LA SOLEDAD PERTENECIENTE A LA SINDICATURA DE SANTIAGO DE LOS CABALLEROS DEL MUNICIPIO DE
    BADIAGUATO SINALOA CONTRATO: No.MB08R-AD-FAISMUN-013/2025 MONTO DEL CONTRATO: $864259.65 IMPORTE DE LA OBRA EJECUTADA SIN IVA: $438818.48 MAS IVA
    16% $70210.96 TOTAL DE LA OBRA EJECUTADA CON IVA $509029.44 AMORTIZACION ANTICIPO 35% $153506.47 MAS IVA $24573.84 TOTAL AMORTIZACION DE ANTICIPO
    $178100.31 IMPORTE TOTAL A FACTURAR $285232.01 MAS IVA $45637.12 MONTO NETO A FACTURAR $330869.13 RETENCION 3% (S.V.I.F. Y C.) $13164.55 TOTAL
    DEDUCCIONES $191324.86 MONTO LIQUIDO A RECIBIR $317704.58" ValorUnitario="285232.01" Importe="285232.010000" ObjetoImp="02">
      <cfdi:Impuestos>
        <cfdi:Traslados>
          <cfdi:Traslado Base="285232.010000" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.160000" Importe="45637.121600"/>
        </cfdi:Traslados>
        <cfdi:Retenciones>
          <cfdi:Retencion Base="285232.010000" Impuesto="001" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.012500" Importe="3565.400125"/>
        </cfdi:Retenciones>
      </cfdi:Impuestos>
    </cfdi:Concepto>
  </cfdi:Conceptos>
  <cfdi:Impuestos TotalImpuestosTrasladados="45637.12" TotalImpuestosRetenidos="3565.40">
    <cfdi:Retenciones>
      <cfdi:Retencion Impuesto="001" Importe="3565.40"/>
    </cfdi:Retenciones>
    <cfdi:Traslados>
      <cfdi:Traslado Base="285232.01" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.160000" Importe="45637.12"/>
    </cfdi:Traslados>
  </cfdi:Impuestos>
  <cfdi:Complemento>
    <tfd:TimbreFiscalDigital xmlns:tfd="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital" xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital
    http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/TimbreFiscalDigital/TimbreFiscalDigitalv11.xsd" Version="1.1" UUID="0531BF55-57C8-471A-91EC-F5A10EEFE82F"
    FechaTimbrado="2025-09-22T11:28:47" RfcProvCertif="SAT970701NN3"
    SelloCFD="Qoj2LTK9IdFGg7a45w89AzZpHpUZEbYs10sH5xsBcC58xDJ3ir22S6ssNeywKPF03BCI48F19JVFFjlpPVYscBL2Gjys3G21d/RohXHIV8MG05TPruzQFQLLO0uWrdujMakrEL6xW
    NoCertificadoSAT="00001000000705250068"
    SelloSAT="UQYrhI/Ty2l0h5R0z243f/Y65gFpikAKgFvh2bbZorksjZk9pNCAUN/45vyYyWeq3o5J4MwXwM4MX8ylp2vjZhwYOC7wN1lpt8A3mgkptz80E7s0tmbWaTyPNpxu94offnxJiE2V
  </tfd:Complemento>
</cfdi:Comprobante>
```



Fecha: 18 de septiembre de 2025

CARATULA DE ESTIMACIÓN

CONTRATISTA: DENISSE MACHADO OROZCO		ESTIMACIÓN No: 01 NORMAL	
DOMICILIO: Calle. Const. Heriberto Jara N. 1961, Colonia: Loc. Libertad, C.P. 80180, Culiacán, Sinaloa, Código Postal: 80180		PERIODO DE ESTIMACIÓN:	
TELÉFONO: 6671-325077	CEL: 6671633083	DEL	01-sep-25
R.F.C. MAOD870924MZ9.		AL	15-sep-25
DEPENDENCIA:		FECHA DE CONTRATO:	
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA		19-jun-25	
LOCALIDAD:		MUNICIPIO:	PERIODO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO:
LA SOLEDAD		BADIRAGUATO	INICIO: 01-sep-25
			TERMINACIÓN: 15-oct-24
DESCRIPCIÓN:			
REHABILITACIÓN DE COMEDOR PÚBLICO EN LA COMUNIDAD DE LA SOLEDAD, PERTENECIENTE A LA SINDICATURA DE SANTIAGO DE LOS CABALLEROS, DEL MUNICIPIO DE BADIRAGUATO, SINALOA.			
CONTRATO No:			
MBGBR-AD-FAISMUN-013/2025			
IMPORTE SIN IVA DE LA OBRA	IMPORTE CON IVA DE LA OBRA	30% ANTICIPO DE LA OBRA	IMPORTE TOTAL DE CONTRATO:
\$745,051.42	\$864,259.65	\$302,490.88	\$864,259.65
			BUENO POR: \$ 317,704.58
RECIBI DEL H. AYUNTAMIENTO DE BADIRAGUATO:			
\$ 317,704.58		(SON TRESCIENTOS DIECISIETE MIL SETECIENTOS CUATRO PESOS 58/100 M.N.)	
EN PAGO DE ESTIMACIÓN:		01 NORMAL	
DEDUCCIONES:		CALCULO DE ESTIMACIÓN	
AMORTIZACIÓN ANTICIPO 35%	\$ 153,586.47	IMPORTE DE LA OBRA EJECUTADA SIN IVA	\$ 438,818.48
MAS I.V.A.:	\$ 24,573.84	MAS I.V.A 16 %	\$ 70,210.96
TOTAL AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO:	\$ 178,160.31	TOTAL DE LA OBRA EJECUTADA CON IVA	\$ 509,029.44
3 % SVFYC:	\$ 13,164.55	MENOS TOTAL DEDUCCIONES:	\$ 191,324.86
TOTAL DEDUCCIONES:	\$ 191,324.86	MONTO A FACTURAR CON IVA	\$ 330,869.13
			SALDO A PAGAR: \$ 317,704.58

ELABORO:

C. DENISSE MACHADO OROZCO
REPRESENTANTE LEGAL

REVISÓ:

ING. JOSE RODOLFO CONTRERAS LOPEZ
COSTOS Y PRESUPUESTOS

AUTORIZO:

ING. RUBIEL RINCON RAMOS
DIRECTOR D. O. P. D. U. Y



**CONSTRUCCIONES
MACHADO**

Dependencia : Ayuntamiento de Badiraguato
Control de Estimaciones

DENISSE MACHADO OROZCO

REHABILITACIÓN DE COMEDOR PÚBLICO EN LA COMUNIDAD DE LA SOLEDAD, PERTENECIENTE A LA SINDICATURA DE SANTIAGO DE LOS CABALLEROS, DEL MUNICIPIO DE BADIRAGUATO, SINALOA.			Fecha:	Estimacion:
			18 de septiembre de 2025	01 NORMAL
Periodo de la estimación:	01/09/2025	15/09/2025	Localidad:	No. De contrato:
Periodo de Ejecución:	01/09/2025	15/10/2024	LA SOLEDAD	MBGBR-AD-FAISMUN-013/2025
Importe del contrato con I.V.A:	Imp. Contratado sin I.V.A	Anticipo	Importe Anticipo sin I.V.A	% de Avance
\$ 864,259.65	\$ 745,051.42	\$ 302,490.88	\$ 260,768.00	59%
				% Avance Total
				59%

Control Del Anticipo	Liquidacion de Estimacion	Control de Estimacion
AMORTIZA ESTA ESTIMACION	Importe de la Estimacion (+) \$ 438,818.48	ESTA ESTIMACION
\$ 178,160.30	16 % I.V.A (+) \$ 70,210.96	\$ 509,029.44
	Sub- Total A (=) \$ 509,029.44	
	Amortizacion Anticipo \$ 153,586.47	
AMORTIZACION ANTERIOR	16 % I.V.A (+) \$ 24,573.84	ACUMULADO ANTERIOR
\$ -	Total (=) \$ 178,160.31	\$ -
	Importe TOTAL \$ 285,232.01	
TOTAL AMORTIZADO	16 % I.V.A (+) \$ 45,637.12	TOTAL ACUMULADO.
\$ 178,160.30	Total (=) \$ 330,869.13	\$ 509,029.44
	3 % SVIFYC: \$ 13,164.55	
ANTICIPO OTORGADO	Total Deducciones (=) \$ 191,324.86	CONTRATADO
\$ 302,490.88	Importe TOTAL \$ 317,704.58	\$ 864,259.65
	NETO A PAGAR	
SALDO DEL ANTICIPO	\$ 317,704.58	SALDO
\$124,330.58	Son:	\$ 355,230.21
	(SON TRESCIENTOS DIECISIETE MIL SETECIENTOS CUATRO PESOS 58/100 M.N.)	

ELABORO:


C. DENISSE MACHADO OROZCO
REPRESENTANTE LEGAL

REVISO

ING. JOSE RODOLFO CONTRERAS LOPEZ
COSTOS Y PRESUPUESTOS

AUTORIZO

ING. RUBIEL RINCON RAMOS
DIR. D. O. P. D. U. Y E.

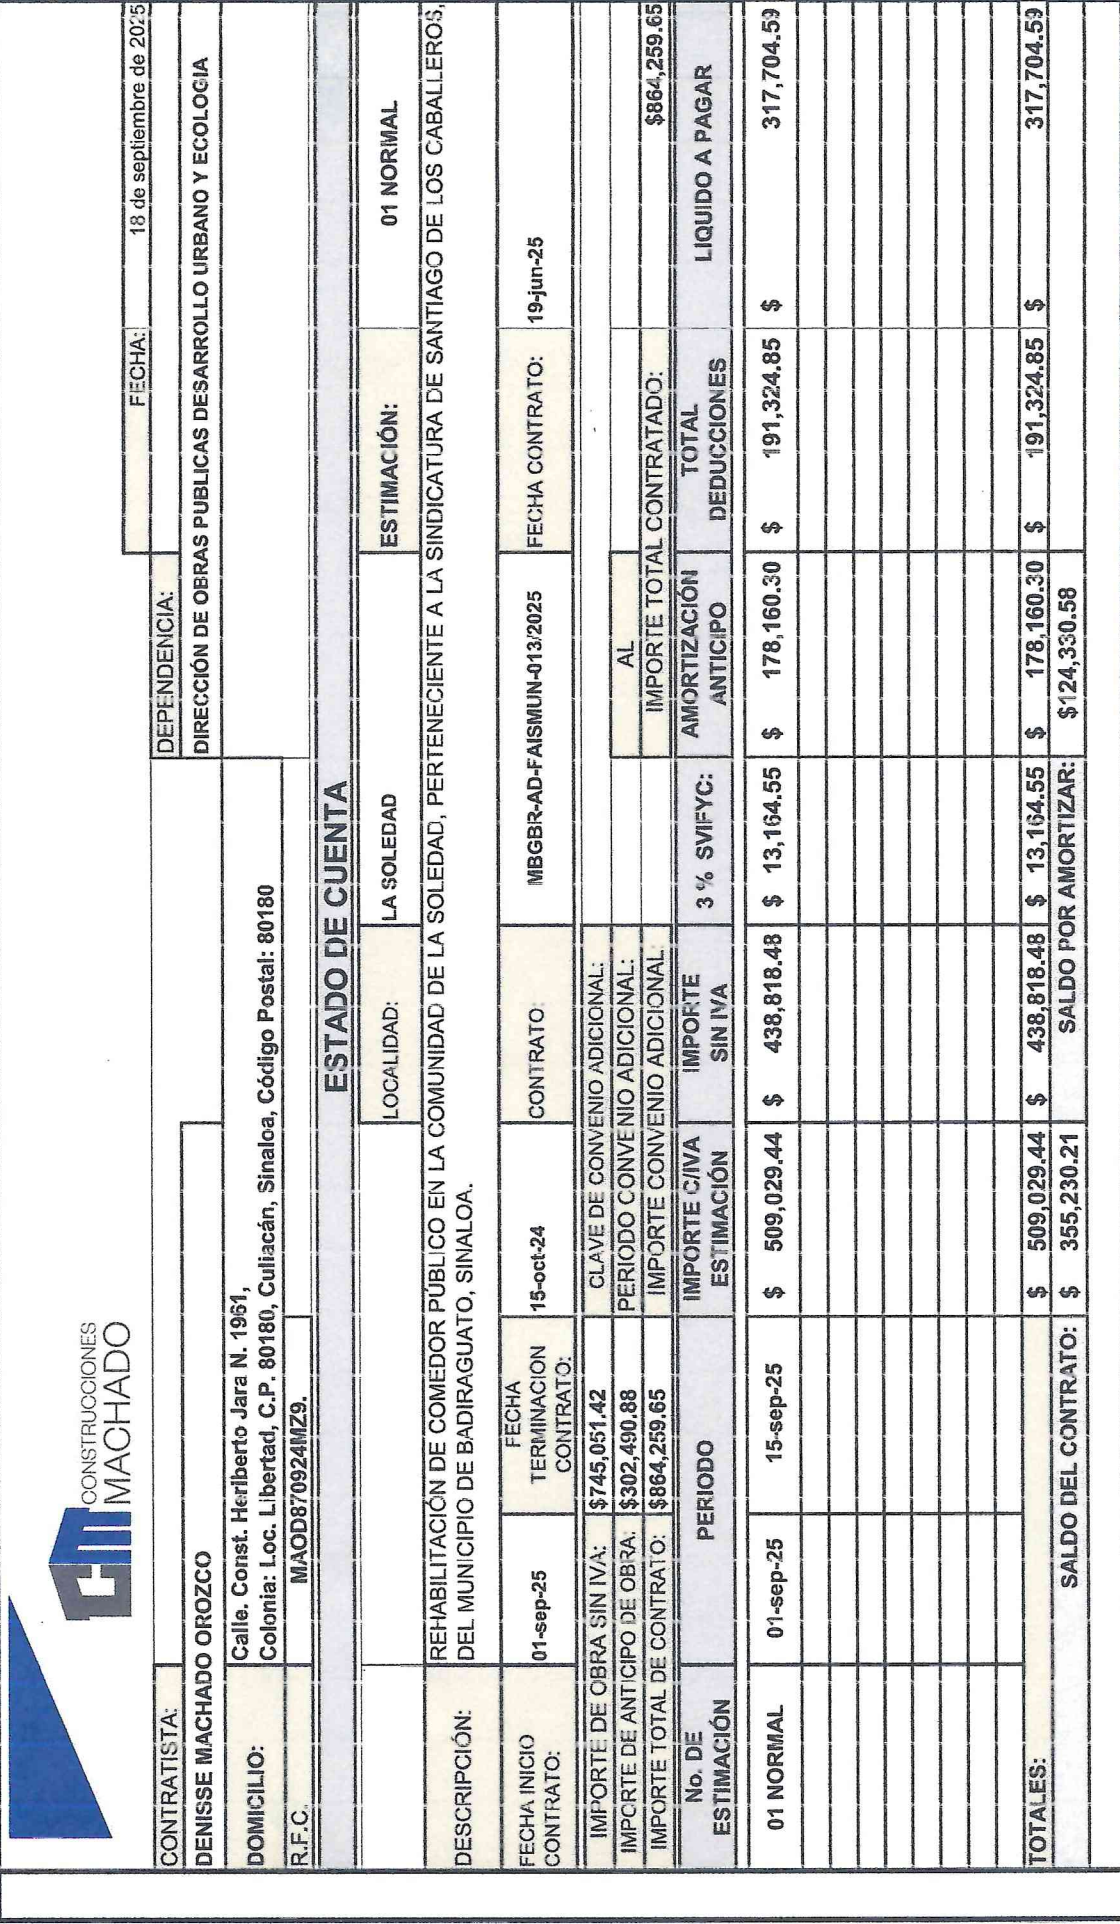

REVISOR: 

ING. JOSE RODOLFO CONTRERAS LOPEZ
COSTOS Y PRESUPUESTOS



ING. RUBIEL RINCON RAMOS
DIRECTOR DE O.P.D.U.Y.E.



CONSTRUCCIONES
MACHADO

FECHA 18 de septiembre de 2025

CONTRATISTA:

DENISSE MACHADO OROZCO

DEPENDENCIA:

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DESARROLLO URBANO Y
ECOLOGIA

DOMICILIO:

Calle. Const. Heriberto Jara N. 1961,
Colonia: Loc. Libertad, C.P. 80180, Culiacán,

R.F.C.

MAOD870924MZ9.

RESÚMEN DE ESTIMACIÓN

	LOCALIDAD:	LA SOLEDAD	ESTIMACIÓN:	01 NORMAL
DESCRIPCIÓN:	REHABILITACIÓN DE COMEDOR PÚBLICO EN LA COMUNIDAD DE LA SOLEDAD, PERTENECIENTE A LA SINDICATURA DE SANTIAGO DE LOS CABALLEROS, DEL MUNICIPIO DE BADIRAGUATO, SINALOA.			

IMPORTE DE OBRA SIN IVA:	\$ 745,051.42
IMPORTE DE ANTICIPO DE OBRA:	\$ 302,490.88
IMPORTE TOTAL DE CONTRATO:	\$ 864,259.65

DESTAJOS		IMPORTE
1	PRELIMINARES	\$ 19,353.84
2	CIMENTACION	\$ 105,656.37
3	ESTRUCTURA	\$ 313,608.27
4	ALBAÑILERIA	\$ -
5	ACABADOS	\$ -
6	INSTALACIONES ESPECIALES	\$ -
7	TRABAJOS FINALES	\$ -
SUBTOTAL ESTIMACIÓN:		\$ 438,618.48

SUB TOTAL=	\$ 438,618.48
I.V.A AL 16 %	\$ 70,210.96
TOTAL =	\$ 509,029.44

ELABORO.

C. DENISSE MACHADO OROZCO
REPRESENTANTE LEGAL

REVISO.

ING. JOSE ROBERTO CONTRERAS LOPEZ
COSTOS Y PRESUPUESTOS

AUTORIZO.-

ING. RUBIEL RINCON RAMOS
DIRECTOR D. O. P. D. U. Y. E.



FECHA: 18/09/2025

CONTRATISTA: DENISSE MACHADO OROZCO DEPENDENCIA: DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA

DOMICILIO: Calle, Const. Heriberto Jara N. 1961, Colonia: Loc. Libertad, C.P. 80180, Culiacán, Sinaloa, Código Postal: 80180 R.F.C.: MAOD870924MZ9, 1 de 3

DESGLASE DE CONCEPTOS DE ESTIMACION LOCALIDAD: LA SOLEDAD ESTIMACION: 01 NORMAL

DESCRIPCIÓN: REHABILITACIÓN DE COMEDOR PÚBLICO EN LA COMUNIDAD DE LA SOLEDAD, PERTENECIENTE A LA SINDICATURA DE SANTIAGO DE LOS CABALLEROS, DEL MUNICIPIO DE BADIAGUATO, SINALOA.

IMPORTE DE OBRA SIN IVA: \$745,051.42 IMPORTE DE ANTICIPO DE OBRA: \$302,490.88 IMPORTE TOTAL DE CONTRATO: \$864,259.65

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	SEGUN PROYECTO		VOLUMEN TOTAL	HASTA ESTIM ANTERIOR	EXCEDENTE	DE ESTA ESTIMACIÓN	IMPORTE
			CANT	P.U.					
1	PRELIMINARES								
GP01	TRAZO Y NIVELACIÓN DEL TERRENO ESTABLECIENDO EJES Y NIVELETAS DE REFERENCIA, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M2	136.00	\$ 15.06	\$ 2,048.16	0.00	0.00	136.00	\$ 2,048.16
GBR39	DESMANTELAMIENTO DE INSTALACIONES, INCLUYE: RETIRO DE MATERIAL A UN LUGAR AUTORIZADO POR SUPERVISION, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	M2	35.45	\$ 209.42	\$ 7,423.94	0.00	0.00	35.45	\$ 7,423.94
GP17	EXCAVACIÓN POR MEDIOS MANUALES EN MATERIAL TIPO "B" DE 0.00 A 2.00 MTS.	M3	6.00	\$ 734.66	\$ 4,407.96	0.00	0.00	6.00	\$ 4,407.96
GP26	RELLENO COMPACTADO AL 95% CON BAILARINA EN CAPAS DE 20 CMS DE ESPESOR CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN, INCLUYE: AGUA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU TERMINACIÓN.	M3	4.61	\$ 353.51	\$ 1,629.68	0.00	0.00	4.61	\$ 1,629.68
GP03	CARGA Y ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN Y/O DEMOLICIONES MEDIDO COMPACTO, 1ER KILOMETRO.	M3	1.00	\$ 578.37	\$ 578.37	0.00	0.00	1.00	\$ 578.37
GP033	AFINE DE FONDOS Y TALUDES DE LAS EXCAVACIONES HECHAS INCLUYE: MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M2	70.02	\$ 46.64	\$ 3,265.73	0.00	0.00	70.02	\$ 3,265.73
2	CIMENTACION		-	\$ 19,353.84	\$ 19,353.84				
GP2448	PLANTILLA DE CONCRETO SIMPLE DE 5 CM. DE ESPESOR PARA DESPLANTE DE CIMENTACION CON CONCRETO F'C=100 KG/CM2 T.M.A. 3/4", INCLUYE : SUMINISTRO DE MATERIALES, FABRICACION Y COLADO DE CONCRETO, REGLEADO, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M2	6.00	\$ 817.66	\$ 4,906.08	0.00	0.00	6.00	\$ 4,906.08
GP206	ZAPATA AISLADA DE 1.0X1.0X0.20 MTS DE ESPESOR ARMADA CON VARILLA DE 3/8" @ 15 CMS EN AMBAS DIRECCIONES , COLADA CON CONCRETO HECHO EN OBRA CON F'C=250 KG/CM. INCLUYE: MANO DE OBRA, MATERIALES, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	6.00	\$ 6,595.06	\$ 39,570.34	0.00	0.00	6.00	\$ 39,570.36

ELABORADO: [Firma]

C. DENISSE MACHADO OROZCO

REVISADO: [Firma]
ING. JOSE RODOLFO CONTRERAS LOPEZ
COORDINADOR PRESUPUESTOS

AUTORIZADO: [Firma]
ING. RUBEN RINCON RAMOS
DIRECTOR DE O. P. D. U. Y E.

DESGLOSE



CONTRATISTA:		DENISSE MACHADO OROZCO		DEPENDENCIA:		DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA		FECHA:		18/09/2025	
DOMICILIO:		Calle: Const. Heriberto Jara N. 1961, Colonia: Loc. Libertad, C.P. 80180, Culiacán, Sinaloa. Código Postal: 80180		R.F.C.:		MAOD870924MIZ9.		2 de 3			
DESGLOSE DE CONCEPTOS DE ESTIMACIÓN											
DESCRIPCIÓN:		LOCALIDAD:		LA SOLEDAD		ESTIMACIÓN:		01 NORMAL		DEL MUNICIPIO DE	
REHABILITACIÓN DE COMEDOR PÚBLICO EN LA COMUNIDAD DE LA SOLEDAD, PERTENECIENTE A LA SINDICATURA DE SANTIAGO DE LOS CABALLEROS, DEL MUNICIPIO DE		LOCALIDAD:		LA SOLEDAD		ESTIMACIÓN:		01 NORMAL		DEL MUNICIPIO DE	
BADIRAGUATO, SINALOA.		LOCALIDAD:		LA SOLEDAD		ESTIMACIÓN:		01 NORMAL		DEL MUNICIPIO DE	
IMPORTE DE OBRA SIN IVA:		\$745,051.42		IMPORTE DE ANTICIPO DE OBRA:		\$302,490.88		IMPORTE TOTAL DE CONTRATO:		\$964,259.65	
CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANT	P.U.	TOTAL	VOLUMEN TOTAL	HASTA ESTIM. ANTERIOR	EXCEDENTE	DE ESTA ESTIMACIÓN	IMPORTE	
GP209	DADO DE 20X20 CM ARMADO CON ARMEX DALA Y REFORZADO CON 2 VARILLAS DE 3/8", CONCRETO HECHO EN OBRA CON UN F'C=200 KG/CM2, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTAS.	PZA	6.00	\$ 3,483.15	\$ 20,898.90	6.00	0.00	0.00	6.00	\$ 20,898.90	
GBR89	CADENA DE DESPLANTE DE 20X35 CM, ARMADO CON ARMEX Y 2 VARS #3, INCLUYE: EXCAVACION, TRASLADOS, ACARREOS, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	ML	27.00	\$ 1,491.89	\$ 40,281.54				27.00	\$ 40,281.03	
3	ESTRUCTURA										
GBR80	COLUMNA DE 20X25 CM, ARMADO CON 4 VARS #3, EST. @20 CMS, INCLUYE: TRASLADOS DE MATERIALES, ACARREOS, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	ML	15.00	\$ 1,072.96	\$ 16,094.40	15.15	0.00	0.00	15.15	\$ 16,253.34	
GBR92	CADENA DE CERRAMIENTO DE 20X35 CM, ARMADO CON ARMEX Y 2 VARS #3, INCLUYE: TRASLADOS DE MATERIALES, ACARREOS, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	ML	33.50	\$ 1,021.06	\$ 34,205.44	26.50	0.00	0.00	26.50	\$ 27,053.09	
GP505	MURO DE BLOCK 15x20x40 CMS, DE ALTURA PROMEDIO 60 CMS INCLUYE: TRASLADOS DE MATERIALES, ACARREOS, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	25.00	\$ 791.93	\$ 19,798.25	46.32	0.00	0.00	46.32	\$ 36,682.20	
GP237	LOSA DE 10 CM DE ESPESOR CON CONCRETO F'C= DE 200 KG/CM HECHO EN OBRA, ARMADO CON VARILLA DE 3/8" @ 20 CMS EN AMBOS SENTIDOS, INCLUYE: TRASLADOS DE MATERIAL, ACARREOS, CIBRA, MANO DE OBRA, MATERIALES, EQUIPO Y HERRAMIENTAS.	M2	95.38	\$ 1,551.52	\$ 147,983.98	105.94	0.00	0.00	105.94	\$ 164,368.03	
GP2515	FIRME DE CONCRETO F'C=200 KG/CM2 DE 10 CM DE ESPESOR NCLUYE: TRASLADO DE MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, CIBRA, NIVELACION Y COMPACTACION.	M2	64.02	\$ 1,052.51	\$ 67,381.69				65.98	\$ 69,444.61	
4	ALBAÑILERIA										
				\$ 285,463.76	\$ 285,463.76					\$ -	

AUTORIZO
ING. RUBIEL RINCON RAMOS
DIRECTOR DE O. P. D. U. Y E.

REVISO
ING. JOSE RODOLFO CONTRERAS LOPEZ
CONTAS Y PRESUPUESTOS

ELABORO
C. DENISSE MACHADO OROZCO



CONTRATISTA:		DENISSE MACHADO OROZCO		DEPENDENCIA:		DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA		FECHA: 18/09/2025			
DOMICILIO:		Calle. Const. Heriberto Jara N. 1961. Colonia: Loc. Libertad, C.P. 80180, Culiacán, Sinaloa, Código Postal: 80180						R.F.C. MAOD870924MZ9.		3 de 3	
DESGLOSE DE CONCEPTOS DE ESTIMACIÓN											
DESCRIPCIÓN:		REHABILITACIÓN DE COMEDOR PÚBLICO EN LA COMUNIDAD DE LA SOLEDAD, PERTENECIENTE A LA SINDICATURA DE SANTIAGO DE LOS CABALLEROS, DEL MUNICIPIO DE BADIRAGUATO, SINALOA.		LOCALIDAD:		LA SOLEDAD		ESTIMACIÓN:		01 NORMAL	
IMPORTE DE OBRA SIN IVA:		\$745,051.42		IMPORTE DE ANTICIPO DE OBRA:		\$302,490.88		IMPORTE TOTAL DE CONTRATO:		\$864,259.65	
CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANT	SEGUN PROYECTO P.U.	TOTAL	VOLUMEN TOTAL	HASTA ESTIM ANTERIOR	EXCEDENTE	DE ESTA ESTIMACIÓN	IMPORTE	
5	ACABADOS									\$	-
6	INSTALACIONES ESPECIALES									\$	-
7	TRABAJOS FINALES									\$	-
										SUBTOTAL \$	438,818.48
										IVA \$	70,210.96
										TOTAL \$	509,029.44

ELABORÓ
C. DENISSE MACHADO OROZCO
REPRESENTANTE LEGAL

REVISÓ
ING. JOSE RODOLFO CONTRERAS LOPEZ
COSTOS Y PRESUPUESTOS

AUTORIZO
ING. RUBIEL RINCON RAMOS
DIRECTOR DE O. P. D. U. Y E.

DENISSE MACHADO OROZCO

R.F.C. MAOD870924MZ9.

REHABILITACIÓN DE DISPENSARIO MEDICO EN LA COMUNIDAD DEL RINCON DE
LOS MONTES, PERTENECIENTE A LA ALCALDIA CENTRAL DEL MUNICIPIO DE
BADIRAGUATO, SINALOA.

ESTIMACION
01 NORMAL

CLAVE		CONCEPTO	LOCALIZACION	UNIDAD	LARGO	ANCHO	ALTO	PZA	TOTAL	OBSERVACIONES
			EJE	TRAMO	EN METROS					
1		PRELIMINARES								
GP01		TRAZO Y NIVELACIÓN DEL TERRENO ESTABLECIENDO EJES Y NIVELETAS DE REFERENCIA, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.		M2						VER CROQUIS
					17.00	8.00			136.00	
								TOTAL	136.00	
GBR39		DESMANTELAMIENTO DE INSTALACIONES, INCLUYE: RETIRO DE MATERIAL A UN LUGAR AUTORIZADO POR SUPERVISION, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.		M2						VER CROQUIS
					5.70	6.22			35.45	
								TOTAL	35.45	
GP17		EXCAVACIÓN POR MEDIOS MANUALES EN MATERIAL TIPO "B" DE 0.00 A 2.00 MTS.		M3						VER CROQUIS
					1.00	1.00	1.00	6.00	6.00	
								TOTAL	6.00	
GP26		RELLENO COMPACTADO AL 95% CON BAILARINA EN CAPAS DE 20 CMS DE ESPESOR CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN, INCLUYE: AGUA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU TERMINACIÓN.		M3						VER CROQUIS
				EXCAVACION	1.00	1.00	1.00	6.00	6.00	
				ZAPATA	1.00	1.00	0.20	6.00	1.20	
				DADO	0.20	0.20	0.80	6.00	0.19	
								TOTAL	4.61	
GP03		CARGA Y ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN Y/O DEMOLICIONES MEDIDO COMPACTO, 1ER. KILOMETRO.		M2						VER CROQUIS
				VOL. DE CONCRETO DE LA ZAPATA	1.00	1.00	0.20	6.00	1.20	
				VOL. DE CONCRETO DEL DADO	0.20	0.20	0.80	6.00	0.19	
								TOTAL	1.39	
GP033		AFINE DE FONDOS Y TALUDES DE LAS EXCAVACIONES HECHAS INCLUYE: MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.		PZA						VER CROQUIS
				ZAPATA	1.00	1.00		6.00	6.00	
				FIRMES	6.30	6.60			41.58	
					6.60	3.40			22.44	
								TOTAL	70.02	
2		CIMENTACION								
GP2448		PLANTILLA DE CONCRETO SIMPLE DE 5 CM. DE ESPESOR PARA DESPLANTE DE CIMENTACION CON CONCRETO F'C=100 KG/CM2 T.M.A. 3/4", INCLUYE : SUMINISTRO DE MATERIALES, FABRICACION Y COLADO DE CONCRETO, REGLEADO, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.		M2						VER CROQUIS
				ZAPATA	1.00	1.00		6.00	6.00	
								TOTAL	6.00	
GP206		ZAPATA AISLADA DE 1.0X1.0X0.20 MTS DE ESPESOR, ARMADA CON VARILLA DE 3/8" @ 15 CMS EN AMBAS DIRECCIONES , COLADA CON CONCRETO HECHO EN OBRA, CON F'C=250 KG/CM, INCLUYE: MANO DE OBRA, MATERIALES, HERRAMIENTA Y EQUIPO.		PZA						VER CROQUIS
				ZAPATA	1.00	1.00		6.00	6.00	
								TOTAL	6.00	
GP209		DADO DE 20X20 CM ARMADO CON ARMEX DALA Y REFORZADO CON 2 VARILLAS DE 3/8", CONCRETO HECHO EN OBRA CON UN F'C=200 KG/CM2, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTAS.		PZA						VER CROQUIS
								6.00	6.00	
								TOTAL	6.00	
GBR69		CADENA DE DESPLANTE DE 20X35 CM, ARMADO CON ARMEX Y 2 VARS #3, INCLUYE: EXCAVACION, TRASLADOS, ACARREOS, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.		ML						VER CROQUIS
					27.00			27.00		
								TOTAL	27.00	

ELABORADO
[Assinatura]
C. DENISE MACHADO ORFÃO
REPRESENTANTE LEGAL

ARQ. PRIMITIVA GPE NIFRIAS MARTINEZ
COSTOS Y PRESUPUESTOS

AUTORIZADO:
ING. RUBEN RINCON RAMOS
DIRECTOR D.O.P.D.U.Y.E.

VOLUMENES GENERADORES



CONTRATISTA:

DENISSE MACHADO OROZCO

R.E.C. MAOD870924MZ9.

REHABILITACIÓN DE DISPENSARIO MEDICO EN LA COMUNIDAD DEL RINCÓN DE LOS MONTES, PERTENECIENTE A LA ALCALDIA CENTRAL DEL MUNICIPIO DE BADIRAGUATO, SINALOA.

ESTIMACION

01 NORMAL


CLAVE	CONCEPTO	LOCALIZACIÓN		UNIDAD	LARGO	ANCHO	ALTO	PZA	TOTAL	OBSERVACIONES
		EJE	TRAMO							
3	ESTRUCTURA									
GBR60	COLUMNA DE 20X25 CM, ARMADO CON 4 VARS #3, EST. @20 CMS, INCLUYE: TRASLADOS DE MATERIALES, ACARREOS, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.			M2	6.00	2.50		15.00		VER CROQUIS
								TOTAL	15.00	
GBR62	CADENA DE CERRAMIENTO DE 20X35 CM, ARMADO CON ARMEX Y 2 VARS #3, INCLUYE: TRASLADOS DE MATERIALES, ACARREOS, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.			ML	33.50			33.50		VER CROQUIS
								TOTAL	33.50	
GP505	MURO DE BLOCK 15X20X40 CMS, DE ALTURA PROMEDIO 60 CMS INCLUYE: TRASLADOS DE MATERIALES, ACARREOS, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.			ML	25.00			25.00		VER CROQUIS
								TOTAL	25.00	
GP217	LOSA DE 10 CM DE ESPESOR CON CONCRETO F' C= DE 200 KG/CM HECHO EN OBRA, ARMADO CON VARILLA DE 3/8" @ 20 CMS EN AMBOS SENTIDOS, INCLUYE: TRASLADOS DE MATERIAL, ACARREOS, CIMBRA, MANO DE OBRA, MATERIALES EQUIPO Y HERRAMIENTAS.			M2	6.60	3.40		22.44		VER CROQUIS
					5.60	5.60		31.36		
					6.30	6.60		41.58		
								TOTAL	95.38	
GP2515	FIRME DE CONCRETO F' C=200 KG/CM2 DE 10 CM DE ESPESOR NCLUYE: TRASLADO DE MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, CIMBRA, NIVELACION Y COMPACTACION.			M3	6.60	3.40		22.44		VER CROQUIS
					6.30	6.60		41.58		
								TOTAL	64.02	

ELABORÓ:
C. DENISSE MACHADO OROZCO
REPRESENTANTE LEGAL

REVISÓ:
ARQ. RICARDO GONZALEZ MARTINEZ
COSTOS Y PRESUPUESTOS

AUTORIZÓ:
ING. RUBEN RINCON RAMOS
DIRECTOR D.O.P.D.U.Y.E.

	
CONTRATISTA: DENISSE MACHADO OROZCO	
DEPENDENCIA: DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	
DOMICILIO: Calle. Const. Heriberto Jara N. 1961, Colonia: Loc. Libertad, C.P. 80180, Culiacán, Sinaloa, Código Postal: 80180	
R.F.C. MAOD870024MZ9.	OBRA: RENABILITACIÓN DE COMEDOR PÚBLICO EN LA COMUNIDAD DE LA SOLEDAD, PERTENECIENTE A LA SINDICATURA DE SANTIAGO DE LOS CABALLEROS, DEL MUNICIPIO DE BADIRAGUATO, SINALOA.
CROQUIS ESTIMACION:	
CLAVE	CONCEPTO
1	PRELIMINARES
GP01	TRAZO Y NIVELACIÓN DEL TERRENO ESTABLECIENDO EJES Y NIVELETAS DE REFERENCIA, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.
GBR39	DESMANTELAMIENTO DE INSTALACIONES, INCLUYE: RETIRO DE MATERIAL A UN LUGAR AUTORIZADO POR SUPERVISION, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.
GP17	EXCAVACIÓN POR MEDIOS MANUALES EN MATERIAL TIPO "B" DE 0.00 A 2.00 MTS.
GP26	RELLENO COMPACTADO AL 95% CON BAILARINA EN CAPAS DE 20 CMS DE ESPESOR CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN, INCLUYE: AGUA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU TERMINACIÓN.
GP03	CARGA Y ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN Y/O DEMOLICIONES MEDIDO COMPACTO, 1ER KILÓMETRO.
GP033	AFINE DE FONDOS Y TALUDES DE LAS EXCAVACIONES HECHAS INCLUYE: MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.

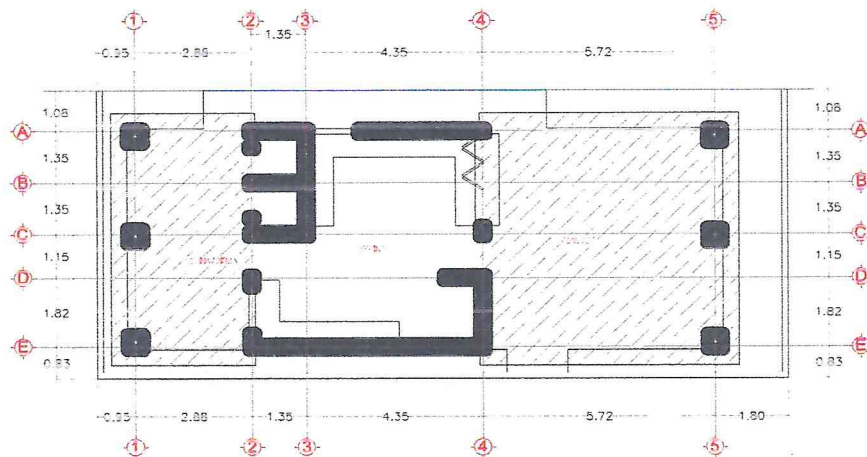

ELABORO.-

 C. DENISSE MACHADO OROZCO
 REPRESENTANTE LEGAL


REVISÓ.-

 SUPERVISOR

AUTORIZO.-

 ING. RUBIEL RINCON RAMOS
 DIRECTOR O. P. D. U. Y. E.

	
CONTRATISTA:	DEPENDENCIA:
DENISSE MACHADO OROZCO	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA
DOMICILIO:	Calle. Const. Heriberto Jara N. 1961, Colonia: Loc. Libertad, C.P. 80180, Culiacán, Sinaloa, Código Postal: 80180
R.F.C.	MAOD870924MZ9.
OBRA:	REHABILITACIÓN DE COMEDOR PÚBLICO EN LA COMUNIDAD DE LA SOLEDAD, PERTENECIENTE A LA SINDICATURA DE SANTIAGO DE LOS CABALLEROS, DEL MUNICIPIO DE BADRAGUATO, SINALOA.
CROQUIS ESTIMACIÓN:	
2	CIMENTACION
GP2448	PLANTILLA DE CONCRETO SIMPLE DE 5 CM. DE ESPESOR PARA DESPLANTE DE CIMENTACION CON CONCRETO F'C=100 KG/CM2 T.M.A. 3/4", INCLUYE : SUMINISTRO DE MATERIALES, FABRICACIÓN Y COLADO DE CONCRETO, REGLEADO, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.
GP206	ZAPATA AISLADA DE 1.0X1.0X0.20 MTS DE ESPESOR ARMADA CON VARILLA DE 3/8" @ 15 CMS EN AMBAS DIRECCIONES , COLADA CON CONCRETO HECHO EN OBRA CON F'C=250 KG/CM, INCLUYE: MANO DE OBRA, MATERIALES, HERRAMIENTA Y EQUIPO.
GP209	DADO DE 20X20 CM ARMADO CON ARMEX DALA Y REFORZADO CON 2 VARILLAS DE 3/8", CONCRETO HECHO EN OBRA CON UN F'C=200 KG/CM2, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTAS.
GBR89	CADENA DE DESPLANTE DE 20X35 CM, ARMADO CON ARMEX Y 2 VARS #3, INCLUYE: EXCAVACION, TRASLADOS, ACARREOS, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

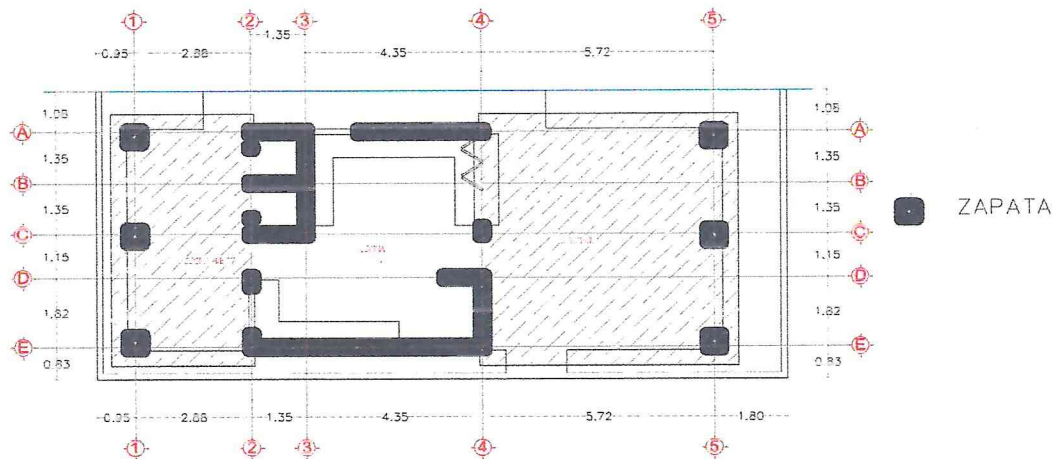

REVISOR-

SUPERVISOR



AUTORIZO-

ING. RUBIEL RINCON RAMOS
DIRECTOR O. P. D. U. Y E.

ELABORO-

C. DENISSE MACHADO OROZCO
REPRESENTANTE LEGAL

	
CONTRATISTA:	DEPENDENCIA:
DENISSE MACHADO OROZCO	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA
DOMICILIO: Calle. Const. Heriberto Jara N. 1961, Colonia: Loc. Libertad, C.P. 80180, Culiacán, Sinaloa, Código Postal: 80180	
R.F.C.	MAOD870924MZ9.
OBRA:	REHABILITACIÓN DE COMEDOR PÚBLICO EN LA COMUNIDAD DE LA SOLEDAD, PERTENECIENTE A LA SINDICATURA DE SANTIAGO DE LOS CABALLEROS, DEL MUNICIPIO DE BADIRAGUATO, SINALOA.
CROQUIS ESTIMACION:	
3	ESTRUCTURA
GBR60	COLUMNA DE 20X25 CM, ARMADO CON 4 VARS #3, EST. @20 CMS, INCLUYE: TRASLADOS DE MATERIALES, ACARREOS, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.
GBR92	CADENA DE CERRAMIENTO DE 20X35 CM, ARMADO CON ARMEX Y 2 VARS #3, INCLUYE: TRASLADOS DE MATERIALES, ACARREOS, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.
GP505	MURO DE BLOCK 15X20X40 CMS, DE ALTURA PROMEDIO 60 CMS INCLUYE: TRASLADOS DE MATERIALES, ACARREOS, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.
GP237	LOSA DE 10 CM DE ESPESOR CON CONCRETO F'C= 200 KG/CM HECHO EN OBRA, ARMADO CON VARILLA DE 3/8" @ 20 CMS EN AMBOS SENTIDOS, INCLUYE: TRASLADOS DE MATERIAL, ACARREOS, CIMBRA, MANO DE OBRA, MATERIALES, EQUIPO Y HERRAMIENTAS.
GP2515	FIRME DE CONCRETO F'C=200 KG/CM2 DE 10 CM DE ESPESOR INCLUYE: TRASLADO DE MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, CIMBRA, NIVELACION Y COMPACTACION.

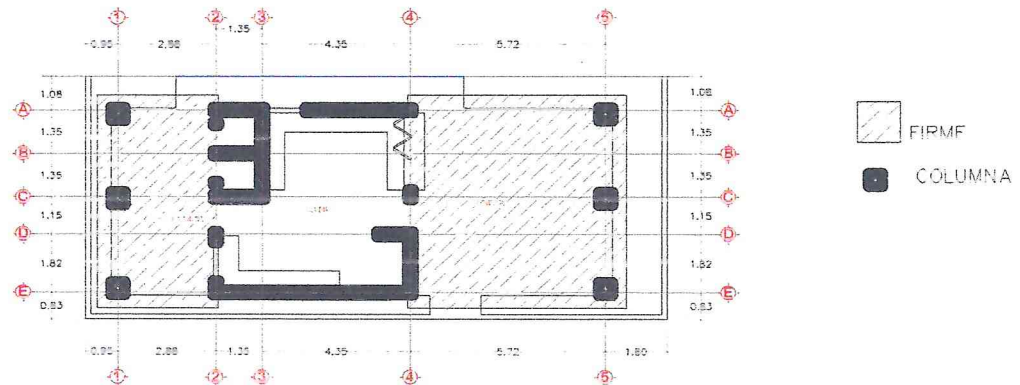

ELABORA

 C. DENISSE MACHADO OROZCO
 REPRESENTANTE LEGAL

REVISÓ.-


 SUPERVISOR

AUTORIZO.-

 ING. RUBIEL RINCON RAMOS
 DIRECTOR O. P. D. U. Y. E.

DENISSE MACHADO OROZCO



OBRA:	REHABILITACIÓN DE COMEDOR PÚBLICO EN LA COMUNIDAD DE LA SOLEDAD, PERTENECIENTE A LA SINDICATURA DE SANTIAGO DE LOS CABALLEROS, DEL MUNICIPIO DE BADIRAGUATO, SINALOA.
ESTIMACIÓN:	01 NORMAL

REPORTE FOTOGRAFICO DE ESTIMACION

PRELIMINARES

1	
GP01	TRAZO Y NIVELACIÓN DEL TERRENO ESTABLECIENDO EJES Y NIVELETAS DE REFERENCIA, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.
GP17	DESMANTELAMIENTO DE INSTALACIONES, INCLUYE: RETIRO DE MATERIAL A UN LUGAR AUTORIZADO POR SUPERVISION, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.
GP17	EXCAVACIÓN POR MEDIOS MANUALES EN MATERIAL TIPO "B" DE 0.00 A 2.00 MTS.
GP26	RELLENO COMPACTADO AL 95% CON BAILARINA EN CAPAS DE 20 CMS DE ESPESOR CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN, INCLUYE: AGUA, MANO DE OBRA,
GP03	CARGA Y ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN Y/O DEMOLICIONES MEDIDO COMPACTO, 1ER KILÓMETRO.
GP033	AFINE DE FONDOS Y TALUDES DE LAS EXCAVACIONES HECHAS INCLUYE: MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.



ELABORO.-

C. DENISSE MACHADO OROZCO
REPRESENTANTE LEGAL

REVISO.-

SUPERVISOR

AUTORIZO.-

ING. RUBIEL RINCON RAMOS
DIRECTOR DE O.P.D.U. Y E.



DENISSE MACHADO OROZCO

OBRAS:		REHABILITACIÓN DE COMEDOR PÚBLICO EN LA COMUNIDAD DE LA SOLEDAD, PERTENECIENTE A LA SINDICATURA DE SANTIAGO DE LOS CABALLEROS, DEL MUNICIPIO DE BADIRAGUATO, SINALOA.
ESTIMACION:		01 NORMAL
REPORTE FOTOGRAFICO DE ESTIMACION		
CIMENTACION		
2		
GP2448	PLANTILLA DE CONCRETO SIMPLE DE 5 CM. DE ESPESOR PARA DESPLANTE DE CIMENTACION CON CONCRETO F'C=100 KG/CM2 T.M.A. 3/4", INCLUYE : SUMINISTRO DE	
GP206	ZAPATA AISLADA DE 1.0X1.0X0.20 MTS DE ESPESOR ARMADA CON VARILLA DE 3/8" @ 15 CMS EN AMBAS DIRECCIONES , COLADA CON CONCRETO HECHO EN OBRA CON	
GP209	DADO DE 20X20 CM ARMADO CON ARMEX DALA Y REFORZADO CON 2 VARILLAS DE 3/8", CONCRETO HECHO EN OBRA CON UN F'C=200 KG/CM2, INCLUYE: MATERIALES, MANO	
GBR89	CADENA DE DESPLANTE DE 20X35 CM, ARMADO CON ARMEX Y 2 VARS #3, INCLUYE: EXCAVACION, TRASLADOS, ACARREOS, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA,	



ELABORO.-
C. DENISSE MACHADO OROZCO
DEDICATANTE I FGA

REVISO.-

SUPERVISOR

AUTORIZO.-
ING. RUBIEL RINCON RAMOS
DIRECTOR DE O.P.D.U. Y E.

DENISSE MACHADO OROZCO



OBRA:	REHABILITACIÓN DE COMEDOR PÚBLICO EN LA COMUNIDAD DE LA SOLEDAD, PERTENECIENTE A LA SINDICATURA DE SANTIAGO DE LOS CABALLEROS, DEL MUNICIPIO DE BADIRAGUATO, SINALOA.
ESTIMACION:	01 NORMAL

REPORTE FOTOGRAFICO DE ESTIMACION	
ESTRUCTURA	
3	
GBR80	COLUMNA DE 20X25 CM, ARMADO CON 4 VARS #3, EST. @20 CMS, INCLUYE: TRASLADOS DE MATERIALES, ACARREOS, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y
GBR92	CADENA DE CERRAMIENTO DE 20X35 CM, ARMADO CON ARMEX Y 2 VARS #3, INCLUYE: TRASLADOS DE MATERIALES, ACARREOS, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA,
GP505	MURO DE BLOCK 15x20x40 CMS, DE ALTURA PROMEDIO 60 CMS INCLUYE: TRASLADOS DE MATERIALES, ACARREOS, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y
GP237	LOSA DE 10 CM DE ESPESOR CON CONCRETO F'C= DE 200 KG/CM HECHO EN OBRA, ARIMADO CON VARILLA DE 3/8" @ 20 CMS EN AMBOS SENTIDOS, INCLUYE: TRASLADOS DE
GP2515	FIRME DE CONCRETO F'C=200 KG/CM2 DE 10 CM DE ESPESOR NCLUYE: TRASLADO DE MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, CIMBRA, NIVELACION Y COMPACTACION.



ELABORO:-

C. DENISSE MACHADO OROZCO
REPRESENTANTE LEGAL

REVISO.-

SUPERVISOR

AUTORIZO.-

ING. RUBIEL RINCON RAMOS
DIRECTOR DE O.P.D.U. Y E.



Fecha y hora de consulta 29/09/2025 8:32:44 PM

Contrato
Nombre del Cliente

00798320
MUNICIPIO DE BADIRAGUATO

BBVA Net Cash - Pagos Mismo Banco

Operación autorizada

Datos del firmante

Usuario: ADMIN1

Poder: 100%

Datos de la operación

Tipo de operación: Pago Mismo Banco

Descripción: EST 01 NORM AD013

Importe de la operación: 314,139.18 MXP

Cuenta de retiro: 0124174836

Cuenta de depósito: 0488130388

Divisa de la cuenta: MXP

Divisa de la cuenta: MXP

Titular de la cuenta: MUNICIPIO DE BADIRAG
UATO

Titular de la cuenta: DENISSE MACHADO
OROZCO

Fecha de creación: 29/09/2025

Fecha de aplicación: 29/09/2025

Hora: 20:32:42

Instrumento de seguridad: ASD 6551749382

Motivo de pago: EST 01 NORM AD013

Datos de confirmación de la transferencia

Folio de firma: 0087402045

Folio único: I323202509292032420087402052

Estado operación

Porcentaje firmado: 100%

Estado: Operado

Detalle de firmas

Acción	Usuario	Porcentaje aportado	Fecha
CREO	ADMIN1	— %	29/09/2025
FIRMO	ADMIN1	100 %	29/09/2025

BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México

www.bbvanetcash.mx
