


MODALIDAD DE ADJUDICACIÓN	CONTRATO											DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	DOMICILIO DE LOS TRABAJOS	RECURSOS	NÚMERO DE PROCEDIMIENTO	NÚMERO DE CONTRATO	PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO	PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO
	NOMBRE O DENOMINACIÓN SOCIAL	MONTO AUTORIZADO	MONTO DEL CONTRATO	IMPORTE DEL CONVENIO	IMPORTE CONTRATADO + IMPORTE DEL CONVENIO	FECHA DE INICIO DE LOS TRABAJOS	FECHA DE TERMINACIÓN DE LOS TRABAJOS	PERIODO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS	PLAZO DEL CONVENIO	PERIODO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS + PLAZO DEL CONVENIO	FECHA DE TERMINACIÓN DE LOS TRABAJOS							
ADJUDICACIÓN DIRECTA ESTATAL	INFRAESTRUCTURA Y SUPERVISION INTEGRAL S.A. DE C.V.	\$800,000.00	\$800,000.00	N/A	N/A	23 DE ABRIL DE 2026	13 DE MAYO DE 2026	21 DÍAS NATURALES	N/A	21 DÍAS NATURALES	13 DE MAYO DE 2026	CONSTRUCCIÓN DE CISTERNA CON DOS TANQUES DE CAPACIDAD DE 10,000 LTS CADA TANQUE, DE LA UNIDAD REGIONAL LOS MOCHIS	BLVD. MACARIO GAXIOLA Y CARRETERA INT MÉXICO 15 S/N, LOS MOCHIS, SINALOA	RECURSOS PROPIOS 2026	UADEO-001-2026	UADEO-OP-ADE-001-2026	100%	100%
LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL PRESENCIAL	MICA SERVICIOS CONSTRUCTIVOS, S.A. DE C.V.; CEJEMA ARQUITECTURA, S.A. DE C.V. Y JOSE MARTIN LOPEZ CARRILLO	\$9,145,752.00	\$8,231,176.80	N/A	N/A	03 DE JULIO DE 2026	29 DE DICIEMBRE DE 2026	180 DÍAS NATURALES	N/A	180 DÍAS NATURALES	29 DE DICIEMBRE DE 2026	CONSTRUCCIÓN DE 2DA. ETAPA DE EDIFICIO "H", INCLUYE 05 AULAS, MÓDULO DE ESCALERAS, TERMINACIÓN MÓDULO BAÑOS EN PLANTA BAJA Y OBRA EXTERIOR DE EDIFICIO. UNIDAD REGIONAL GUAMÚCHIL	LÁZARO CÁRDENAS SN, INFONAVIT CHUTAMONAS, MAGISTERIO, 81470 GUAMÚCHIL, SINALOA	FAM 2026	UADEO-002-2026	UADEO-OP-ADE-001-2026	45%	35%
ADJUDICACIÓN DIRECTA ESTATAL	GRUPO DE INGENIEROS DE INFRAESTRUCTURA CIVIL, S.A. DE C.V.	\$1,000,000.00	\$1,000,000.00	N/A	N/A	28 DE AGOSTO DE 2026	26 DE SEPTIEMBRE DE 2026	30 DÍAS NATURALES	N/A	26 DE SEPTIEMBRE DE 2026	30 DÍAS NATURALES	ADECUACIONES Y MEJORAS EN LAS UNIDADES REGIONALES DE LOS MOCHIS Y EL FUERTE, DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE OCCIDENTE	BLVD. MACARIO GAXIOLA Y CARRETERA INT MÉXICO 15 S/N, LOS MOCHIS, SINALOA Y CARRETERA FUERTE DE CHOIX KM 1.5, C.P. 81820 EL FUERTE, SINALOA	RECURSOS PROPIOS 2026	UADEO-003-2026	UADEO-OP-ADE-002-2026	100%	100%
ADJUDICACIÓN DIRECTA ESTATAL	TANIA VANESSA HERRERA AGUIAR	\$1,262,000.50	\$1,262,000.50	N/A	N/A	14 DE SEPTIEMBRE DE 2026	13 DE OCTUBRE DE 2026	30 DÍAS NATURALES	N/A	13 DE OCTUBRE DE 2026	30 DÍAS NATURALES	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CANCELERÍAS, CRISTALES Y ALUMINIOS, EN LOS TALLERES DE GASTRONOMÍA DE LAS UNIDADES REGIONALES DE GUASAVE Y LOS MOCHIS	AV. UNIVERSIDAD S/N, FRACC. VILLA UNIVERSIDAD C.P. 81000, GUASAVE, SINALOA Y BLVD. MACARIO GAXIOLA Y CARRETERA INT MÉXICO 15 S/N, LOS MOCHIS, SINALOA	RECURSOS PROPIOS 2026	UADEO-004-2026	UADEO-OP-ADE-003-2026	100%	0%



ARQ. JOEL SEBASTIÁN GARCÍA REGALADO


DIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO

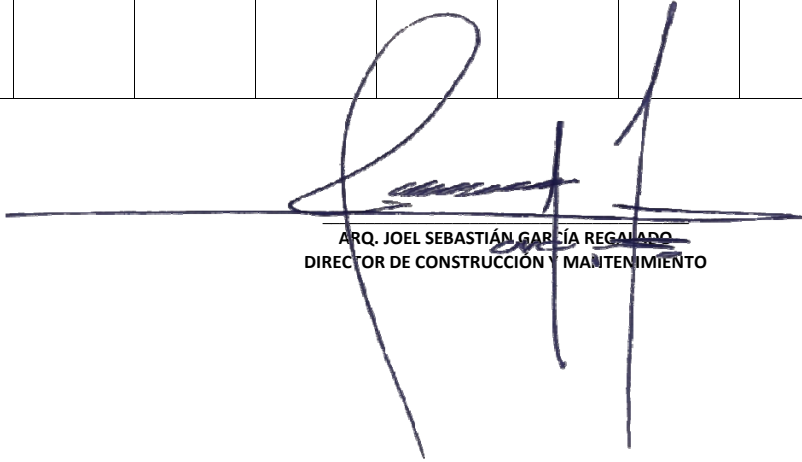



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE OCCIDENTE
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO
REPORTE TRIMESTRAL DE OBRA JULIO - SEPTIEMBRE 2026
REPORTE DE OBRAS PÚBLICAS
BD-OP-36-(20260709)

N°	CAMPO	Descripción del campo			
1	Año	2026	2026	2026	2026
2	Periodo	20260406	20260709	20260709	20260709
3	Cuenta_Contable	N/A	N/A	N/A	N/A
4	Nombre Cuenta Contable	N/A	N/A	N/A	N/A
5	Núm. de Obra	UADEO-001-2026	UADEO-002-2026	UADEO-003-2026	UADEO-004-2026
6	Municipio	AHOME	SALVADOR ALVARADO	AHOME Y EL FUERTE	GUASAVE Y AHOME
7	Localidad	LOS MOCHIS	GUAMÚCHIL	LOS MOCHIS Y EL FUERTE	GUASAVE Y LOS MOCHIS
8	Coordenadas Geográficas	25.813437, -108.962633	25.455486, -108.064840	25.813437, -108.962633; 26.429499, -108.588951	25.567855, -108.485613; 25.813437, -108.962633
9	Programa	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN
10	Subprograma	CONSTRUCCIÓN	CONSTRUCCIÓN	CONSTRUCCIÓN	CONSTRUCCIÓN
11	Nombre del Proyecto	CONSTRUCCIÓN DE CISTERNA CON DOS TANQUES DE CAPACIDAD DE 10,000 LTS CADA TANQUE, DE LA UNIDAD REGIONAL LOS MOCHIS	CONSTRUCCIÓN DE 2DA. ETAPA DE EDIFICIO "H", INCLUYE 05 AULAS, MÓDULO DE ESCALERAS, TERMINACIÓN MÓDULO BAÑOS EN PLANTA BAJA Y OBRA EXTERIOR DE EDIFICIO. UNIDAD REGIONAL GUAMÚCHIL	ADECUACIONES Y MEJORAS EN LAS UNIDADES REGIONALES DE LOS MOCHIS Y EL FUERTE, DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE OCCIDENTE	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CANCELERÍAS, CRISTALES Y ALUMINIOS, EN LOS TALLERES DE GASTRONOMÍA DE LAS UNIDADES REGIONALES DE GUASAVE Y LOS MOCHIS
12	Importe Total Autorizado	\$ 800,000.00	\$ 9,145,752.00	\$ 1,000,000.00	\$ 1,262,000.50
13	Origen Federal	N/A	FAM 2026	N/A	N/A
14	Importe	\$0.00	\$ 9,145,752.00	\$0.00	\$0.00
15	Origen Estatal	N/A	N/A	N/A	N/A
16	Importe	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
17	Origen Municipal	N/A	N/A	N/A	N/A
18	Importe	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
19	Otras Inversiones	RECURSOS PROPIOS 2026	N/A	RECURSOS PROPIOS 2026	RECURSOS PROPIOS 2026
20	Origen	UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE OCCIDENTE	N/A	UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE OCCIDENTE	UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE OCCIDENTE
21	Importe	\$ 800,000.00	\$0.00	\$ 1,000,000.00	\$ 1,262,000.50
22	Modalidad de Ejecución	CONTRATO	CONTRATO	CONTRATO	CONTRATO
23	Tipo de Contratación	ADJUDICACIÓN DIRECTA ESTATAL	LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL PRESENCIAL	ADJUDICACIÓN DIRECTA ESTATAL	ADJUDICACIÓN DIRECTA ESTATAL
24	Nombre del Contratista o Proveedor	INFRAESTRUCTURA Y SUPERVISION INTEGRAL S.A. DE C.V.	MICA SERVICIOS CONSTRUCTIVOS, S.A. DE C.V.; CEJEMA ARQUITECTURA, S.A. DE C.V. Y JOSE MARTIN LOPEZ CARRILLO	GRUPO DE INGENIEROS DE INFRAESTRUCTURA CIVIL, S.A. DE C.V.	TANIA VANESSA HERRERA AGUIAR
25	Representante legal	C. ANGEL ALFONSO OCHOA DEL VALLE	C. FRANCISCO MIGUEL CAMACHO; C. CESAR MARTIN MIGUEL CAMACHO Y C. JOSE MARTIN LOPEZ CARRILLO	C. ROMUALDO DANIEL RIOS PERALTA	C. TANIA VANESSA HERRERA AGUIAR
26	Número de Contrato	UADEO-OP-ADE-001-2026	UADEO-OP-FAM-LPE-001-2026	UADEO-OP-ADE-002-2026	UADEO-OP-ADE-003-2026
27	Importe del Contrato / Administración Directa	\$ 800,000.00	\$ 8,653,608.18	\$ 1,000,000.00	\$ 1,262,000.50
28	Fecha del contrato	22 DE ABRIL DE 2026	01 DE JULIO DE 2026	27 DE AGOSTO DE 2026	10 DE SEPTIEMBRE DE 2026
29	Fecha Inicio de Ejecución	23 DE ABRIL DE 2026	03 DE JULIO DE 2026	28 DE AGOSTO DE 2026	14 DE SEPTIEMBRE DE 2026
30	Fecha Terminación de Ejecución	13 DE MAYO DE 2026	29 DE DICIEMBRE DE 2026	26 DE SEPTIEMBRE DE 2026	13 DE OCTUBRE DE 2026
31	Porcentaje Avance Físico	100%	45%	100%	100%
32	Importe Ejercido	\$ 800,000.00	\$2,880,911.88	\$ 974,137.93	\$ -
33	Porcentaje Avance Financiero	100%	35%	100%	0%
34	Beneficiarios	2,033	529	2,618	1,775
35	Estatus	CONCLUIDA	EN PROCESO	CONCLUIDA	CONCLUIDA
36	Fecha de convenio modificatorio al contrato	N/A	N/A	N/A	N/A
37	Tipo de convenio modificatorio	N/A	N/A	N/A	N/A
38	Importe del convenio modificatorio	N/A	N/A	N/A	N/A
39	Días que se incrementan con el convenio	N/A	N/A	N/A	N/A
40	Fecha del acta de entrega recepción	13 DE MAYO DE 2026	N/A	15 DE SEPTIEMBRE DE 2026	N/A
41	Fecha del acta de suspensión	N/A	N/A	N/A	N/A



ARQ. JOEL SEBASTIÁN GARCÍA
DIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO
