

MARIA DE LA LUZ VALENZUELA PASOS
CARRETERA CONCORDIA - EL VERDE No.3
CONCORDIA, SINALOA
R.F.C.
VAPL-570617-JS3

I.M.S.S.
L51-11198-10-1



MUNICIPIO DE ESCUINAPA, SINALOA
DIRECCION DE OBRAS, SERVICIOS PUBLICOS
Y ECOLOGIA
ESCUINAPA, SINALOA

HOJA: 1 de 1



CONCEPTOS DE ESTIMACION

CONTRATO: **ESC-FAISMUN-2025-012** ESTIMACION: **01 (Finiquito)**
PERIODO: **13-ago-25** AL **11-oct-25** LOCALIDAD: **ISLA DEL BOSQUE** MUNICIPIO: **ESCUINAPA**
DESCRIPCION: **CONSTRUCCION DE TECHO FIRME 4 X 4 M2 EN LA SINDICATURA DE ISLA DEL BOSQUE, ESCUINAPA, SINALOA**

IMPORTE DE OBRA: **\$406,035.27**
IMPORTE DE ANTICIPO DE OBRA: **\$142,112.35**
IMPORTE TOTAL DE CONTRATO: **\$406,035.27**

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	SEGUN PROYECTO			HASTA ESTA ESTIMACION	HASTA ESTIMACION ANTERIOR	EXCEDENTE	DE ESTA ESTIMACION	IMPORTE
			VOL	PU	\$					
TECHOS DE CONCRETO EN LA SINDICATURA DE ISLA DEL BOSQUE.										
TRA	Trazo de terreno, el precio incluye: material, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución.	M2	144.00	\$ 6,860.00	\$ 987.84	144.00	0.00	0.00	144.00	987.84
CIM-LS	Cimbra y descimbra en losas con tarimas de triplay 1.22 x 2.44 Incluye: Materiales, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución.	M2	144.00	\$ 780.66	\$ 112,415.04	144.00	0.00	0.00	144.00	112,415.04
ACRVR	Acero de refuerzo del núm. 3, (3/8") fyp = 4200 kg/ml, en losa de techo , incluye: habilitado y armado, materiales, mano de obra, equipo, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.	TON	0.90	\$ 38,439.48	\$ 34,595.53	0.90	0.00	0.00	0.90	34,595.53
SM-CO	Suministro y colocación de concreto simple de 10 cm de espesor, acabado común, concreto hecho en obra de f'c= 200 kg/cm2,incluye: material, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución.	M2	144.00	\$ 701.86	\$ 101,067.84	144.00	0.00	0.00	144.00	101,067.84
SE-AL	Salida de electricidad para alumbrado a base de tubo conduit pared delgada de 13 mm., con un desarrollo de 4 mts, con cable thw cal. 12 , con dos cajas conduit T-9, T-29 serie 9, El precio incluye: conectores pared delgada de 13 mm, coples de 13 mm, abrazaderas de uña, apagador y placa sencilla marca quinziflo, caja de registro de 1/2" y soque de sobreponer. incluye: material, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución.	SAL	9.00	\$ 1,613.36	\$ 14,520.24	9.00	0.00	0.00	9.00	14,520.24
SE-AB	Salida de electricidad para abanico a base de tubo conduit pared delgada de 13 mm., con un desarrollo de 10 mts, con cable thw cal. 12 , con dos cajas conduit T-9, T-29 serie 9, y una FS-1 de 13 mm; El precio incluye: conectores pared delgada de 13 mm, coples de 13 mm, abrazaderas de uña, apagador y placa sencilla marca quinziflo, caja de registro de 1/2" y soque de sobreponer. incluye: material, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución.	SAL	9.00	\$ 1,613.36	\$ 14,520.24	9.00	0.00	0.00	9.00	14,520.24
PRET	Pretit block de concreto 9x14x28 con mortero cemento 1:5 14cm. de espesor acabado comun, incluye: acarreo 1a. estacion a 20.00m, incluye: material, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ML	144.00	\$ 193.56	\$ 27,872.64	144.00	0.00	0.00	144.00	27,872.64
CHAF	Chaffan de 10 x 10 asentado con mezcla cemento arena de proporción 1:5, incluye: material, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ML	144.00	\$ 253.77	\$ 36,542.88	144.00	0.00	0.00	144.00	36,542.88
LIMP-F	Limpieza final de la obra, incluye: material, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución.	M2	144.00	\$ 52.14	\$ 7,508.16	144.00	0.00	0.00	144.00	7,508.16

TOTAL TECHOS DE CONCRETO EN LA SINDICATURA DE OJO DE ISLA DEL BOSQUE.: \$ **350,030.41**

TOTAL DE ESTIMACION:

\$ **350,030.41**

ELABORÓ

C. MARIA DE LA LUZ VALENZUELA PASOS
CONTRATISTA

REVISÓ

ARQ. SILVIA ZAYDEE PADILLA CRESPO
SUPERVISOR DE OBRAS PUBLICAS

AUTORIZÓ

M. en ARQ. GRACIELA ELIZALDE SANTOS
DIRECTORA DE OBRAS, SERVICIOS
PUBLICOS Y ECOLOGIA

MARIA DE LA LUZ VALENZUELA PASOS
CARRETERA CONCORDIA - EL VERDE No.3
CONCORDIA, SINALOA
R.F.C.
VAPL-570617-JS3

I.M.S.S.
L51-11198-10-1



MUNICIPIO DE ESCUINAPA, SINALOA
DIRECCION DE OBRAS, SERVICIOS PUBLICOS
Y ECOLOGIA
ESCUINAPA, SINALOA

HOJA: 1 de 1



RESUMEN DE ESTIMACION

CONTRATO: **ESC-FAISMUN-2025-012**
PERIODO: **13-ago-25** AL **11-oct-25** LOCALIDAD: **ISLA DEL BOSQUE** ESTIMACION: **01 (Finiquito)**
MUNICIPIO: **ESCUINAPA**
DESCRIPCION: **CONSTRUCCION DE TECHO FIRME 4 X 4 M2 EN LA SINDICATURA DE ISLA DEL BOSQUE, ESCUINAPA, SINALOA**
IMPORTE DE OBRA: **\$406,035.27** CONVENIO ADICIONAL:
IMPORTE DE ANTICIPO DE OBRA: **\$142,112.35** PERIODO CONVENIO ADICIONAL: DEL AL
IMPORTE TOTAL DE CONTRATO: **\$406,035.27**

TECHOS DE CONCRETO EN LA SINDICATURA DE ISLA DEL BOSQUE.

OBRA	IMPORTE
TECHOS DE CONCRETO EN LA SINDICATURA DE ISLA DEL BOSQUE.	\$ 350,030.41

SUB TOTAL= \$ 350,030.41
I.V.A \$ 56,004.86
TOTAL = \$ 406,035.27

Elaboró

C. MARIA DE LA LUZ VALENZUELA PASOS
CONTRATISTA

Revisó

ARQ. SILVIA ZAYDEE PADILLA CRESPO
SUPERVISOR DE OBRAS PUBLICAS

Autorizó

M. en ARQ. GRACIELA ELIZALDE SANTOS
DIRECTORA DE OBRAS, SERVICIOS
PUBLICOS Y ECOLOGIA



MARIA DE LA LUZ VALENZUELA PASOS
CARRETERA CONCORDIA - EL VERDE No.3
CONCORDIA, SINALOA
R.F.C.
VAPL-570617-JS3

I.M.S.S.
L51-11198-10-1



MUNICIPIO DE ESCUINAPA, SINALOA
DIRECCION DE OBRAS, SERVICIOS PUBLICOS

ESCUINAPA, SINALOA



ESTADO DE CUENTA

ESTIMACION: 01 (Finiquito)
MUNICIPIO: ESCUINAPA

LOCALIDAD: ISLA DEL BOSQUE

DESCRIPCION: CONSTRUCCION DE TECHO FIRME 4 X 4 M2 EN LA SINDICATURA DE ISLA DEL BOSQUE, ESCUINAPA, SINALOA

FECHA INICIO CONTRATO: 13-ago-25
FECHA TERMINACION CONTRATO: 11-oct-25
FECHA CONTRATO: 12-ago-25

CONTRATO: ESC-FAISMUN-2025-012

IMPORTE DE OBRA: \$406,035.27 CLAVE DE CONVENIO ADICIONAL:
IMPORTE DE ANTICIPO DE OBRA: \$142,112.35 PERIODO CONVENIO ADICIONAL:
IMPORTE TOTAL DE CONTRATO: \$406,035.27 IMPORTE CONVENIO ADICIONAL:

AL

No. DE ESTIMACION	PERIODO	IMPORTE ESTIMACION \$	IMPORTE IVA \$	SIN	3% ORGANISMO INTERNO DE CONTROL MPAL Y CONGRESO DEL EDO.	35% AMORTIZACION ANTICIPO \$	TOTAL DEDUCCIONES \$	LIQUIDO A PAGAR \$
01 (Finiquito)	13-ago-25 11-oct-25	\$ 406,035.27	\$ 350,030.41	\$	10,500.91	\$ 142,112.34	\$ 152,613.25	\$ 253,422.02
TOTALES:		\$ 406,035.27	\$ 350,030.41	\$	10,500.91	\$ 142,112.34	\$ 152,613.25	\$ 253,422.02
SALDO DEL CONTRATO:		\$0.00			SALDO POR AMORTIZAR:	\$0.00		

REALIZÓ

C. MARIA DE LA LUZ VALENZUELA PASOS
CONTRATISTA

REVISÓ

ARQ. SILVIA ZAYDEE PADILLA CRESPO
SUPERVISOR DE OBRAS PUBLICAS

AUTORIZÓ

M. en ARQ. GRACIELA ELIZALDE SANTOS
DIRECTORA DE OBRAS, SERVICIOS PUBLICOS Y ECOLOGIA

AUTORIZÓ

L.C.P. JOSE TRINIDAD IBARRA MARTINEZ
TESORERO MUNICIPAL

CARATULA DE RECIBO

Hoja: 1 de 1

RECIBO MUNICIPAL No. 01 (Finiquito)

MARIA DE LA LUZ VALENZUELA PASOS
CARRETERA CONCORDIA - EL VERDE No.3
CONCORDIA, SINALOA

TELEFONO: CEL: 694-968-1382

R.F.C.
VAPL-570617-JS3

UBICACION:
CONCORDIA, SIN.
I.M.S.S.
L51-11198-10-1

FECHA : 11-oct-25
ESTIMACION No: 01 (Finiquito)
PERIODO:
DEL 13-ago-25
AL 11-oct-25
FECHA DE CONTRATO: 12-ago-25
PERIODO DE EJECUCION DEL CONTRATO:
INICIO: 13-ago-25
TERMINACION: 11-oct-25
PRORROGA:
DEL
AL

DESCRIPCION:

CONSTRUCCION DE TECHO FIRME 4 X 4 M2 EN LA SINDICATURA DE ISLA DEL BOSQUE,
ESCUINAPA, SINALOA

CONTRATO NO:

ESC-FAISMUN-2025-012

IMPORTE SIN IVA	IMPORTE CON IVA	35% ANTICIPO	IMPORTE TOTAL DE CONTRATO:
\$350,030.41	\$406,035.27	\$142,112.35	\$406,035.27
			BUENO POR: \$253,422.02

RECIBI DE LA TESORERIA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE ESCUINAPA, SINALOA, LA CANTIDAD DE:

\$253,422.02 SON: (DOSCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS VEINTIDOS PESOS 02/100 M.N.

EN PAGO DE ESTIMACION 01 (Finiquito)

DEDUCCIONES:

AMORTIZACION ANTICIPO 35% (*)	\$ 122,510.64
MAS I.V.A.	\$ 19,601.70
TOTAL AMORTIZACION DE ANTICIPO	\$ 142,112.34
3% ORGANO INTERNO DE CONTROL MPAL Y CONGRESO DEL ESTADO: (*)	\$ 10,500.91
TOTAL DE DEDUCCIONES:	\$ 152,613.25

CALCULO DE ESTIMACION

IMPORTE DE LA OBRA EJECUTADA SIN IVA	\$ 350,030.41
DEDUCCION ANTICIPO (35%):	-\$ 122,510.64
SUMA:	\$ 227,519.77
MAS I.V.A. 16 %	\$ 36,403.16
TOTAL:	\$ 263,922.93
DEDUCCION SVIFC (3%):	-\$ 10,500.91
LIQUIDO A PAGAR:	\$ 253,422.02

(*) DEL IMPORTE EJECUTADO SIN IVA.

SALDO A PAGAR: \$ 253,422.02

REALIZÓ



C. MARIA DE LA LUZ VALENZUELA PASOS
CONTRATISTA

REVISÓ


ARQ. SILVIA ZAYDEE PADILLA CRESPO
SUPERVISOR DE OBRAS PUBLICAS

AUTORIZÓ



M. en ARQ. GRACIELA ELIZALDE SANTOS
DIRECTORA DE OBRAS, SERVICIOS
PUBLICOS Y ECOLOGIA

AUTORIZÓ



L.C.P. JOSE TRINIDAD IBARRA MARTINEZ
TESORERO MUNICIPAL

María de La Luz Valenzuela Pasos

Construcción de obra civil

PUBLICA y PRIVADA

Carretera Municipal Libre
Concordia-El Verde, No. 3.
Ciudad: Concordia, Sinaloa.

Rfc : VAPL570617-JS3
Registro patronal: L51-11198-10-1
Tel Oficina: 01-694-96-813-82

Escuinapa, Sinaloa a 11 de octubre de 2025

Recibo No. **1 (Uno)**
Bueno por: **\$253,422.02**

RECIBI DE TESORERIA DEL MUNICIPIO DE ESCUINAPA LA CANTIDAD DE: -----
\$253,422.02 (DOSCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS VEINTIDOS PESOS 02/100 M.N.).

POR CONCEPTO DE:
PAGO CORRESPONDIENTE A LA **ESTIMACION No.1 (FINIQUITO)** DEL CONTRATO No.
ESC-FAISMUN-2025-012 DE LA OBRA DE DESIGNACION:

- CONSTRUCCION DE TECHO FIRME 4 X 4 M2 EN LA SINDICATURA DE ISLA DEL BOSQUE, ESCUINAPA, SINALOA.

Monto total Contratado =	\$406,035.27	(Son Cuatrocientos Seis Mil Treinta y Cinco Pesos 27/100 M.N.)
IMPORTE DE ESTIMACION:		\$350,030.41
SUBTOTAL:		\$350,030.41
16% IVA:		\$56,004.86
TOTAL:		\$406,035.27
DEDUCCIONES:		
AMORTIZACION ANTICIPO 35%:		\$142,112.34
CONGRESO DEL ESTADO 3%:		\$10,500.91
TOTAL NETO A COBRAR:		\$253,422.02

ATENTAMENTE:



María de la Luz Valenzuela Pasos
Contratista

MARIA DE LA LUZ VALENZUELA PASOS
CARRETERA CONCORDIA - EL VERDE No.3
CONCORDIA, SINALOA
R.F.C.
VAPL-670617-JS3

I.M.S.S.
L51-11198-10-1



MUNICIPIO DE ESCUINAPA, SINALOA
DIRECCION DE OBRAS, SERVICIOS PUBLICOS
Y ECOLOGIA
ESCUINAPA, SINALOA

HOJA: 1 de 1



NUMEROS GENERADORES

LOCALIDAD: ISLA DEL BOSQUE ESTIMACION: 01 (Finiquito)
MUNICIPIO: ESCUINAPA
DESCRIPCION: CONSTRUCCION DE TECHO FIRME 4 X 4 M2 EN LA SINDICATURA DE ISLA DEL BOSQUE, ESCUINAPA, SINALOA

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	LOCALIZACIÓN			LARGO	ANCHO	ALTO	RESULTADO	OBSERVACIONES
			EJE	TRAMO	PZAS					
TECHOS DE CONCRETO EN LA SINDICATURA DE ISLA DEL BOSQUE.										
TRA	Traza de terreno, el precio incluye: material, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución.	M2			9.00	4.00	4.00		144.00	
CIM-LS	Cimbra y descimbra en losas con tarimas de triplay 1.22 x 2.44 Incluye: Materiales, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución.	M2			9.00	4.00	4.00		144.00	
ACRVR	Acero de refuerzo del núm. 3, (3/8") fyp = 4200 kg/ml, en losa de techo, incluye: habilitado y armado, materiales, mano de obra, equipo, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.	TON		9.00	4.00/0.20= 21 pzas(4.00)=84 ml		0.00056		0.42336	
				9.00	4.00/0.20= 21 pzas(4.00)= 84 ml		0.00056		0.42336	
				9.00	4.00/0.20= 11 pzas(1.00)= 11 ml		0.00056		0.05544	
									0.90	
SM-CO	Suministro y colocación de concreto simple de 10 cm de espesor, acabado común, concreto hecho en obra de f'c= 200 kg/cm2.incluye: material, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución.	M2			9.00	4.00	4.00		144.00	
SE-AL	Salida de electricidad para alumbrado a base de tubo conduit pared delgada de 13 mm., con un desarrollo de 4 mts, con cable thw cal. 12, con dos cajas conduit T-9, T-29 serie 9; El precio incluye: conectores pared delgada de 13 mm, coples de 13 mm, abrazaderas de uña, apagador y placa sencilla marca quinziflo, caja de registro de 1/2" y soque de sobreponer. incluye: material, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución.	SAL			9.00				9.00	
SE-AB	Salida de electricidad para abanico a base de tubo conduit pared delgada de 13 mm., con un desarrollo de 10 mts, con cable thw cal. 12, con dos cajas conduit T-9, T-29 serie 9, y una FS-1 de 13 mm; El precio incluye: conectores pared delgada de 13 mm, coples de 13 mm, abrazaderas de uña, apagador y placa sencilla marca quinziflo, caja de registro de 1/2" y soque de sobreponer. incluye: material, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución.	SAL			9.00				9.00	
PRET	Pretil block de concreto 9x14x28 con mortero cem-are 1:5 14cm. de espesor acabado comun, incluye: acarreo 1a. estacion a 20.00m. incluye: material, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ML			9.00	16.00			144.00	
CHAF	Chafan de 10 x 10 asentado con mezcla cemento arena de proporción 1:5, incluye: material, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ML			9.00	16.00			144.00	
LIMP-F	Limpieza final de la obra, incluye: material, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución.	M2			9.00	4.00	4.00		144.00	

ELABORÓ

ING. AARON MORAN HIDALGO
SUPERINTENDENTE DE OBRA

AUTORIZÓ

ARQ. SILVIA ZAYDEE PADILLA CRESPO
SUPERVISOR DE OBRAS PUBLICAS

MARIA DE LA LUZ VALENZUELA PASOS
CARRETERA CONCORDIA - EL VERDE No.3
CONCORDIA, SINALOA
R.F.C.
VAPL-570617-JS3

I.M.S.S.
L51-11198-10-1



MUNICIPIO DE ESCUINAPA, SINALOA
DIRECCION DE OBRAS, SERVICIOS PUBLICOS
Y ECOLOGIA
ESCUINAPA, SINALOA

HOJA: 1 de 3




CROQUIS

LOCALIDAD: ISLA DEL BOSQUE

ESTIMACION: 01 (Finiquito)
MUNICIPIO: ESCUINAPA

DESCRIPCION: CONSTRUCCION DE TECHO FIRME 4 X 4 M2 EN LA SINDICATURA DE ISLA DEL BOSQUE, ESCUINAPA, SINALOA

ALZADO PRINCIPAL TECHO FIRME TIPO

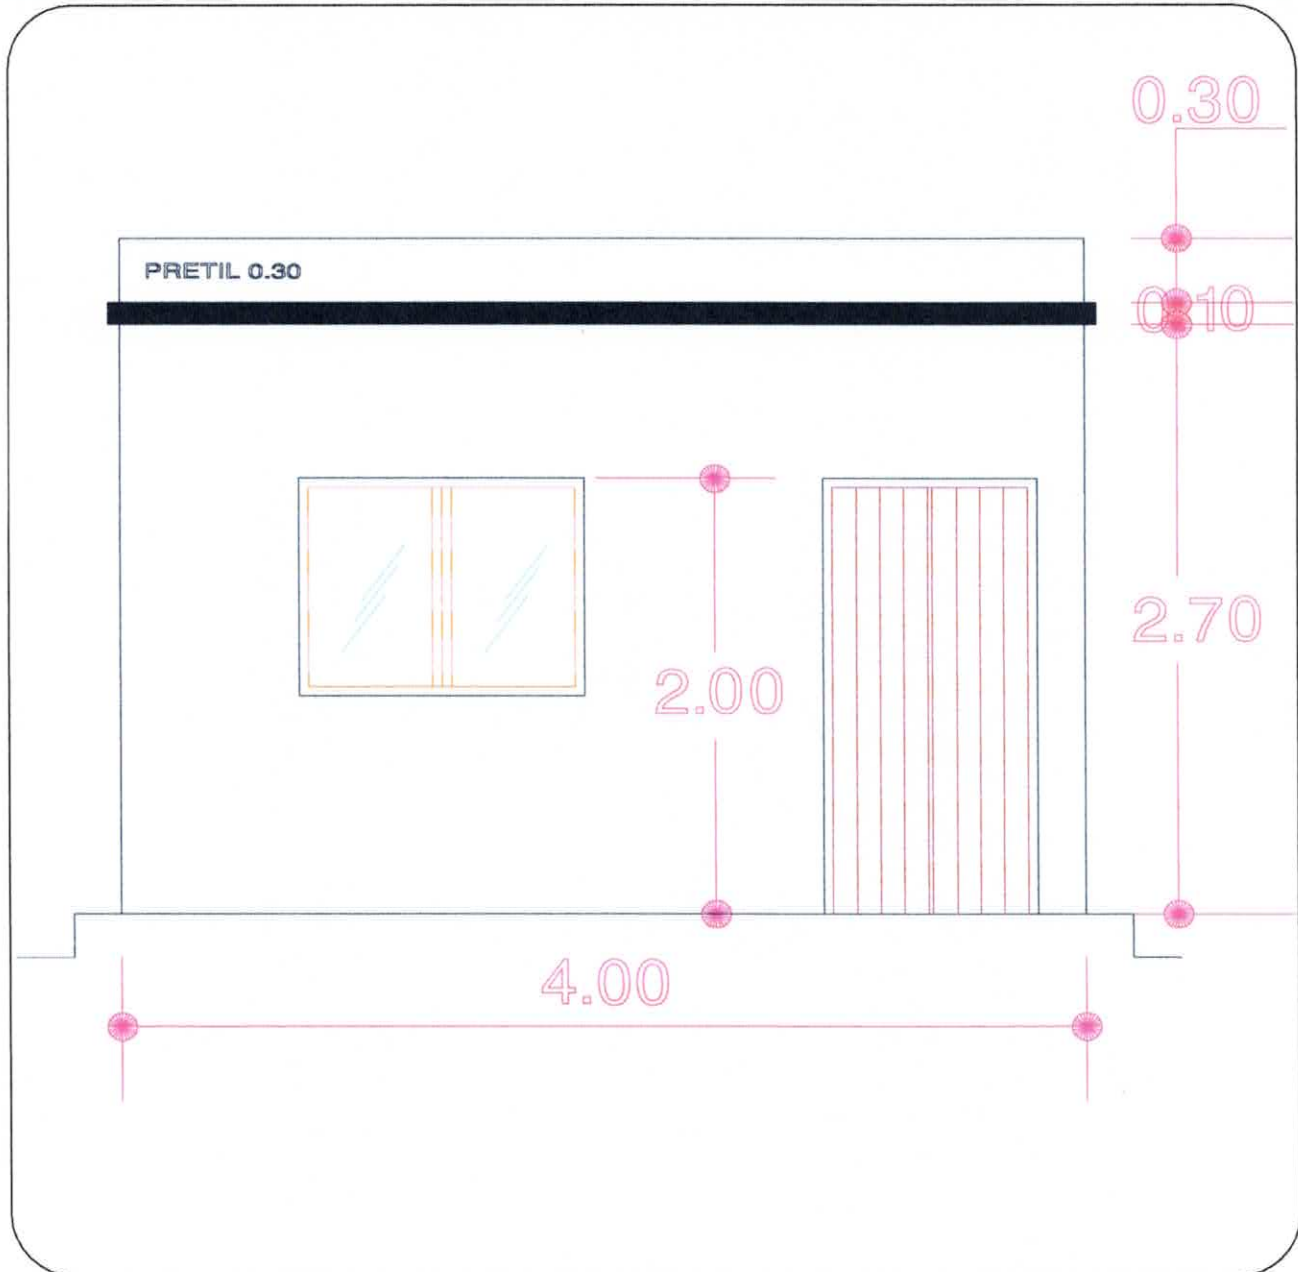

ELABORÓ

ING. AARON MORAN HIDALGO
SUPERINTENDENTE DE OBRA

AUTORIZO

ARQ. SILVIA ZAYDEE PADILLA CRESPO
SUPERVISOR DE OBRAS PUBLICAS

MARIA DE LA LUZ VALENZUELA PASOS
CARRETERA CONCORDIA - EL VERDE No.3
CONCORDIA, SINALOA
R.F.C.
VAPL-570617-JS3

I.M.S.S.
L51-11198-10-1



HOJA: 2 de 3
MUNICIPIO DE ESCUINAPA, SINALOA
DIRECCION DE OBRAS, SERVICIOS PUBLICOS
Y ECOLOGIA
ESCUINAPA, SINALOA



CROQUIS


LOCALIDAD: ISLA DEL BOSQUE

ESTIMACION: 01 (Finiquito)
MUNICIPIO: ESCUINAPA

DESCRIPCION: CONSTRUCCION DE TECHO FIRME 4 X 4 M2 EN LA SINDICATURA DE ISLA DEL BOSQUE, ESCUINAPA, SINALOA

DETALLE DE LOSA DE TECHO FIRME TIPO

Losa plana en estructura de 0.10
varilla $\frac{3}{8}$ " @ 20 cm ambos sentidos

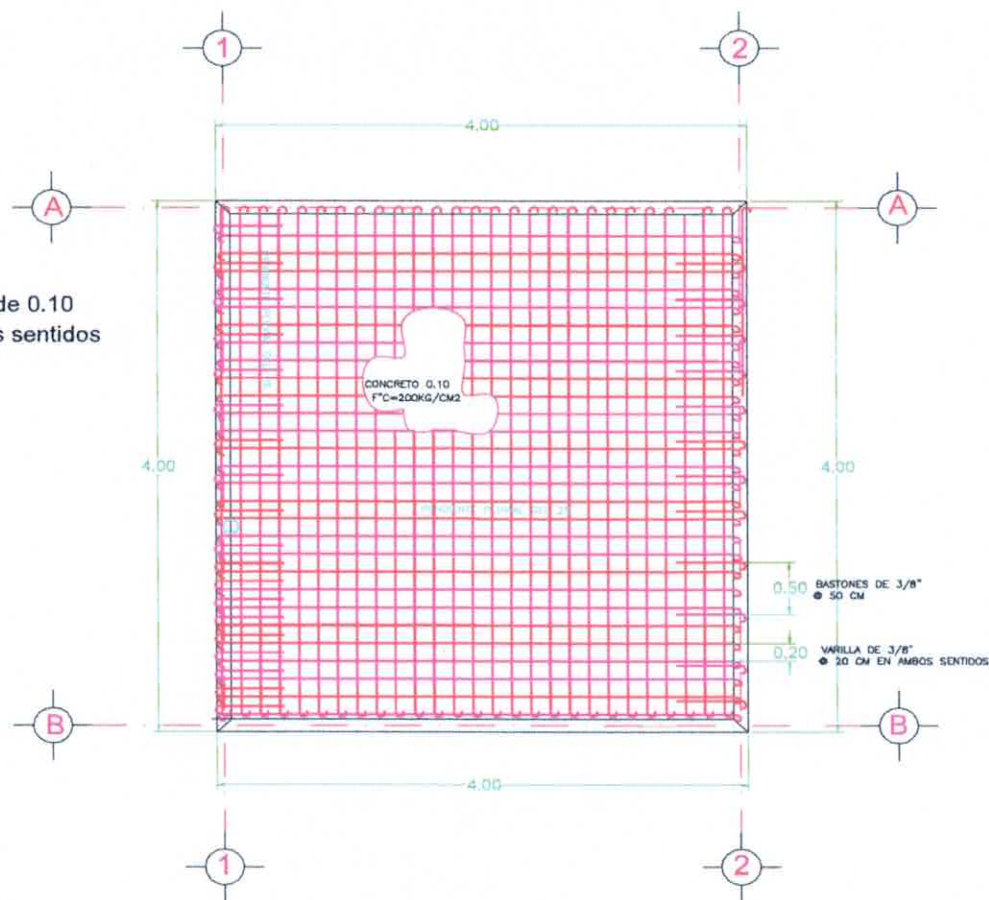

ELABORÓ

ING. AARON MORAN HIDALGO
SUPERINTENDENTE DE OBRA

AUTORIZÓ

ARQ. SILVIA ZAYDEE PADILLA CRESPO
SUPERVISOR DE OBRAS PUBLICAS

MARIA DE LA LUZ VALENZUELA PASOS
CARRETERA CONCORDIA - EL VERDE No.3
CONCORDIA, SINALOA
R.F.C.
VAPL-570617-JS3

I.M.S.S.
L51-11198-10-1



MUNICIPIO DE ESCUINAPA, SINALOA
DIRECCION DE OBRAS, SERVICIOS PUBLICOS
Y ECOLOGIA
ESCUINAPA, SINALOA



HOJA: 3 de 3

CROQUIS

LOCALIDAD: ISLA DEL BOSQUE


ESTIMACION: 01 (Finiquito)
MUNICIPIO: ESCUINAPA

DESCRIPCION: CONSTRUCCION DE TECHO FIRME 4 X 4 M2 EN LA SINDICATURA DE ISLA DEL BOSQUE, ESCUINAPA, SINALOA

CLAVE

(Descripcion del Concepto)

PLANTA DE LOAS DE AZOTEA

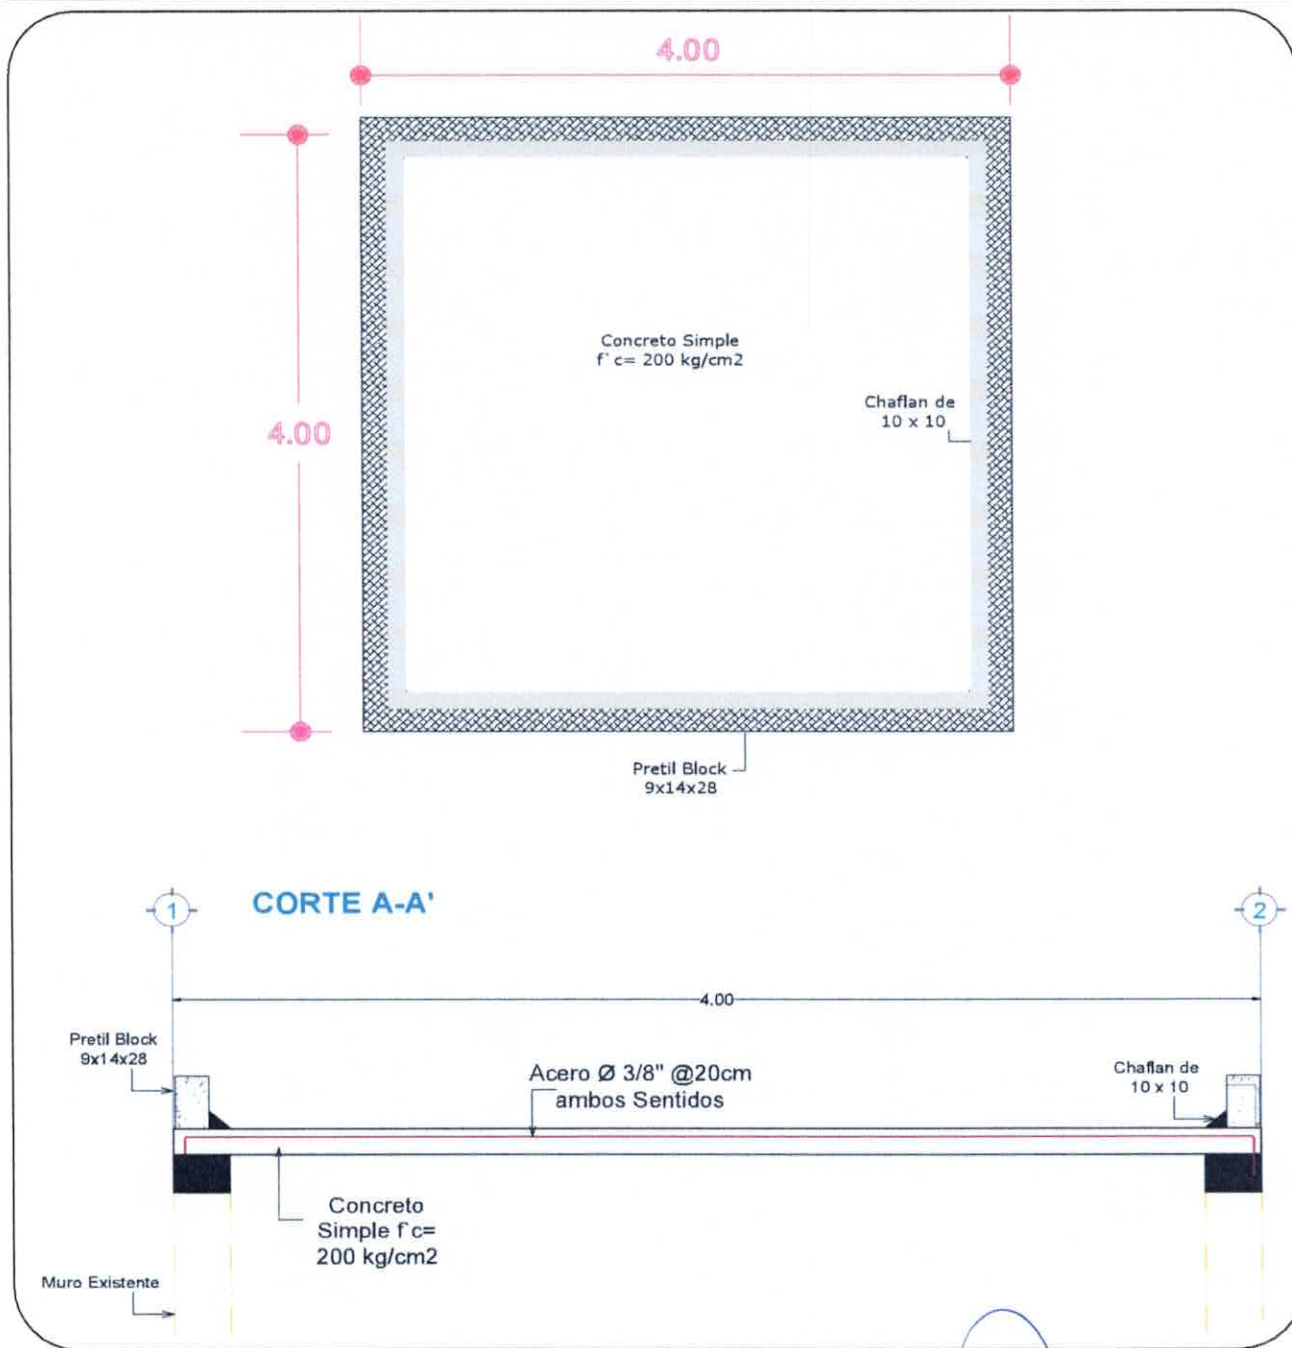

ELABORÓ

ING. SUPERINTENDENTE DE OBRA
SUPERINTENDENTE DE OBRA

AUTORIZÓ

ARQ. SILVIA ZAYDEE PADILLA CRESPO
SUPERVISOR DE OBRAS PUBLICAS

MARIA DE LA LUZ VALENZUELA PASOS
CARRETERA CONCORDIA - EL VERDE No.3
CONCORDIA, SINALOA
R.F.C.
VAPL-570617-JS3

I.M.S.S.
L51-11198-10-1



MUNICIPIO DE ESCUINAPA, SINALOA
DIRECCION DE OBRAS, SERVICIOS PUBLICOS
Y ECOLOGIA
ESCUINAPA, SINALOA

HOJA: 1 de 3




FOTOGRAFIAS

LOCALIDAD: ISLA DEL BOSQUE

ESTIMACION: 01 (Finiquito)
MUNICIPIO: ESCUINAPA

DESCRIPCION: CONSTRUCCION DE TECHO FIRME 4 X 4 M2 EN LA SINDICATURA DE ISLA DEL BOSQUE, ESCUINAPA, SINALOA

CLAVE	(Descripcion del Concepto)
CIM-LS	Cimbra y descimbra en losas con tarimas de triplay 1.22 x 2.44 Incluye: Materiales, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución.

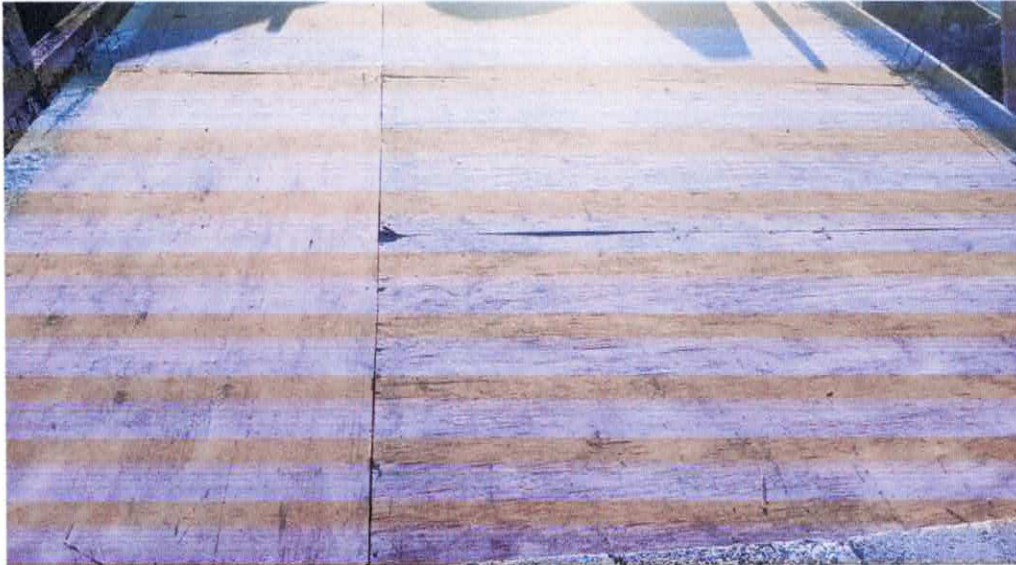

CLAVE	(Descripcion del Concepto)
ACRVR	Acero de refuerzo del núm. 3, (3/8") fyp = 4200 kg/ml, en losa de techo , incluye: habilitado y armado, materiales, mano de obra, equipo, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.



ELABORÓ

ING. AARON MORAN HIDALGO
SUPERINTENDENTE DE OBRA

AUTORIZO

ARQ. SILVIA ZAYDRE PADILLA CRESPO
SUPERVISOR DE OBRAS PUBLICAS

MARIA DE LA LUZ VALENZUELA PASOS
CARRETERA CONCORDIA - EL VERDE No.3
CONCORDIA, SINALOA
R.F.C.
VAPL-570617-JS3

I.M.S.S.
L51-11198-10-1



MUNICIPIO DE ESCUINAPA, SINALOA
DIRECCION DE OBRAS, SERVICIOS PUBLICOS
Y ECOLOGIA
ESCUINAPA, SINALOA

HOJA: 2 de 3



FOTOGRAFIAS

LOCALIDAD: ISLA DEL BOSQUE

ESTIMACION: 01 (Finiquito)
MUNICIPIO: ESCUINAPA

DESCRIPCION: CONSTRUCCION DE TECHO FIRME 4 X 4 M2 EN LA SINDICATURA DE ISLA DEL BOSQUE, ESCUINAPA, SINALOA

CLAVE	(Descripcion del Concepto)
SE-AL	Salida de electricidad para alumbrado a base de tubo conduit pared delgada de 13 mm., con un desarrollo de 4 mts, con cable thw cal. 12 , con dos cajas conduit T-9, T-29 serie 9; El precio incluye: conectores pared delgada de 13 mm, coples de 13 mm, abrazaderas de uña, apagador y placa sencilla marca quinzño, caja de registro de 1/2" y soque de sobreponer. incluye: material, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución.



CLAVE	(Descripcion del Concepto)
SE-AB	Salida de electricidad para abanico a base de tubo conduit pared delgada de 13 mm., con un desarrollo de 10 mts, con cable thw cal. 12 , con dos cajas conduit T-9, T-29 serie 9, y una FS-1 de 13 mm; El precio incluye: conectores pared delgada de 13 mm, coples de 13 mm, abrazaderas de uña, apagador y placa sencilla marca quinzño, caja de registro de 1/2" y soque de sobreponer. incluye: material, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución.



ELABORÓ

ING. AARON MORAN HIDALGO
SUPERINTENDENTE DE OBRA

AUTORIZÓ

ARQ. SILVIA ZAYDEE PADILLA CRESPO
SUPERVISOR DE OBRAS PUBLICAS

MARIA DE LA LUZ VALENZUELA PASOS
CARRETERA CONCORDIA - EL VERDE No.3
CONCORDIA, SINALOA
R.F.C.
VAPL-570617-JS3

I.M.S.S.
L51-11198-10-1



MUNICIPIO DE ESCUINAPA, SINALOA
DIRECCION DE OBRAS, SERVICIOS PUBLICOS
Y ECOLOGIA
ESCUINAPA, SINALOA

HOJA: 3 de 3



FOTOGRAFIAS

LOCALIDAD: ISLA DEL BOSQUE

ESTIMACION: 01 (Finiquito)
MUNICIPIO: ESCUINAPA

DESCRIPCION: CONSTRUCCION DE TECHO FIRME 4 X 4 M2 EN LA SINDICATURA DE ISLA DEL BOSQUE, ESCUINAPA, SINALOA

CLAVE	(Descripcion del Concepto)
SM-CO	Suministro y colocación de concreto simple de 10 cm de espesor, acabado común, concreto hecho en obra de $f'c = 200 \text{ kg/cm}^2$, incluye: material, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución.



CLAVE	(Descripcion del Concepto)
SM-CO	Suministro y colocación de concreto simple de 10 cm de espesor, acabado común, concreto hecho en obra de $f'c = 200 \text{ kg/cm}^2$, incluye: material, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución.



ELABORÓ

ING. AARON MORAN HIDALGO
SUPERINTENDENTE DE OBRA

AUTORIZO

ARQ. SILVIA ZAYDEE PADILLA CRESPO
SUPERVISOR DE OBRAS PUBLICAS
