



CORPORATIVO LA PALOMA S.A. DE C.V.
CALLE MARIANO ESCOBEDO No.6, COL. CENTRO
CONCORDIA, SINALOA.

I.M.S.S.
L51-11189-10-0



MUNICIPIO DE ESCUINAPA, SINALOA
DIRECCION DE OBRAS, SERVICIOS PUBLICOS
Y ECOLOGIA

ESCUINAPA, SINALOA

HOJA: 1 de 3



CONCEPTOS DE ESTIMACION

CONTRATO: ESC-FAISMUN-2025-033	ESTIMACION: 01 (Finiquito)
PERIODO: 18-sep-25 AL 16-nov-25	LOCALIDAD: ISLA DEL BOSQUE
MUNICIPIO: ESCUINAPA	
DESCRIPCION: CONSTRUCCION DE PUENTE (PEATONAL Y VEHICULAR) EN CALLE EMILIANO ZAPATA EN ISLA DEL BOSQUE, ESCUINAPA, SINALOA.	
IMPORTE DE OBRA:	\$817,005.86
IMPORTE DE ANTICIPO DE OBRA:	\$285,952.05
IMPORTE TOTAL DE CONTRATO:	\$817,005.86

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	SEGUN PROYECTO			HASTA ESTA ESTIMACION	HASTA ESTIMACION ANTERIOR	EXCEDENTE	DE ESTA ESTIMACION	IMPORTE		
			VOL	PJ	\$							
CONSTRUCCION DE PUENTE												
CONSTRUCCION DE PUENTE VADO												
CONS-01	CONSTRUCCION DE PISO DE 10 CM ESP. DE CONCRETO HECHO EN OBRA F'C=200 KG/CM2 REFORZADO CON VS #3 (3/8") @ 20 CM AMBOS SENTIDOS ACABADO APLANADO.	M2	49.14	\$	980.20	\$	48,157.03	62.22	0.00	13.08	62.22	60,988.04
TOTAL DE CONSTRUCCION DE PUENTE VADO:										\$ 60,988.04		
PRELIMINARES												
PUE-0010	TRAZO Y NIVELACIÓN DE ÁREA CONTRATADA PARA LA CONSTRUCCIÓN TERRENO NATURAL EXCLUYENDO ÁREAS NO AFECTADAS INC. TOPOGRAFIA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	284.00	\$	21.29	\$	6,046.36	300.00	0.00	16.00	300.00	6,387.00
PUE-0030	EXCAVACIÓN EN CEPA DE 0.00 HASTA 2.00 M DE PROFUNDIDAD CON RETROEXCAVADORA EN MATERIAL TIPO "B" INC. MAQUINARIA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M3	9.04	\$	78.51	\$	709.73	16.06	0.00	7.02	16.06	1,260.87
TOTAL DE PRELIMINARES:										\$ 7,647.87		
CIMENTACION												
CIM-001	CONST. DE DENTELLÓN AGUAS ARRIBA DE 30X60 CM DE CONCRETO CICLOPIO REFORZADO CON ACERO # 3 (3/8") Y PIEDRA LIMPIA AL 60% T.M.A. 6" Y 40% CONCRETO HECHO EN OBRA F'C= 200 KG/CM2 T.M.A 1 1/2" INC. MATERIAL, MANO DE OBRA, JUNTADO DE PIEDRA EN EL LUGAR TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	ML	18.20	\$	1,812.13	\$	32,980.77	32.40	0.00	14.20	32.40	58,713.01
CIM-002	CONST. DE CIMENTO TIPO CICLOPIO EN RESPALDOS 40X80 CM REFORZADO CON ACERO # 3 (3/8"), ESTRUCTURA CON PIEDRA LIMPIA AL 60% T.M.A. 8" Y 40% CONCRETO HECHO EN OBRA F'C= 150 KG/CM2 T.M.A 1 1/2" INC. MATERIAL, MANO DE OBRA, JUNTADO DE PIEDRA EN EL LUGAR TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	ML	24.00	\$	1,806.63	\$	43,359.12	12.20	0.00	0.00	12.20	22,040.89
TOTAL DE CIMENTACION:										\$ 80,753.90		
ALCANTARILLADO												
ALC-001	SUMINISTRO Y COLOC. DE TUBO DE POLIETILENO PEAD CORRUGADO DE 48" X 5.00 MTS INC. MANIOBRA CON GRUA, COLOCACIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	6.00	\$	16,602.53	\$	99,615.18	6.00	0.00	0.00	6.00	99,615.18
ALC-002	CONST. DE MURO DE CONTENCIÓN PARA SUJECCIÓN DE TUBERIA AGUAS ARRIBA Y AGUA ABAJO DE 30 CM ESP. CONCRETO CICLOPIO CON PIEDRA BOLA LIMPIA DE RIO AL 60% Y 40% DE CONCRETO F'C= 200 KG/CM2 HECHO EN OBRA T.M.A 1 1/2" CUBRADO ESPECIAL CON SACABOCADO DE TUBERIA INC. CUBRADO, COLADO, MATERIAL, MANO DE OBRA, JUNTADO DE PIEDRA EN EL LUGAR Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	4.44	\$	2,182.19	\$	9,688.92	20.09	0.00	15.65	20.09	43,840.20

ELABORÓ

ARQ. ARNULFO LIZARRAGA VALENZUELA
REPRESENTANTE LEGAL

REVISÓ

ARQ. SILVIA ZAYORE PADILLA CRESPO
SUPERVISOR DE OBRAS PUBLICAS

AUTORIZÓ

M. en ARQ. GRACIELA ELIZALDE SANTOS
DIRECTORA DE OBRAS, SERVICIOS
PUBLICOS Y ECOLOGIA



CORPORATIVO LA PALOMA S.A. DE C.V.
CALLE MARIANO ESCOBEDO No.6, COL. CENTRO
CONCORDIA, SINALOA.

R.F.C.
CPA-061117-QJ8

I.M.S.S.
L51-11189-10-0



MUNICIPIO DE ESCUINAPA, SINALOA
DIRECCION DE OBRAS, SERVICIOS PUBLICOS
Y ECOLOGIA

ESCUINAPA, SINALOA

HOJA: 2 de 3



CONCEPTOS DE ESTIMACION

CONTRATO: **ESC-FAISMUN-2025-033** ESTIMACION: **01 (Finiquito)**
PERIODO: **18-sep-25** AL **16-nov-25** LOCALIDAD: **ISLA DEL BOSQUE** MUNICIPIO: **ESCUINAPA**
DESCRIPCION: **CONSTRUCCION DE PUENTE (PEATONAL Y VEHICULAR) EN CALLE EMILIANO ZAPATA EN ISLA DEL BOSQUE, ESCUINAPA, SINALOA.**

IMPORTE DE OBRA: **\$817,005.86**
IMPORTE DE ANTICIPO DE OBRA: **\$285,952.05**
IMPORTE TOTAL DE CONTRATO: **\$817,005.86**

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	SEGUN PROYECTO			HASTA ESTA ESTIMACION	HASTA ESTIMACION ANTERIOR	EXCEDENTE	DE ESTA ESTIMACION	IMPORTE
			VOL	PU	\$					
ALC-003	RELLENO CON MATERIAL SOBRE TUBERIA PARA RECIBIR LOSA DE CONCRETO ESPESOS MINIMO 30 CM COMPACTADO AL 95% EN CAPAS NO MAYOR A 20 CM. INC. MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M3	36.46	\$ 587.65	\$ 21,425.72	52.44	0.00	15.98	52.44	30,816.37
TOTAL DE ALCANTARILLADO:										\$ 174,271.75
RESPALDOS										
ALB-003	CONST. DE RESPALDO DE CONCRETO CICLOPIO 30 CM ESP. REFORZADO CON ACERO # 3 (3/8") Y PIEDRA BOLA LIMPIA DE RIO AL 60% T.M.A. 6" Y 40% DE CONCRETO F'C= 200 KG/CM2 HECHO EN OBRA T.M.A 1 1/2" INC. CIMBRADO, COLADO, MATERIAL, MANO DE OBRA, JUNTADO DE PIEDRA BOLA EN EL LUGAR Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	12.00	\$ 3,419.38	\$ 41,032.56	18.70	0.00	6.70	18.70	63,942.41
TOTAL DE RESPALDOS:										\$ 63,942.41
ALEROS										
ALE-001	CONST. DE ALEROS AGUAS ARRIBA DE 3.00 MTS DE LONG. X 30 CM ESP. REFORZADO CON ACERO # 3 (3/8") Y CONCRETO CICLOPIO CON PIEDRA BOLA LIMPIA DE RIO AL 60% T.M.A. 6" Y 40% DE CONCRETO F'C= 200 KG/CM2 HECHO EN OBRA T.M.A 1 1/2" INC. CIMBRADO, COLADO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	10.50	\$ 3,026.08	\$ 31,773.84	8.40	0.00	0.00	8.40	25,419.07
ALE-002	CONST. DE ALEROS AGUAS ABAJO DE 4.00 MTS DE LONG. X 30 CM ESP. REFORZADO CON ACERO # 3 (3/8") Y CONCRETO CICLOPIO CON PIEDRA BOLA LIMPIA DE RIO AL 60% T.M.A. 6" Y 40% DE CONCRETO F'C= 200 KG/CM2 HECHO EN OBRA T.M.A 1 1/2" INC. CIMBRADO, COLADO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	14.00	\$ 3,037.56	\$ 42,525.84	8.40	0.00	0.00	8.40	25,515.50
TOTAL DE ALEROS:										\$ 50,934.57
LOSA DE RODAMIENTO										
ROD-001	CONSTRUCCION DE TRABE DE LIGA EN LOSA DE RODAMIENTO DE 25X40 CM REFORZADO CON 8 VS # 3 (3/8") Y ESTRIBOS # 2 (1/4") A CADA 25 CM UTILIZANDO CONCRETO F'C= 200 KG/CM2 T.M.A 1 1/2" INC. MATERIAL MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	ML	19.40	\$ 1,710.27	\$ 33,179.24	20.40	0.00	1.00	20.40	34,889.51
ROD-002	CONSTRUCCION DE LOSA DE CONCRETO HIDRAULICO DE 15 CM ESP. CONCRETO F'C= 250 KG/CM2 HECHO EN OBRA, EN RODAMIENTO Y LAVADERO REFORZADO CON ACERO # 3 (3/8") A CADA 20 CM AMBOS SENTIDOS ACABADO ESCOBEADO INC. MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	53.35	\$ 1,510.53	\$ 80,592.11	57.12	0.00	3.77	57.12	86,287.19
TOTAL DE LOSA DE RODAMIENTO:										\$ 121,176.70

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

ARQ. ARNULFO LIZARRAGA VALENZUELA
CORPORATIVO LA PALOMA, S.A. DE C.V.
REPRESENTANTE LEGAL

ARQ. SILVIA ZAYDEE PADILLA CRESCO
SUPERVISOR DE OBRAS PUBLICAS

M. en ARQ. GRACIELA ELIZALDE SANTOS
DIRECTORA DE OBRAS, SERVICIOS
PUBLICOS Y ECOLOGIA



CORPORATIVO LA PALOMA S.A. DE C.V.
CALLE MARIANO ESCOBEDO No.6, COL. CENTRO
CONCORDIA, SINALOA.

R.F.C.
CPA-061117-QJ8

I.M.S.S.
L51-11189-10-0



MUNICIPIO DE ESCUINAPA, SINALOA
DIRECCION DE OBRAS, SERVICIOS PUBLICOS
Y ECOLOGIA

ESCUINAPA, SINALOA

HOJA: 3 de 3



CONCEPTOS DE ESTIMACION

CONTRATO: **ESC-FAISMUN-2025-033** ESTIMACION: **01 (Finiquito)**
PERIODO: **18-sep-25** AL **16-nov-25** LOCALIDAD: **ISLA DEL BOSQUE** MUNICIPIO: **ESCUINAPA**
DESCRIPCION: **CONSTRUCCION DE PUENTE (PEATONAL Y VEHICULAR) EN CALLE EMILIANO ZAPATA EN ISLA DEL BOSQUE, ESCUINAPA, SINALOA.**

IMPORTE DE OBRA: **\$817,005.86**
IMPORTE DE ANTICIPO DE OBRA: **\$285,952.05**
IMPORTE TOTAL DE CONTRATO: **\$817,005.86**

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	SEGUN PROYECTO			HASTA ESTA ESTIMACION	HASTA ESTIMACION ANTERIOR	EXCEDENTE	DE ESTA ESTIMACION	IMPORTE
			VOL	PU	\$					
APROCHES										
APR-001	EXTRACCIÓN Y CORTE DE MATERIAL TIPO POR MEDIOS MECÁNICOS UTILIZANDO RETROEXCAVADORA INC. MAQUINARIA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M3	105.23	\$ 43.14	\$ 4,539.62	76.80	0.00	0.00	76.80	3,313.15
APR-002	CARGA, ACARREO EN CAMION A 1ER KM DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION INC. CARGA.	M3	131.53	\$ 360.03	\$ 47,354.75	99.84	0.00	0.00	99.84	35,945.40
APR-003	ACARREO EN CAMION KM SUBSECUENTE A UNA DIST. MAX. DE 7 KM.	M3/KM	6,576.87	\$ 20.28	\$ 133,378.92	3,993.60	0.00	0.00	3,993.60	80,990.21
APR-004	FORMACIÓN DE TERRAPLEN AFINE, TENDIDO, APLICACIÓN DE HUMEDAD ÓPTIMA Y NIVELACIÓN UTILIZANDO MATERIAL DE BANCO INC. MAQUINARIA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M3	83.04	\$ 170.49	\$ 14,157.49	86.00	0.00	12.96	96.00	16,367.04
		TOTAL DE APROCHES:								\$ 136,615.80
LIMPIEZA										
LIM-001	LIMPIEZA GENERAL DE OBRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN CON EQUIPO MECÁNICO Y MANUAL.	M2	284.00	\$ 48.55	\$ 13,788.20	180.00	0.00	0.00	180.00	8,739.00
		TOTAL DE LIMPIEZA:								\$ 8,739.00
TOTAL DE ESTIMACION:									\$ 705,070.04	

ELABORÓ

ARQ. ARNULFO LIZARRAGA VALENZUELA

REPRESENTANTE LEGAL

REVISÓ

ARQ. SILVIA ZAYDEE PADILLA CRESPO
SUPERVISOR DE OBRAS PUBLICAS

AUTORIZÓ

M. en ARQ. GRACIELA ELIZALDE SANTOS
DIRECTORA DE OBRAS, SERVICIOS
PUBLICOS Y ECOLOGIA


R.F.C.
CPA-061117-QJ8

CORPORATIVO LA PALOMA S.A. DE C.V.
CALLE MARIANO ESCOBEDO No.6, COL. CENTRO
CONCORDIA, SINALOA.

I.M.S.S.
L51-11189-10-0



MUNICIPIO DE ESCUINAPA, SINALOA
DIRECCION DE OBRAS, SERVICIOS PUBLICOS
Y ECOLOGIA
ESCUINAPA, SINALOA

HOJA: 1 de 1



RESUMEN DE ESTIMACION

CONTRATO: **ESC-FAISMUN-2025-033** ESTIMACION: **01 (Finiquito)**
PERIODO: **18-sep-25** AL **16-nov-25** LOCALIDAD: **ISLA DEL BOSQUE** MUNICIPIO: **ESCUINAPA**
DESCRIPCION: **CONSTRUCCION DE PUENTE (PEATONAL Y VEHICULAR) EN CALLE EMILIANO ZAPATA EN ISLA DEL BOSQUE, ESCUINAPA, SINALOA.**
IMPORTE DE OBRA: **\$817,005.86** CONVENIO ADICIONAL:
IMPORTE DE ANTICIPO DE OBRA: **\$285,952.05** PERIODO CONVENIO ADICIONAL: DEL AL
IMPORTE TOTAL DE CONTRATO: **\$817,005.86**

CONSTRUCCION DE PUENTE

OBRA	IMPORTE
CONSTRUCCION DE PUENTE VADO	\$ 60,988.04
PRELIMINARES	\$ 7,647.87
CIMENTACION	\$ 80,753.90
ALCANTARILLADO	\$ 174,271.75
RESPALDOS	\$ 63,942.41
ALEROS	\$ 50,934.57
LOSA DE RODAMIENTO	\$ 121,176.70
APROCHES	\$ 136,615.80
LIMPIEZA	\$ 8,739.00

SUB TOTAL= \$ 705,070.04
I.V.A \$ 112,811.21
TOTAL = \$ 817,881.25

\$ 704,315.40 Por cierre de
\$ 112,690.46 Contrato se
\$ 817,005.86 cobrara esta
cantidad

Elaboró

ARQ. ARNULFO LIZARRAGA VALENZUELA
CORPORATIVO LA PALOMA, S.A. DE C.V.
REPRESENTANTE LEGAL

Revisó

ARQ. SILVIA ZAYDEE PADILLA CRESPO
SUPERVISOR DE OBRAS PUBLICAS

Autorizó

M. en ARQ. GRACIELA ELIZALDE SANTOS
DIRECTORA DE OBRAS, SERVICIOS
PUBLICOS Y ECOLOGIA




R.F.C.
CPA-061117-QJ8

CORPORATIVO LA PALOMA S.A. DE C.V.
CALLE MARIANO ESCOBEDO No.6, COL. CENTRO
CONCORDIA, SINALOA.

I.M.S.S.
L51-11189-10-0



MUNICIPIO DE ESCUINAPA, SINALOA
DIRECCION DE OBRAS, SERVICIOS PUBLICOS
ESCUINAPA, SINALOA

HOJA: 1 de 1



ESTADO DE CUENTA

ESTIMACION: 01 (Finiquito)
MUNICIPIO: ESCUINAPA
LOCALIDAD: ISLA DEL BOSQUE
DESCRIPCION: CONSTRUCCION DE PUENTE (PEATONAL Y VEHICULAR) EN CALLE EMILIANO ZAPATA EN ISLA DEL BOSQUE, ESCUINAPA, SINALOA.
FECHA INICIO CONTRATO: 18-sep-25 FECHA TERMINACION CONTRATO: 16-nov-25 CONTRATO: ESC-FAISMUN-2025-033 FECHA CONTRATO: 17-sep-25

IMPORTE DE OBRA: \$817,005.86 CLAVE DE CONVENIO ADICIONAL:
IMPORTE DE ANTICIPO DE OBRA: \$285,952.05 PERIODO CONVENIO ADICIONAL: DEL
IMPORTE TOTAL DE CONTRATO: \$817,005.86 IMPORTE CONVENIO ADICIONAL: AL

No. DE ESTIMACION	PERIODO	IMPORTE ESTIMACION \$	IMPORTE IVA \$	IMPORTE IEN \$	3% ORGANISMO INTERNO DE CONTROL MPAL Y CONGRESO DEL EDO.	35% AMORTIZACION ANTICIPO \$	TOTAL DEDUCCIONES \$	LIQUIDO A PAGAR \$
01 (Finiquito)	18-sep-25 16-nov-25	\$ 817,005.86	\$ 704,315.40	\$ 21,129.46	\$ 285,952.05	\$ 307,081.51	\$ 509,924.35	
TOTALES:		\$ 817,005.86	\$ 704,315.40	\$ 21,129.46	\$ 285,952.05	\$ 307,081.51	\$ 509,924.35	
SALDO DEL CONTRATO:		\$0.00		SALDO POR AMORTIZAR:		\$0.00		

REALIZÓ
ARQ. ARNULFO LIZARRAGA VALENZUELA
CORPORATIVO LA PALOMA, S.A. DE C.V.
REPRESENTANTE LEGAL

AUTORIZÓ
M. en ARQ. GRACIELA ELIZALDE SANTOS
DIRECTORA DE OBRAS, SERVICIOS
PUBLICOS Y ECOLOGIA

REVISÓ
ARQ. SILVIA ZAYDEE PADILLA CRESPO
SUPERVISOR DE OBRAS PUBLICAS

AUTORIZÓ
L.C.P. JOSE TRINIDAD IBARRA MARTINEZ
TESORERO MUNICIPAL

CARATULA DE RECIBO

Hoja: 1 de 1

RECIBO MUNICIPAL No. 01 (Finiquito)



CORPORATIVO LA PALOMA S.A. DE C.V.
CALLE MARIANO ESCOBEDO No.6, COL. CENTRO
CONCORDIA, SINALOA.

TELEFONO:

CEL:

669-127-9484

UBICACION:

CONCORDIA, SIN.

R.F.C.

CPA-061117-QJ8

I.M.S.S.

L51-11189-10-0

FECHA:

16-nov-25

ESTIMACION No:

01 (Finiquito)

PERIODO:

DEL

18-sep-25

AL

16-nov-25

FECHA DE CONTRATO:

17-sep-25

PERIODO DE EJECUCION DEL CONTRATO:

INICIO:

18-sep-25

TERMINACION:

16-nov-25

PRORROGA:

DEL

AL

DESCRIPCION:

CONSTRUCCION DE PUENTE (PEATONAL Y VEHICULAR) EN CALLE EMILIANO ZAPATA EN ISLA DEL BOSQUE, ESCUINAPA, SINALOA.

CONTRATO NO:

ESC-FAISMUN-2025-033

IMPORTE SIN IVA

\$704,315.40

IMPORTE CON IVA

\$817,005.86

35% ANTICIPO

\$285,952.05

IMPORTE TOTAL DE CONTRATO:

\$817,005.86

BUENO POR:

\$509,924.35

RECIBI DE LA TESORERIA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE ESCUINAPA, SINALOA, LA CANTIDAD DE:

\$509,924.35

SON: (QUINIENTOS NUEVE MIL NOVECIENTOS VEINTICUATRO PESOS 35/100 M.N.

EN PAGO DE ESTIMACION 01 (Finiquito)

DEDUCCIONES:

AMORTIZACION ANTICIPO 35% (*)

\$ 246,510.39

MAS I.V.A.

\$ 39,441.66

TOTAL AMORTIZACION DE ANTICIPO

\$ 285,952.05

CALCULO DE ESTIMACION

IMPORTE DE LA OBRA EJECUTADA SIN IVA

\$ 704,315.40

DEDUCCION ANTICIPO (35%):

-\$ 246,510.39

SUMA:

\$ 457,805.01

MAS I.V.A 16 %

\$ 73,248.80

TOTAL:

\$ 531,053.81

DEDUCCION SVIFC (3%):

-\$ 21,129.46

LIQUIDO A PAGAR:

\$ 509,924.35

3% ORGANO INTERNO DE CONTROL
MPAL Y CONGRESO DEL ESTADO: (*)

\$ 21,129.46

TOTAL DE DEDUCCIONES:

\$ 307,081.51

(*) DEL IMPORTE EJECUTADO SIN IVA

SALDO A PAGAR:

\$ 509,924.35

REALIZÓ

ARQ. ARNULFO LIZARRAGA VALENZUELA
CORPORATIVO LA PALOMA, S.A. DE C.V.
REPRESENTANTE LEGAL

REVISÓ

ARQ. SILVIA ZAYDE PADILLA CRESPO
SUPERVISOR DE OBRAS PUBLICAS

AUTORIZÓ

M. en ARQ. GRACIELA ELIZALDE SANTOS
DIRECTORA DE OBRAS, SERVICIOS
PUBLICOS Y ECOLOGIA

AUTORIZÓ

José Trinidad Ibarra Martínez
L.C.P. JOSE TRINIDAD IBARRA MARTINEZ
TESORERO MUNICIPAL



Corporativo

La Paloma

Arq. Arnulfo Lizarraga Valenzuela
Representante Legal

R.F.C. CPA-061117-QJ8

C. MARIANO ESCOBEDO No. 6 CENTRO ESQ. CON ISIDORO PERAZA
CONCORDIA, SINALOA. C.P. 82600

TEL/FAX 01(694) 968-22-17, 968-13-82 CEL 044(6691)
27-94-84

Recibo No. 1 (Uno)
Bueno por: **\$509,924.35**

RECIBI DE TESORERIA DEL MUNICIPIO DE ESCUINAPA LA CANTIDAD DE: -----
----- **\$509,924.35** (QUINIENTOS NUEVE MIL NOVECIENTOS VEINTICUATRO PESOS 35/100 M.N.).

POR CONCEPTO DE:

PAGO CORRESPONDIENTE A LA **ESTIMACION No.1 (FINIQUITO)** DEL CONTRATO No.

ESC-FAISMUN-2025-033 DE LA OBRA DE DESIGNACION:

- **CONSTRUCCION DE PUENTE (PEATONAL Y VEHICULAR) EN CALLE EMILIANO ZAPATA EN ISLA DEL BOSQUE, ESCUINAPA, SINALOA.**

Monto total Contratado = \$817,005.86 (Son Ochocientos Diecisiete Mil Cinco Pesos 86/100 M.N.)

IMPORTE DE ESTIMACION:	\$704,315.40
SUBTOTAL:	\$704,315.40
16% IVA:	\$112,690.46
TOTAL:	\$817,005.86

DEDUCCIONES:

AMORTIZACION ANTICIPO 35%:	\$285,952.05
CONGRESO DEL ESTADO 3%:	\$21,129.46

TOTAL NETO A COBRAR:	\$509,924.35
-----------------------------	---------------------

RECIBI:
ESCUINAPA, SINALOA A 16 DE NOVIEMBRE DE 2025
CORPORATIVO LA PALOMA, S.A. DE C.V.

Atentamente:

Arq. Arnulfo Lizarraga Valenzuela
Representante Legal

c.c. Archivo



CONSTRUCCIÓN Y DISEÑO DE OBRA CIVIL EN GENERAL



CORPORATIVO LA PALOMA S.A. DE C.V.
CALLE MARIANO ESCOBEDO No.6, COL. CENTRO
CONCORDIA, SINALOA.

I.M.S.S.
L51-11189-10-0



MUNICIPIO DE ESCUINAPA, SINALOA
DIRECCION DE OBRAS, SERVICIOS PUBLICOS
Y ECOLOGIA

ESCUINAPA, SINALOA

HOJA: 1 de 2



NUMEROS GENERADORES

LOCALIDAD: ISLA DEL BOSQUE

ESTIMACION: 01 (Finiquito)
MUNICIPIO: ESCUINAPA

DESCRIPCION: CONSTRUCCION DE PUENTE (PEATONAL Y VEHICULAR) EN CALLE EMILIANO ZAPATA EN ISLA DEL BOSQUE, ESCUINAPA, SINALOA.

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	LOCALIZACIÓN			LARGO	ANCHO	ALTO	RESULTADO	OBSERVACIONES		
			EJE	TRAMO	PZAS							
CONSTRUCCION DE PUENTE VADO												
CONS-01	CONSTRUCCION DE PISO DE 10 CM ESP. DE CONCRETO HECHO EN OBRA F'C=200 KG/CM2 REFORZADO CON VS #3 (3/8") @ 20 CM AMBOS SENTIDOS ACABADO APLANADO.	M2			1.00	6.10	10.20		62.22			
PRELIMINARES												
PUE-0010	TRAZO Y NIVELACIÓN DE ÁREA CONTRATADA PARA LA CONSTRUCCIÓN TERRENO NATURAL EXCLUYENDO ÁREAS NO AFECTADAS INC. TOPOGRAFÍA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M2			1.00	20.00	15.00		300.00			
PUE-0030	EXCAVACION EN CEPA DE 0.00 HASTA 2.00 M DE PROFUNDIDAD CON RETROEXCAVADORA EN MATERIAL TIPO "B" INC. MAQUINARIA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M3			2.00	10.20	0.60	0.60	7.34			
					2.00	6.10	0.60	0.60	4.39			
					4.00	3.00	0.60	0.60	4.32			
											16.06	
CIMENTACION												
CIM-001	CONST. DE DENTELLÓN AGUAS ARRIBA DE 30X60 CM DE CONCRETO CICLOPIO REFORZADO CON ACERO # 3 (3/8") Y PIEDRA LIMPIA AL 60% T.M.A. 6" Y 40% CONCRETO HECHO EN OBRA F'C= 200 KG/CM2 T.M.A 1 1/2" INC. MATERIAL, MANO DE OBRA, JUNTADO DE PIEDRA EN EL LUGAR TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	ML			2.00	10.20			20.40			
					4.00	3.00			12.00			
											32.40	
CIM-002	CONST. DE CIMIENTO TIPO CICLOPIO EN RESPALDOS 40X80 CM REFORZADO CON ACERO # 3 (3/8"), ESTRUCTURA CON PIEDRA LIMPIA AL 60% T.M.A. 8" Y 40% CONCRETO HECHO EN OBRA F'C= 150 KG/CM2 T.M.A 1 1/2" INC. MATERIAL, MANO DE OBRA, JUNTADO DE PIEDRA EN EL LUGAR TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	ML			2.00	6.10			12.20			
ALCANTARILLADO												
ALC-001	SUMINISTRO Y COLOC. DE TUBO DE POLIETILENO PEAD CORRUGADO DE 48" X 5.00 MTS INC. MANIOBRA CON GRUA, COLOCACIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA			6.00				6.00			
ALC-002	CONST. DE MURO DE CONTENCIÓN PARA SUJECIÓN DE TUBERÍA AGUAS ARRIBA Y AGUA ABAJO DE 30 CM ESP. CONCRETO CICLOPIO CON PIEDRA BOLA LIMPIA DE RIO AL 60% Y 40% DE CONCRETO F'C= 200 KG/CM2 HECHO EN OBRA T.M.A 1 1/2" CIMBRADO ESPECIAL CON SACABOCADO DE TUBERÍA INC. CIMBRADO, COLADO, MATERIAL, MANO DE OBRA, JUNTADO DE PIEDRA EN EL LUGAR Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M2			2.00	10.20		1.65	33.66			
					-12.00	3.1416	0.60	0.60	-13.57	menos Diam. Del Tubo		
											20.09	
ALC-003	RELLENO CON MATERIAL SOBRE TUBERÍA PARA RECIBIR LOSA DE CONCRETO ESPESOS MINIMO 30 CM COMPACTADO AL 95% EN CAPAS NO MAYOR A 20 CM. INC. MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M3			1.00	9.60	5.50	1.70	89.76			
					3.1416	-6.00	5.50	0.60	0.60	-37.32		
											52.44	
RESPALDOS												
ALB-003	CONST. DE RESPALDO DE CONCRETO CICLOPIO 30 CM ESP. REFORZADO CON ACERO # 3 (3/8") Y PIEDRA BOLA LIMPIA DE RIO AL 60% T.M.A. 6" Y 40% DE CONCRETO F'C= 200 KG/CM2 HECHO EN OBRA T.M.A 1 1/2" INC. CIMBRADO, COLADO, MATERIAL, MANO DE OBRA, JUNTADO DE PIEDRA BOLA EN EL LUGAR Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M2			2.00	5.50		1.70	18.70			

ELABORÓ

ARQ. SUPERINTENDENTE DE OBRA
SUPERINTENDENTE DE OBRA

AUTORIZO

ARQ. SILVIA ZAYDEE PADILLA CRESPO
SUPERVISOR DE OBRAS PUBLICAS



NUMEROS GENERADORES

ESTIMACION: 01 (Finiquito)
MUNICIPIO: ESCUINAPA
LOCALIDAD: ISLA DEL BOSQUE
DESCRIPCION: CONSTRUCCION DE PUENTE (PEATONAL Y VEHICULAR) EN CALLE EMILIANO ZAPATA EN ISLA DEL BOSQUE, ESCUINAPA, SINALOA.

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	LOCALIZACION			LARGO	ANCHO	ALTO	RESULTADO	OBSERVACIONES
			EJE	TRAMO	PZAS					
ALE-001	ALEROS CONST. DE ALEROS AGUAS ARRIBA DE 3.00 MTS DE LONG. X 30 CM ESP. REFORZADO CON ACERO # 3 (3/8") Y CONCRETO CICLOPIO CON PIEDRA BOLA LIMPIA DE RIO AL 60% T.M.A. 6" Y 40% DE CONCRETO F'C= 200 KG/CM2 HECHO EN OBRA T.M.A 1 1/2" INC. CIMBRADO, COLADO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M2			2.00	3.00		1.40	8.40	
ALE-002	CONST. DE ALEROS AGUAS ABAJO DE 4.00 MTS DE LONG. X 30 CM ESP. REFORZADO CON ACERO # 3 (3/8") Y CONCRETO CICLOPIO CON PIEDRA BOLA LIMPIA DE RIO AL 60% T.M.A. 6" Y 40% DE CONCRETO F'C= 200 KG/CM2 HECHO EN OBRA T.M.A 1 1/2" INC. CIMBRADO, COLADO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M2			2.00	3.00		1.40	8.40	
ROD-001	LOSA DE RODAMIENTO CONSTRUCCIÓN DE TRABE DE LIGA EN LOSA DE RODAMIENTO DE 25X40 CM REFORZADO CON 8 VS # 3 (3/8") Y ESTRIBOS # 2 (1/4") A CADA 25 CM UTILIZANDO CONCRETO F'C= 200 KG/CM2 T.M.A 1 1/2" INC. MATERIAL MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	ML			2.00	10.20			20.40	
ROD-002	CONSTRUCCIÓN DE LOSA DE CONCRETO HIDRÁULICO DE 15 CM ESP. CONCRETO F'C= 250 KG/CM2 HECHO EN OBRA, EN RODAMIENTO Y LAVADERO REFORZADO CON ACERO # 3 (3/8") A CADA 20 CM AMBOS SENTIDOS ACABADO ESCOBEADO INC. MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M2			1.00	10.20	5.60		57.12	
APR-001	APROCHES EXTRACCIÓN Y CORTE DE MATERIAL TIPO POR MEDIOS MECÁNICOS UTILIZANDO RETROEXCAVADORA INC. MAQUINARIA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M3			2.00	4.00	8.00	1.20	76.80	
	APR-002 CARGA, ACARREO EN CAMION A 1ER KM DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION INC. CARGA.	M3			1.30		76.80		99.84	
APR-003	ACARREO EN CAMION KM SUBSECUENTE A UNA DIST. MAX. DE 7 KM.	M3/KM			40.00		99.84		3,993.60	
APR-004	FORMACIÓN DE TERRAPLEN AFINE, TENDIDO, APLICACIÓN DE HUMEDAD ÓPTIMA Y NIVELACIÓN UTILIZANDO MATERIAL DE BANCO INC. MAQUINARIA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M3			2.00	4.00	8.00	1.50	96.00	
LIM-001	LIMPIEZA LIMPIEZA GENERAL DE OBRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN CON EQUIPO MECÁNICO Y MANUAL.	M2			1.00	18.00	10.00		180.00	

ELABORÓ

ARQ. ARNULFO LIZARRAGA VALENZUELA
SUPERINTENDENTE DE OBRA


AUTORIZO

ARQ. SILVIA ZAYDEE PADILLA CRESPO
SUPERVISOR DE OBRAS PUBLICAS

CROQUIS

ESTIMACION: **01 (Finiquito)**
MUNICIPIO: **ESCUINAPA**
LOCALIDAD: **ISLA DEL BOSQUE**
DESCRIPCION: **CONSTRUCCION DE PUENTE (PEATONAL Y VEHICULAR) EN CALLE EMILIANO ZAPATA EN ISLA DEL BOSQUE, ESCUINAPA, SINALOA.**

PLANTA GENERAL DE PUENTE

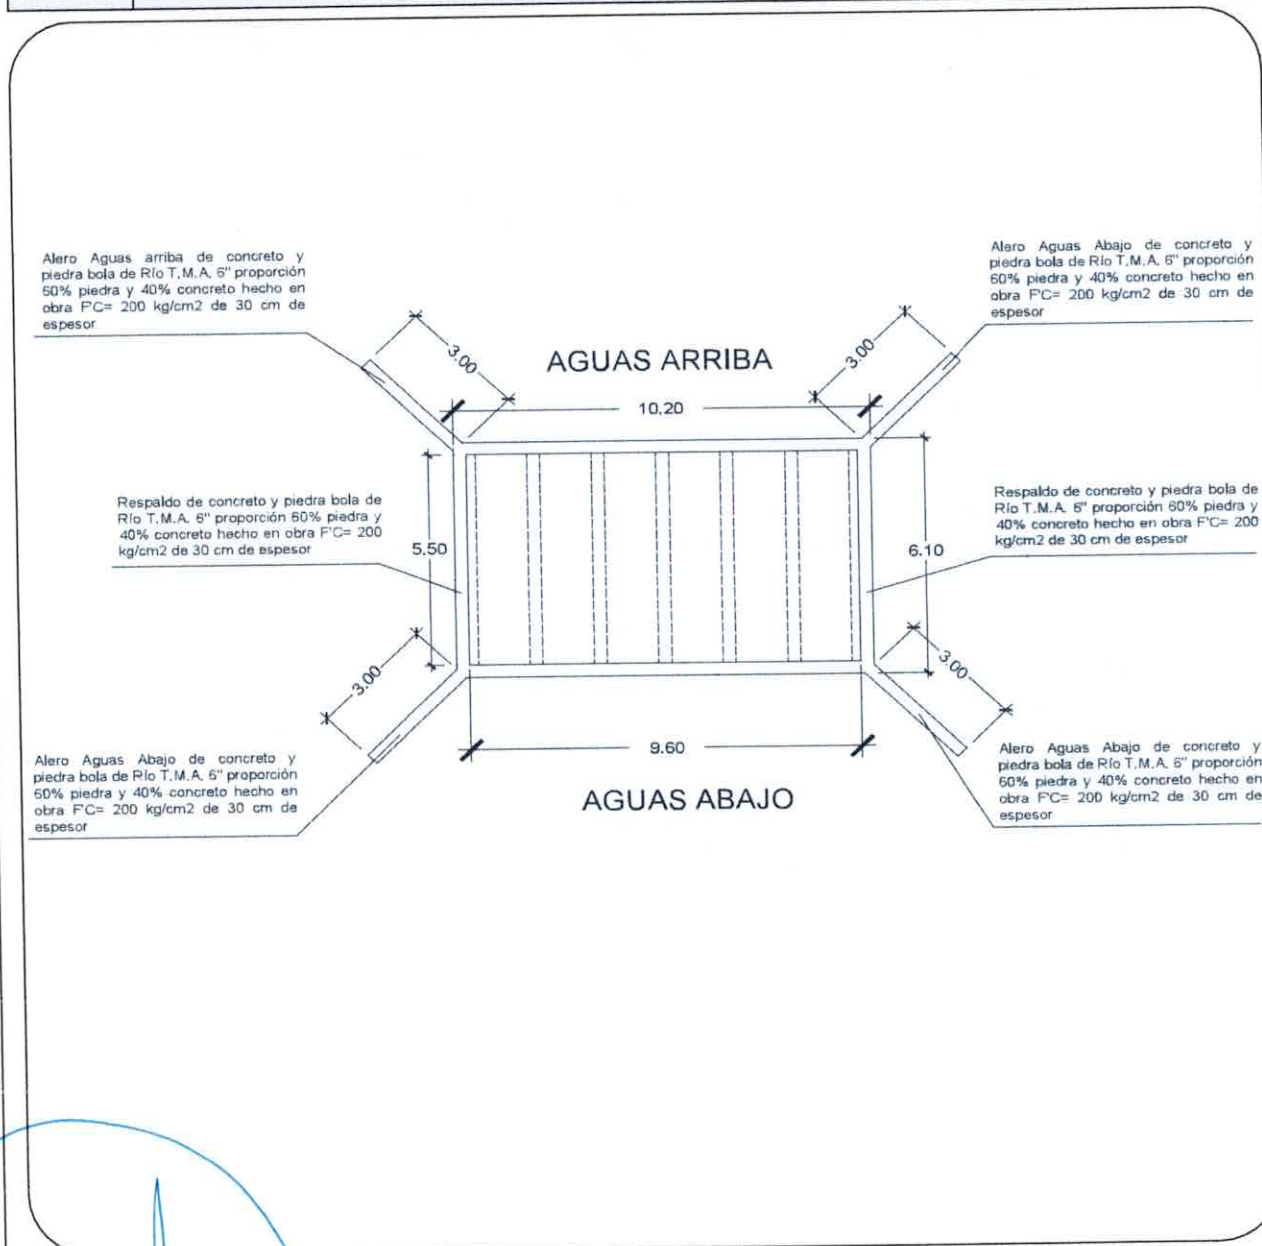

ELABORÓ

ARQ. ARNULFO LIZARRAGA VALENZUELA
SUPERINTENDENTE DE OBRA

AUTORIZÓ

ARQ. SILVIA ZAYDEE PADILLA CRESPO
SUPERVISOR DE OBRAS PUBLICAS



CROQUIS


ESTIMACION: 01 (Finiquito)

MUNICIPIO: ESCUINAPA

LOCALIDAD: ISLA DEL BOSQUE

DESCRIPCION: CONSTRUCCION DE PUENTE (PEATONAL Y VEHICULAR) EN CALLE EMILIANO ZAPATA EN ISLA DEL BOSQUE, ESCUINAPA, SINALOA.

ALZADO LONGITUDINAL Y TRANSVERSAL

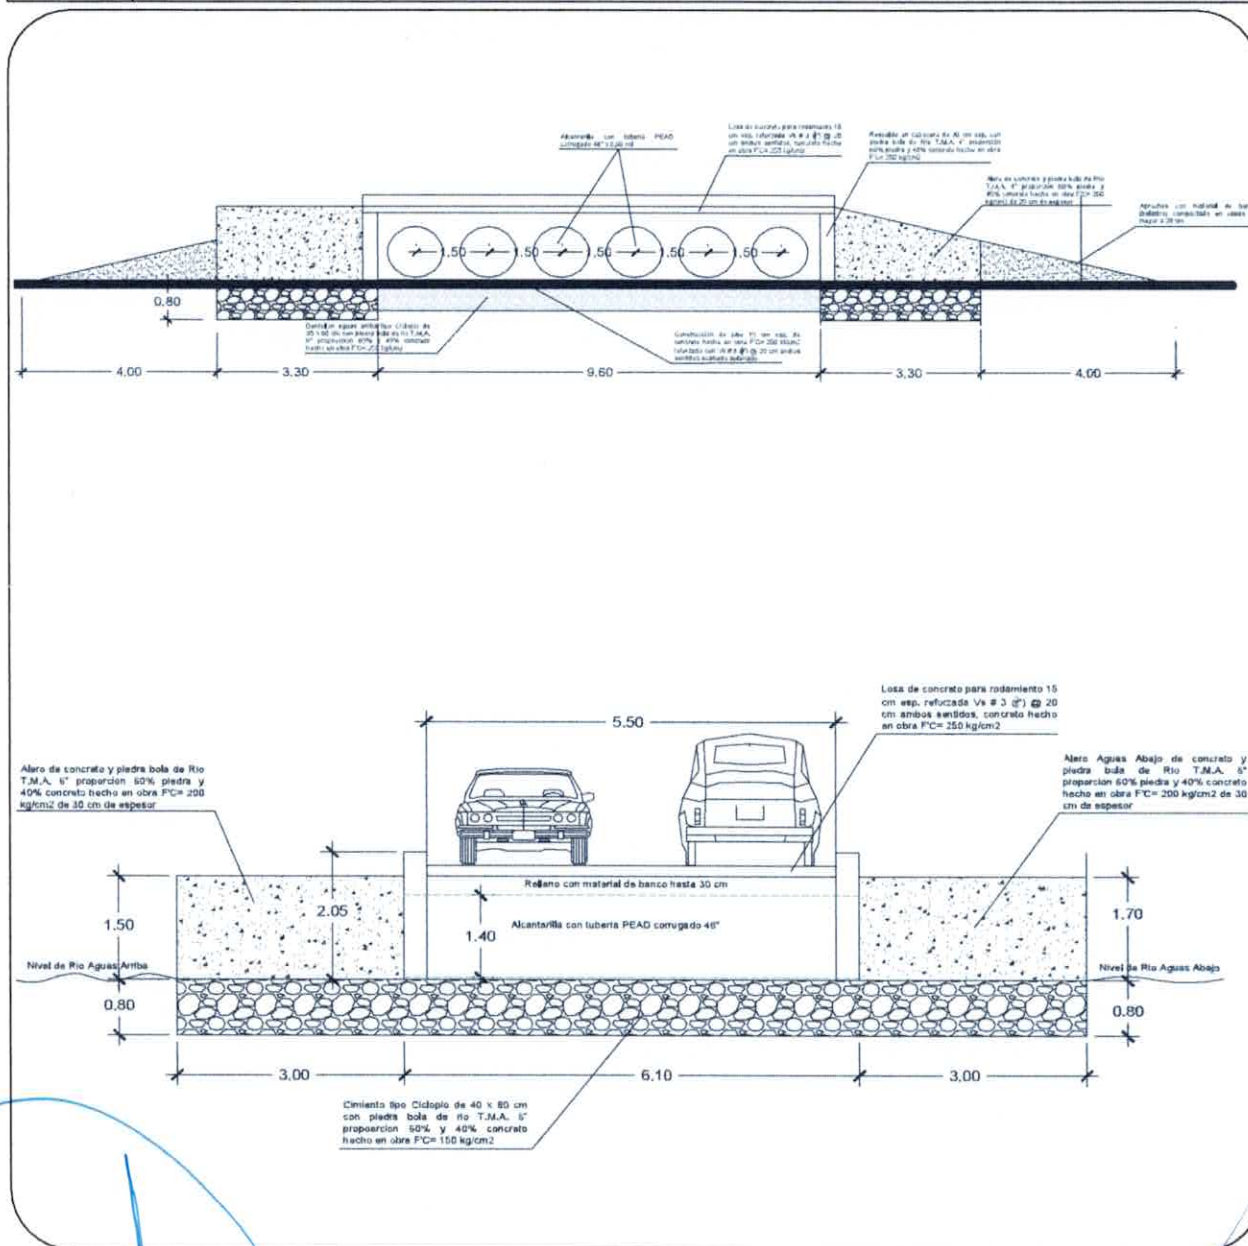

ELABORÓ

ARQ. ARNULFO LIZARRAGA VALENZUELA
SUPERINTENDENTE DE OBRA

AUTORIZO

ARQ. SILVIA ZAYDEE PADILLA CRESPO
SUPERVISOR DE OBRAS PUBLICAS



CORPORATIVO LA PALOMA S.A. DE C.V.
CALLE MARIANO ESCOBEDO No.6, COL. CENTRO
CONCORDIA, SINALOA.

R.F.C.
CPA-061117-QJ8

I.M.S.S.
L51-11189-10-0



MUNICIPIO DE ESCUINAPA, SINALOA
DIRECCION DE OBRAS, SERVICIOS PUBLICOS
Y ECOLOGIA

ESCUINAPA, SINALOA

HOJA: 1 de 5



FOTOGRAFIAS

ESTIMACION: **01 (Finiquito)**
MUNICIPIO: **ESCUINAPA**
LOCALIDAD: **ISLA DEL BOSQUE**
DESCRIPCION: **CONSTRUCCION DE PUENTE (PEATONAL Y VEHICULAR) EN CALLE EMILIANO ZAPATA EN ISLA DEL BOSQUE, ESCUINAPA, SINALOA.**

CLAVE	(Descripcion del Concepto)
PUE-0010	TRAZO Y NIVELACIÓN DE ÁREA CONTRATADA PARA LA CONSTRUCCIÓN TERRENO NATURAL EXCLUYENDO ÁREAS NO AFECTADAS INC. TOPOGRAFÍA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.



CLAVE	(Descripcion del Concepto)
PUE-0030	EXCAVACION EN CEPA DE 0.00 HASTA 2.00 M DE PROFUNDIDAD CON RETROEXCAVADORA EN MATERIAL TIPO "B" INC. MAQUINARIA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.



ELABORÓ

ARQ. ARNULFO LIZARRAGA VALENZUELA
SUPERINTENDENTE DE OBRA

AUTORIZO

ARQ. SILVIA ZAYDEE PADILLA CRESPO
SUPERVISOR DE OBRAS PUBLICAS

FOTOGRAFIAS

LOCALIDAD: ISLA DEL BOSQUE
 ESTIMACION: 01 (Finiquito)
 MUNICIPIO: ESCUINAPA
 DESCRIPCION: CONSTRUCCION DE PUENTE (PEATONAL Y VEHICULAR) EN CALLE EMILIANO ZAPATA EN ISLA DEL BOSQUE, ESCUINAPA, SINALOA.

CLAVE	(Descripcion del Concepto)
CONS-01	CONSTRUCCION DE PISO DE 10 CM ESP. DE CONCRETO HECHO EN OBRA F'C=200 KG/CM2 REFORZADO CON VS #3 (3/8") @ 20 CM AMBOS SENTIDOS ACABADO APLANADO.



CLAVE	(Descripcion del Concepto)
CONS-01	CONSTRUCCION DE PISO DE 10 CM ESP. DE CONCRETO HECHO EN OBRA F'C=200 KG/CM2 REFORZADO CON VS #3 (3/8") @ 20 CM AMBOS SENTIDOS ACABADO APLANADO.



ELABORÓ

ARQ. ARNULFO LIZARRAGA VALENZUELA
 SUPERINTENDENTE DE OBRA

AUTORIZÓ

ARQ. SILVIA ZAYDEE PADILLA CRESPO
 SUPERVISOR DE OBRAS PUBLICAS


FOTOGRAFIAS

LOCALIDAD: ISLA DEL BOSQUE

ESTIMACION: 01 (Finiquito)
MUNICIPIO: ESCUINAPA

DESCRIPCION: CONSTRUCCION DE PUENTE (PEATONAL Y VEHICULAR) EN CALLE EMILIANO ZAPATA EN ISLA DEL BOSQUE, ESCUINAPA, SINALOA.

CLAVE	(Descripcion del Concepto)
CIM-001	CONST. DE DENTELLÓN AGUAS ARRIBA DE 30X60 CM DE CONCRETO CICLOPIO REFORZADO CON ACERO # 3 (3/8") Y PIEDRA LIMPIA AL 60% T.M.A. 6" Y 40% CONCRETO HECHO EN OBRA F'C= 200 KG/CM2 T.M.A 1 1/2" INC. MATERIAL, MANO DE OBRA, JUNTADO DE PIEDRA EN EL LUGAR TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.

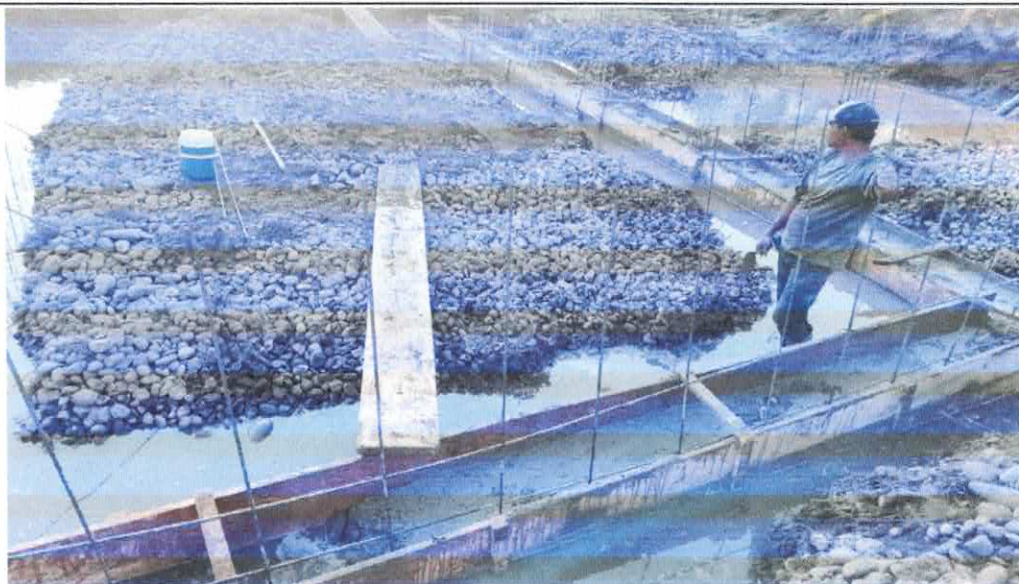

CLAVE	(Descripcion del Concepto)
CIM-001	CONST. DE DENTELLÓN AGUAS ARRIBA DE 30X60 CM DE CONCRETO CICLOPIO REFORZADO CON ACERO # 3 (3/8") Y PIEDRA LIMPIA AL 60% T.M.A. 6" Y 40% CONCRETO HECHO EN OBRA F'C= 200 KG/CM2 T.M.A 1 1/2" INC. MATERIAL, MANO DE OBRA, JUNTADO DE PIEDRA EN EL LUGAR TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.



ELABORÓ

ARQ. ARNULFO LIZARRAGA VALENZUELA
 SUPERINTENDENTE DE OBRA

AUTORIZÓ

ARQ. SILVIA ZAYDEE PADILLA CRESPO
 SUPERVISOR DE OBRAS PUBLICAS

FOTOGRAFIAS

LOCALIDAD: ISLA DEL BOSQUE
 ESTIMACION: 01 (Finiquito)
 MUNICIPIO: ESCUINAPA
 DESCRIPCION: CONSTRUCCION DE PUENTE (PEATONAL Y VEHICULAR) EN CALLE EMILIANO ZAPATA EN ISLA DEL BOSQUE, ESCUINAPA, SINALOA.

CLAVE	(Descripcion del Concepto)
CIM-002	CONST. DE CIMIENTO TIPO CICLOPIO EN RESPALDOS 40X80 CM REFORZADO CON ACERO # 3 (3/8"), ESTRUCTURA CON PIEDRA LIMPIA AL 60% T.M.A. 8" Y 40% CONCRETO HECHO EN OBRA F'C= 150 KG/CM2 T.M.A 1 1/2" INC. MATERIAL, MANO DE OBRA, JUNTADO DE PIEDRA EN EL LUGAR TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.



CLAVE	(Descripcion del Concepto)
CIM-002	CONST. DE CIMIENTO TIPO CICLOPIO EN RESPALDOS 40X80 CM REFORZADO CON ACERO # 3 (3/8"), ESTRUCTURA CON PIEDRA LIMPIA AL 60% T.M.A. 8" Y 40% CONCRETO HECHO EN OBRA F'C= 150 KG/CM2 T.M.A 1 1/2" INC. MATERIAL, MANO DE OBRA, JUNTADO DE PIEDRA EN EL LUGAR TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.



ELABORÓ

ARQ. ARNULFO LIZARRAGA VALENZUELA
 SUPERINTENDENTE DE OBRA

AUTORIZO

ARQ. SILVIA ZAYDEE PADILLA CRESPO
 SUPERVISOR DE OBRAS PUBLICAS



CORPORATIVO LA PALOMA S.A. DE C.V.
CALLE MARIANO ESCOBEDO No.6, COL. CENTRO
CONCORDIA, SINALOA.

R.F.C.
CPA-061117-QJ8

I.M.S.S.
LS1-11189-10-0



MUNICIPIO DE ESCUINAPA, SINALOA
DIRECCION DE OBRAS, SERVICIOS PUBLICOS
Y ECOLOGIA

ESCUINAPA, SINALOA

HOJA: 5 de 5



FOTOGRAFIAS

LOCALIDAD: ISLA DEL BOSQUE

ESTIMACION: 01 (Finiquito)

MUNICIPIO: ESCUINAPA

DESCRIPCION: CONSTRUCCION DE PUENTE (PEATONAL Y VEHICULAR) EN CALLE EMILIANO ZAPATA EN ISLA DEL BOSQUE, ESCUINAPA, SINALOA.

CLAVE	(Descripcion del Concepto)
ALC-001	SUMINISTRO Y COLOC. DE TUBO DE POLIETILENO PEAD CORRUGADO DE 48" X 5.00 MTS INC. MANIOBRA CON GRUA, COLOCACIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.



CLAVE	(Descripcion del Concepto)
ALC-001	SUMINISTRO Y COLOC. DE TUBO DE POLIETILENO PEAD CORRUGADO DE 48" X 5.00 MTS INC. MANIOBRA CON GRUA, COLOCACIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.



ELABORÓ

ARQ. ARNULFO LIZARRAGA VALENZUELA
SUPERINTENDENTE DE OBRA

AUTORIZO

ARQ. SILVIA ZAYDEE PADILLA CRESPO
SUPERVISOR DE OBRAS PUBLICAS
