

JEOS CONSTRUCTORA S.A. DE C.V.
CALLE INDEPENDENCIA NO. 52 BIS, NTE, CENTRO
ESCUINAPA, SINALOA

R.F.C.
JCO-990915-QR3

I.M.S.S.
E5111999101



MUNICIPIO DE ESCUINAPA, SINALOA
DIRECCION DE OBRAS, SERVICIOS PUBLICOS
Y ECOLOGIA

ESCUINAPA, SINALOA

HOJA: 1 de 1



CONCEPTOS DE ESTIMACION

CONTRATO: ESC-FAISMUN-2025-005

PERIODO: 04-ago-25 AL 02-sep-25

LOCALIDAD: EL PALMITO DEL VERDE

ESTIMACION: 01 (Finiquito)

MUNICIPIO: ESCUINAPA

DESCRIPCION: REHABILITACION DE 30 LUMINARIAS EN CALLES DE LA SINDICATURA EL PALMITO DEL VERDE, MUNICIPIO DE ESCUINAPA, SINALOA

IMPORTE DE OBRA: \$174,918.60
IMPORTE DE ANTICIPO DE OBRA: \$61,221.51
IMPORTE TOTAL DE CONTRATO: \$174,918.60

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	SEGUN PROYECTO			HASTA ESTA	HASTA ESTIMACION ANTERIOR	EXCEDENTE	DE ESTA ESTIMACION	IMPORTE
			VOL.	PU	\$	ESTIMACION				
REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO										
ALUMBRADO PUBLICO										
56225	DESINSTALACION DE LAMPARA SEMI URBANA.	P7A	30.00	\$ 577.3765	\$ 15,821.30	30.00	0.00	0.00	30.00	15,821.30
100951	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LAMPARA SEMI URBANA MODELO RADIANT- R0- 190- 5K; POTENCIA 60 WATTS; CON 180 LUMENES POR WATT; 11400 LUMENES TOTALES; CHIP SMD 5050; CORRIENTE: 0.72- 0.23 A; VOLTAJE 100- 277 V; HERTZ 60 HZ; DISTORSION ARMONICA (THD) <15%; FACTOR DE POTENCIA >0.97; RANGO DE TEMPERATURA DE TRABAJO- 20°C A +50°C; CRI>80; TEMPERATURA DE COLOR 5000K (BLANCO NEUTRO); SUPRESOR DE PICOS EN DRIVER 6 KV Y CUENTA CON UN EXTERNO DE 20 KV, MARCA DEL DRIVER SOSEN; RESISTENCIA CONTRA IMPACTOS IK1 (ANTIVANDALISMO); PROTECCION IP67 EN DRIVER Y IP68 EN MODULO DE LED; CARCASA DE ALUMINIO, CON PANTALLA DE POLICARBONATO; (10 AÑOS DE GARANTIA EN SISTEMA).	M2	30.00	\$ 4,499.02	\$ 134,970.60	30.00	0.00	0.00	30.00	134,970.60
TOTAL DE ALUMBRADO:									\$	150,791.90
TOTAL DE ESTIMACION:									\$	150,791.90

ELABORO

JEOS CONSTRUCTORA S.A. DE C.V.
ING. VICTOR JUAN ESPINOZA TIRADO
REPRESENTANTE LEGAL

REVISO

ARQ. SILVIA ZAYDEE PADILLA CRESPO
SUPERVISOR DE OBRAS PUBLICAS

AUTORIZO

M. en ARQ. GRACIELA ELIZALDE SANTOS
DIRECTORA DE OBRAS, SERVICIOS
PUBLICOS Y ECOLOGIA

JEOS CONSTRUCTORA S.A. DE C.V.
 CALLE INDEPENDENCIA NO. 52 BIS, NTE, CENTRO
 ESCUINAPA, SINALOA
 R.F.C.
 JCO-930915-QR3

I.M.S.S.
 E5111999101



MUNICIPIO DE ESCUINAPA, SINALOA
 DIRECCION DE OBRAS, SERVICIOS PUBLICOS
 Y ECOLOGIA
 ESCUINAPA, SINALOA



RESUMEN DE ESTIMACION

CONTRATO: ESC-FAISMUN-2025-005
 PERIODO: 04-ago-25 AL 02-sep-25
 DESCRIPCION: REHABILITACION DE 30 LUMINARIAS EN CALLES DE LA SINDICATURA EL PALMITO DEL VERDE, MUNICIPIO DE ESCUINAPA, SINALOA

ESTIMACION: 01 (Finiquito)
 MUNICIPIO: ESCUINAPA

LOCALIDAD: EL PALMITO DEL VERDE

IMPORTE DE OBRA: \$174,918.60
 IMPORTE DE ANTICIPO DE OBRA: \$61,221.51
 IMPORTE TOTAL DE CONTRATO: \$174,918.60

CONVENIO ADICIONAL:
 PERIODO CONVENIO ADICIONAL:
 DEL

AL

REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO

OBRA

IMPORTE

REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO \$ 150,791.90

SUB TOTAL =
 I.V.A.
 TOTAL =

\$ 150,791.90
 \$ 24,126.70
 \$ 174,918.60

Elaboró:

Revisó:

Autorizó:

JEOS CONSTRUCTORA S.A. DE C.V.
 ING. VICTOR JUAN ESPINOZA TIRADO
 REPRESENTANTE LEGAL

ARO. SILVIA ZAYDEE PADILLA CRESCO
 SUPERVISOR DE OBRAS PUBLICAS

M. ARQ. GRACIELA ELIZAL DE SANTOS
 DIRECTORA DE OBRAS, SERVICIOS
 PUBLICOS Y ECOLOGIA

JEOS CONSTRUCTORA S.A. DE C.V.
CALLE INDEPENDENCIA NO. 52 BIS, NTE, CENTRO
ESCUINAPA, SINALOA
R.F.C. JCO-990915-QR3
I.M.S.S.
E5111999101



MUNICIPIO DE ESCUINAPA, SINALOA
DIRECCION DE OBRAS, SERVICIOS PUBLICOS
ESCUINAPA, SINALOA



ESTADO DE CUENTA

ESTIMACION: 01 (Finiquito)
MUNICIPIO: ESCUINAPA
LOCALIDAD: EL PALMITO DEL VERDE
DESCRIPCION: REHABILITACION DE 30 LUMINARIAS EN CALLES DE LA SINDICATURA EL PALMITO DEL VERDE, MUNICIPIO DE ESCUINAPA, SINALOA

FECHA INICIO: 04-ago-25
FECHA TERMINACION: 02-sep-25
CONTRATO: ESC-FAISMUN-2025-005
FECHA CONTRATO: 01-ago-25

IMPORTE DE OBRA: \$174,918.60 CLAVE DE CONVENIO ADICIONAL:
IMPORTE DE ANTICIPO DE OBRA: \$61,221.51 PERICDO CONVENIO ADICIONAL:
IMPORTE TOTAL DE CONTRATO: \$174,918.60 IMPORTE CONVENIO ADICIONAL:

No. DE ESTIMACION	PERICDO	IMPORTE ESTIMACION \$	IMPORTE IVA \$	SIN	3% DE GANHO INTERNO DE CONTROL FIPAL Y CONGRESO DEL EDO.	35% AMORTIZACION ANTICIPO \$	TOTAL DEDUCCIONES \$	LIQUIDO A PAGAR \$
01 (Finiquito)	04-ago-25	02-sep-25	\$ 174,918.60	\$ 150,791.90	\$ 4,523.76	\$ 61,221.51	\$ 65,745.27	\$ 109,173.33
TOTAL ES:								
			\$ 174,918.60	\$ 150,791.90	\$ 4,523.76	\$ 61,221.51	\$ 65,745.27	\$ 109,173.33
SALDO DEL CONTRATO:			\$0.00	SALDO POR AMORTIZAR:				
				\$0.00				

REALIZO

JEOS CONSTRUCTORA S.A. DE C.V.
ING. VICTOR JUAN ESPINOZA TIRADO
REPRESENTANTE LEGAL

REVISO

ARQ. SILVIA ZAYDEE PADILLA CRESPO
SUPERVISOR DE OBRAS PUBLICAS

AUTORIZO

M. en ARQ. GRACIELA ELIZALDE SANTOS
DIRECTORA DE OBRAS, SERVICIOS PUBLICOS Y ECOLOGIA

AUTORIZO

L.C.P. JOSE TRINIDAD IBARRA MARTINEZ
TESORERO MUNICIPAL

CARATULA DE RECIBO

Hoja: 1 de 1

RECIBO MUNICIPAL No. 01 (Finiquito)

JEOS CONSTRUCTORA S.A. DE C.V.
CALLE INDEPENDENCIA NO. 52 BIS, NTE, CENTRO
ESCUINAPA, SINALOA

TELEFONO:

CEL:

UBICACION:
MAZATLAN, SIN.

I.M.S.S.
E5111999101

R.F.C.
JCO-990915-QR3

FECHA: 02-sep-25
ESTIMACION No: 01 (Finiquito)
PERIODO:
DEL 04-ago-25
AL 02-sep-25

FECHA DE CONTRATO: 01-ago-25
PERIODO DE EJECUCION DEL CONTRATO:
INICIO: 04-ago-25
TERMINACION: 02-sep-25
PRORROGA:
DEL
AL

DESCRIPCION:

REHABILITACION DE 30 LUMINARIAS EN CALLES DE LA SINDICATURA EL PALMITO DEL VERDE, MUNICIPIO DE ESCUINAPA, SINALOA

CONTRATO NO:

ESC-FAISMUN-2025-005

IMPORTE SIN IVA
\$150,791.90

IMPORTE CON IVA
\$174,918.60

35% ANTICIPO
\$61,221.51

IMPORTE TOTAL DE CONTRATO:
\$174,918.60

BUENO POR: \$109,173.33

RECIBI DE LA TESORERIA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE ESCUINAPA, SINALOA, LA CANTIDAD DE:

\$109,173.33 SON: (CIENTO NUEVE MIL CIENTO SETENTA Y TRES PESOS 33/100 M.N.

EN PAGO DE ESTIMACION 01 (Finiquito)

DEDUCCIONES:

AMORTIZACION ANTICIPO 35% (*)

\$ 52,777.16

MAS I.V.A.

\$ 8,444.35

TOTAL AMORTIZACION DE ANTICIPO

\$ 61,221.51

3% ORGANO INTERNO DE CONTROL
MPAL Y CONGRESO DEL ESTADO: (*)

\$ 4,523.76

TOTAL DE DEDUCCIONES:

\$ 65,745.27

(*) DEL IMPORTE EJECUTADO SIN IVA

CALCULO DE ESTIMACION

IMPORTE DE LA OBRA EJECUTADA SIN IVA

\$ 150,791.90

DEDUCCION ANTICIPO (35%):

-\$ 52,777.16

SUMA:

\$ 98,014.74

MAS I.V.A 16 %

\$ 15,682.35

TOTAL:

\$ 113,697.09

DEDUCCION SVIFC (3%):

-\$ 4,523.76

LIQUIDO A PAGAR:

\$ 109,173.33

SALDO A PAGAR: \$ 109,173.33

REALIZO

JEOS CONSTRUCTORA S.A. DE C.V.
ING. VICTOR JUAN ESPINOZA TIRADO
CONTRATISTA

AUTORIZO

M. en ARQ. GRACIELA ELIZALDE SANTOS
DIRECTORA DE OBRAS, SERVICIOS
PUBLICOS Y ECOLOGIA

REVISO

ARQ. SILVIA ZAYDEE PADILLA CRESPO
SUPERVISOR DE OBRAS PUBLICAS

AUTORIZO

L.C.P. JOSE TRINIDAD IBARRA MARTINEZ
TESORERO MUNICIPAL



JEOS CONSTRUCTORA S.A. DE C.V.

UN MUNDO EN CONSTRUCCION...

INDEPENDENCIA NO. 52 BIS NTE. CENTRO, ESCUINAPA SINALOA

Tel. 69595.30588 C. e.: jeos2391@gmail.com

Recibo No. 1

Bueno por: **\$109,173.33**

RECIBI DE TESORERIA DEL MUNICIPIO DE ESCUINAPA LA CANTIDAD DE: - - - - -
\$109,173.33 (CIENTO NUEVE MIL CIENTO SETENTA Y TRES PESOS 33/100 M.N.).
POR CONCEPTO DE:

PAGO CORRESPONDIENTE A LA **ESTIMACION No.1 (FINIQUITO)** DEL CONTRATO No.
ESC-FAISMUN-2025-005 DE LA OBRA DE DESIGNACION:

REHABILITACION DE 30 LUMINARIAS EN CALLES DE LA SINDICATURA EL PALMITO DEL VERDE, MUNICIPIO DE ESCUINAPA, SINALOA.

Monto total Contratado = \$174,918.60 (Son Ciento Setenta y Cuatro Mil Novecientos Dieciocho Pesos 60/100 M.N.)

IMPORTE DE ESTIMACION:	\$150,791.90
SUBTOTAL:	\$150,791.90
16% IVA:	\$24,126.70
TOTAL:	\$174,918.60

DEDUCCIONES:	
AMORTIZACION ANTICIPO 35%:	\$61,221.51
CONGRESO DEL ESTADO 3%:	\$4,523.76

TOTAL NETO A COBRAR:	\$109,173.33
-----------------------------	---------------------

RECIBI:
ESCUINAPA, SINALOA A 02 DE SEPTIEMBRE DE 2025
JEOS CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.

Atentamente:



ING. VICTOR JUAN ESPINOZA TIRADO
Representante Legal

c.c. Archivo

JEOS CONSTRUCTORA S.A. DE C.V.
CALLE INDEPENDENCIA NO. 52 BIS, NTE, CENTRO
ESCUINAPA, SINALOA
R.F.C.
JCO-990915-QR3

I.M.S.S.
E5111999101



MUNICIPIO DE ESCUINAPA, SINALOA
DIRECCION DE OBRAS, SERVICIOS PUBLICOS
Y ECOLOGIA
ESCUINAPA, SINALOA

HOJA: 1 de 1



NUMEROS GENERADORES

LOCALIDAD: EL PALMITO DEL VERDE ESTIMACION: 01 (Finiquito)
MUNICIPIO: ESCUINAPA

DESCRIPCION: REHABILITACION DE 30 LUMINARIAS EN CALLES DE LA SINDICATURA EL PALMITO DEL VERDE, MUNICIPIO DE ESCUINAPA, SINALOA

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	LOCALIZACION			LARGO	ANCHO	ALTO	RESULTADO	OBSERVACIONES
			EJE	TRAMO	PZAS					
	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO									
	ALUMBRADO PUBLICO									
56235	DESINSTALACION DE LAMPARA SEMI URBANA.	PZA			30.00				30.00	
100951	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LAMPARA SEMI URBANA MODELO RADIANT- 60- 190- 5K; POTENCIA 60 WATTS; CON 190 LUMENES POR WATT; 11400 LUMENES TOTALES; CHIP SMD 5050; CORRIENTE: 0.72- 0.23 A; VOLTAJE 100- 277 V, HERTZ 60 HZ; DISTORSION ARMONICA (THD) <15%; FACTOR DE POTENCIA >0.97; RANGO DE TEMPERATURA DE TRABAJO- 20°C A +50°C; CRI>80; TEMPERATURA DE COLOR 5000K (BLANCO NEUTRO); SUPRESOR DE PICOS EN DRIVER 6 KV Y CUENTA CON UN EXTERNO DE 20 KV; MARCA DEL DRIVER SUSEN; RESISTENCIA CONTRA IMPACTOS IK1 (ANTIVANDALISMO); PROTECCION IP67 EN DRIVER Y IP68 EN MODULO DE LED; CARCASA DE ALUMINIO; CON PANTALLA DE POLICARBONATO; (10 AÑOS DE GARANTIA EN SISTEMA).	M2			30.00				30.00	

ELABORO

JEOS CONSTRUCTORA S.A. DE C.V.
REPRESENTANTE LEGAL

AUTORIZO

ARQ. SILVIA ZAYDEE PADILLA CRESPO
SUPERVISOR DE OBRAS PUBLICAS

JEOS CONSTRUCTORA S.A. DE C.V.
CALLE INDEPENDENCIA NO. 52 BIS, NTE, CENTRO
ESCUINAPA, SINALOA
R.F.C.
JCO-990915-QR3

I.M.C.C.
E5111999101



MUNICIPIO DE ESCUINAPA, SINALOA
DIRECCION DE OBRAS, SERVICIOS PUBLICOS
Y ECOLOGIA

ESCUINAPA, SINALOA

HOJA: 1 de 4



FOTOGRAFIAS

DESCRIPCION: REHABILITACION DE 30 LUMINARIAS EN CALLES DE LA SINDICATURA EL PALMITO DEL VERDE, MUNICIPIO DE ESCUINAPA, SINALOA
LOCALIDAD: EL PALMITO DEL VERDE
ESTIMACION: 01 (Finiquito)
MUNICIPIO: ESCUINAPA

CLAVE (Descripcion del Concepto)

56235 DESINSTALACION DE LAMPARA SEMI URBANA.



CLAVE (Descripcion del Concepto)

56235 DESINSTALACION DE LAMPARA SEMI URBANA.



ELABORO

JEOS CONSTRUCTORA S.A. DE C.V.
ING. VICTOR JUAN ESPINOZA TIRADO
REPRESENTANTE LEGAL

AUTORIZO

ARQ. SILVIA ZAYDEE PADILLA CRESPO
SUPERVISOR DE OBRAS PUBLICAS

JEOS CONSTRUCTORA S.A. DE C.V.
CALLE INDEPENDENCIA NO. 52 BIS, NTE, CENTRO
ESCUINAPA, SINALOA
R.F.C.
JCO-990915-QR3

I.M.S.E.
E5111999101



MUNICIPIO DE ESCUINAPA, SINALOA
DIRECCION DE OBRAS, SERVICIOS PUBLICOS
Y ECOLOGIA

ESCUINAPA, SINALOA

HOJA: 2 de 4



FOTOGRAFIAS

LOCALIDAD: EL PALMITO DEL VERDE

ESTIMACION: 01 (Finiquito)
MUNICIPIO: ESCUINAPA

DESCRIPCION: REHABILITACION DE 30 LUMINARIAS EN CALLES DE LA SINDICATURA EL PALMITO DEL VERDE, MUNICIPIO DE ESCUINAPA, SINALOA

CLAVE

(Descripcion del Concepto)

56235

DESINSTALACION DE LAMPARA SEMI URBANA.



CLAVE

(Descripcion del Concepto)

56235

DESINSTALACION DE LAMPARA SEMI URBANA.



ELABORO

JEOS CONSTRUCTORA S.A. DE C.V.
ING. VICTOR JUAN ESPINOZA TIRADO
REPRESENTANTE LEGAL

AUTORIZO

ARQ. SILVIA ZAYDEE PADILLA CRESPO
SUPERVISOR DE OBRAS PUBLICAS

JEOS CONSTRUCTORA S.A. DE C.V.
CALLE INDEPENDENCIA NO. 52 BIS, NTE, CENTRO
ESCUINAPA, SINALOA
R.F.C.
JCO-990915-QR3

I.M.S.S.
E5111999101



MUNICIPIO DE ESCUINAPA, SINALOA
DIRECCION DE OBRAS, SERVICIOS PUBLICOS
Y ECOLOGIA

ESCUINAPA, SINALOA

HOJA: 3 de 4



FOTOGRAFIAS

LOCALIDAD: EL PALMITO DEL VERDE

ESTIMACION: 01 (Finiquito)
MUNICIPIO: ESCUINAPA

DESCRIPCION: REHABILITACION DE 30 LUMINARIAS EN CALLES DE LA SINDICATURA EL PALMITO DEL VERDE, MUNICIPIO DE ESCUINAPA, SINALOA

CLAVE

(Descripcion del Concepto)

100951

SUMINISTRO Y COLOCACION DE LAMPARA SEMI URBANA MODELO RADIANT- 60- 190- 5K; POTENCIA 60 WATTS; CON 190 LUMENES POR WATT; 11400 LUMENES TOTALES; CHIP SMD 5050; CORRIENTE: 0.72- 0.23 A; VOLTAJE 100-277 V; HERTZ 60 HZ; DISTORSION ARMONICA (THD) <15%; FACTOR DE POTENCIA >0.97; RANGO DE TEMPERATURA DE TRABAJO- 20°C A +50°C; CRI>80; TEMPERATURA DE COLOR 5000K (BLANCO NEUTRO); SUPRESOR DE PICOS EN DRIVER 6 KV Y CUENTA CON UN EXTERNO DE 20 KV; MARCA DEL DRIVER SOSEN; RESISTENCIA CONTRA IMPACTOS IK1 (ANTIVANDALISMO); PROTECCION IP67 EN DRIVER Y IP68 EN MODULO DE LED; CARCASA DE ALUMINIO; CON PANTALLA DE POLICARBONATO: (10 AÑOS DE GARANTIA EN SISTEMA).



CLAVE

(Descripcion del Concepto)

100951

SUMINISTRO Y COLOCACION DE LAMPARA SEMI URBANA MODELO RADIANT- 60- 190- 5K; POTENCIA 60 WATTS; CON 190 LUMENES POR WATT; 11400 LUMENES TOTALES; CHIP SMD 5050; CORRIENTE: 0.72- 0.23 A; VOLTAJE 100-277 V; HERTZ 60 HZ; DISTORSION ARMONICA (THD) <15%; FACTOR DE POTENCIA >0.97; RANGO DE TEMPERATURA DE TRABAJO- 20°C A +50°C; CRI>80; TEMPERATURA DE COLOR 5000K (BLANCO NEUTRO); SUPRESOR DE PICOS EN DRIVER 6 KV Y CUENTA CON UN EXTERNO DE 20 KV; MARCA DEL DRIVER SOSEN; RESISTENCIA CONTRA IMPACTOS IK1 (ANTIVANDALISMO); PROTECCION IP67 EN DRIVER Y IP68 EN MODULO DE LED; CARCASA DE ALUMINIO; CON PANTALLA DE POLICARBONATO: (10 AÑOS DE GARANTIA EN SISTEMA).



ELABORÓ

JEOS CONSTRUCTORA S.A. DE C.V.
ING. VICTOR JUAN ESPINOZA TIRADO
REPRESENTANTE LEGAL

AUTORIZÓ

ARQ. SILVIA ZAYDEE PADILLA CRESPO
SUPERVISOR DE OBRAS PUBLICAS

JEOS CONSTRUCTORA S.A. DE C.V.
CALLE INDEPENDENCIA NO. 52 BIS, NTE, CENTRO
ESCUINAPA, SINALOA
R.F.C.
JCO-990915-QR3

I.V.S.S.
E5111999101



MUNICIPIO DE ESCUINAPA, SINALOA
DIRECCION DE OBRAS, SERVICIOS PUBLICOS
Y ECOLOGIA

ESCUINAPA, SINALOA

HOJA: 4 de 4



FOTOGRAFIAS

LOCALIDAD: EL PALMITO DEL VERDE

ESTIMACION: 01 (Finiquito)

MUNICIPIO: ESCUINAPA


DESCRIPCION: REHABILITACION DE 30 LUMINARIAS EN CALLES DE LA SINDICATURA EL PALMITO DEL VERDE, MUNICIPIO DE ESCUINAPA, SINALOA

CLAVE

(Descripción del Concepto)

100951

SUMINISTRO Y COLOCACION DE LAMPARA SEMI URBANA MODELO RADIANT- 60- 190- 5K; POTENCIA 60 WATTS; CON 190 LUMENES POR WATT; 11400 LUMENES TOTALES; CHIP SMD 5050; CORRIENTE: 0.72- 0.23 A; VOLTAJE 100-277 V; HERTZ 60 HZ; DISTORSION ARMONICA (THD) <15%; FACTOR DE POTENCIA >0.97; RANGO DE TEMPERATURA DE TRABAJO- 20°C A +50°C; CRI>80; TEMPERATURA DE COLOR 5000K (BLANCO NEUTRO); SUPRESOR DE PICOS EN DRIVER 6 KV Y CUENTA CON UN EXTERNO DE 20 KV; MARCA DEL DRIVER SOSEN; RESISTENCIA CONTRA IMPACTOS IK1 (ANTIVANDALISMO); PROTECCION IP67 EN DRIVER Y IP68 EN MODULO DE LED; CARCASA DE ALUMINIO; CON PANTALLA DE POLICARBONATO: (10 AÑOS DE GARANTIA EN SISTEMA).

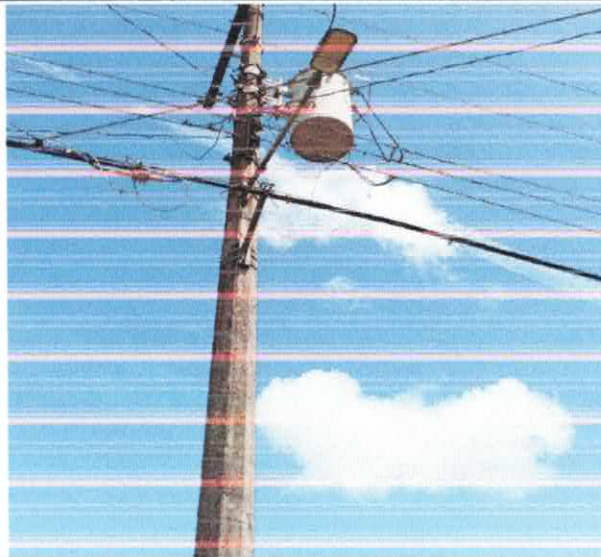

CLAVE

(Descripción del Concepto)

100951

SUMINISTRO Y COLOCACION DE LAMPARA SEMI URBANA MODELO RADIANT- 60- 190- 5K; POTENCIA 60 WATTS; CON 190 LUMENES POR WATT; 11400 LUMENES TOTALES; CHIP SMD 5050; CORRIENTE: 0.72- 0.23 A; VOLTAJE 100-277 V; HERTZ 60 HZ; DISTORSION ARMONICA (THD) <15%; FACTOR DE POTENCIA >0.97; RANGO DE TEMPERATURA DE TRABAJO- 20°C A +50°C; CRI>80; TEMPERATURA DE COLOR 5000K (BLANCO NEUTRO); SUPRESOR DE PICOS EN DRIVER 6 KV Y CUENTA CON UN EXTERNO DE 20 KV; MARCA DEL DRIVER SOSEN; RESISTENCIA CONTRA IMPACTOS IK1 (ANTIVANDALISMO); PROTECCION IP67 EN DRIVER Y IP68 EN MODULO DE LED; CARCASA DE ALUMINIO; CON PANTALLA DE POLICARBONATO: (10 AÑOS DE GARANTIA EN SISTEMA).



ELABORÓ

JEOS CONSTRUCTORA S.A. DE C.V.
ING. VICTOR JUAN ESPINOZA TIRADO
REPRESENTANTE LEGAL

REVISÓ

ARO. SILVIA ZAYDEE PADILLA CRESPO
SUPERVISOR DE OBRAS PUBLICAS
