



CORPORATIVO LA PALOMA S.A. DE C.V.
CALLE MARIANO ESCOBEDO No.6, COL. CENTRO
CONCORDIA, SINALOA.

R.F.C.
CPA-061117-QJ8

C.M.I.C.
102553

I.M.S.S.
L51-11189-10-0



MUNICIPIO DE ESCUINAPA, SINALOA
DIRECCION DE OBRAS, SERVICIOS PUBLICOS
Y ECOLOGIA

ESCUINAPA, SINALOA

HOJA: 1 de 2



CONCEPTOS DE ESTIMACION

CONTRATO: **ESC-FAISMUN-2025-013** ESTIMACION: **01 (Finiquito)**
PERIODO: **13-ago-25** AL **11-oct-25** LOCALIDAD: **ESCUINAPA**
DESCRIPCION: **REHABILITACION DE POZO PROFUNDO EN TERRENO DE JUMAPAE, ESCUINAPA, SINALOA.**

IMPORTE DE OBRA: **\$306,615.75**
IMPORTE DE ANTICIPO DE OBRA: **\$107,315.51**
IMPORTE TOTAL DE CONTRATO: **\$306,615.75**

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	SEGUN PROYECTO			HASTA ESTA ESTIMACION	HASTA ESTIMACION ANTERIOR	EXCEDENTE	DE ESTA ESTIMACION	IMPORTE
			VOL	PU	\$					
REH. POZO PROFUNDO - JUMAPAE										
ESC-001	SUMINISTRO Y COLOCACION DE POLIDUTO DE 1 1/2" PARA ALIMENTADOR ELECTRICO, INCLUYE EXCAVACION DE ZANJA Y DEMOLICION DE PISO DE CONCRETO	ML	48.00	\$ 170.4000	\$ 8,179.20	48.00	0.00	0.00	48.00	8,179.20
ESC-003	SUMINISTRO Y COLOCACION DE BOMBA DE 6" 20 HP 220 V 3F.	PZA	1.00	\$ 105,623.93	\$ 105,623.93	1.00	0.00	0.00	1.00	105,623.93
ESC-004	INSTALACION DEL ALIMENTADOR ELECTRICO CON CABLE CAL. 4 Y 1 P. SUBTERRANEO MAS 1 CABLE CAL. 10 PARA TIERRA FISICA.	ML	63.00	\$ 228.38	\$ 14,387.94	63.00	0.00	0.00	63.00	14,387.94
ESC-006	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CAJA DE ARRANCADOR, EN MURO EXSISTENTE.	PZA	1.00	\$ 11,705.27	\$ 11,705.27	1.00	0.00	0.00	1.00	11,705.27
ESC-008	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ALIMENTADOR ELÉCTRICO CON 4 CABLES DEL NO. 4, ALIMENTADOR PRINCIPAL DE INTERRUPTOR PPAL A INTERRUPTOR GENERAL DE BOMBA.	ML	1.40	\$ 364.32	\$ 510.05	1.40	0.00	0.00	1.40	510.05
ESC-010	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CAJA HIMEL EN MURETE DE MEDICIÓN (40X30CM).	PZA	1.00	\$ 2,847.13	\$ 2,847.13	1.00	0.00	0.00	1.00	2,847.13
ESC-012	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBERIA DE PVC DE 6" CEDULA DE 40 PARA SUCCION DE AGUA.	ML	15.00	\$ 525.83	\$ 7,887.45	15.00	0.00	0.00	15.00	7,887.45
ESC-013	SUMINISTRO Y COLOCACION DE VALVULA CHECK DE 4 FOFO.	PZA	1.00	\$ 7,652.10	\$ 7,652.10	1.00	0.00	0.00	1.00	7,652.10
ESC-014	SUMINISTRO Y COLOCACION DE VALVULA DE COMPUERTA DE 4".	PZA	1.00	\$ 5,913.31	\$ 5,913.31	1.00	0.00	0.00	1.00	5,913.31
ESC-015	CONEXION DE TUBO DE GALERIA FILTRANTE A RED MUNICIPAL, INCLUYE BRIDAS, COPLES, PIEZAS ESPECIALES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.	PZA	1.00	\$ 9,970.14	\$ 9,970.14	1.00	0.00	0.00	1.00	9,970.14
ESC-016	PRUEBA DE LABORATORIO ESTUDIO-FISICO-QUIMICO PARA DETERMINACION DEL CONSUMO DEL AGUA.	PZA	1.00	\$ 16,715.72	\$ 16,715.72	1.00	0.00	0.00	1.00	16,715.72
ESC-017	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE INTERRUPTOR PRINCIPAL DE 3X60 AMP.	PZA	1.00	\$ 4,617.20	\$ 4,617.20	1.00	0.00	0.00	1.00	4,617.20
ESC-018	SISTEMA PLC PARA PROTECCIÓN DE BOMBA, INCLUYE CABLE, SENSORES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	LOTE	1.00	\$ 32,318.46	\$ 32,318.46	1.00	0.00	0.00	1.00	32,318.46
ESC-019	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CODO DE 90 X4" DE FOFO.	PZA	1.00	\$ 2,775.06	\$ 2,775.06	1.00	0.00	0.00	1.00	2,775.06
ESC-020	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE VALVULA DE EXPULSION DE AIRE.	PZA	1.00	\$ 2,215.05	\$ 2,215.05	1.00	0.00	0.00	1.00	2,215.05

ELABORÓ

CORPORATIVO LA PALOMA, S.A. DE C.V.
Arq. Arnulfo Lizarraga Valenzuela
REPRESENTANTE LEGAL

REVISÓ

ARQ. SILVIA ZAMDEE PADILLA CRESPO
SUPERVISOR DE OBRAS PUBLICAS

AUTORIZÓ

M. en ARQ. GRACIELA ELIZALDE SANTOS
DIRECTORA DE OBRAS, SERVICIOS
PUBLICOS Y ECOLOGIA



CORPORATIVO LA PALOMA S.A. DE C.V.
CALLE MARIANO ESCOBEDO No.6, COL. CENTRO
CONCORDIA, SINALOA.

C.M.I.C.
102653

I.M.S.S.
L51-11189-10-0



MUNICIPIO DE ESCUINAPA, SINALOA
DIRECCION DE OBRAS, SERVICIOS PUBLICOS
Y ECOLOGIA

ESCUINAPA, SINALOA

HOJA: 2 de 2



CONCEPTOS DE ESTIMACION

CONTRATO: **ESC-FAISMUN-2025-013**

PERIODO: **13-ago-25** AL **11-oct-25**

LOCALIDAD: **ESCUINAPA**

ESTIMACION: **01 (Finiquito)**

MUNICIPIO: **ESCUINAPA**

DESCRIPCION: **REHABILITACION DE POZO PROFUNDO EN TERRENO DE JUMAPAE, ESCUINAPA, SINALOA.**

IMPORTE DE OBRA: **\$306,616.75**

IMPORTE DE ANTICIPO DE OBRA: **\$107,315.51**

IMPORTE TOTAL DE CONTRATO: **\$306,616.75**

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	SEGUN PROYECTO			HASTA ESTA ESTIMACION	HASTA ESTIMACION ANTERIOR	EXCEDENTE	DE ESTA ESTIMACION	IMPORTE
			VOL	PU	\$					
ESC-023	SUMINISTRO Y ELABORACIÓN DE TREN DE PZAS ESPECIALES A BASE DE TUBERIA DE 4" DE FOFO.	PZA	1.00	\$ 31,005.91	\$ 31,005.91	1.00	0.00	0.00	1.00	31,005.91
TOTAL DE REH. POZO PROFUNDO - JUMAPAE:										\$ 264,323.92
TOTAL DE ESTIMACION:										\$ 264,323.92



ELABORÓ

CORPORATIVO LA PALOMA, S.A DE C.V.
Arq. Arnulfo Lizarraga Valenzuela
REPRESENTANTE LEGAL

REVISÓ

ARQ. SILVIA ZAVIDES PADILLA CRESPO
SUPERVISOR DE OBRAS PUBLICAS

AUTORIZÓ

M. en ARQ. GRACIELA ELIZALDE SANTOS
DIRECTORA DE OBRAS, SERVICIOS
PUBLICOS Y ECOLOGIA

CARATULA DE RECIBO

Hoja: 1 de 1

RECIBO MUNICIPAL No. 01 (Finiquito)



CORPORATIVO LA PALOMA S.A. DE C.V.
CALLE MARIANO ESCOBEDO No.6, COL. CENTRO
CONCORDIA, SINALOA.

TELÉFONO:
694-968-2217
R.F.C.
CPA-061117-QJ8

CEL:
669-174-9377
C.M.I.C.
102653

UBICACION:
CONCORDIA, SIN.
I.M.S.S.
L51-11189-10-0

FECHA : **11-oct-25**
ESTIMACION No: **01 (Finiquito)**
PERIODO:
DEL **13-ago-25**
AL **11-oct-25**

DESCRIPCION:

REHABILITACION DE POZO PROFUNDO EN TERRENO DE JUMAPAE, ESCUINAPA, SINALOA.

FECHA DE CONTRATO: **12-oct-25**
PERIODO DE EJECUCION DEL CONTRATO:
INICIO: **13-ago-25**
TERMINACION: **11-oct-25**
PRORROGA:
DEL
AL

CONTRATO NO:

ESC-FAISMUN-2025-013

IMPORTE SIN IVA
\$264,323.92

IMPORTE CON IVA
\$306,615.75

35% ANTICIPO
\$107,315.51

IMPORTE TOTAL DE CONTRATO:
\$306,615.75

BUENO POR: **\$191,370.52**

RECIBI DE LA TESORERIA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE ESCUINAPA, SINALOA, LA CANTIDAD DE:

\$191,370.52 SON: (CIENTO NOVENTA Y UN MIL TRESCIENTOS SETENTA PESOS 52/100 M.N.

EN PAGO DE ESTIMACION 01 (Finiquito)

DEDUCCIONES:

AMORTIZACION ANTICIPO 35% (*)	\$	92,513.37
MAS I.V.A.	\$	14,802.14
TOTAL AMORTIZACION DE ANTICIPO	\$	107,315.51

CALCULO DE ESTIMACION

IMPORTE DE LA OBRA EJECUTADA SIN IVA	\$	264,323.92
DEDUCCION ANTICIPO (35%):	-\$	92,513.37
SUMA:	\$	171,810.55
MAS I.V.A. 16 %	\$	27,489.69
TOTAL:	\$	199,300.24
DEDUCCION SVIFC (3%):	-\$	7,929.72
LIQUIDO A PAGAR:	\$	191,370.52

3% ORGANO INTERNO DE CONTROL MPAL Y CONGRESO DEL ESTADO: (*)	\$	7,929.72
TOTAL DE DEDUCCIONES:	\$	115,245.23

(*) DEL IMPORTE EJECUTADO SIN IVA

SALDO A PAGAR: \$ 191,370.52

REALIZÓ

CORPORATIVO LA PALOMA, S.A. DE C.V.
Arq. Arnulfo Lizarraga Valenzuela
REPRESENTANTE LEGAL

AUTORIZÓ

M. en **ARQ. GRACIELA ELIZALDE SANTOS**
DIRECTORA DE OBRAS, SERVICIOS
PUBLICOS Y ECOLOGIA

REVISÓ

ARQ. SILVIA ZAYDEE PADILLA CRESPO
SUPERVISOR DE OBRAS PUBLICAS

AUTORIZÓ

L.C.P. JOSE TRINIDAD IBARRA MARTINEZ
TESORERO MUNICIPAL



Corporativo

La Paloma

Arq. Arnulfo Lizarraga Valenzuela
Representante Legal

R.F.C. CPA-061117-QJ8

C. MARIANO ESCOBEDO No. 6 CENTRO ESQ. CON ISIDORO PERAZA
CONCORDIA, SINALOA. C.P. 82600

TEL/FAX 01(694) 968-22-17, 968-13-82 CEL 044(6691)
27-94-84

Recibo No. 1 (Uno)
Bueno por: \$191,370.52

RECIBI DE TESORERIA DEL MUNICIPIO DE ESCUINAPA LA CANTIDAD DE: -----
----- \$191,370.52 (CIENTO NOVENTA Y UN MIL TRESCIENTOS SETENTA PESOS 52/100
M.N.).
POR CONCEPTO DE:
PAGO CORRESPONDIENTE A LA ESTIMACION No.1 (FINIQUITO) DEL CONTRATO No.
ESC-FAISMUN-2025-013 DE LA OBRA DE DESIGNACION:
- REHABILITACION DE POZO PROFUNDO EN TERRENO DE JUMAPAE, ESCUINAPA,
SINALOA.

Monto total Contratado =	\$306,615.75	(Son Trescientos Seis Mil Seiscientos Quince Pesos 75/100 M.N.)
IMPORTE DE ESTIMACION:		\$264,323.92
SUBTOTAL:		\$264,323.92
16% IVA:		\$42,291.83
TOTAL:		\$306,615.75
DEDUCCIONES:		
AMORTIZACION ANTICIPO 35%:		\$107,315.51
CONGRESO DEL ESTADO 3%:		\$7,929.72
TOTAL NETO A COBRAR:		\$191,370.52

RECIBI:
ESCUINAPA, SINALOA A 11 DE OCTUBRE DE 2025
CORPORATIVO LA PALOMA, S.A. DE C.V.

Atentamente:

Arq. Arnulfo Lizarraga Valenzuela
Representante Legal

c.c. Archivo



CONSTRUCCIÓN Y DISEÑO DE OBRA CIVIL EN GENERAL



CORPORATIVO LA PALOMA S.A. DE C.V.
CALLE MARIANO ESCOBEDO No.6, COL. CENTRO
CONCORDIA, SINALOA.

R.F.C.
CPA-061117-QJ8

C.M.I.C.
102653

I.M.S.S.
L51-11189-10-0



MUNICIPIO DE ESCUINAPA, SINALOA
DIRECCION DE OBRAS, SERVICIOS PUBLICOS
Y ECOLOGIA

ESCUINAPA, SINALOA

HOJA: 1 de 1



NUMEROS GENERADORES

LOCALIDAD: ESCUINAPA

ESTIMACION: 01 (Finiquito)
MUNICIPIO: ESCUINAPA

DESCRIPCION: REHABILITACION DE POZO PROFUNDO EN TERRENO DE JUMAPAE, ESCUINAPA, SINALOA.

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	LOCALIZACIÓN			LARGO	ANCHO	ALTO	RESULTADO	OBSERVACIONES
			EJE	TRAMO	PZAS					
REH. POZO PROFUNDO - JUMAPAE										
ESC-001	SUMINISTRO Y COLOCACION DE POLIDUTO DE 1 1/2" PARA ALIMENTADOR ELECTRICO, INCLUYE EXCAVACION DE ZANJA Y DEMOLICION DE PISO DE CONCRETO	ML			1.00	48.00			48.00	
ESC-003	SUMINISTRO Y COLOCACION DE BOMBA DE 6" 20 HP 220 V 3F.	PZA			1.00				1.00	
ESC-004	INSTALACION DEL ALIMENTADOR ELECTRICO CON CABLE CAL. 4 XLP SUBTERRANEO MÁS 1 CABLE CAL. 10 PARA TIERRA FÍSICA.	ML			1.00	63.00			63.00	
ESC-006	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CAJA DE ARRANCADOR, EN MURO EXSISTENTE.	PZA			1.00				1.00	
ESC-008	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ALIMENTADOR ELÉCTRICO CON 4 CABLES DEL NO. 4, ALIMENTADOR PRINCIPAL DE INTERRUPTOR PPAL A INTERRUPTOR GENERAL DE BOMBA.	ML			1.00	1.40			1.40	
ESC-010	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CAJA HIMEL EN MURETE DE MEDICIÓN (40X30CM).	PZA			1.00				1.00	
ESC-012	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBERIA DE PVC DE 6" CEDULA DE 40 PARA SUCCION DE AGUA.	ML			1.00	15.00			15.00	
ESC-013	SUMINISTRO Y COLOCACION DE VALVULA CHECK DE 4 FOFO".	PZA			1.00				1.00	
ESC-014	SUMINISTRO Y COLOCACION DE VALVULA DE COMPUERTA DE 4".	PZA			1.00				1.00	
ESC-015	CONEXION DE TUBO DE GALERIA FILTRANTE A RED MUNICIPAL, INCLUYE, BRIDAS, COPLES, PIEZAS ESPECIALES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.	PZA			1.00				1.00	
ESC-016	PRUEBA DE LABORATORIO ESTUDIO-FISICO-QUIMICO PARA DETERMINACION DEL CONSUMO DEL AGUA.	PZA			1.00				1.00	
ESC-017	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE INTERRUPTOR PRINCIPAL DE 3X60 AMP.	PZA			1.00				1.00	
ESC-018	SISTEMA PLC PARA PROTECCIÓN DE BOMBA, INCLUYE: CABLE, SENSORES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	LOTE			1.00				1.00	
ESC-019	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CODO DE 90"X4" DE FOFO.	PZA			1.00				1.00	
ESC-020	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE VALVULA DE EXPULSION DE AIRE.	PZA			1.00				1.00	
ESC-023	SUMINISTRO Y ELABORACIÓN DE TREN DE PZAS ESPECIALES A BASE DE TUBERIA DE 4" DE FOFO.	PZA			1.00				1.00	

ELABORÓ

CORPORATIVO LA PALOMA, S.A. DE C.V.
Arq. Arnulfo Lizarraga Valenzuela
REPRESENTANTE LEGAL

AUTORIZÓ

ARQ. SILVIA ZAYDEE PADILLA CRESPO
SUPERVISOR DE OBRAS PUBLICAS


CROQUIS

LOCALIDAD: ESCUINAPA

ESTIMACION: 01 (Finiquito)
MUNICIPIO: ESCUINAPA

DESCRIPCION: REHABILITACION DE POZO PROFUNDO EN TERRENO DE JUMAPAE, ESCUINAPA, SINALOA.

PLANTA GENERAL DEL PROYECTO

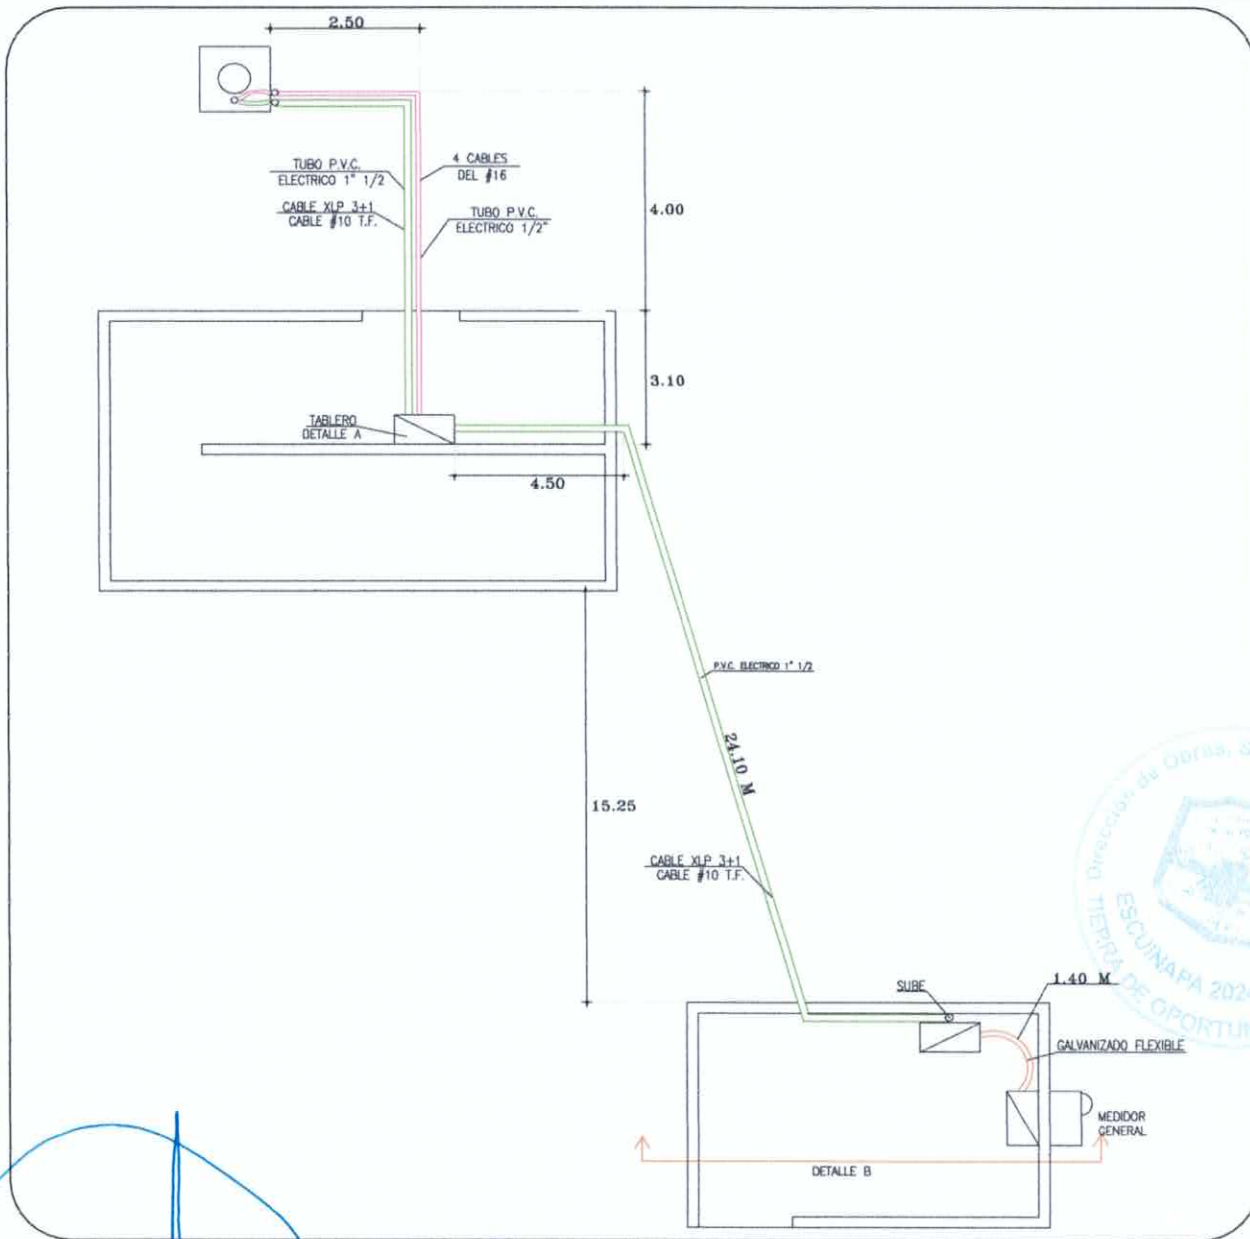

ELABORÓ

CORPORATIVO LA PALOMA, S.A. DE C.V.
Arq. Arnulfo Lizarraga Valenzuela
REPRESENTANTE LEGAL

AUTORIZÓ

ARQ. SILVIA ZAYDEE PADILLA CRESPO
SUPERVISOR DE OBRAS PUBLICAS


CROQUIS

LOCALIDAD: ESCUINAPA

ESTIMACION: 01 (Finiquito)
MUNICIPIO: ESCUINAPA

DESCRIPCION: REHABILITACION DE POZO PROFUNDO EN TERRENO DE JUMAPAE, ESCUINAPA, SINALOA.

CORTE DE POZO DE AGUA POTABLE

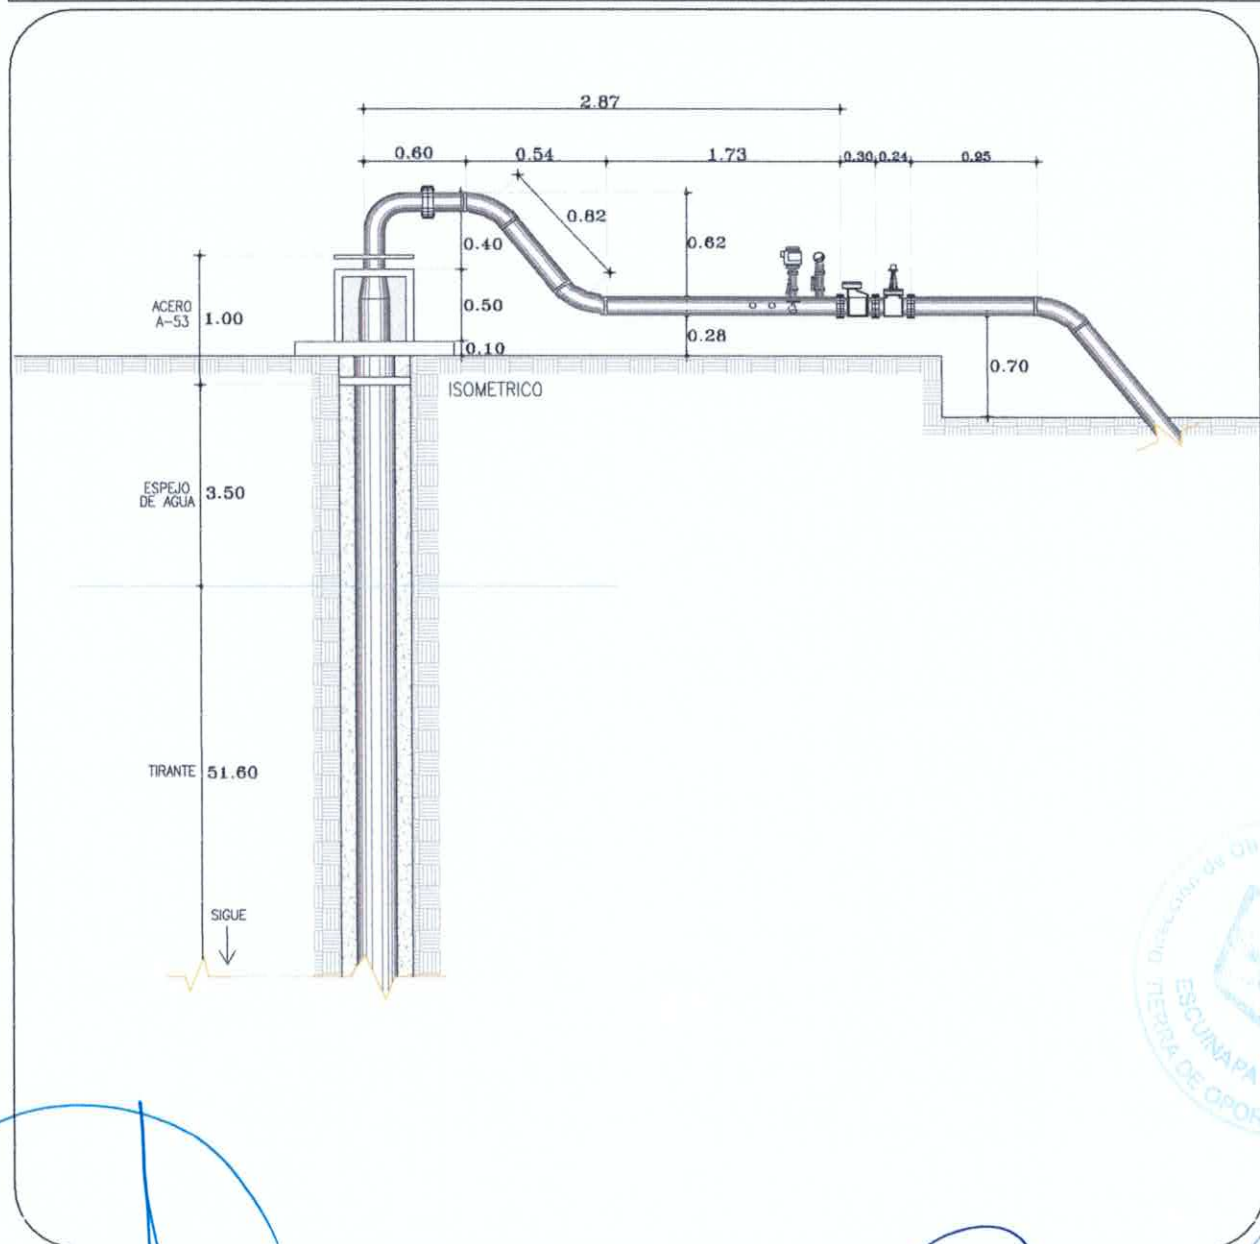

ELABORÓ

CORPORATIVO LA PALOMA, S.A. DE C.V.
Arq. Arnulfo Lizarraga Valenzuela
REPRESENTANTE LEGAL

AUTORIZA

ARQ. SILVIA ZAYDEE PADILLA CRESPO
SUPERVISOR DE OBRAS PUBLICAS

CROQUIS

LOCALIDAD: ESCUINAPA

ESTIMACION: 01 (Finiquito)


MUNICIPIO: ESCUINAPA

DESCRIPCION: REHABILITACION DE POZO PROFUNDO EN TERRENO DE JUMAPAE, ESCUINAPA, SINALOA.

CLAVE

(Descripcion del Concepto)

TREN DE PIEZAS ESPECIALES

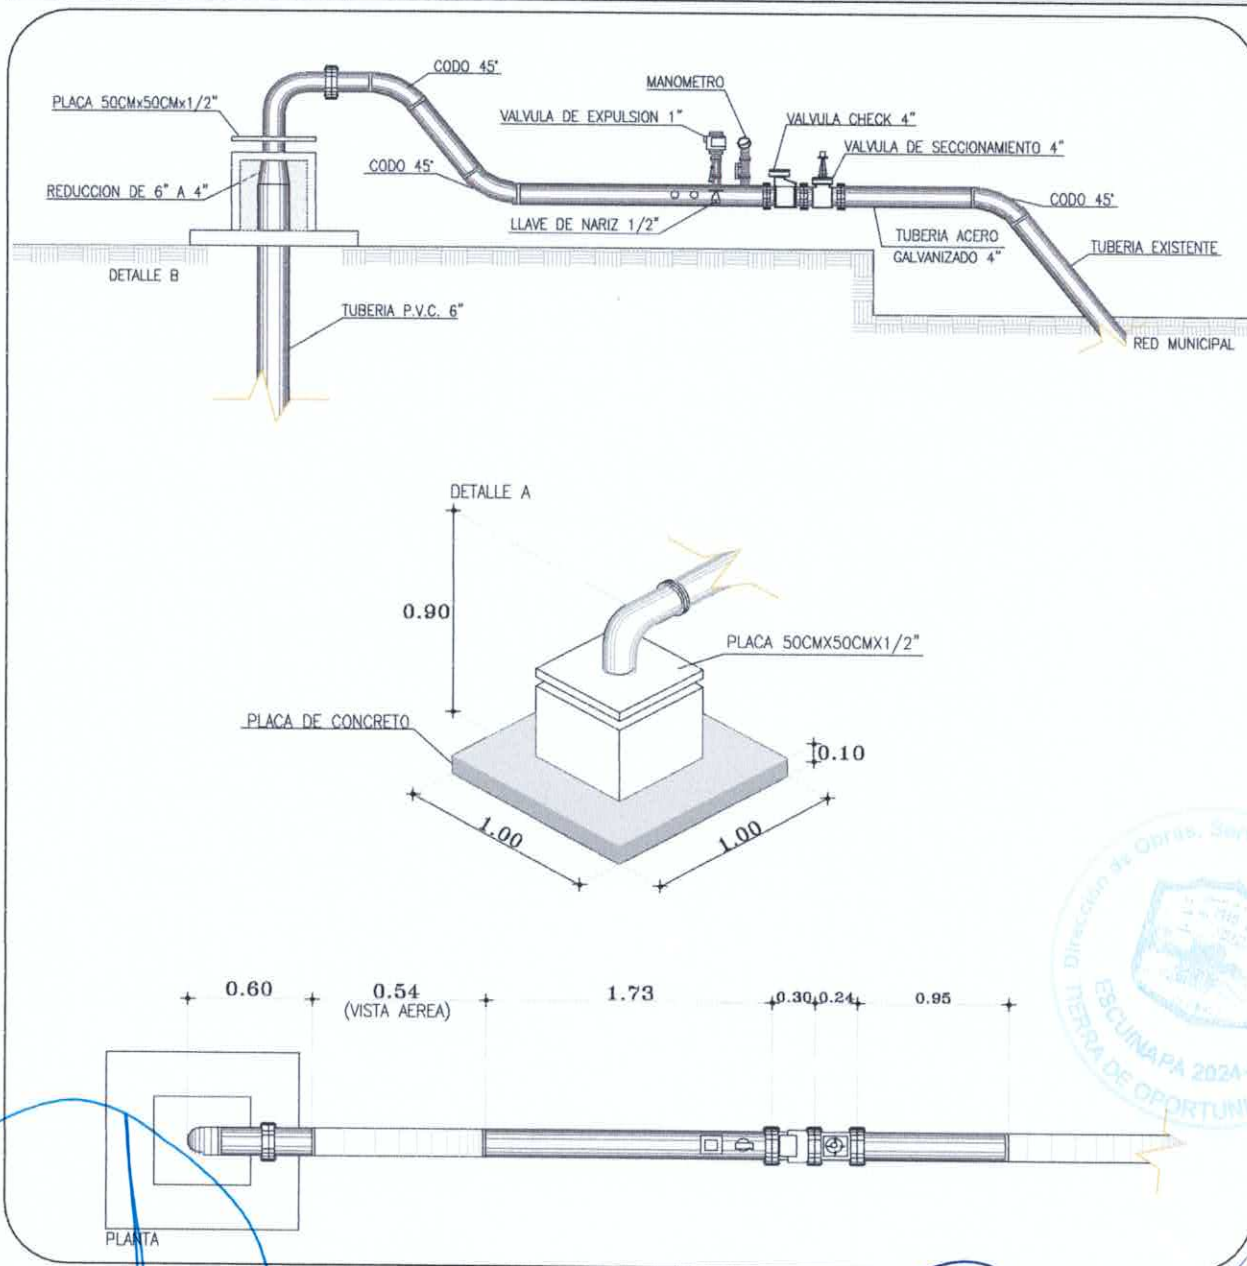

ELABORÓ

CORPORATIVO LA PALOMA, S.A. DE C.V.
 Arq. Arnulfo Lizarraga Valenzuela
 REPRESENTANTE LEGAL

AUTORIZO

ARQ. SILVIA ZAYDE PADILLA CRESPO
 SUPERVISOR DE OBRAS PUBLICAS

CROQUIS

LOCALIDAD: ESCUINAPA



ESTIMACION: 01 (Finiquito)
MUNICIPIO: ESCUINAPA

DESCRIPCION: REHABILITACION DE POZO PROFUNDO EN TERRENO DE JUMAPAE, ESCUINAPA, SINALOA.

CLAVE

(Descripcion del Concepto)

DETALLES ELECTRICOS EN CASETA

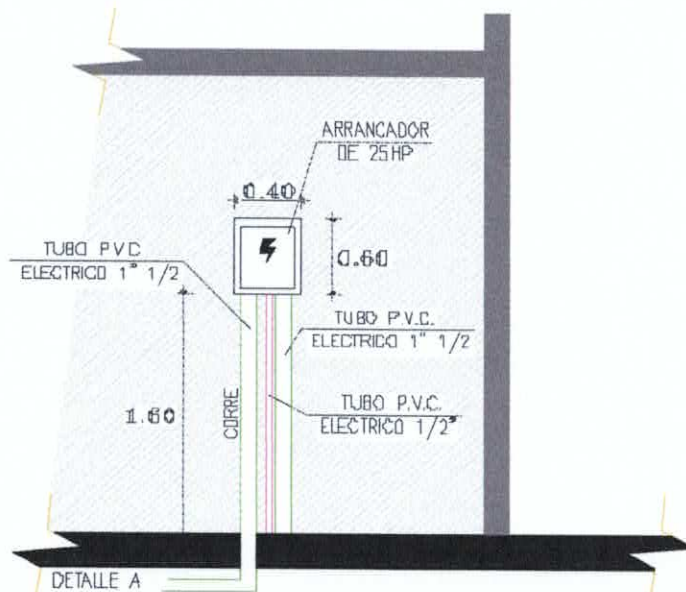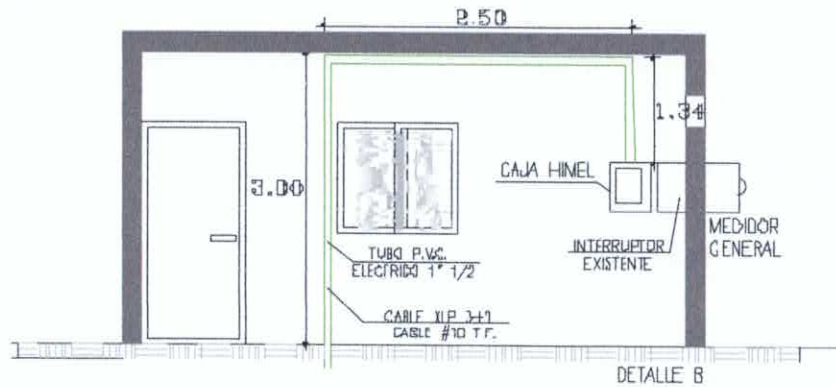

ELABORÓ

CORPORATIVO LA PALOMA, S.A. DE C.V.
Arq. Arnulfo Lizanaga Valenzuela
REPRESENTANTE LEGAL

AUTORIZÓ

ARQ. SILVIA ZAYDEE PADILLA CRESPO
SUPERVISOR DE OBRAS PUBLICAS

FOTOGRAFIAS

DESCRIPCION: REHABILITACION DE POZO PROFUNDO EN TERRENO DE JUMAPAE, ESCUINAPA, SINALOA.

LOCALIDAD: ESCUINAPA

ESTIMACION: 01 (Finiquito)
 MUNICIPIO: ESCUINAPA

CLAVE	(Descripcion del Concepto)
ESC-012	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBERIA DE PVC DE 6" CEDULA DE 40 PARA SUCCION DE AGUA.



CLAVE	(Descripcion del Concepto)
ESC-012	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBERIA DE PVC DE 6" CEDULA DE 40 PARA SUCCION DE AGUA.



ELABORÓ

CORPORATIVO LA PALOMA, S.A. DE C.V.
 Arq. Arnulfo Lizarraga Valenzuela
 REPRESENTANTE LEGAL

ANOTÓ

ARQ. SILVIA ZAYDEE PADILLA CRESPO
 SUPERVISOR DE OBRAS PUBLICAS



FOTOGRAFIAS

LOCALIDAD: **ESCUINAPA**

ESTIMACION: **01 (Finiquito)**
MUNICIPIO: **ESCUINAPA**

DESCRIPCION: **REHABILITACION DE POZO PROFUNDO EN TERRENO DE JUMAPAE, ESCUINAPA, SINALOA.**

CLAVE

(Descripcion del Concepto)

ESC-023

SUMINISTRO Y ELABORACIÓN DE TREN DE PZAS ESPECIALES A BASE DE TUBERIA DE 4" DE FOFO.



CLAVE

(Descripcion del Concepto)

ESC-013

SUMINISTRO Y COLOCACION DE VALVULA CHECK DE 4 FOFO".



ELABORÓ

AUTORIZA

CORPORATIVO LA PALOMA, S.A. DE C.V.
Arq. Arnulfo Lizarraga Valenzuela
REPRESENTANTE LEGAL

ARQ. SILVIA ZAYDEE PADILLA CRESPO
SUPERVISOR DE OBRAS PUBLICAS

FOTOGRAFIAS

LOCALIDAD: ESCUINAPA

ESTIMACION: 01 (Finiquito)
 MUNICIPIO: ESCUINAPA

DESCRIPCION: REHABILITACION DE POZO PROFUNDO EN TERRENO DE JUMAPAE, ESCUINAPA, SINALOA.

CLAVE	(Descripcion del Concepto)
ESC-010	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CAJA HIMEL EN MURETE DE MEDICIÓN (40X30CM).



CLAVE	(Descripcion del Concepto)
ESC-006	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CAJA DE ARRANCADOR, EN MURO EXSISTENTE.



ELABORÓ

CORPORATIVO LA PALOMA, S.A. DE C.V.
 Arq. Arnulfo Lizarraga Valenzuela
 REPRESENTANTE LEGAL

AUTORIZÓ

ARQ. SILVIA ZAYDEE PADILLA CRESPO
 SUPERVISOR DE OBRAS PUBLICAS



FOTOGRAFIAS

LOCALIDAD: **ESCUINAPA** ESTIMACION: **01 (Finiquito)**
 MUNICIPIO: **ESCUINAPA**
 DESCRIPCION: **REHABILITACION DE POZO PROFUNDO EN TERRENO DE JUMAPAE, ESCUINAPA, SINALOA.**

CLAVE	(Descripcion del Concepto)
ESC-008	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ALIMENTADOR ELÉCTRICO CON 4 CABLES DEL NO. 4, ALIMENTADOR PRINCIPAL DE INTERRUPTOR PPAL A INTERRUPTOR GENERAL DE BOMBA.



CLAVE	(Descripcion del Concepto)
ESC-004	INSTALACION DEL ALIMENTADOR ELECTRICO CON CABLE CAL. 4 XLP SUBTERRANEO MÁS 1 CABLE CAL. 10 PARA TIERRA FÍSICA.



ELABORÓ

CORPORATIVO LA PALOMA, S.A. DE C.V.
 Arq. Arnulfo Lizarraga Valenzuela
 REPRESENTANTE LEGAL

AUTORIZO

ARQ. SILVIA ZAYDEE PADILLA CRESPO
 SUPERVISOR DE OBRAS PUBLICAS

