



COMISION DE VIVIENDA DEL ESTADO DE SINALOA

CARATULA DE ESTIMACIÓN

FECHA 01 DE JULIO DEL 2025 BUENO POR \$ 8,346.17
RECIBIMOS DE: COMISION DE VIVIENDA DEL ESTADO DE SINALOA
LA CANTIDAD DE \$ OCHO MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y SEIS 17/100 M.N.
EN PAGO DE LA ESTIMACIÓN No. 07 (NORMAL)

REFERENTE A TRABAJOS DE :

OBRA: Ejecución de 64 (sesenta y cuatro) acciones de mejoramiento de unidades habitacionales destinadas a casa habitación de los beneficiarios de los municipios de Ahome, El Fuerte y Choix: 46 (cuarenta y seis) acciones en la modalidad de mejoramiento de vivienda - (techo firme de concreto), 14 (catorce) acciones en la modalidad de mejoramiento de vivienda - (techo de lámina), 04 (cuatro) acciones en la modalidad de mejoramiento de vivienda - (piso firme) en las localidades de Goros Pueblo, Goros 2, Cohuibampo, Jitzamuri y Ejido Jitzamuri en el Municipio de Ahome; El fuerte, Lo de Mayo, Álamo Caído, Las Chunas, Chinobampo y Arroyo de los Armenta en el Municipio de El Fuerte; Guadalupe, Agua Caliente Grande y Mesa de los Torres en el Municipio de Choix.

EJECUTADOS EN EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 03/06/2025 AL 14/06/2025
QUE AMPARA EL N° DE OBRA: CV-DG-LP-PTZN-003/2024 \$ 3,748,423.06

OBRA NORMAL \$ 11,527.86
16 % I.V.A. \$ 1,844.46

IMPORTE AUTORIZADO IMPORTE TOTAL 13,372.32

DEDUCCIONES Y RETENCIONES: AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO 35.00 % \$ 4,680.31
AMORTIZACIÓN DE 3 % \$ 345.84

SUBTOTAL \$ 8,346.17
TOTAL \$ 8,346.17

ESTADO DE CUENTA					
CONCEPTO	IMPORTE	PAGOS ANTERIORES	ESTA ESTIMACIÓN	ACUMULADO	POR EJERCER
CONTRATO	\$ 3,231,399.19	\$ 3,184,496.86	\$ 11,527.86	\$ 3,196,024.72	\$ 35,374.47
16% DE I.V.A.	\$ 517,023.87	\$ 509,519.50	\$ 1,844.46	\$ 511,363.96	\$ 5,659.92
TOTAL	\$ 3,748,423.06	\$ 3,694,016.36	\$ 13,372.32	\$ 3,707,388.68	\$ 41,034.39
SALDO TOTAL	3,748,423.06	3,694,016.36	13,372.32	3,707,388.68	41,034.39

RESUMEN DE DEDUCCIONES Y RETENCIONES

ANTICIPO	MONTO DE FIANZAS
OTORGADO \$ 1,311,948.07	FIANZA DE ANTICIPO \$ 1,311,948.07
AMORTIZACIONES	FIANZA DE CUMPLIMIENTO \$ 374,842.31
ANTERIOR \$ 1,292,905.72	
ESTA ESTIMACIÓN \$ 4,680.31	
ACUMULADO \$ 1,297,586.03	
POR AMORTIZAR \$ 14,362.04	

ARQ. YONATHAN LOYA FLORES
DIRECTOR DE PLANEACION Y PROYECTOS
COMISION DE VIVIENDA

ING. LUIS FELIPE ARELLANO BARREDA
SUPERVISION DE OBRA
COMISION DE VIVIENDA

ARQ. ALBERTO REYES SALCIDO
CONSTRUCTORA INTEGRAL CYPE DEL PACIFICO
SA DE CV



COMISION DE VIVIENDA DEL ESTADO DE SINALOA
CONTROL DE ESTIMACIONES.

FECHA	
1	7
DIA	MES
	AÑO

OBRA: Ejecución de 64 (sesenta y cuatro) acciones de mejoramiento de unidades habitacionales destinadas a casa habitación de los beneficiarios de los municipios de Ahome, El Fuerte y Choix: 46 (cuarenta y seis) acciones en la modalidad de mejoramiento de vivienda - (techo firme de concreto), 14 (catorce) acciones en la modalidad de mejoramiento de vivienda- (techo de lámina), 04 (cuatro) acciones en la modalidad de mejoramiento de vivienda - (piso firme) en las localidades de Goros Pueblo, Goros 2, de El Fuerte; Jitzamuri y Ejido Jitzamuri en el Municipio de Ahome; El fuerte, Lo de Mayo, Álamo Caído, Las Chunas, Chinobampo y Arroyo de los Armenta en el Municipio de Choix.

LA CANTIDAD DE: OCHO MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y SEIS 17/100 M.N.

COMO:

RECIBO No. \$ 8,346.17

ESTIMACION No 07 (NORMAL)

POR OBRA EJECUTADA DEL 03 DE JUNIO AL 14 DE JUNIO DEL 2025

DATOS DE CONTRATACION				
No. DE OBRA	FECHA:	IMPORTE TOTAL	FECHA TERM	ANTICIPO
CV-DG-LP-PTZN-003/2024	30/dic/2024	\$ 3,748,423.06	01/jul/2025	\$1,311,948.07
				N/A

CREDITO \$	
FECHA	
REGISTROS CONTRATISTA	
REG. FED. CAUS.	RESA870212BA9
BANDBRAS	
C.M.I.C.	
CRED. EMP.	Z3337993102
I.M.S.S.	
IMPORTE DE ESTIMACIÓN	\$ 11,527.86
I.V.A.	\$ 1,844.46
DEDUCCIONES	\$ 13,372.32
35.00 % AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO	\$ 4,680.31
0.50% CONTROL Y VIGILANCIA	\$
1.00% PRO-OBRA DE BENEFICIO SOC	\$
3.00 % FISCALIZACIÓN Y CONTROL	\$ 345.84
0.20% I.C.I.C.	\$
0.1% RETENCIÓN POR INCUMPL. DE PROG.	\$
SUMA DE DEDUC.	\$ 5,026.15
BUENO POR \$	\$ 8,346.17

ARQ. YONATHAN LOYA FLORES
DIRECTOR DE PLANEACION Y PROYECTOS
COMISION DE VIVIENDA

ING. LOIS FELIPE ARELLANO BARRERA
SUPERVISOR DE OBRA
COMISION DE VIVIENDA

ARQ. ALBERTO REYES SALCIDO
CONSTRUCTORA INTEGRAL CYPE DEL
ESTADO DE SINALOA

COMISION DE VIVIENDA DEL ESTADO DE SINALOA
CONTROL ACUMULATIVO DE ESTIMACIONES

ESTIMACIÓN NUM. 07 (NORMAL)		DEL 03 DE JUNIO 2025 AL 14 DE JUNIO DEL 2025		IMPORTE	\$	13,372.32
LUGAR:	LOCALIDADES DE GOROS PUEBLO, GOROS 2, COHUABAMPO, JITZAMURI Y EJIDO JITZAMURI EN EL MUNICIPIO DE AHOME, LAS LOCALIDADES DE EL FUERTE, LO DE MAYO, ÁLAMO CAÍDO, LAS CHUNAS, CHINOBAMPO ARROYO DE LOS ARMENTA EN EL MUNICIPIO DE EL FUERTE Y LOCALIDADES DE GUADALUPE, MESA DE LOS TORRES Y AGUA CALIENTE GRANDE DEL MUNICIPIO DE CHOIX					
OBRA:	Ejecución de 64 (sesenta y cuatro) acciones de mejoramiento de unidades habitacionales destinadas a casa habitación de los beneficiarios de los municipios de Ahome, El Fuerte y Choix: 64 (cuarenta y seis) acciones en la modalidad de mejoramiento de vivienda - (techo firme de concreto), 14 (catorce) acciones en la modalidad de mejoramiento de vivienda- (techo de lámina), 04 (cuatro) acciones en la modalidad de mejoramiento de vivienda - (piso firme) en las localidades de Goros Pueblo, Goros 2, Cohuabampo, Jitzamuri y Ejido Jitzamuri en el Municipio de Ahome; El fuerte, Lo de Mayo, Álamo Caído, Las Chunas, Chinobampo y Arroyo de los Armenta en el Municipio de El Fuerte; Guadalupe, Agua Caliente Grande y Mesa de los Torres en el Municipio de Choix.					
		CONTRATISTA:	CONSTRUCTORA INTEGRAL CYPE DEL PACIFICO SA DE CV			
		CONTRATO (No. Y FECHA)	CV-DG-LP-PTZN-003/2024 30 DE DICIEMBRE DE 2024 AL 01 DE JULIO DE 2025			
		PRESUPUESTO	\$3,748,423.06			
EJECUCIÓN DE 64 (SESENTA Y CUATRO) ACCIONES DE MEJORAMIENTO DE UNIDADES HABITACIONALES DESTINADAS A CASA HABITACIÓN DE LOS BENEFICIARIOS DE LOS MUNICIPIOS DE AHOME, EL FUERTE Y CHOIX: 64 (CUARENTA Y SEIS) ACCIONES EN LA MODALIDAD DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA - (TECHO FIRME DE CONCRETO), 14 (CATORCE) ACCIONES EN LA MODALIDAD DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA- (TECHO DE LÁMINA), 04 (CUATRO) ACCIONES EN LA MODALIDAD DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA - (PISO FIRME) EN LAS LOCALIDADES DE GOROS PUEBLO, GOROS 2, COHUABAMPO, JITZAMURI Y EJIDO JITZAMURI EN EL MUNICIPIO DE AHOME; EL FUERTE, LO DE MAYO, ÁLAMO CAÍDO, LAS CHUNAS, CHINOBAMPO Y ARROYO DE LOS ARMENTA EN EL MUNICIPIO DE EL FUERTE; GUADALUPE, AGUA CALIENTE GRANDE Y MESA DE LOS TORRES EN EL MUNICIPIO DE CHOIX.						

EJECUCIÓN DE 64 (SESENTA Y CUATRO) ACCIONES DE MEJORAMIENTO DE UNIDADES HABITACIONALES DESTINADAS A CASA HABITACIÓN DE LOS BENEFICIARIOS DE LOS MUNICIPIO DE AHOME, EL FUERTE Y CHOIX.

1	AHOME: EJECUCION DE 23 (VEINTITRES) ACCIONES DE MEJORAMIENTO DE UNIDADES HABITACIONALES: 20 ACC (TECHO FIRME DE CONCRETO); 01 ACC (TECHO DE LAMINA); 02 ACC (PISO DE CONCRETO) EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.	SUBTOTAL AHOME \$	-
2	EL FUERTE: EJECUCION DE 29 (VEINTINUEVE) ACCIONES DE MEJORAMIENTO DE UNIDADES HABITACIONALES: 19 ACC (TECHO FIRME DE CONCRETO); 10 ACC (TECHO DE LAMINA) EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE EL FUERTE, SINALOA.	SUBTOTAL EL FUERTE \$	4,841.11
3	CHOIX: EJECUCION DE 12 (DOC) ACCIONES DE MEJORAMIENTO DE UNIDADES HABITACIONALES: 07 ACC (TECHO FIRME DE CONCRETO); 03 ACC (TECHO DE LAMINA); 02 ACC (PISO DE CONCRETO) EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE CHOIX, SINALOA.	SUBTOTAL CHOIX \$	6,686.75
		SUMATORIA \$	11,527.86
		I.V.A. \$	1,844.46
		TOTAL \$	13,372.32

COMISION DE VIVIENDA DEL ESTADO DE SINALOA CONTROL ACUMULATIVO DE ESTIMACIONES									
ESTIMACIÓN NUM. 07 (NORMAL)		DEL 03 DE JUNIO 2025 AL 14 DE JUNIO DEL 2025			IMPORTE		\$		
LUGAR:		LOCALIDADES DE EL FUERTE, LO DE MAYO, ÁLAMO CAIDO, LAS CHUNAS, CHINOBAMPO, ARROYO DE LOS ARMENTA EN EL MUNICIPIO DE EL FUERTE.			CONTRATISTA:		CONSTRUCTORA INTEGRAL CYPE DEL PACIFICO SA DE CV		
OBRA:		Ejecución de 64 (sesenta y cuatro) acciones de mejoramiento de unidades habitacionales destinadas a casa habitación de los beneficiarios de los municipios de Ahome, El Fuerte y Choix: 46 (cuarenta y seis) acciones en la modalidad de mejoramiento de vivienda - (techo firme de concreto), 14 (catorce) acciones en la modalidad de mejoramiento de vivienda- (techo de lámina), 04 (cuatro) acciones en la modalidad de mejoramiento de vivienda - (piso firme) en las localidades de Goros Pueblo, Goros 2, Chuhubampo, Jitzamuri y Ejido Jitzamuri en el Municipio de Ahome; El fuerte, Lo de Mayo, Álamo Caído, Las Chunas, Chinobampo y Arroyo de los Armenta en el Municipio de El Fuerte; Guadalupe, Agua Caliente Grande y Mesa de los Torres en el Municipio de Choix.			CONTRATO (No. Y FECHA)		CV-DG-LP-PTZN-003/2024 30 DE DICIEMBRE DE 2024 AL 01 DE JULIO DE 2025		
					PRESUPUESTO		\$3,748,423.06		
PARTIDA									
CANTIDAD DE OBRA (VOLUMENES)									
No.	EL FUERTE: EJECUCION DE 29 (VEINTINUEVE) ACCIONES DE MEJORAMIENTO DE UNIDADES HABITACIONALES: 19 ACC (TECHO FIRME DE CONCRETO) ; 10 ACC (TECHO DE LAMINA) EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE EL FUERTE, SINALOA.	UNI	CONTRATADO EN PRESUPUESTO	ACUMULADA EJECUTADO	ESTIMACION EJECUTADO ANTERIOR	RESTANTE	ESTA ESTIMACIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
3	ESTRUCTURA								
3.02	MURO DE ENRASE ALTURA SEGÚN PROYECTO A BASE DE TABIQUE DE JAL 10X14X28 CMS, ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA PROP 1:3. INCLUYE: FLETE, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION, ANDAMIOS, TRAZO, NIVELACION, PLOMEADOS, CORTES, AJUSTES, FABRICACION DEL MORTERO, COLOCACION, ACEROS DE REFUERZO, ENRASE, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRENTE FUERA DE OBRA, HERRAMIENTA , EQUIPO Y MANO DE OBRA.	ML	136.35	135.50	133.20	0.85	2.30	\$547.83	\$ 1,260.01
3.03	CASTILLO DE CONCRETO 15 X 15 CMS.,ACABADO COMUN, ARMADO CON ARMEX 15X15-4, CONCRETO Fc=200 Kg/cm2. INCLUYE: CIMBRA, TUINO, DESCIMBRA, VIBRADO, ANCLAJES, MATERIALES.	ML	54.10	19.00	18.60	35.10	0.40	\$434.41	\$ 173.76
3.04	DALA DE CERRAMIENTO DE 15 X 20 CMS, ACABADO APARENTE, ARMADO CON ARMEX 12 X 20-4 Y CONCRETO Fc=200 Kg/cm2. INCLUYE: CIMBRA, DESCIMBRA, VIBRADO, MATERIALES.	ML	46.70	46.70	46.70	0.00	0.00	\$522.63	\$ -
3.05	14. PARA COLUMNAS COMO SOPORTE DE TECHO DE LAMINA GALVANIZADA R-101 CAL.26. INCLUYE: MATERIALES. SOLDADURA, MANO DE OBRA PARA TRAZO, CORTE, HABILITADO, ENSAMBLE, APLICACIÓN DE FONDO PRIMARIO ANTICORROSIVO, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	ML	36.85	36.85	36.85	0.00	0.00	\$821.83	\$ -
3.06	COLOCACION Y FIJACION DE PLACA DE ACERO DE 6 X 6 X 3/8" DE ESPESOR CON 4 VARILLAS DE ACERO CORRUGADO No. 3 DE 30 Cms DE LONGITUD CADA UNA COMO ANCLAJE DE SUJECION, A BASE DE CONCRETO F C= 250 KG/CM2 DE EN MEDIDAS DE 20 Cms DE DIAMETRO POR 40 Cms DE PROFUNDIDAD. INCLUYE: EXCAVACION, AFINE, CONCRETO Y LA PLACA BASE.	PZA	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	\$406.07	\$ -

COMISION DE VIVIENDA DEL ESTADO DE SINALOA
CONTROL ACUMULATIVO DE ESTIMACIONES

ESTIMACIÓN NUM. 07 (NORMAL)		DEL 03 DE JUNIO 2025 AL 14 DE JUNIO DEL 2025		IMPORTE		\$		13,372.32	
LUGAR:		LOCALIDADES DE EL FUERTE, LO DE MAYO, ÁLAMO CAÍDO, LAS CHUNAS, CHINOBAMPO, ARROYO DE LOS ARMENTA EN EL MUNICIPIO DE EL FUERTE.		CONTRATISTA:		CONSTRUCTORA INTEGRAL CYPE DEL PACIFICO SA DE CV			
OBRA:		Ejecución de 64 (sesenta y cuatro) acciones de mejoramiento de unidades habitacionales destinadas a casa habitación de los beneficiarios de los municipios de Ahome, El Fuerte y Choix: 46 (cuarenta y seis) acciones en la modalidad de mejoramiento de vivienda - (techo firme de concreto), 14 (catorce) acciones en la modalidad de mejoramiento de vivienda- (techo de lámina), 04 (cuatro) acciones en la modalidad de mejoramiento de vivienda - (piso firme) en las localidades de Goros Pueblo, Goros 2, Cohuibampo, Jitzamuri y Ejido Jitzamuri en el Municipio de Ahome; El fuerte, Lo de Mayo, Álamo Caído, Las Chunas, Chinobampo y Arroyo de los Armenta en el Municipio de El Fuerte; Guadalupe, Agua Caliente Grande y Mesa de los Torres en el Municipio de Choix.		CONTRATO (No. Y FECHA)		CV-DG-LP-PTZN-003/2024 30 DE DICIEMBRE DE 2024 AL 01 DE JULIO DE 2025			
PRESUPUESTO				\$3,748,423.06					
PARTIDA									
CANTIDAD DE OBRA (VOLUMENES)						\$		\$	
No.	EL FUERTE: EJECUCION DE 29 (VEINTINUEVE) ACCIONES DE MEJORAMIENTO DE UNIDADES HABITACIONALES: 19 ACC (TECHO FIRME DE CONCRETO) ; 10 ACC (TECHO DE LAMINA) EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE EL FUERTE, SINALOA.	UNI	CONTRATADO EN PRESUPUESTO	ACUMULADA EJECUTADO	ESTIMACION EJECUTADO ANTERIOR	RESTANTE	ESTA ESTIMACIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
4	LOSAS								
4.01	LOSA MACIZA DE 10 Cms DE ESPESOR, CON CONCRETO F'C= 200 KG/CM2, ARMADA CON VARILLA 3/8" A. @ 20 CMS EN AMBOS SENTIDOS UN SOLO LECHO, REFORZADOS CON BASTONES VARILLA 3/8" A. @ 40 CMS EN EL PERIMETRO DE LOSA, INCLUYE: CIMBRA DE CONTACTO PARA LOSA A BASE DE BARROTE, TUINO Y DUELA, APUNTALADO, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, ANDAMIOS, DESCIMBRADO, COLADO Y CURADO.	M2	380.95	380.93	380.93	0.00	0.00	\$1,658.00	\$ -
4.02	TECHUMBRE METALICA, HECHA A BASE DE POLIN 4 X 16 M C/14 C.C., LAMINA GALVANIZADA R-101 C/26, SEGÚN INDIQUE PROYECTO INCLUYE: PINTURA ANTIOXIDANTE, MATERIALES NECESARIOS PARA SU INSTALACION Y CONSTRUCCION, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA Y EQUIPO NECESARIO.	M2	245.37	235.05	232.76	10.32	2.29	\$1,487.92	\$ 3,407.34
5	CUBIERTA								
5.01	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE IMPERMEABILIZANTE ELASTOMERICO EN COLOR BLANCO, MARCA IMPAC O SIMILAR CON CALIDAD DE 3 AÑOS. INCLUYE: LIMPIEZA DE LA SUPERFICIE, UNA CAPA DE SELLADOR PRIMER, PRIMERA APLICACIÓN DE IMPERMEABILIZANTE, UNA CAPA DE MEMBRANA DE REFUERZO UNA SEGUNDA CAPA DE IMPERMEABILIZANTE ELASTOMÉRICO.	M2	410.15	410.15	410.15	0.00	0.00	\$247.52	\$ -
6	DETALLES DE ALBAÑILERIA								
6.01	APLANADO EN PLAFÓN CON YESO EN INTERIOR, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	M2	312.19	312.19	312.19	0.00	0.00	\$300.79	\$ -
6.02	APLANADO EN PLAFÓN CON ESTUCO EN EXTERIOR (VOLADO-MAQUESINA) MARCA UNIBLOCK O SIMILAR, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	M2	13.62	13.62	13.62	0.00	0.00	\$347.26	\$ -



COMISION DE VIVIENDA DEL ESTADO DE SINALOA
CONTROL ACUMULATIVO DE ESTIMACIONES

ESTIMACIÓN NUM. 07 (NORMAL)		DEL 03 DE JUNIO		AL 14 DE JUNIO DEL 2025		IMPORTE		\$		13,372.32	
LUGAR:		LOCALIDADES DE EL FUERTE, LO DE MAYO, ÁLAMO CAÍDO, LAS CHUNAS, CHINOBAMPO, ARROYO DE LOS ARMENTA EN EL MUNICIPIO DE EL FUERTE.				CONSTRUCTORA INTEGRAL CYPE DEL PACIFICO SA DE CV					
OBRA:		Ejecución de 64 (sesenta y cuatro) acciones de mejoramiento de unidades habitacionales destinadas a casa habitación de los beneficiarios de los municipios de Ahome, El Fuerte y Choix: 46 (cuarenta y seis) acciones en la modalidad de mejoramiento de vivienda - (techo firme de concreto), 14 (catorce) acciones en la modalidad de mejoramiento de vivienda- (techo de lámina), 04 (cuatro) acciones en la modalidad de mejoramiento de vivienda - (piso firme) en las localidades de Goros Pueblo, Goros 2, Conuibampo, Jitzamuri y Ejido Jitzamuri en el Municipio de Ahome; El fuerte, Lo de Mayo, Álamo Caído, Las Chunas, Chinobampo y Arroyo de los Armenta en el Municipio de El Fuerte; Guadalupe, Agua Caliente Grande y Mesa de los Torres en el Municipio de Choix.				CONTRATISTA:		CONTRATO (No. Y FECHA) CV-DG-LP-PTZN-003/2024 30 DE DICIEMBRE DE 2024 AL 01 DE JULIO DE 2025 PRESUPUESTO \$3,748,423.06			
PARTIDA		CANTIDAD DE OBRA (VOLUMENES)									
No.		UNI	CONTRATADO EN PRESUPUESTO	ACUMULADA EJECUTADO	ESTIMACION EJECUTADO ANTERIOR	RESTANTE	ESTA ESTIMACIÓN	PRECIO UNITARIO	\$	\$	
6.03	EL FUERTE: EJECUCION DE 29 (VEINTINUEVE) ACCIONES DE MEJORAMIENTO DE UNIDADES HABITACIONALES: 19 ACC (TECHO FIRME DE CONCRETO); 10 ACC (TECHO DE LAMINA) EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE EL FUERTE, SINALOA. ENTORTADO PROMEDIO DE 4 CMS DE ESPESOR, A BASE DE MEZCLA CEMENTO-ARENA EN PROPORCION 1:3; INCLUYE: TRAZO, NIVELACION, LECHEREA DA CON CEMENTO GRIS; DARAWELL COMO AGLUTINANTE. SUMINISTRO DE MATERIALES, ACARREOS, ELEVACIONES. MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA LA EJECUCION DE LA OBRA.	M2	29.20	29.20	29.20	0.00	0.00	\$460.65	\$	-	
9	INSTALACION ELECTRICA										
9.01	SALIDA DE LUMINARIA CANALIZADO CON POLIDUCTO DE 1/2", SAL. INCLUYE: RANURA Y RESANE DE MURO, APAGADOR, PORTALAMPARA, FOCO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y EQUIPO.	SAL	38.00	38.00	38.00	0.00	0.00	\$1,299.85	\$	-	
9.02	SALIDA DE CONTACTO CANALIZADO CON POLIDUCTO DE 1/2", INCLUYE: RANURA Y RESANE EN MURO, CONTACTO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y EQUIPO.	SAL	26.00	26.00	26.00	0.00	0.00	\$1,230.90	\$	-	
9.03	SALIDA DE LUMINARIA CANALIZADO CON TUBERIA CONDUIT VERDE DE 1/2", INCLUYE: APAGADOR, PORTALAMPARA, FOCO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y EQUIPO.	SAL	22.00	21.00	21.00	1.00	0.00	\$1,470.94	\$	-	
9.04	SALIDA DE CONTACTO CANALIZADO CON TUBERIA CONDUIT VERDE DE 1/2", INCLUYE: CONTACTO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y EQUIPO.	SAL	18.00	17.00	17.00	1.00	0.00	\$1,362.78	\$	-	
13	VARIOS										
13.01	LIMPIEZA GRUESA Y FINA DE OBRA, INCLUYE: RETIRO DE ESCOMBRO, MATERIAL SOBRENTE Y BASURA, TANTO EN EL INTERIOR DEL PATIO Y FRENTE DE LA VIVIENDA, LIMPIEZA DEL PISO DE CUALQUIER TIPO DE MEZCLA Y LAVADO CON AGUA Y JABON	LOTE	19.00	19.00	19.00	0.00	0.00	\$2,398.71	\$	-	

SUB-TOTAL EL FUERTE	\$	4,841.11
---------------------	----	----------

CONSTRUCTORA INTEGRAL CYPE DEL PACIFICO SA DE CV

[illegible]

[illegible]

CONSTRUCTORA INTEGRAL CYPE DEL PACIFICO SA DE CV

REPORTE FOTOGRAFICO					
N° DE CONTRATO:	CV-DG-LP-PTZN-003/2024		ESTIMACIÓN		07 (NORMAL)
OBRA	Ejecución de 64 (sesenta y cuatro) acciones de mejoramiento de unidades habitacionales destinadas a casa habitación de los beneficiarios de los municipios de Ahome, El Fuerte y Choix: 46 (cuarenta y seis) acciones en la modalidad de mejoramiento de vivienda - (techo firme de concreto), 14 (catorce) acciones en la modalidad de mejoramiento de vivienda- (techo de lámina), 04 (cuatro) acciones en la modalidad de mejoramiento de vivienda - (piso firme) en las localidades de Goros Pueblo, Goros 2, Coahuilbampo, Jitzamuri y Ejido Jitzamuri en el Municipio de Ahome; El fuerte, Lo de Mayo, Álamo Calido, Las Chunas, Chinobampo y Arroyo de los Armenta en el Municipio de El Fuerte; Guadalupe, Agua Caliente Grande y Mesa de los Torres en el Municipio de Choix.		FECHA		01 DE JULIO DEL 2025
			PERIODO DE ESTIMACIÓN		
			DE	03 DE JUNIO DEL 2025	
			AL	14 DE JUNIO DEL 2025	


PROGRAMA DE APOYOS EN PISOS Y TECHOS 2024.-		TECHO FIRME DE CONCRETO.-20.-ELEAZAR MARTINEZ PACHECO, LAS CHUNAS, EL FUERTE
CONCEPTOS	3.02.- MURO DE ENRASE ALTURA SEGÚN PROYECTO A BASE DE TABIQUE DE 7X14X28 CMS (O A BASE DEL MATERIAL EXISTENTE EN LA CONSTRUCCION), ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA PROP 1:3, INCLUYE: FLETE, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION, ANDAMIOS, TRAZO, NIVELACION, PLOMEADOS, CORTES, AJUSTES, FABRICACION DEL MORTERO, COLOCACION, ACEROS DE REFUERZO, ENRASE, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRENTE FUERA DE OBRA, HERRAMIENTA , EQUIPO Y MANO DE OBRA.	



CONSTRUCTORA INTEGRAL CYPE DEL PACIFICO SA DE CV

REPORTE FOTOGRAFICO				
N° DE CONTRATO:	CV-DG-LP-PTZN-003/2024		ESTIMACIÓN	
OBRA	Ejecución de 64 (sesenta y cuatro) acciones de mejoramiento de unidades habitacionales destinadas a casa habitación de los beneficiarios de los municipios de Ahome, El Fuerte y Choix: 46 (cuarenta y seis) acciones en la modalidad de mejoramiento de vivienda - (techo firme de concreto), 14 (catorce) acciones en la modalidad de mejoramiento de vivienda- (techo de lámina), 04 (cuatro) acciones en la modalidad de mejoramiento de vivienda - (piso firme) en las localidades de Goros Pueblo, Goros 2, Coahuilbampo, Jitzamuri y Ejido Jitzamuri en el Municipio de Ahome; El fuerte, Lo de Mayo, Álamo Caído, Las Chunas, Chinobampo y Arroyo de los Armenta en el Municipio de El Fuerte; Guadalupe, Agua Caliente Grande y Mesa de los Torres en el Municipio de Choix.		FECHA	07 (NORMAL)
			01 DE JULIO DEL 2025	
			DE	PERIODO DE ESTIMACIÓN
			AL	03 DE JUNIO DEL 2025
			14 DE JUNIO DEL 2025	

PROGRAMA DE APOYOS EN PISOS Y TECHOS 2024.-		TECHUMBRE METÁLICA.- 26.- MATEO COTA GASTELUM, ARROYO DE LOS ARMENTA, EL FUERTE.	
CONCEPTOS	3.02.- MURO DE ENRASE ALTURA SEGÚN PROYECTO A BASE DE TABIQUE DE JAL 10X14X28 CMS, ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA PROP 1:3, INCLUYE: FLETE, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION, ANDAMIOS, TRAZO, NIVELACION, PLOMEADOS, CORTES, AJUSTES, FABRICACION DEL MORTERO, COLOCACION, ACEROS DE REFUERZO, ENRASE, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRENTE FUERA DE OBRA, HERRAMIENTA , EQUIPO Y MANO DE OBRA.		

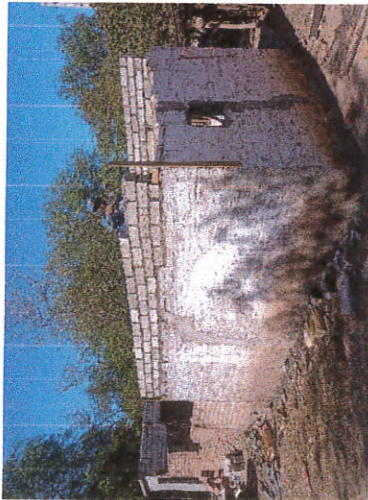

[Handwritten signature]




[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

CONSTRUCTORA INTEGRAL CYPE DEL PACIFICO SA DE CV

REPORTE FOTOGRAFICO				
N° DE CONTRATO:		CV-DG-LP-PTZN-003/2024		
OBRA	Ejecución de 64 (sesenta y cuatro) acciones de mejoramiento de unidades habitacionales destinadas a casa habitación de los beneficiarios de los municipios de Ahome, El Fuerte y Choix: 46 (cuarenta y seis) acciones en la modalidad de mejoramiento de vivienda - (techo firme de concreto), 14 (catorce) acciones en la modalidad de mejoramiento de vivienda- (techo de lámina), 04 (cuatro) acciones en la modalidad de mejoramiento de vivienda - (piso firme) en las localidades de Goros Pueblo, Goros 2, Coahuilampo, Jitzamuri y Ejido Jitzamuri en el Municipio de Ahome; El fuerte, Lo de Mayo, Álamo Caído, Las Chunas, Chinobampo y Arroyo de los Armenta en el Municipio de El Fuerte; Guadalupe, Agua Caliente Grande y Mesa de los Torres en el Municipio de Choix.		ESTIMACIÓN	07 (NORMAL)
			FECHA	01 DE JULIO DEL 2025
			PERIODO DE ESTIMACIÓN	03 DE JUNIO DEL 2025
			DE	AL
		14 DE JUNIO DEL 2025		

PROGRAMA DE APOYOS EN PISOS Y TECHOS 2024.-		TECHO FIRME DE CONCRETO.-20.-ELEAZAR MARTINEZ PACHECO, LAS CHUNAS, EL FUERTE
CONCEPTOS	3.03.- CASTILLO DE CONCRETO DE 15 X 15 CMS., ACABADO COMUN, ARMADO CON ARMEX 15 X 15-4, CONCRETO Fc'=200 Kg/cm2, INCLUYE; CIMBRA, TUINO, DESCIMBRA, VIBRADO, ANCLAJES, MATERIALES.	

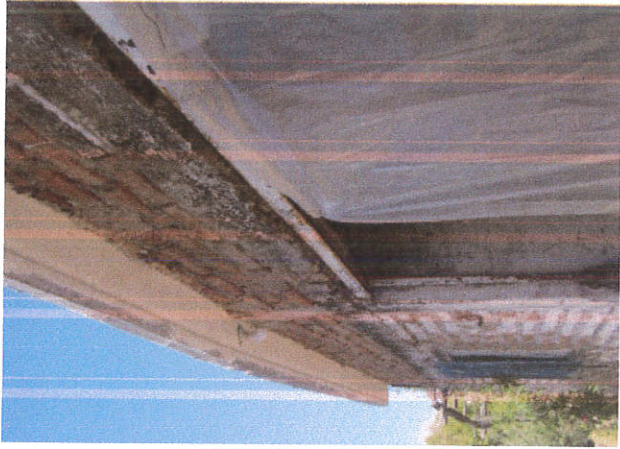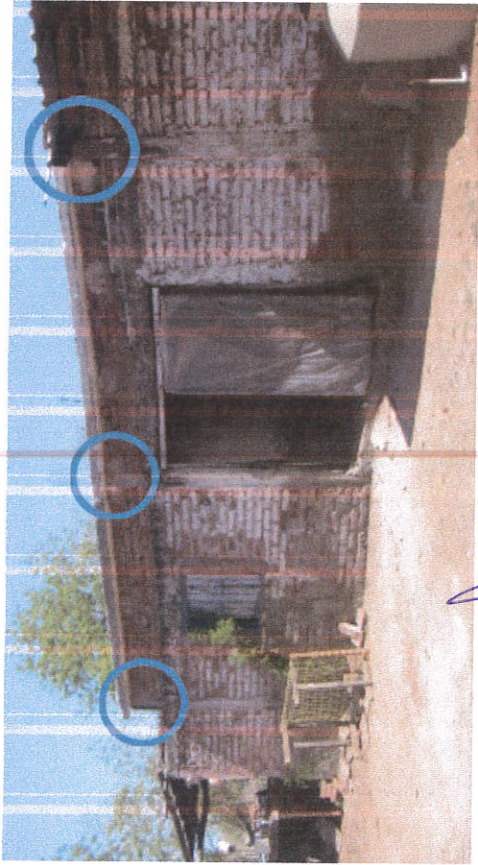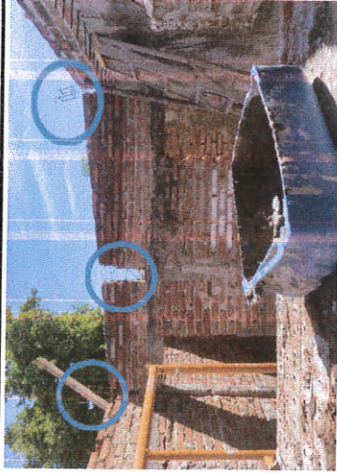




CONSTRUCTORA INTEGRAL CYPE DEL PACIFICO SA DE CV


N° DE CONTRATO: CV-DG-LP-PTZN-003/2024			
OBRA		Ejecución de 64 (sesenta y cuatro) acciones de mejoramiento de unidades habitacionales destinadas a casa habitación de los beneficiarios de los municipios de Ahome, El Fuerte y Choix: 46 (cuarenta y seis) acciones en la modalidad de mejoramiento de vivienda - (techo firme de concreto), 14 (catorce) acciones en la modalidad de mejoramiento de vivienda- (techo de lámina), 04 (cuatro) acciones en la modalidad de mejoramiento de vivienda - (piso firme) en las localidades de Goros Pueblo, Goros 2, Cohuibampo, Jitzamuri y Ejido Jitzamuri en el Municipio de Ahome; El fuerte, Lo de Mayo, Álamo Caldo, Las Chunas, Chinobampo y Arroyo de los Armenta en el Municipio de El Fuerte; Guadalupe, Agua Caliente Grande y Mesa de los Torres en el Municipio de Choix.	
ESTIMACIÓN		07 (NORMAL)	
FECHA		01 DE JULIO DEL 2025	
PERIODO DE ESTIMACIÓN		DE 03 DE JUNIO DEL 2025	
AL		14 DE JUNIO DEL 2025	

PROGRAMA DE APOYOS EN PISOS Y TECHOS 2024.- TECHUMBRE METÁLICA.- 26.- MATEO COTA GASTELUM, ARROYO DE LOS ARMENTA, EL FUERTE.	
CONCEPTOS	3.03.- CASTILLO DE CONCRETO 15 X 15 CMS.,ACABADO COMUN, ARMADO CON ARMEX 15X15-4, CONCRETO Fc'=200 Kg/cm2. INCLUYE: CIMBRA, TUINO, DESCIMBRA, VIBRADO, ANCLAJES, MATERIALES.

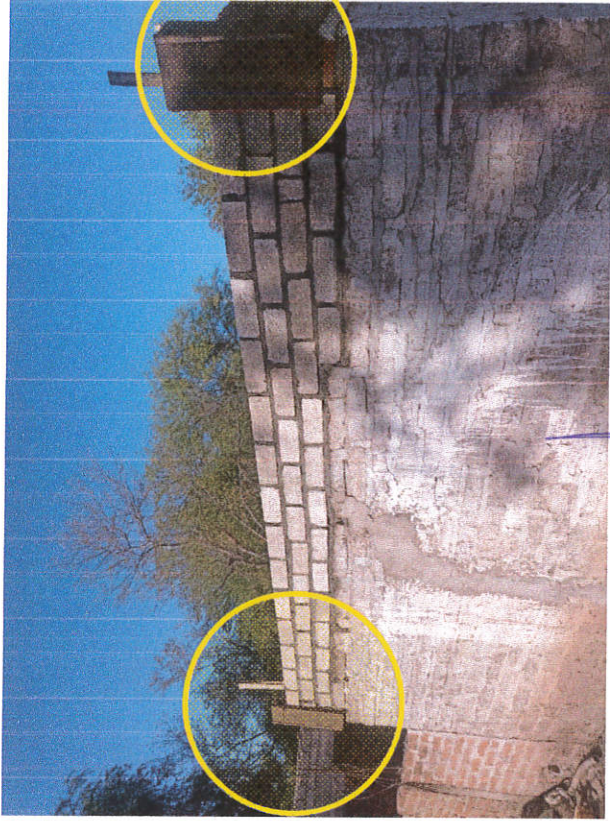

CONSTRUCTORA INTEGRAL CYPE DEL PACIFICO SA DE CV

REPORTE FOTOGRAFICO				
N° DE CONTRATO:		CV-DG-LP-PTZN-003/2024		
OBRA	Ejecución de 64 (sesenta y cuatro) acciones de mejoramiento de unidades habitacionales destinadas a casa habitación de los beneficiarios de los municipios de Ahome, El Fuerte y Choix: 46 (cuarenta y seis) acciones en la modalidad de mejoramiento de vivienda - (techo firme de concreto), 14 (catorce) acciones en la modalidad de mejoramiento de vivienda- (techo de lámina), 04 (cuatro) acciones en la modalidad de mejoramiento de vivienda - (piso firme) en las localidades de Goros Pueblo, Goros 2, Cohuibampo, Jitzamuri y Ejido Jitzamuri en el Municipio de Ahome; El fuerte, Lo de Mayo, Álamo Caído, Las Chunas, Chinobampo y Arroyo de los Armenta en el Municipio de El Fuerte; Guadalupe, Agua Caliente Grande y Mesa de los Torres en el Municipio de Choix.		ESTIMACIÓN	07 (NORMAL)
			FECHA	01 DE JULIO DEL 2025
			PERIODO DE ESTIMACIÓN	
			DE	03 DE JUNIO DEL 2025
		AL	14 DE JUNIO DEL 2025	
PROGRAMA DE APOYOS EN PISOS Y TECHOS 2024.- TECHUMBRE METÁLICA -26.- MATEO COTA GASTELUM, ARROYO DE LOS ARMENTA, EL FUERTE				
CONCEPTOS	4.02.- TECHUMBRE METALICA, HECHA A BASE DE POLIN 4 X 16 M C/14 C.C., LAMINA GALVANIZADA R-101 C/26, SEGÚN INDIQUE PROYECTO, INCLUYE: PINTURA ANTIOXIDANTE, MATERIALES NECESARIOS PARA SU INSTALACION Y CONSTRUCCION, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA Y EQUIPO NECESARIO.			

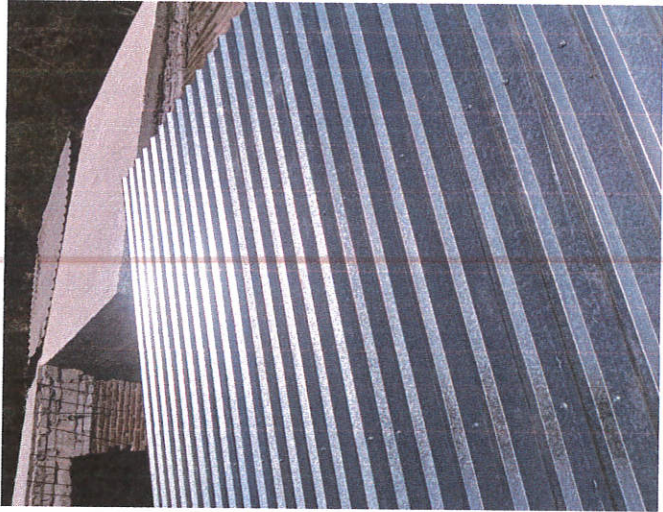

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

COMISION DE VIVIENDA DEL ESTADO DE SINALOA
CONTROL ACUMULATIVO DE ESTIMACIONES

ESTIMACIÓN NUM. 07 (NORMAL)									
		DEL 03 DE JUNIO 2025 AL 14 DE JUNIO DEL 2025			IMPORTE		\$ 13,372.32		
LUGAR:		LOCALIDADES DE GUADALUPE, AGUA CALIENTE GRANDE Y MESA DE LOS TORRES. MUNICIPIO DE CHOIX.							
OBRA:		Ejecución de 64 (sesenta y cuatro) acciones de mejoramiento de unidades habitacionales destinadas a casa habitación de los beneficiarios de los municipios de Ahome, El Fuerte y Choix: 46 (cuarenta y seis) acciones en la modalidad de mejoramiento de vivienda - (techo firme de concreto), 14 (catorce) acciones en la modalidad de mejoramiento de vivienda- (techo de lámina), 04 (cuatro) acciones en la modalidad de mejoramiento de vivienda - (piso firme) en las localidades de Goros Pueblo, Goros 2, Cohuitambo, Jitzamuri y Ejido Jitzamuri en el Municipio de Ahome; El fuerte, Lo de Mayo, Álamo Calido, Las Chunas, Chirobampo y Arroyo de los Amenta en el Municipio de El Fuerte; Guadalupe, Agua Caliente Grande y Mesa de los Torres en el Municipio de Choix.		CONTRATISTA:		CONSTRUCTORA INTEGRAL CYPE DEL PACIFICO SA DE CV			
				CONTRATO (No. Y FECHA)		CV-DG-LP-PTZN-003/2024 30 DE DICIEMBRE DE 2024 AL 01 DE JULIO DE 2025			
				PRESUPUESTO		\$3,748,423.06			
		PARTIDA							
		CANTIDAD DE OBRA (VOLUMENES)							
No.		UNI	CONTRATADO EN PRESUPUESTO	ACUMULADA EJECUTADO	ESTIMACION EJECUTADO ANTERIOR	RESTANTE	ESTA ESTIMACIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1 PRELIMINARES									
1.01	TRAZO Y NIVELACION DEL TERRENO ESTABLECIENDO REFERENCIA Y NIVELETAS.	M2	42.80	42.80	42.80	0.00	0.00	\$12.61	\$ -
2 CIMENTACIÓN									
2.01	SUMINISTRO Y RELLENO DE MATERIAL INERTE, COMPACTADO CON PISON DE MANO Y AGUA.	M3	6.42	6.42	6.42	0.00	0.00	\$488.18	\$ -
2.02	PISO DE CONCRETO DE 10 CMS. DE ESPESOR, ACABADO SEMI-PULIDO CON LLANA, CON MALLA ELECTROSOLDADA 6X6-10/10 DE REFUERZO Y COLADO CON CONCRETO F'c=200 KG/CM². INCLUYE; EQUIPO, MATERIALES, VIBRADO Y MANO DE OBRA.	M2	42.80	42.80	42.80	0.00	0.00	\$685.77	\$ -
3 ESTRUCTURA									
3.02	MURO DE ENRASE ALTURA SEGÚN PROYECTO A BASE DE TABIQUE DE JAL 10X14X28 CMS. ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA PROP 1:3. INCLUYE: FLETE, DESPERDICIO. ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION, ANDAMIOS, TRAZO, NIVELACION, PLOMEADOS, CORTES, AJUSTES, FABRICACION DEL MORTERO. COLOCACION, ACEROS DE REFUERZO, ENRASE, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRAANTE FUERA DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO DE OBRA.	ML	33.79	39.69	33.79	0.00	5.90	\$547.83	\$ 3,232.20
3.03	CASTILLO DE CONCRETO 15 X 15 CMS.,ACABADO COMUN, ARMADO CON ARMEX 15X15-4, CONCRETO Fc=200 Kg/cm2. INCLUYE: CIMBRA, TUINO, DESCIMBRA, VIBRADO, ANCLAJES, MATERIALES.	ML	7.20	4.80	3.20	2.40	1.60	\$434.41	\$ 695.06
3.04	DALA DE CERRAMIENTO DE 15 X 20 CMS. ACABADO APARENTE. ARMADO CON ARMEX 12 X 20-4 Y CONCRETO Fc=200 Kg/cm2. INCLUYE: CIMBRA, DESCIMBRA, VIBRADO, MATERIALES.	ML	18.91	24.19	18.91	0.00	5.28	\$522.63	\$ 2,759.49



COMISION DE VIVIENDA DEL ESTADO DE SINALOA
CONTROL ACUMULATIVO DE ESTIMACIONES

ESTIMACIÓN NUM. 07 (NORMAL)		DEL 03 DE JUNIO 2025 AL 14 DE JUNIO DEL 2025		IMPORTE		\$		13,372.32	
LUGAR:		LOCALIDADES DE GUADALUPE, AGUA CALIENTE GRANDE Y MESA DE LOS TORRES, MUNICIPIO DE CHOIX.		CONTRATISTA:		CONSTRUCTORA INTEGRAL CYPE DEL PACIFICO SA DE CV			
OBRA:		Ejecución de 64 (sesenta y cuatro) acciones de mejoramiento de unidades habitacionales destinadas a casa habitación de los beneficiarios de los municipios de Ahomé, El Fuerte y Choix: 46 (cuarenta y seis) acciones en la modalidad de mejoramiento de vivienda - (techo firme de concreto), 14 (catorce) acciones en la modalidad de mejoramiento de vivienda- (techo de lámina), 04 (cuatro) acciones en la modalidad de mejoramiento de vivienda - (piso firme) en las localidades de Goros Pueblo, Goros 2, Cohuabampo, Jitzamuri y Ejido Jitzamuri en el Municipio de Ahomé; El fuerte, Lo de Mayo, Alamo Calido, Las Chunas, Chirobampo y Arroyo de los Armenta en el Municipio de El Fuerte; Guadalupe, Agua Caliente Grande y Mesa de los Torres en el Municipio de Choix.		CONTRATO (No Y FECHA)		CV-DG-LP-PTZN-003/2024 30 DE DICIEMBRE DE 2024 AL 01 DE JULIO DE 2025			
				PRESUPUESTO		\$3,748,423.06			
PARTIDA		CANTIDAD DE OBRA (VOLUMENES)						\$	
No.	CHOIX: EJECUCION DE 12 (DOCE) ACCIONES DE MEJORAMIENTO DE UNIDADES HABITACIONALES: 07 ACC (TECHO FIRME DE CONCRETO); 03 ACC (TECHO DE LAMINA); 02 ACC (PISO DE CONCRETO) EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE CHOIX, SINALOA.	UNI	CONTRATADO EN PRESUPUESTO	ACUMULADA EJECUTADO	ESTIMACION EJECUTADO ANTERIOR	RESTANTE	ESTA ESTIMACIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
3.05	FABRICACION Y COLOCACION DE POLIN MONTEN CAJON DE 4" CAL. 14. PARA COLUMNAS COMO SOPORTE DE TECHO DE LAMINA GALVANIZADA R-101 CAL.26, INCLUYE: MATERIALES, SOLDADURA, MANO DE OBRA PARA TRAZO, CORTE; HABILITADO, ENSAMBLE, APLICACIÓN DE FONDO PRIMARIO ANTICORROSIVO, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. COLOCACION Y FIJACION DE PLACA DE ACERO DE 6 X 6 X 3/8" DE ESPESOR CON 4 VARILLAS DE ACERO CORRUGADO No. 3 DE 30 Cms DE LONGITUD CADA UNA COMO ANCLAJE DE SUJECION, A BASE DE CONCRETO F'C= 250 KG/CM2 DE EN MEDIDAS DE 20 Cms DE DIAMETRO POR 40 Cms DE PROFUNDIDAD, INCLUYE: EXCAVACION, AFINE, CONCRETO Y LA PLACA BASE.	ML	9.00	9.00	9.00	0.00	0.00	\$821.83	\$
3.06	COLOCACION Y FIJACION DE PLACA DE ACERO DE 6 X 6 X 3/8" DE ESPESOR CON 4 VARILLAS DE ACERO CORRUGADO No. 3 DE 30 Cms DE LONGITUD CADA UNA COMO ANCLAJE DE SUJECION, A BASE DE CONCRETO F'C= 250 KG/CM2 DE EN MEDIDAS DE 20 Cms DE DIAMETRO POR 40 Cms DE PROFUNDIDAD, INCLUYE: EXCAVACION, AFINE, CONCRETO Y LA PLACA BASE.	PZA	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	\$406.07	\$
3.07	TRABE EN PARTE INFERIOR DE LOSA MACISA DE 15 X 20 CM ARMADA CON 4 VARILLAS DE 3/8". CONCRETO F'C = 200 KG/CM2, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	ML	4.20	4.20	4.20	0.00	0.00	\$765.90	\$
4	LOSAS								
4.01	LOSA MACIZA DE 10 Cms DE ESPESOR, CON CONCRETO F'C= 200 KG/CM2, ARMADA CON VARILLA 3/8" A @ 20 CMS EN AMBOS SENTIDOS UN SOLO LECHO. REFORZADOS CON BASTONES VARILLA 3/8" A @ 40 CMS EN EL PERIMETRO DE LOSA, INCLUYE: CIMBRA DE CONTACTO PARA LOSA A BASE DE BARROTE, TUJINO Y DUELA, APUNTALADO, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, ANDAMIOS, DESCIMBRADO, COLADO Y CURADO.	M2	153.36	153.36	153.36	0.00	0.00	\$1,658.00	\$

DO.

COMISION DE VIVIENDA DEL ESTADO DE SINALOA CONTROL ACUMULATIVO DE ESTIMACIONES																			
ESTIMACIÓN NUM. 07 (NORMAL)		DEL 03 DE JUNIO 2025 AL 14 DE JUNIO DEL 2025		IMPORTE		\$		13,372.32											
LUGAR:		LOCALIDADES DE GUADALUPE, AGUA CALIENTE GRANDE Y MESA DE LOS TORRES, MUNICIPIO DE CHOIX.		CONTRATISTA:		CONSTRUCTORA INTEGRAL CYPE DEL PACIFICO SA DE CV													
OBRA:		Ejecución de 64 (sesenta y cuatro) acciones de mejoramiento de unidades habitacionales destinadas a casa habitación de los beneficiarios de los municipios de Ahome, El Fuerte y Choix: 46 (cuarenta y seis) acciones en la modalidad de mejoramiento de vivienda - (techo firme de concreto), 14 (catorce) acciones en la modalidad de mejoramiento de vivienda- (techo de lámina), 04 (cuatro) acciones en la modalidad de mejoramiento de vivienda - (piso firme) en las localidades de Goros Pueblo, Goros 2, Chichibampo, Jiltzamuri y Ejido Jiltzamuri en el Municipio de Ahome; El fuerte, Lo de Mayo, Álamo Caído, Las Chunas, Chinobampo y Arroyo de los Armenta en el Municipio de El Fuerte; Guadalupe, Agua Caliente Grande y Mesa de los Torres en el Municipio de Choix.		CONTRATO (No. Y FECHA)		CV-DG-LP-PTZN-003/2024 30 DE DICIEMBRE DE 2024 AL 01 DE JULIO DE 2025													
				PRESUPUESTO		\$3,748,423.06													
		PARTIDA		CANTIDAD DE OBRA (VOLUMENES)						\$									
No.		CHOIX: EJECUCION DE 12 (DOCE) ACCIONES DE MEJORAMIENTO DE UNIDADES HABITACIONALES: 07 ACC (TECHO FIRME DE CONCRETO); 03 ACC (TECHO DE LAMINA); 02 ACC (PISO DE CONCRETO) EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE CHOIX, SINALOA.		UNI		CONTRATADO EN PRESUPUESTO		ACUMULADA EJECUTADO		ESTIMACION EJECUTADO ANTERIOR		RESTANTE		ESTA ESTIMACIÓN		PRECIO UNITARIO		IMPORTE	
4.02		TECHUMBRE METALICA, HECHA A BASE DE POLIN 4 X 16 M C/14 C.C., LAMINA GALVANIZADA R-101 C/26, SEGÚN INDIQUE PROYECTO, INCLUYE: PINTURA ANTIOXIDANTE, MATERIALES NECESARIOS PARA SU INSTALACION Y CONSTRUCCION, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA Y EQUIPO NECESARIO.		M2		53.56		53.56		53.56		0.00		0.00		\$1,487.92		\$	
5		CUBIERTA																	
5.01		SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE IMPERMEABILIZANTE ELASTOMERICO EN COLOR BLANCO, MARCA IMPAC O SIMILAR CON CALIDAD DE 3 AÑOS, INCLUYE: LIMPIEZA DE LA SUPERFICIE, UNA CAPA DE SELLADOR PRIMER, PRIMERA APLICACIÓN DE IMPERMEABILIZANTE, UNA CAPA DE MEMBRANA DE REFUERZO UNA SEGUNDA CAPA DE IMPERMEABILIZANTE ELASTOMERICO.		M2		153.36		153.36		153.36		0.00		0.00		\$247.52		\$	
6		DETALLES DE ALBAÑILERIA																	
6.01		APLANADO EN PLAFÓN CON YESO EN INTERIOR, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.		M2		124.87		124.87		124.87		0.00		0.00		\$300.79		\$	
6.02		APLANADO EN PLAFÓN CON ESTUCCO EN EXTERIOR (VOLADO-MAQUESINA) MARCA UNIBLOCK O SIMILAR, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.		M2		2.48		2.48		2.48		0.00		0.00		\$347.26		\$	
9		INSTALACION ELECTRICA																	
9.01		SALIDA DE LUMINARIA CANALIZADO CON POLIDUCTO DE 1/2", SAL. INCLUYE: RANURA Y RESANE DE MURO, APAGADOR, PORTALAMPARA, FOCO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y EQUIPO.		SAL		12.00		12.00		12.00		0.00		0.00		\$1,299.85		\$	



COMISION DE VIVIENDA DEL ESTADO DE SINALOA CONTROL ACUMULATIVO DE ESTIMACIONES									
ESTIMACIÓN NUM. 07 (NORMAL)		DEL 03 DE JUNIO 2025 AL 14 DE JUNIO DEL 2025			IMPORTE		\$ 13,372.32		
LUGAR:		LOCALIDADES DE GUADALUPE, AGUA CALIENTE GRANDE Y MESA DE LOS TORRES, MUNICIPIO DE CHOIX.			CONTRATISTA:		CONSTRUCTORA INTEGRAL CYPE DEL PACIFICO SA DE CV		
OBRA:		Ejecución de 64 (sesenta y cuatro) acciones de mejoramiento de unidades habitacionales destinadas a casa habitación de los beneficiarios de los municipios de Ahome, El Fuerte y Choix: 46 (cuarenta y seis) acciones en la modalidad de mejoramiento de vivienda - (techo firme de concreto), 14 (catorce) acciones en la modalidad de mejoramiento de vivienda- (techo de lámina), 04 (cuatro) acciones en la modalidad de mejoramiento de vivienda - (piso firme) en las localidades de Goros Pueblo, Goros 2, Cohuibampo, Jitzamuri y Ejido Jitzamuri en el Municipio de Ahome; El fuerte, Lo de Mayo, Álamo Calido, Las Chunas, Chinobampo y Arroyo de los Armenta en el Municipio de El Fuerte; Guadalupe, Agua Caliente Grande y Mesa de los Torres en el Municipio de Choix.			CONTRATO (No. Y FECHA)		CV-DG-LP-PTZN-003/2024 30 DE DICIEMBRE DE 2024 AL 01 DE JULIO DE 2025		
					PRESUPUESTO		\$3,748,423.06		
CANTIDAD DE OBRA (VOLUMENES)									
PARTIDA									
No.	CHOIX: EJECUCION DE 12 (DOCE) ACCIONES DE MEJORAMIENTO DE UNIDADES HABITACIONALES: 07 ACC (TECHO FIRME DE CONCRETO); 03 ACC (TECHO DE LAMINA); 02 ACC (PISO DE CONCRETO) EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE CHOIX, SINALOA.	UNI	CONTRATADO EN PRESUPUESTO	ACUMULADA EJECUTADO	ESTIMACION EJECUTADO ANTERIOR	RESTANTE	ESTA ESTIMACIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
9.02	SALIDA DE CONTACTO CANALIZADO CON POLIDUCTO DE 1/2", INCLUYE: RANURA Y RESANE EN MURO, CONTACTO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y EQUIPO.	SAL	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	\$1,230.90	\$ -
9.03	SALIDA DE LUMINARIA CANALIZADO CON TUBERIA CONDUIT VERDE DE 1/2", INCLUYE: APAGADOR, PORTALAMPARA, FOCO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y EQUIPO.	SAL	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	\$1,470.94	\$ -
9.04	SALIDA DE CONTACTO CANALIZADO CON TUBERIA CONDUIT VERDE DE 1/2", INCLUYE: CONTACTO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y EQUIPO.	SAL	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	\$1,362.78	\$ -
13	VARIOS								
13.01	LIMPIEZA GRUESA Y FINA DE OBRA, INCLUYE: RETIRO DE ESCOMBRO, MATERIAL SOBRENTE Y BASURA, TANTO EN EL INTERIOR DEL PATIO Y FRENTE DE LA VIVIENDA, LIMPIEZA DEL PISO DE CUALQUIER TIPO DE MEZCLA Y LAVADO CON AGUA Y JABON.	LOTE	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	\$2,398.71	\$ -

SUB-TOTAL CHOIX \$ 6,686.75

[illegible]

1

[illegible]

1

CONSTRUCTORA INTEGRAL CYPE DEL PACIFICO SA DE CV

N° DE CONTRATO: CV-DG-LP-PTZN-003/2024					
OBRA	Ejecución de 64 (sesenta y cuatro) acciones de mejoramiento de unidades habitacionales destinadas a casa habitación de los beneficiarios de los municipios de Ahome, El Fuerte y Choix: 46 (cuarenta y seis) acciones en la modalidad de mejoramiento de vivienda - (techo firme de concreto), 14 (catorce) acciones en la modalidad de mejoramiento de vivienda- (techo de lámina), 04 (cuatro) acciones en la modalidad de mejoramiento de vivienda - (piso firme) en las localidades de Goros Pueblo, Goros 2, Cohuibampo, Jitzamuri y Ejido Jitzamuri en el Municipio de Ahome; El fuerte, Lo de Mayo, Álamo Caldo, Las Chunas, Chinobampo y Arroyo de los Armenta en el Municipio de El Fuerte; Guadalupe, Agua Caliente Grande y Mesa de los Torres en el Municipio de Choix.			ESTIMACIÓN	
				FECHA	07 (NORMAL)
				PERIODO DE ESTIMACIÓN	01 DE JULIO DEL 2025
				DE	03 DE JUNIO DEL 2025
			AL	14 DE JUNIO DEL 2025	

PROGRAMA DE APOYOS EN PISOS Y TECHOS 2024.-		TECHO FIRME DE CONCRETO.- 04.- LUZ ELENA GOMEZ IBARRA, AGUA CALIENTE GRANDE, CHOIX.
CONCEPTOS	3.02.- MURO DE ENRASE ALTURA SEGÚN PROYECTO A BASE DE TABIQUE DE JAL 10X14X28 CMS, ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA PROP 1:3, INCLUYE: FLETE, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION, ANDAMIOS, TRAZO, NIVELACION, PLOMEADOS, CORTES, AJUSTES, FABRICACION DEL MORTERO, COLOCACION, ACEROS DE REFUERZO, ENRASE, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRENTE FUERA DE OBRA, HERRAMIENTA , EQUIPO Y MANO DE OBRA.	




[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

CONSTRUCTORA INTEGRAL CYPE DEL PACIFICO SA DE CV

REPORTE FOTOGRAFICO				
N° DE CONTRATO:	CV-DG-LP-PTZN-003/2024		ESTIMACIÓN	
OBRA	Ejecución de 64 (sesenta y cuatro) acciones de mejoramiento de unidades habitacionales destinadas a casa habitación de los beneficiarios de los municipios de Ahome, El Fuerte y Choix: 46 (cuarenta y seis) acciones en la modalidad de mejoramiento de vivienda - (techo firme de concreto), 14 (catorce) acciones en la modalidad de mejoramiento de vivienda- (techo de lámina), 04 (cuatro) acciones en la modalidad de mejoramiento de vivienda - (piso firme) en las localidades de Goros Pueblo, Goros 2, Coahuibampo, Jitzamuri y Ejido Jitzamuri en el Municipio de Ahome; El fuerte, Lo de Mayo, Álamo Caído, Las Chunas, Chinobampo y Arroyo de los Armenta en el Municipio de El Fuerte; Guadalupe, Agua Caliente Grande y Mesa de los Torres en el Municipio de Choix.		07 (NORMAL)	
			FECHA	
			PERIODO DE ESTIMACIÓN	
			DE	AL
				01 DE JULIO DEL 2025
				03 DE JUNIO DEL 2025
				14 DE JUNIO DEL 2025

PROGRAMA DE APOYOS EN PISOS Y TECHOS 2024.-		TECHO FIRME DE CONCRETO.-05.- BENTURA VALENCIA RUELAS, AGUA CALIENTE GRANDE, CHOIX.
CONCEPTOS	3.02.- MURO DE ENRASE ALTURA SEGÚN PROYECTO A BASE DE TABIQUE DE JAL 10X14X28 CMS, ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA PROP 1:3, INCLUYE: FLETE, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION, ANDAMIOS, TRAZO, NIVELACION, PLOMEADOS, CORTES, AJUSTES, FABRICACION DEL MORTERO, COLOCACION, ACEROS DE REFUERZO, ENRASE, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRENTE FUERA DE OBRA, HERRAMIENTA , EQUIPO Y MANO DE OBRA.	

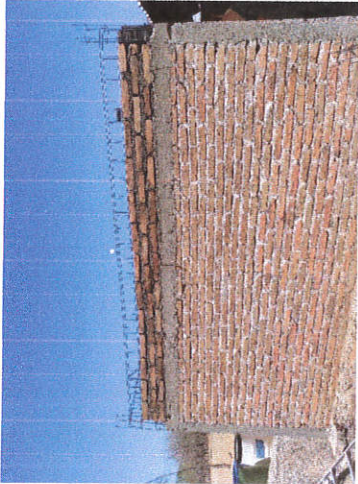

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

CONSTRUCTORA INTEGRAL CYPE DEL PACIFICO SA DE CV

REPORTE FOTOGRAFICO					
OBRA	N° DE CONTRATO:	CV-DG-LP-PTZN-003/2024		ESTIMACIÓN	
		Ejecución de 64 (sesenta y cuatro) acciones de mejoramiento de unidades habitacionales destinadas a casa habitación de los beneficiarios de los municipios de Ahome, El Fuerte y Choix: 46 (cuarenta y seis) acciones en la modalidad de mejoramiento de vivienda - (techo firme de concreto), 14 (catorce) acciones en la modalidad de mejoramiento de vivienda- (techo de lámina), 04 (cuatro) acciones en la modalidad de mejoramiento de vivienda - (piso firme) en las localidades de Goros Pueblo, Goros 2, Cohuibampo, Jitzamuri y Ejido Jitzamuri en el Municipio de Ahome; El fuerte, Lo de Mayo, Álamo Caído, Las Chunas, Chinobampo y Arroyo de los Armenta en el Municipio de El Fuerte; Guadalupe, Agua Caliente Grande y Mesa de los Torres en el Municipio de Choix.		FECHA	
				PERIODO DE ESTIMACIÓN	
				DE	03 DE JUNIO DEL 2025
				AL	14 DE JUNIO DEL 2025

PROGRAMA DE APOYOS EN PISOS Y TECHOS 2024.-		TECHO FIRME DE CONCRETO -07.- GERONIMA VALENZUELA TORRES, AGUA CALIENTE GRANDE, CHOIX.
CONCEPTOS	3.02.- MURO DE ENRASE ALTURA SEGÚN PROYECTO A BASE DE TABIQUE DE JAL 10X14X28 CMS, ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA PROP 1:3, INCLUYE: FLETE, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION, ANDAMIOS, TRAZO, NIVELACION, PLOMEADOS, CORTES, AJUSTES, FABRICACION DEL MORTERO, COLOCACION, ACEROS DE REFUERZO, ENRASE, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRENTE FUERA DE OBRA, HERRAMIENTA , EQUIPO Y MANO DE OBRA.	






[Handwritten signature]

CONSTRUCTORA INTEGRAL CYPE DEL PACIFICO SA DE CV

REPORTE FOTOGRAFICO					
N° DE CONTRATO:	CV-DG-LP-PTZN-003/2024				
OBRA	Ejecución de 64 (sesenta y cuatro) acciones de mejoramiento de unidades habitacionales destinadas a casa habitación de los beneficiarios de los municipios de Ahome, El Fuerte y Choix: 46 (cuarenta y seis) acciones en la modalidad de mejoramiento de vivienda - (techo firme de concreto), 14 (catorce) acciones en la modalidad de mejoramiento de vivienda- (techo de lámina), 04 (cuatro) acciones en la modalidad de mejoramiento de vivienda - (piso firme) en las localidades de Goros Pueblo, Goros 2, Cohuibampo, Jitzamuri y Ejido Jitzamuri en el Municipio de Ahome; El fuerte, Lo de Mayo, Álamo Caldo, Las Chunas, Chinobampo y Arroyo de los Armenta en el Municipio de El Fuerte; Guadalupe, Agua Caliente Grande y Mesa de los Torres en el Municipio de Choix.	ESTIMACIÓN		07 (NORMAL)	
		FECHA		01 DE JULIO DEL 2025	
		PERIODO DE ESTIMACIÓN			
		DE	03 DE JUNIO DEL 2025		
		AL	14 DE JUNIO DEL 2025		

PROGRAMA DE APOYOS EN PISOS Y TECHOS 2024.-		TECHO FIRME DE CONCRETO.- 04.- LUZ ELENA GOMEZ IBARRA, AGUA CALIENTE GRANDE, CHOIX.
CONCEPTOS	3.03.- CASTILLO DE CONCRETO DE 15 X 15 CMS., ACABADO COMUN, ARMADO CON ARMEX 15 X 15-4, CONCRETO Fc'=200 Kg/cm2, INCLUYE; CIMBRA, TUINO, DESCIMBRA, VIBRADO, ANCLAJES, MATERIALES.	

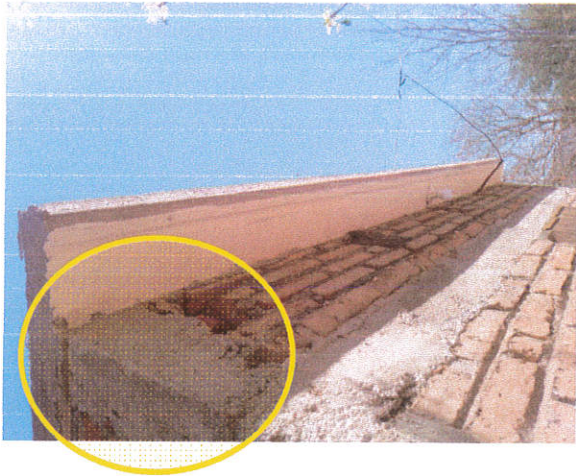

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

CONSTRUCTORA INTEGRAL CYPE DEL PACIFICO SA DE CV

REPORTE FOTOGRAFICO					
N° DE CONTRATO:	CV-DG-LP-PTZN-003/2024		ESTIMACIÓN		07 (NORMAL)
OBRA	Ejecución de 64 (sesenta y cuatro) acciones de mejoramiento de unidades habitacionales destinadas a casa habitación de los beneficiarios de los municipios de Ahome, El Fuerte y Choix: 46 (cuarenta y seis) acciones en la modalidad de mejoramiento de vivienda - (techo firme de concreto), 14 (catorce) acciones en la modalidad de mejoramiento de vivienda- (techo de lámina), 04 (cuatro) acciones en la modalidad de mejoramiento de vivienda - (piso firme) en las localidades de Goros Pueblo, Goros 2, Cohuabampo, Jitzamuri y Ejido Jitzamuri en el Municipio de Ahome; El fuerte, Lo de Mayo, Alamo Caldo, Las Chunas, Chinobampo y Arroyo de los Armenta en el Municipio de El Fuerte; Guadalupe, Agua Caliente Grande y Mesa de los Torres en el Municipio de Choix.		FECHA		01 DE JULIO DEL 2025
			PERIODO DE ESTIMACIÓN		
			DE	03 DE JUNIO DEL 2025	
			AL	14 DE JUNIO DEL 2025	

PROGRAMA DE APOYOS EN PISOS Y TECHOS 2024.-		TECHO FIRME DE CONCRETO.- 05.- BENTURA VALENCIA RUELAS, AGUA CALIENTE GRANDE, CHOIX.
CONCEPTOS	3.03.- CASTILLO DE CONCRETO 15 X 15 CMS.,ACABADO COMUN, ARMADO CON ARMEX 15X15-4, CONCRETO Fc'=200 Kg/cm2. INCLUYE: CIMBRA, TUINO, DESCIMBRA, VIBRADO, ANCLAJES, MATERIALES.	





[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

CONSTRUCTORA INTEGRAL CYPE DEL PACIFICO SA DE CV

N° DE CONTRATO: CV-DG-LP-PTZN-003/2024				
Ejecución de 64 (sesenta y cuatro) acciones de mejoramiento de unidades habitacionales destinadas a casa habitación de los beneficiarios de los municipios de Ahome, El Fuerte y Choix: 46 (cuarenta y seis) acciones en la modalidad de mejoramiento de vivienda - (techo firme de concreto), 14 (catorce) acciones en la modalidad de mejoramiento de vivienda- (techo de lámina), 04 (cuatro) acciones en la modalidad de mejoramiento de vivienda - (piso firme) en las localidades de Goros Pueblo, Goros 2, Cohuibampo, Jitzamuri y Ejido Jitzamuri en el Municipio de Ahome; El fuerte, Lo de Mayo, Álamo Calido, Las Chunas, Chinobampo y Arroyo de los Armenta en el Municipio de El Fuerte; Guadalupe, Agua Caliente Grande y Mesa de los Torres en el Municipio de Choix.				
OBRA	ESTIMACIÓN		07 (NORMAL)	
	FECHA		01 DE JULIO DEL 2025	
	PERIODO DE ESTIMACIÓN			
	DE	03 DE JUNIO DEL 2025	AL	14 DE JUNIO DEL 2025

PROGRAMA DE APOYOS EN PISOS Y TECHOS 2024.-		TECHO FIRME DE CONCRETO.- 05.- BENTURA VALENCIA RUELAS, AGUA CALIENTE GRANDE, CHOIX.
CONCEPTOS	3.04.- DALA DE CERRAMIENTO DE 15 X 20 CMS, ACABADO APARENTE, ARMADO CON ARMEX 12 X 20-4 Y CONCRETO Fc=200 Kg/cm2. INCLUYE: CIMBRA, DESCIMBRA, VIBRADO, MATERIALES.	

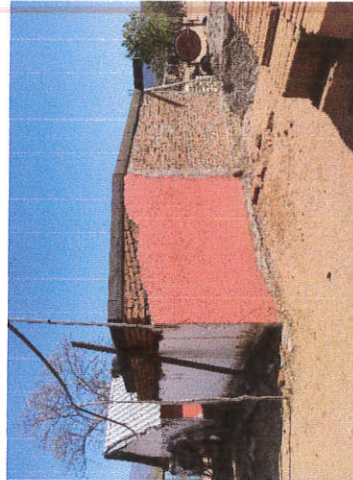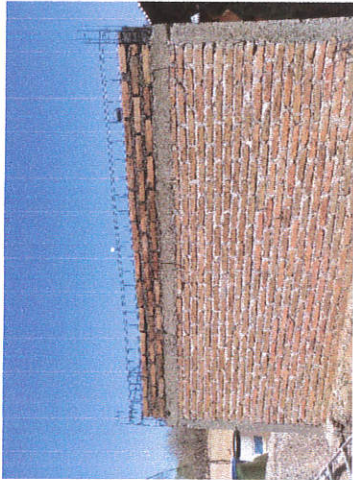

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

CONSTRUCTORA INTEGRAL CYPE DEL PACIFICO SA DE CV

N° DE CONTRATO:					CV-DG-LP-PTZN-003/2024					REPORTE FOTOGRAFICO				
OBRA					Ejecución de 64 (sesenta y cuatro) acciones de mejoramiento de unidades habitacionales destinadas a casa habitación de los beneficiarios de los municipios de Ahome, El Fuerte y Choix: 46 (cuarenta y seis) acciones en la modalidad de mejoramiento de vivienda - (techo firme de concreto), 14 (catorce) acciones en la modalidad de mejoramiento de vivienda- (techo de lámina), 04 (cuatro) acciones en la modalidad de mejoramiento de vivienda - (piso firme) en las localidades de Goros Pueblo, Goros 2, Coahuibampo, Jitzamuri y Ejido Jitzamuri en el Municipio de Ahome; El fuerte, Lo de Mayo, Álamo Caído, Las Chunas, Chinobampo y Arroyo de los Armenta en el Municipio de El Fuerte; Guadalupe, Agua Caliente Grande y Mesa de los Torres en el Municipio de Choix.					ESTIMACIÓN		07 (NORMAL)		
										FECHA		01 DE JULIO DEL 2025		
										PERIODO DE ESTIMACIÓN				
										DE		03 DE JUNIO DEL 2025		
AL		14 DE JUNIO DEL 2025												
PROGRAMA DE APOYOS EN PISOS Y TECHOS 2024.-										TECHO FIRME DE CONCRETO.-10.- LORENZO BLANCO TORRES, MESA DE LOS TORRES, CHOIX.				
CONCEPTOS					13.01.- LIMPIEZA GRUESA Y FINA DE OBRA, INCLUYE; RETIRO DE ESCOMBRO, MATERIAL SOBRENTE Y BASURA, TANTO EN EL INTERIOR DEL PATIO Y FRENTE DE LA VIVIENDA, LIMPIEZA DEL PISO DE CUALQUIER TIPO DE MEZCLA Y LAVADO CON AGUA Y JABON.									



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]


CONSTRUCTORA INTEGRAL CYPE DEL PACIFICO SA DE CV

REPORTE FOTOGRAFICO				
N° DE CONTRATO:	CV-DG-LP-PTZN-003/2024			
OBRA	Ejecución de 64 (sesenta y cuatro) acciones de mejoramiento de unidades habitacionales destinadas a casa habitación de los beneficiarios de los municipios de Ahome, El Fuerte y Choix: 46 (cuarenta y seis) acciones en la modalidad de mejoramiento de vivienda - (techo firme de concreto), 14 (catorce) acciones en la modalidad de mejoramiento de vivienda- (techo de lámina), 04 (cuatro) acciones en la modalidad de mejoramiento de vivienda - (piso firme) en las localidades de Goros Pueblo, Goros 2, Coahuibampo, Jitzamuri y Ejido Jitzamuri en el Municipio de Ahome; El fuerte, Lo de Mayo, Alamo Calido, Las Chunas, Chinobampo y Arroyo de los Armenta en el Municipio de El Fuerte; Guadalupe, Agua Caliente Grande y Mesa de los Torres en el Municipio de Choix.		ESTIMACIÓN	07 (NORMAL)
			FECHA	01 DE JULIO DEL 2025
			PERIODO DE ESTIMACIÓN	
			DE	03 DE JUNIO DEL 2025
		AL	14 DE JUNIO DEL 2025	

PROGRAMA DE APOYOS EN PISOS Y TECHOS 2024.-		TECHO FIRME DE CONCRETO.- 12.- RICARDA CORRALES GONZALEZ, MESA DE LOS TORRES, CHOIX.
CONCEPTOS	13.01.- LIMPIEZA GRUESA Y FINA DE OBRA, INCLUYE: RETIRO DE ESCOMBRO, MATERIAL SOBRENTE Y BASURA, TANTO EN EL INTERIOR DEL PATIO Y FRENTE DE LA VIVIENDA, LIMPIEZA DEL PISO DE CUALQUIER TIPO DE MEZCLA Y LAVADO CON AGUA Y JABON.	



[Handwritten signature]

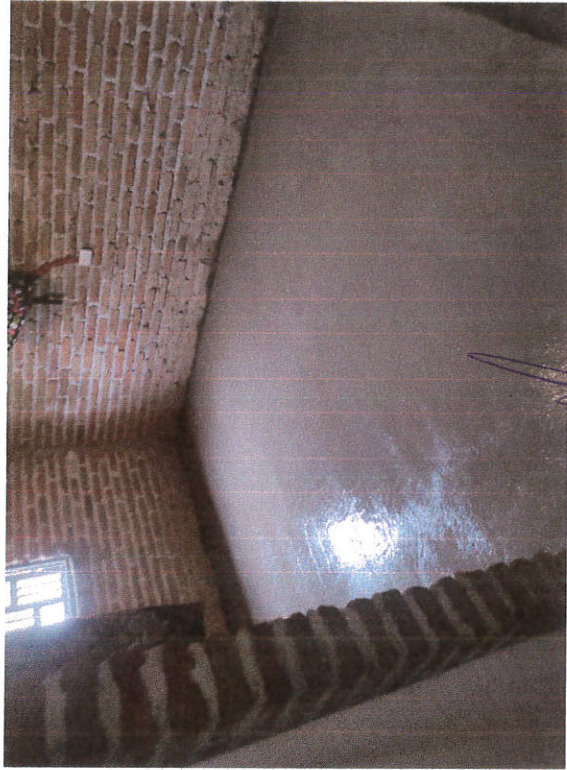

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]
