

MARIA DE LA LUZ VALENZUELA PASOS  
CARRETERA CONCORDIA - EL VERDE No.3  
CONCORDIA, SINALOA  
R.F.C.  
VAPL-570617-JS3

I.M.S.S.  
L51-11198-10-1



MUNICIPIO DE ESCUINAPA, SINALOA  
DIRECCION DE OBRAS, SERVICIOS PUBLICOS  
Y ECOLOGIA  
ESCUINAPA, SINALOA

HOJA: 1 de 1



### CONCEPTOS DE ESTIMACION

CONTRATO: **ESC-FAISMUN-2025-020**  
PERIODO: **13-ago-25** AL **11-oct-25** LOCALIDAD: **CRISTO REY** ESTIMACION: **01 (Finiquito)**  
MUNICIPIO: **ESCUINAPA**  
DESCRIPCION: **CONSTRUCCION DE TECHO FIRME 4X4 M2, EN LA COMUNIDAD DE CRISTO REY, ESCUINAPA, SINALOA.**

IMPORTE DE OBRA: **\$702,174.96**  
IMPORTE DE ANTICIPO DE OBRA: **\$245,761.24**  
IMPORTE TOTAL DE CONTRATO: **\$702,174.96**

| CLAVE                                                   | CONCEPTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | UNIDAD | SEGUN PROYECTO |              |               | HASTA<br>ESTA<br>ESTIMACION | HASTA<br>ESTIMACION<br>ANTERIOR | EXCEDENTE | DE ESTA<br>ESTIMACION | IMPORTE    |
|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------|--------------|---------------|-----------------------------|---------------------------------|-----------|-----------------------|------------|
|                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |        | VOL            | PU           | \$            |                             |                                 |           |                       |            |
| TECHOS DE CONCRETO EN LA COMUNIDAD DE CRISTO REY.       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |        |                |              |               |                             |                                 |           |                       |            |
| TRA                                                     | Trazo de terreno, el precio incluye: material, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | M2     | 240.00         | \$ 6.86      | \$ 1,646.40   | 240.00                      | 0.00                            | 0.00      | 240.00                | 1,646.40   |
| CIM-LS                                                  | Cimbra y descimbra en losas con tarimas comun de 1.00 mts x 1.00 mts Incluye: Materiales, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | M2     | 240.00         | \$ 819.15    | \$ 196,596.00 | 240.00                      | 0.00                            | 0.00      | 240.00                | 196,596.00 |
| ACRVR                                                   | Aceño de refuerzo del núm. 3, (3/8") fyp = 4200 kg/ml, en losa de techo , incluye: habilitado y armado, materiales, mano de obra, equipo, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.                                                                                                                                                                                                                                                                   | TON    | 1.50           | \$ 40,176.02 | \$ 60,264.03  | 1.50                        | 0.00                            | 0.00      | 1.50                  | 60,264.03  |
| SM-CO                                                   | Suministro y colocación de concreto simple de 10 cm de espesor, acabado común, concreto hecho en obra de f'c= 200 kg/cm2,incluye: material, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución.                                                                                                                                                                                                                                                                | M2     | 240.00         | \$ 731.41    | \$ 175,538.40 | 240.00                      | 0.00                            | 0.00      | 240.00                | 175,538.40 |
| SE-AL                                                   | Salida de electricidad para alumbrado a base de tubo poliflex pared delgada de 13mm., con un desarrollo de 4mts, con cable thw cal.12, condos, cajas conduit T-19, T-29 serie 9; El precio incluye: conectores pared delgada de13mm, coples de 13mm, abrazaderas de una, apagador y placas sencilla marca quinziño, caja de registro de 1/2" y soque de sobre poner, incluye: material, mano de obra y todo lo necesario, para su correcta ejecución.                   | SAL    | 15.00          | \$ 1,687.52  | \$ 25,312.80  | 15.00                       | 0.00                            | 0.00      | 15.00                 | 25,312.80  |
| SE-AB                                                   | Salida de electricidad para abanico a base de tubo poliflex pared delgada de 13mm., con un desarrollo de 10mts, con cable thw cal.12, con dos cajas conduit T-19, T-29 serie 9, y una FS-1 de 13 mm; El precio incluye: conectores pared delgadade13mm, coples de 13 mm, abrazaderas de una, apagador y placa sencilla marca quinziño, caja de registro de 1/2" y soque de sobre poner, incluye: material, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución. | SAL    | 15.00          | \$ 1,687.52  | \$ 25,312.80  | 15.00                       | 0.00                            | 0.00      | 15.00                 | 25,312.80  |
| PRET                                                    | Pretel block de concreto 9x14x26 con mortero cemento arena 1:5 14cm, de espesor acabado comun, incluye: acarreo 1a. estacion a 20.00m, incluye: material, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución.                                                                                                                                                                                                                                                  | ML     | 240.00         | \$ 196.81    | \$ 47,234.40  | 240.00                      | 0.00                            | 0.00      | 240.00                | 47,234.40  |
| CHAF                                                    | Chafan de 10 x 10 asentado con mezcla cemento arena de proporción 1:5, incluye: material, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ML     | 240.00         | \$ 253.77    | \$ 60,904.80  | 240.00                      | 0.00                            | 0.00      | 240.00                | 60,904.80  |
| LIMP-F                                                  | Limpieza final de la obra, incluye: material, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | M2     | 240.00         | \$ 52.14     | \$ 12,513.60  | 240.00                      | 0.00                            | 0.00      | 240.00                | 12,513.60  |
| TOTAL TECHOS DE CONCRETO EN LA COMUNIDAD DE CRISTO REY: |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |        |                |              |               |                             |                                 |           | \$                    | 605,323.23 |
| TOTAL DE ESTIMACION:                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |        |                |              |               |                             |                                 |           | \$                    | 605,323.23 |

ELABORÓ

C. MARIA DE LA LUZ VALENZUELA PASOS  
CONTRATISTA

REVISÓ

ARQ. SILVIA ZAYDEE PADILLA CRESPO  
SUPERVISOR DE OBRAS PUBLICAS

AUTORIZÓ

M. en ARQ. GRACIELA ELIZALDE SANTOS  
DIRECTORA DE OBRAS, SERVICIOS  
PUBLICOS Y ECOLOGIA

MARIA DE LA LUZ VALENZUELA PASOS  
CARRETERA CONCORDIA - EL VERDE No.3  
CONCORDIA, SINALOA  
R.F.C.  
VAPL-570617-JS3



I.M.S.S.  
L51-11198-10-1

MUNICIPIO DE ESCUINAPA, SINALOA  
DIRECCION DE OBRAS, SERVICIOS PUBLICOS  
Y ECOLOGIA  
ESCUINAPA, SINALOA



RESUMEN DE ESTIMACION

|                              |                                                                                        |     |           |            |            |             |                |
|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|------------|------------|-------------|----------------|
| CONTRATO:                    | ESC-FAISMUN-2025-020                                                                   | AL  | 11-oct-25 | LOCALIDAD: | CRISTO REY | ESTIMACION: | 01 (Finiquito) |
| PERIODO:                     | 13-ago-25                                                                              |     |           |            |            | MUNICIPIO:  | ESCUINAPA      |
| DESCRIPCION:                 | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME 4X4 M2, EN LA COMUNIDAD DE CRISTO REY, ESCUINAPA, SINALOA. |     |           |            |            |             |                |
| IMPORTE DE OBRA:             | \$702,174.96 CONVENIO ADICIONAL:                                                       |     |           |            |            |             |                |
| IMPORTE DE ANTICIPO DE OBRA: | \$245,761.24 PERIODO CONVENIO ADICIONAL:                                               |     |           |            |            |             |                |
| IMPORTE TOTAL DE CONTRATO:   | \$702,174.96                                                                           |     |           |            |            |             |                |
|                              |                                                                                        | DEL |           |            |            |             | AL             |

TECHOS DE CONCRETO EN LA COMUNIDAD DE CRISTO REY.

| OBRA                     |       | IMPORTE |            |
|--------------------------|-------|---------|------------|
| TECHOS DE CONCRETO       | EN LA | \$      | 605,323.23 |
| COMUNIDAD DE CRISTO REY. |       |         |            |
| SUB TOTAL =              |       | \$      | 605,323.23 |
| I.V.A                    |       | \$      | 96,851.72  |
| TOTAL =                  |       | \$      | 702,174.95 |

C. MARIA DE LA LUZ VALENZUELA PASOS  
CONTRATISTA

Revisó  
ARQ. SILVIA ZAYDEE PADILLA CRESPO  
SUPERVISOR DE OBRAS PUBLICAS

Autorizo  
M. en ARQ. GRACIELA ELIZALDE SANTOS  
DIRECTORA DE OBRAS, SERVICIOS  
PUBLICOS Y ECOLOGIA

MARIA DE LA LUZ VALENZUELA PASOS  
CARRETERA CONCORDIA - EL VERDE No.3  
CONCORDIA, SINALOA  
R.F.C.  
VAPL-570617-JS3

I.M.S.S.  
L51-11198-10-1



MUNICIPIO DE ESCUINAPA, SINALOA  
DIRECCION DE OBRAS, SERVICIOS PUBLICOS  
ESCUINAPA, SINALOA



## ESTADO DE CUENTA

ESTIMACION: 01 (Finiquito)  
MUNICIPIO: ESCUINAPA

LOCALIDAD: CRISTO REY

DESCRIPCION: CONSTRUCCION DE TECHO FIRME 4X4 M2, EN LA COMUNIDAD DE CRISTO REY, ESCUINAPA, SINALOA.

FECHA INICIO CONTRATO: 13-ago-25  
FECHA TERMINACION CONTRATO: 11-oct-25  
FECHA CONTRATO: 12-ago-26

CONTRATO: ESC-FAISMUN-2025-020

IMPORTE DE OBRA: \$702,174.96 CLAVE DE CONVENIO ADICIONAL:  
IMPORTE DE ANTICIPO DE OBRA: \$245,761.24 PERIODO CONVENIO ADICIONAL:  
IMPORTE TOTAL DE CONTRATO: \$702,174.96 IMPORTE CONVENIO ADICIONAL:

DEL AL

| No. DE ESTIMACION   | PERIODO             | IMPORTE ESTIMACION \$ | IMPORTE IVA \$ | SIN | 3% CONTROL MPAL Y CONGRESO DEL EDO. | 35% AMORTIZACION ANTICIPO \$ | TOTAL DEDUCCIONES \$ | LIQUIDO A PAGAR \$ |
|---------------------|---------------------|-----------------------|----------------|-----|-------------------------------------|------------------------------|----------------------|--------------------|
| 01 (Finiquito)      | 13-ago-25 11-oct-25 | \$ 702,174.95         | \$ 605,323.23  | \$  | 18,159.70                           | \$245,761.24                 | \$ 263,920.94        | \$ 438,254.01      |
| TOTALES:            |                     | \$ 702,174.95         | \$ 605,323.23  | \$  | 18,159.70                           | \$ 245,761.24                | \$ 263,920.94        | \$ 438,254.01      |
| SALDO DEL CONTRATO: |                     | \$0.01                |                |     | SALDO POR AMORTIZAR:                | \$0.00                       |                      |                    |

REALIZÓ

C. MARIA DE LA LUZ VALENZUELA PASOS  
CONTRATISTA

REVISÓ

ARQ. SILVIA ZAYDEE PADILLA CRESPO  
SUPERVISOR DE OBRAS PUBLICAS

AUTORIZÓ

M. en ARQ. GRACIELA ELIZALDE SANTOS  
DIRECTORA DE OBRAS, SERVICIOS  
PUBLICOS Y ECOLOGIA

AUTORIZÓ

L.C.P. JOSE TRINIDAD IBARRA MARTINEZ  
TESORERO MUNICIPAL

# CARATULA DE RECIBO

Hoja: 1 de 1

## RECIBO MUNICIPAL No. 01 (Finiquito)

MARIA DE LA LUZ VALENZUELA PASOS  
CARRETERA CONCORDIA - EL VERDE No.3  
CONCORDIA, SINALOA

TELEFONO: 694-968-1382  
R.F.C. VAPL-570617-JS3

UBICACION:  
CONCORDIA, SIN.  
I.M.S.S.  
L51-11198-10-1

FECHA: 11-oct-25  
ESTIMACION No: 01 (Finiquito)  
PERIODO:  
DEL 13-ago-25  
AL 11-oct-25

### DESCRIPCION:

CONSTRUCCION DE TECHO FIRME 4X4 M2, EN LA COMUNIDAD DE CRISTO REY, ESCUINAPA, SINALOA.

FECHA DE CONTRATO: 12-ago-25  
PERIODO DE EJECUCION DEL CONTRATO:  
INICIO: 13-ago-25  
TERMINACION: 11-oct-25  
PRORROGA:  
DEL  
AL

### CONTRATO NO:

ESC-FAISMUN-2025-020

|                 |                 |              |                            |
|-----------------|-----------------|--------------|----------------------------|
| IMPORTE SIN IVA | IMPORTE CON IVA | 35% ANTICIPO | IMPORTE TOTAL DE CONTRATO: |
| \$605,323.24    | \$702,174.96    | \$245,761.24 | \$702,174.96               |

RECIBI DE LA TESORERIA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE ESCUINAPA, SINALOA, LA CANTIDAD DE:

\$438,254.01 SON: (CUATROCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS 01/100 M.N.

EN PAGO DE ESTIMACION 01 (Finiquito)

### DEDUCCIONES:

|                                                                 |               |
|-----------------------------------------------------------------|---------------|
| AMORTIZACION ANTICIPO 35% (*)                                   | \$ 211,863.14 |
| MAS I.V.A.                                                      | \$ 33,898.10  |
| TOTAL AMORTIZACION DE ANTICIPO                                  | \$ 245,761.24 |
| 3% ORGANO INTERNO DE CONTROL<br>MPAL Y CONGRESO DEL ESTADO: (*) | \$ 18,159.70  |
| TOTAL DE DEDUCCIONES:                                           | \$ 263,920.94 |

### CALCULO DE ESTIMACION

|                                      |                |
|--------------------------------------|----------------|
| IMPORTE DE LA OBRA EJECUTADA SIN IVA | \$ 605,323.23  |
| DEDUCCION ANTICIPO (35%):            | -\$ 211,863.14 |
| SUMA:                                | \$ 393,460.09  |
| MAS I.V.A. 16 %                      | \$ 62,953.62   |
| TOTAL:                               | \$ 456,413.71  |
| DEDUCCION SVIFC (3%):                | -\$ 18,159.70  |
| LIQUIDO A PAGAR:                     | \$ 438,254.01  |


(\*) DEL IMPORTE EJECUTADO SIN IVA

**SALDO A PAGAR: \$ 438,254.01**

REALIZÓ  
  
C. MARIA DE LA LUZ VALENZUELA PASOS  
CONTRATISTA

AUTORIZÓ  
  
M. en ARQ. GRACIELA ELIZALDE SANTOS  
DIRECTORA DE OBRAS, SERVICIOS  
PUBLICOS Y ECOLOGIA

REVISÓ  
  
ARQ. SILVIA ZAYDEE PADILLA CRESPO  
SUPERVISOR DE OBRAS PUBLICAS

AUTORIZÓ  
  
L.C.P. JOSE TRINIDAD IBARRA MARTINEZ  
TESORERO MUNICIPAL

# María de La Luz Valenzuela Pasos

## Construcción de obra civil

### PUBLICA y PRIVADA

Carretera Municipal Libre  
Concordia-El Verde, No. 3.  
Ciudad: Concordia, Sinaloa.

Rfc : VAPL570617-JS3  
Registro patronal: L51-11198-10-1  
Tel Oficina: 01-694-96-813-82

Escuinapa, Sinaloa a 11 de octubre de 2025

Recibo No. 1 (Uno)  
Bueno por: \$438,254.01

RECIBI DE TESORERIA DEL MUNICIPIO DE ESCUINAPA LA CANTIDAD DE: -----  
\$438,254.01 (CUATROCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS 01/100 M.N.).

POR CONCEPTO DE:  
PAGO CORRESPONDIENTE A LA ESTIMACION No.1 (FINIQUITO) DEL CONTRATO No.  
ESC-FAISMUN-2025-020 DE LA OBRA DE DESIGNACION:

**- CONSTRUCCION DE TECHO FIRME 4X4 M2, EN LA COMUNIDAD DE CRISTO REY, ESCUINAPA, SINALOA.**

|                            |              |                                                                     |
|----------------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------|
| Monto total Contratado =   | \$702,174.96 | (Son Setecientos Dos Mil Ciento Setenta y Cuatro Pesos 96/100 M.N.) |
| IMPORTE DE ESTIMACION:     |              | \$605,323.23                                                        |
| SUBTOTAL:                  |              | <b>\$605,323.23</b>                                                 |
| 16% IVA:                   |              | <b>\$96,851.72</b>                                                  |
| TOTAL:                     |              | <b>\$702,174.95</b>                                                 |
| DEDUCCIONES:               |              |                                                                     |
| AMORTIZACION ANTICIPO 35%: |              | <b>\$245,761.24</b>                                                 |
| CONGRESO DEL ESTADO 3%:    |              | <b>\$18,159.70</b>                                                  |
| TOTAL NETO A COBRAR:       |              | <b>\$438,254.01</b>                                                 |

ATENTAMENTE:



María de la Luz Valenzuela Pasos  
Contratista

Elaboración de : Proyectos Arquitectónicos y Licitaciones Publicas

MARIA DE LA LUZ VALENZUELA PASOS  
CARRETERA CONCORDIA - EL VERDE No.3  
CONCORDIA, SINALOA  
R.F.C.  
VAPL-570617-JS3

LM.S.S.  
L51-11198-10-1



MUNICIPIO DE ESCUINAPA, SINALOA  
DIRECCION DE OBRAS, SERVICIOS PUBLICOS  
Y ECOLOGIA

ESCUINAPA, SINALOA

HOJA: 1 de 1



## NUMEROS GENERADORES

LOCALIDAD: CRISTO REY

ESTIMACION: 01 (Finiquito)  
MUNICIPIO: ESCUINAPA

DESCRIPCION: CONSTRUCCION DE TECHO FIRME 4X4 M2. EN LA COMUNIDAD DE CRISTO REY, ESCUINAPA, SINALOA.

| CLAVE                                             | CONCEPTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | UNIDAD | LOCALIZACION |       |                                 | LARGO | ANCHO | ALTO    | RESULTADO | OBSERVACIONES |
|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------|-------|---------------------------------|-------|-------|---------|-----------|---------------|
|                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |        | EJE          | TRAMO | PZAS                            |       |       |         |           |               |
| TECHOS DE CONCRETO EN LA COMUNIDAD DE CRISTO REY. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |        |              |       |                                 |       |       |         |           |               |
| TRA                                               | Trazo de terreno, el precio incluye: material, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | M2     |              |       | 15.00                           | 4.00  | 4.00  |         | 240.00    |               |
| CIM-LS                                            | Cimbra y descimbra en losas con tarimas comun de 1.00 mts x 1.00 mts Incluye: Materiales, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | M2     |              |       | 15.00                           | 4.00  | 4.00  |         | 240.00    |               |
| ACRVR                                             | Acero de refuerzo del núm. 3, (3/8") fyp = 4200 kg/ml, en losa de techo, incluye: habilitado y armado, materiales, mano de obra, equipo, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.                                                                                                                                                                                                                                                                      | TON    |              | 15.00 | 4.00/0.20= 21 pzas(4.00)=84 ml  |       |       | 0.00056 | 0.7056    |               |
|                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |        |              | 15.00 | 4.00/0.20= 21 pzas(4.00)= 84 ml |       |       | 0.00056 | 0.7056    |               |
|                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |        |              | 15.00 | 4.00/0.20= 11 pzas(1.00)= 11 ml |       |       | 0.00056 | 0.0924    |               |
|                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |        |              |       |                                 |       |       |         | 1.50      |               |
| SM-CO                                             | Suministro y colocación de concreto simple de 10 cm de espesor, acabado común, concreto hecho en obra de f'c= 200 kg/cm2.incluye: material, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución.                                                                                                                                                                                                                                                                  | M2     |              |       | 15.00                           | 4.00  | 4.00  |         | 240.00    |               |
| SE-AL                                             | Salida de electricidad para alumbrado a base de tubo poliflex, pared delgada de 13mm, con un desarrollo de 4mts, con cable thw cal.12, condos, cajas conduit T-19, T-29 serie 9, El precio incluye: conectores pared delgada de 13mm, coples de 13mm, abrazaderas de uña, apagador y placas sencilla marca quinzifo, caja de registro de 1/2" y soque de sobre poner, incluye: material, mano de obra y todo lo necesario, para su correcta ejecución.                    | SAL    |              |       | 15.00                           |       |       |         | 15.00     |               |
| SE-AB                                             | Salida de electricidad para abanico a base de tubo poliflex, pared delgada de 13mm, con un desarrollo de 10mts, con cable thw cal.12, con dos cajas conduit T-19, T-29 serie 9, y una FS-1 de 13 mm. El precio incluye: conectores pared delgada de 13mm, coples de 13 mm, abrazaderas de uña, apagador y placa sencilla marca quinzifo, caja de registro de 1/2" y soque de sobre poner, incluye: material, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución. | SAL    |              |       | 15.00                           |       |       |         | 15.00     |               |
| PRET                                              | Pretil block de concreto 9x14x28 con mortero cemento 1:5 14cm, de espesor acabado común, incluye: acarreo 1a, estacion a 20.00m, incluye: material, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución.                                                                                                                                                                                                                                                          | ML     |              |       | 15.00                           | 16.00 |       |         | 240.00    |               |
| CHAF                                              | Challan de 10 x 10 asentado con mezcla cemento arena de proporción 1:5, incluye: material, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ML     |              |       | 15.00                           | 16.00 |       |         | 240.00    |               |
| LIMP-F                                            | Limpieza final de la obra, incluye: material, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | M2     |              |       | 15.00                           | 4.00  | 4.00  |         | 240.00    |               |

ELABORÓ  
  
C. MARIA DE LA LUZ VALENZUELA PASOS  
CONTRATISTA

AUTORIZÓ  
  
ARQ. SILVIA ZAYDEE PADILLA CRESPO  
SUPERVISOR DE OBRAS PUBLICAS

MARIA DE LA LUZ VALENZUELA PASOS  
CARRETERA CONCORDIA - EL VERDE No.3  
CONCORDIA, SINALOA  
R.F.C.  
VAPL-670617-JS3

I.M.S.S.  
L51-11198-10-1



MUNICIPIO DE ESCUINAPA, SINALOA  
DIRECCION DE OBRAS, SERVICIOS PUBLICOS  
Y ECOLOGIA  
ESCUINAPA, SINALOA

HOJA: 1 de 3




## CROQUIS

LOCALIDAD: CRISTO REY

ESTIMACION: 01 (Finiquito)  
MUNICIPIO: ESCUINAPA

DESCRIPCION: CONSTRUCCION DE TECHO FIRME 4X4 M2, EN LA COMUNIDAD DE CRISTO REY, ESCUINAPA, SINALOA.

### ALZADO PRINCIPAL TECHO FIRME TIPO

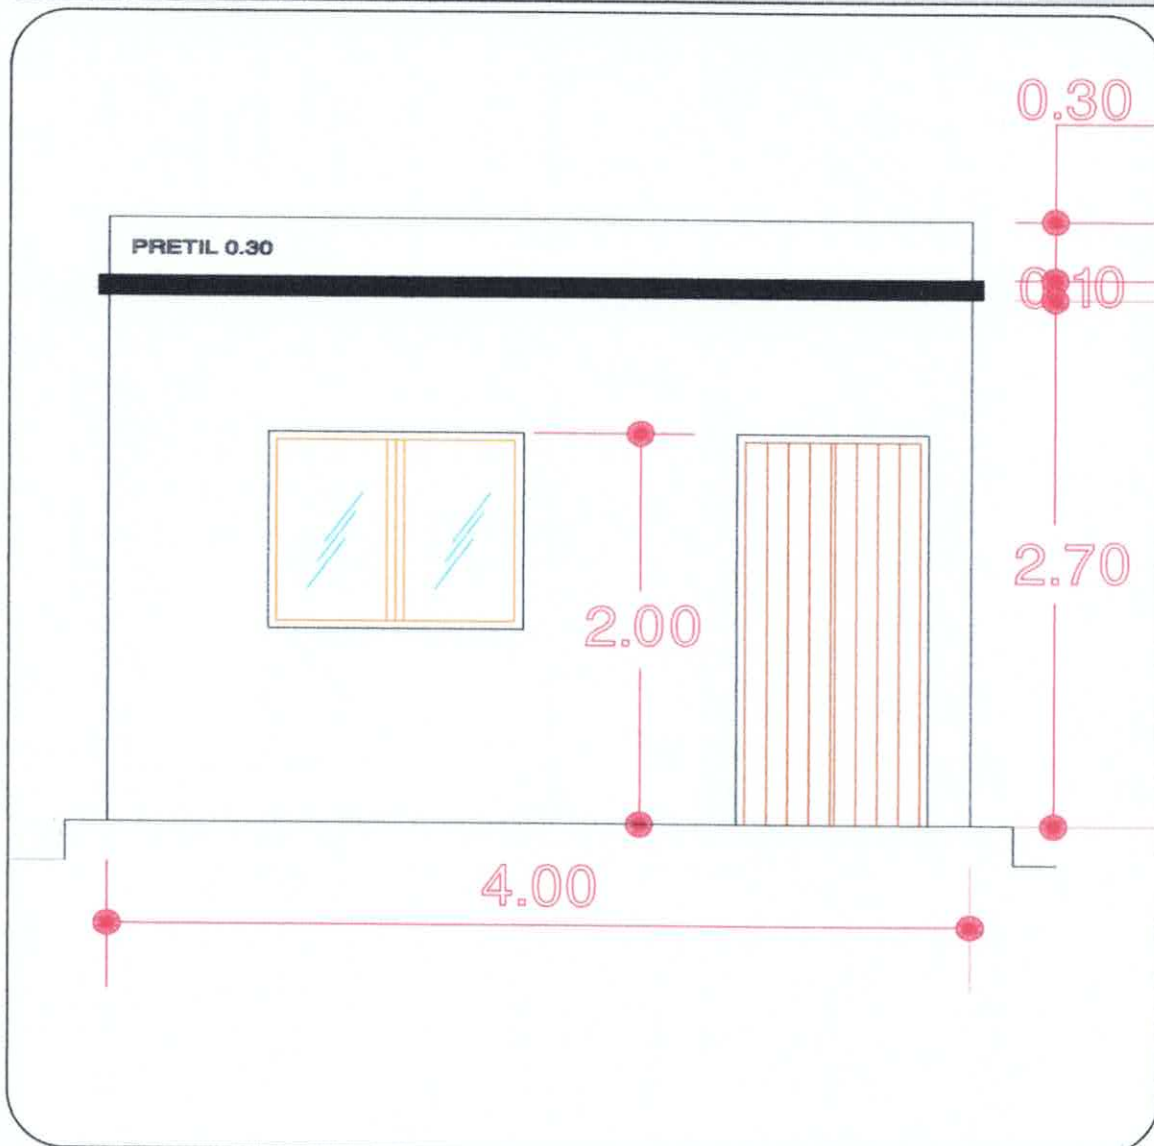

ELABORO  
  
C. MARIA DE LA LUZ VALENZUELA PASOS  
CONTRATISTA

AUTORIZO  
  
ARQ. SILVIA ZAYDEE PADILLA CRESPO  
SUPERVISOR DE OBRAS PUBLICAS

MARIA DE LA LUZ VALENZUELA PASOS  
CARRETERA CONCORDIA - EL VERDE No.3  
CONCORDIA, SINALOA  
R.F.C.  
VAPL-570617-JS3

I.M.S.S.  
L51-11198-10-1



MUNICIPIO DE ESCUINAPA, SINALOA  
DIRECCION DE OBRAS, SERVICIOS PUBLICOS  
Y ECOLOGIA  
ESCUINAPA, SINALOA

HOJA: 2 de 3




### CROQUIS

LOCALIDAD: CRISTO REY

ESTIMACION: 01 (Finiquito)  
MUNICIPIO: ESCUINAPA

DESCRIPCION: CONSTRUCCION DE TECHO FIRME 4X4 M2, EN LA COMUNIDAD DE CRISTO REY, ESCUINAPA, SINALOA.

### DETALLE DE LOSA DE TECHO FIRME TIPO

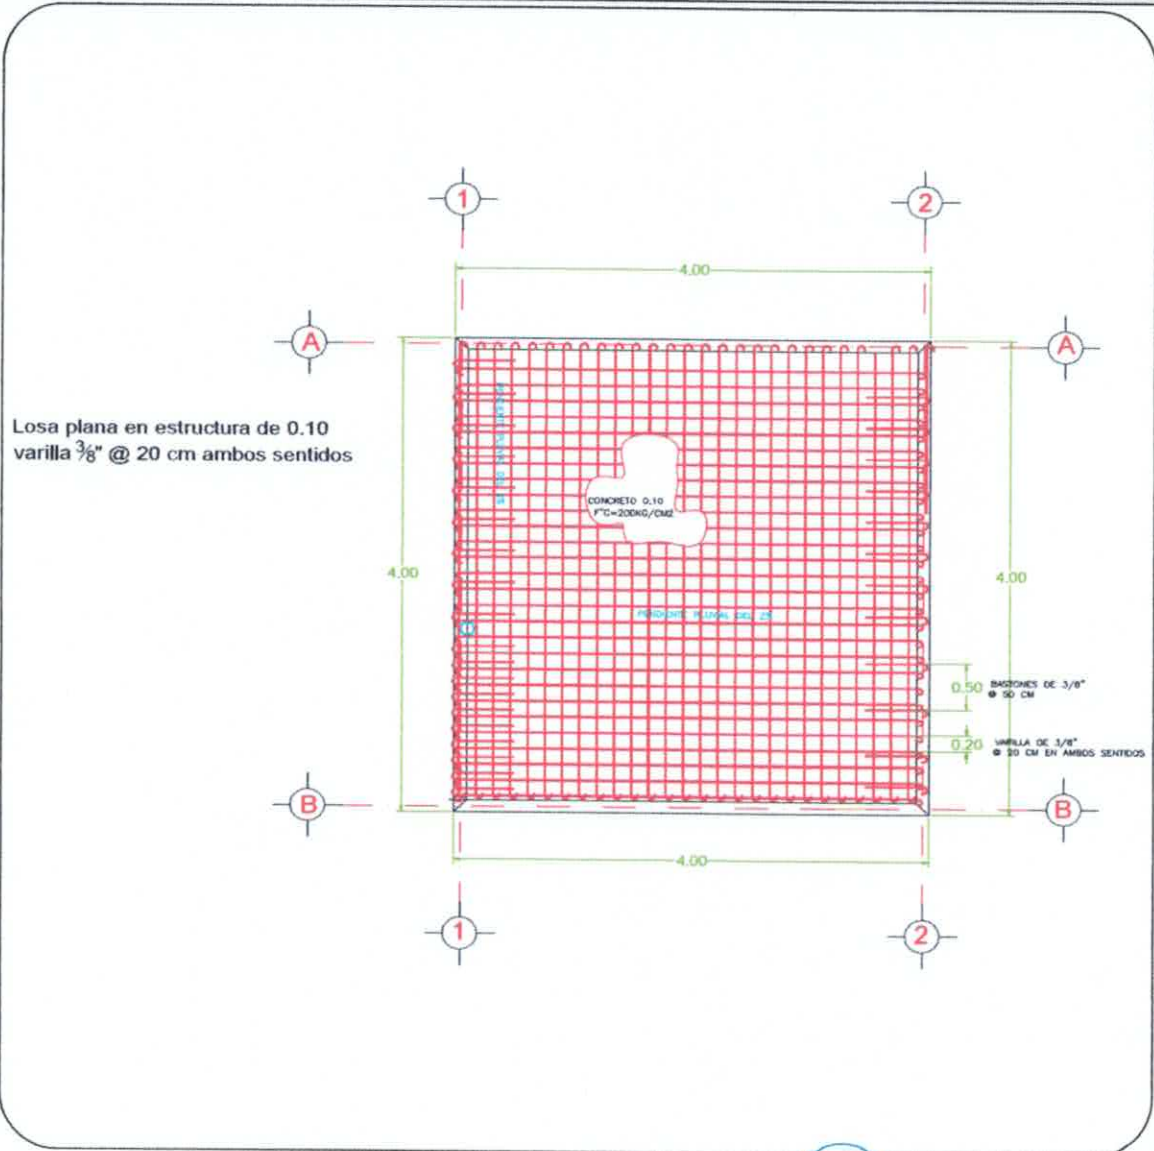

ELABORÓ

C. MARIA DE LA LUZ VALENZUELA PASOS  
CONTRATISTA

AUTORIZO

ARQ. SILVIA ZAYDEE PADILLA CRESPO  
SUPERVISOR DE OBRAS PUBLICAS

MARIA DE LA LUZ VALENZUELA PASOS  
CARRETERA CONCORDIA - EL VERDE No.3  
CONCORDIA, SINALOA  
R.F.C.  
VAPL-570617-JS3

I.M.S.S.  
L51-11198-10-1



MUNICIPIO DE ESCUINAPA, SINALOA  
DIRECCION DE OBRAS, SERVICIOS PUBLICOS  
Y ECOLOGIA  
ESCUINAPA, SINALOA


HOJA: 3 de 3



## CROQUIS

LOCALIDAD: CRISTO REY  
ESTIMACION: 01 (Finiquito)  
MUNICIPIO: ESCUINAPA  
DESCRIPCION: CONSTRUCCION DE TECHO FIRME 4X4 M2, EN LA COMUNIDAD DE CRISTO REY, ESCUINAPA, SINALOA.

| CLAVE | (Descripcion del Concepto) |
|-------|----------------------------|
|       | PLANTA DE LOAS DE AZOTEA   |

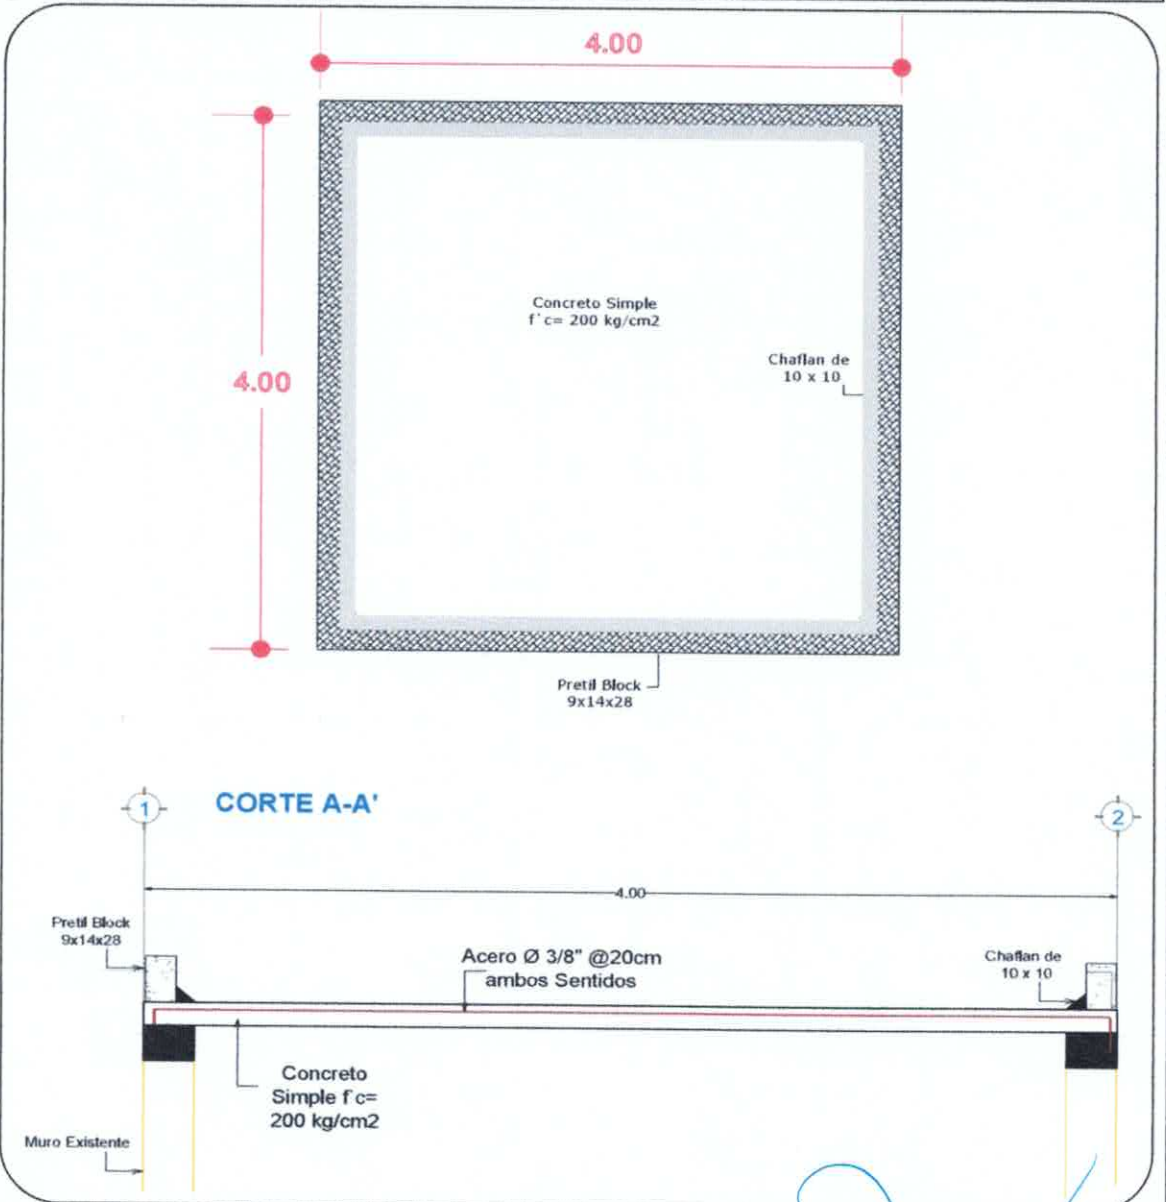

ELABORÓ  
  
C. MARIA DE LA LUZ VALENZUELA PASOS  
CONTRATISTA

AUTORIZA  
  
ARQ. SILVIA ZAYDEE PADILLA CRESPO  
SUPERVISOR DE OBRAS PUBLICAS

MARIA DE LA LUZ VALENZUELA PASOS  
CARRETERA CONCORDIA - EL VERDE No.3  
CONCORDIA, SINALOA  
R.F.C.  
VAPL-570617-JS3

I.M.S.S.  
L51-11198-10-1



MUNICIPIO DE ESCUINAPA, SINALOA  
DIRECCION DE OBRAS, SERVICIOS PUBLICOS  
Y ECOLOGIA  
ESCUINAPA, SINALOA

HOJA: 1 de 5



### FOTOGRAFIAS

LOCALIDAD: CRISTO REY  
ESTIMACION: 01 (Finiquito)  
MUNICIPIO: ESCUINAPA  
DESCRIPCION: CONSTRUCCION DE TECHO FIRME 4X4 M2, EN LA COMUNIDAD DE CRISTO REY, ESCUINAPA, SINALOA.

| CLAVE | (Descripción del Concepto)                                                                                                                                                                           |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ACRVR | Acero de refuerzo del núm. 3, (3/8") fyp = 4200 kg/ml, en losa de techo, incluye: habilitado y armado, materiales, mano de obra, equipo, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución. |



| CLAVE | (Descripción del Concepto)                                                                                                                                                                           |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ACRVR | Acero de refuerzo del núm. 3, (3/8") fyp = 4200 kg/ml, en losa de techo, incluye: habilitado y armado, materiales, mano de obra, equipo, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución. |



ELABORÓ  
  
ING. AARON MORAN HIDALGO  
SUPERINTENDENTE DE OBRA

AUTORIZÓ  
  
ARQ. SILVIA ZAYDE PADILLA CRESPO  
SUPERVISOR DE OBRAS PUBLICAS

MARIA DE LA LUZ VALENZUELA PASOS  
CARRETERA CONCORDIA - EL VERDE No.3  
CONCORDIA, SINALOA  
R.F.C.  
VAPL-570617-JS3

I.M.S.S.  
L51-11198-10-1



MUNICIPIO DE ESCUINAPA, SINALOA  
DIRECCION DE OBRAS, SERVICIOS PUBLICOS  
Y ECOLOGIA  
ESCUINAPA, SINALOA

HOJA: 2 de 5



### FOTOGRAFIAS

LOCALIDAD: CRISTO REY  
ESTIMACION: 01 (Finiquito)  
MUNICIPIO: ESCUINAPA  
DESCRIPCION: CONSTRUCCION DE TECHO FIRME 4X4 M2, EN LA COMUNIDAD DE CRISTO REY, ESCUINAPA, SINALOA.

| CLAVE | (Descripción del Concepto)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| SE-AL | Salida de electricidad para alumbrado a base de tubo poliflex pared delgada de 13mm., con un desarrollo de 4mts, con cable thw cal.12, condos, cajas conduit T-19, T-29 serie 9; El precio incluye: conectores pared delgada de 13mm, coples de 13mm, abrazaderas de uña, apagador y placas sencilla marca quinzño, caja de registro de 1/2" y soque de sobre poner. incluye: material, mano de obra y todo lo necesario, para su correcta ejecución. |



| CLAVE | (Descripción del Concepto)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| SE-AB | Salida de electricidad para abanico a base de tubo poliflex pared delgada de 13mm., con un desarrollo de 10mts, con cable thw cal.12, con dos cajas conduit T-19, T-29 serie 9, y una FS-1 de 13 mm; El precio incluye: conectores pared delgada de 13mm, coples de 13 mm, abrazaderas de uña, apagador y placa sencilla marca quinzño, caja de registro de 1/2" y soque de sobre poner. incluye: material, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución. |



ELABORÓ  
  
ING. AARON MORAN HIDALGO  
SUPERINTENDENTE DE OBRA

AUTORIZÓ  
  
ARQ. SILVIA ZAYDEE PADILLA CRESPO  
SUPERVISOR DE OBRAS PUBLICAS

MARIA DE LA LUZ VALENZUELA PASOS  
CARRETERA CONCORDIA - EL VERDE No.3  
CONCORDIA, SINALOA  
R.F.C.  
VAPL-570617-JS3

I.M.S.S.  
L51-11198-10-1



MUNICIPIO DE ESCUINAPA, SINALOA  
DIRECCION DE OBRAS, SERVICIOS PUBLICOS  
Y ECOLOGIA  
ESCUINAPA, SINALOA

HOJA: 3 de 5



### FOTOGRAFIAS

LOCALIDAD: CRISTO REY

ESTIMACION: 01 (Finiquito)  
MUNICIPIO: ESCUINAPA

DESCRIPCION: CONSTRUCCION DE TECHO FIRME 4X4 M2, EN LA COMUNIDAD DE CRISTO REY, ESCUINAPA, SINALOA.

| CLAVE | (Descripcion del Concepto)                                                                                                                                                                                             |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| SM-CO | Suministro y colocación de concreto simple de 10 cm de espesor, acabado común, concreto hecho en obra de $f'c = 200 \text{ kg/cm}^2$ , incluye: material, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución. |



| CLAVE | (Descripcion del Concepto)                                                                                                                                                                                             |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| SM-CO | Suministro y colocación de concreto simple de 10 cm de espesor, acabado común, concreto hecho en obra de $f'c = 200 \text{ kg/cm}^2$ , incluye: material, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución. |



ELABORÓ

ING. AARON MORAN HIDALGO  
SUPERINTENDENTE DE OBRA

AUTORIZA

ARQ. SILVIA ZAYDEE PADILLA CRESPO  
SUPERVISOR DE OBRAS PUBLICAS

MARIA DE LA LUZ VALENZUELA PASOS  
CARRETERA CONCORDIA - EL VERDE No.3  
CONCORDIA, SINALOA  
R.F.C.  
VAPL-570617-JS3

I.M.S.S.  
L51-11198-10-1



MUNICIPIO DE ESCUINAPA, SINALOA  
DIRECCION DE OBRAS, SERVICIOS PUBLICOS  
Y ECOLOGIA  
ESCUINAPA, SINALOA

HOJA: 4 de 5



### FOTOGRAFIAS

LOCALIDAD: CRISTO REY  
ESTIMACION: 01 (Finiquito)  
MUNICIPIO: ESCUINAPA  
DESCRIPCION: CONSTRUCCION DE TECHO FIRME 4X4 M2, EN LA COMUNIDAD DE CRISTO REY, ESCUINAPA, SINALOA.

| CLAVE | (Descripcion del Concepto)                                                                                                                                                                                       |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| PRET  | Pretil block de concreto 8x14x28 con mortero cem-are 1:5 14cm. de espesor acabado comun, incluye: acarreo 1a. estacion a 20.00m, incluye: material, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución. |



| CLAVE | (Descripcion del Concepto)                                                                                                                                                                                       |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| PRET  | Pretil block de concreto 9x14x28 con mortero cem-are 1:5 14cm. de espesor acabado comun, incluye: acarreo 1a. estacion a 20.00m, incluye: material, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución. |



ELABORÓ

C. MARIA DE LA LUZ VALENZUELA PASOS  
CONTRATISTA

AUTORIZA

ARQ. SILVIA ZAYDEE PADILLA CRESPO  
SUPERVISOR DE OBRAS PUBLICAS

MARIA DE LA LUZ VALENZUELA PASOS  
CARRETERA CONCORDIA - EL VERDE No.3  
CONCORDIA, SINALOA  
R.F.C.  
VAPL-570617-JS3

I.M.S.S.  
L51-11198-10-1



HOJA: 5 de 5  
MUNICIPIO DE ESCUINAPA, SINALOA  
DIRECCION DE OBRAS, SERVICIOS PUBLICOS  
Y ECOLOGIA  
ESCUINAPA, SINALOA



### FOTOGRAFIAS

LOCALIDAD: CRISTO REY  
ESTIMACION: 01 (Finiquito)  
MUNICIPIO: ESCUINAPA  
DESCRIPCION: CONSTRUCCION DE TECHO FIRME 4X4 M2, EN LA COMUNIDAD DE CRISTO REY, ESCUINAPA, SINALOA.

| CLAVE | (Descripción del Concepto)                                                                                                                              |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CHAF  | Chaffan de 10 x 10 asentado con mezcla cemento arena de proporción 1:5, incluye: material, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución. |



| CLAVE | (Descripción del Concepto)                                                                                                                              |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CHAF  | Chaffan de 10 x 10 asentado con mezcla cemento arena de proporción 1:5, incluye: material, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución. |



ELABORÓ

ING. AARON MORAN HIDALGO  
SUPERINTENDENTE DE OBRA

AUTORIZÓ

ARQ. SILVIA ZAYDEE PADILLA CRESPO  
SUPERVISOR DE OBRAS PUBLICAS
