CONT. Nº- OPPU-EST-LP-FISE-3010A-2025

BITACORA DE OBRA FECHA 07/11/2025 1

CON ESTA FECHA SE ABRE ESTA BITACORA DE OBRA PARA DAR DE ALTA EL CONTRATO Nº OPPU-EST-LP-FISE-ELEC-3010A-2025 DE OBRA PÚBLICA A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO, QUE CELEBRAN POR UNA PARTE EL GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA A TRAVÉS DE LA SECRETARÍA DE OBRAS PUBLICAS, REPRESENTADA POR SU TITULAR C. RAUL FRANCISCO MONTERO ZAMUDIO, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ "LA SECRETARÍA", Y POR LA OTRA LA PERSONA MORAL DENOMINADA "CONSTRUCTORA MASLA, S.A. DE C.V." POR CONDUCTO DE SU REPRESENTANTE LEGAL C. MARCO ANTONIO ARAGON TIZNADO A QUIEN EN LO SUBSIGUIENTE SE LE DENOMINARÁ "LA CONTRATISTA" ESTE CONTRATO AMPARA LA OBRA "INTRODUCCIÓN DE RED ELECTRICA SUBTERRANEA PARA CARCAMO DE BOMBEO EN EL MUNICIPIO DE JUAN JOSE RIOS, ESTADO DE SINALOA", POR UN MONTO TOTAL DE $ 2'954,436.98; SON: DOS MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS 98/100 M.N. CON EL PERIODO DE EJECUCION DEL 07 DEL MES DE NOVIEMBRE AL 26 DE DICIEMBRE DE 2025 Y CON ESTA FECHA TAMBIEN LA CONTRATISTA PRESENTA A ESTA SUPERVISION EL OFICIO DE INICIO DE OBRA CON ESTA FECHA Y EL OFICIO DE ASIGNACION DE SUPERINTENDENTE, QUE SERA EL C. INGENIERO ERNESTO MARTINEZ BUSTILLOS, CON CEDULA PROFESIONAL Nº 14228075 *CORRECCION: LOS APELLIDO SON BUSTILLOS MARTINEZ, Y SERA QUIEN AL IGUAL QUE ESTA SUPERVISION TENDREMOS LA CONSIGNA DE LLEVAR A CABO TODAS LAS ANOTACIONES CORRESPONDIENTES DURANTE LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, ASI COMO CAMBIOS, SOLICITUDES Y AUTORIZACIONES EN ESTE LIBRO DE OBRA Y FIRMAN:

POR EL GOBIERNO DEL ESTADO "SECRETARÍA"

ING. ARQ. JOSE ROSARIO VALENZUELA A.
SUPERVISOR SOP

POR LA CONTRATISTA

ING. ERNESTO BUSTILLOS MARTINEZ
SUPERINTENDENTE

CONT. Nº-OPPU-EST-LP-FISE-ELEC-3010A-2025

BITACORA DE OBRA FECHA 07/11/2025 2

NOTA Nº-(1) CON ESTA FECHA TAMBIEN SE LLEVA A CABO EL RECORRIDO POR EL TRAMO DONDE SE VA A LLEVA A CABO LOS TRABAJOS DE ESTA OBRA, CON LA CONTRATISTA EL ING. ERNESTO BUSTILLOS MARTINEZ, POR EL MUNICIPIO DE JUAN JOSÉ RIOS LA ARQ. GABRIELA CERVANTES CASTRO COMO DIRECTORA GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS Y POR LA SECRETARIA ESTE SUPERVISOR ING. ARQ. JOSE ROSARIO VALENZUELA ARAUJO, CON ESTO SE LE HACE ENTREGA DEL INMUEBLE A LA CONTRATISTA Y SE INICIA HOY MISMO CON LOS TRABAJOS DE RETIRO DE LA LINEA ELECTRICA AEREA EXISTENTE Y QUE SERA RETIRADA A PETICION DE C.F.E. YA QUE LA SOLICITAN SUBTERRANEA Y POR FUERA DE LOS CORRALES Y CHIQUEROS EXISTENTES

POR LA SECRETARÍA

ING. ARQ. JOSE ROSARIO VALENZUELA A.
SUPERVISOR SOP

POR LA CONTRATISTA

ING. ERNESTO BUSTILLOS MARTINEZ

18/11/2025

NOTA Nº-(2) HOY SE LLEVA A CABO LA VISITA A ESTA OBRA DONDE SE PUEDE VER COMO SE TIENE RETIRADA TODA LA LINEA ELECTRICA AEREA Y SE ANDA TRABAJANDO EN EL RETIRO DE POSTES DE CONCRETO, FALTANDO 3 PIEZAS QUE ESTAN DENTRO DE LOS CORRALES O COMO POSTES DE LLEGADA DE LINEA ELECTRICA DEL OTRO LADO DEL DREN HACIA LOS CORRALES, TODO LO QUE SE HA RETIRADO (CABLE DE ALUMINIO, HERRAJES Y POSTES SE HA RESGUARDADO DENTRO DEL AREA BARDEADA DEL CORRALON, TAMBIEN SE ANDA TRAZANDO CON CAL PARA INICIAR CON LA EXCAVACION CON RETRO EXCAVADORA PARA LA INTRODUCCION DE MANGUERAS Y REGISTROS PREFABRICADOS.


POR LA SECRETARÍA

POR LA CONTRATISTA

CONT. Nº-OPU-EST-LP-FISE-ELEC-3010A-2025

BITACORA DE OBRA FECHA 25/11/2025 3

NOTA Nº③ DURANTE ESTA VISITA A LA OBRA SE APRECIA COMO YA SE VIENE EXCAVANDO Y COLOCANDO LAS MANGUERAS PARA LA CONDUCCIÓN DE LAS LINEAS ELECTRICAS SUBTERRANEAS, 3 MANGUERAS CORRUGADAS DE COLOR NARANJA Y 2 DE 2" CON LAS MISMAS CARACTERISTICAS DE LAS PRIMERAS 3 DE 3"Ø DE DIAMETRO, TAMBIEN SE TIENEN SUMINISTRADOS REGISTROS PREFABRICADOS DE CONCRETO D 1.50 X 1.50 X 1.50 MTS AUTORIZADOS POR COMISION FEDERAL, YA SE VIENE COLOCANDO LAS MANGUERAS TAMBIEN SE VIENE RELLENANDO CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION

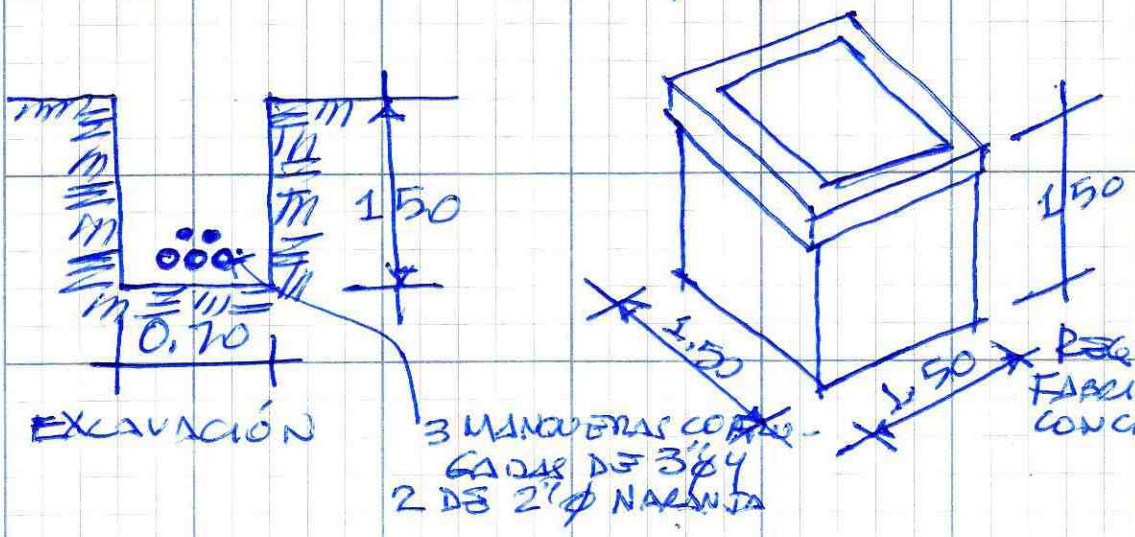

POR LA SECRETARIA

ING. JOSE ROSALIO VALENZUELA A

POR LA CONTRATISTA

ING. ERNESTO BUSTILLOS MARTINEZ

02/12/2025

NOTA Nº④ AL LLEVA A CABO LA VISITA A LA OBRA ESTA SUPERVISION PUEDE OBSERVAR COMO SE CONTINUA CON LOS TRABAJOS DE EXCAVACION, COLOCACION DE LAS MANGUERAS Y TAMBIEN YA SE ANDAN COLOCANDO LOS REGISTROS PREFABRICADOS CON GRUA (JIAP), NIVELANDO Y ALINEANDOSE

POR LA SECRETARÍA

POR LA CONTRATISTA

CONT. Nº OPPU-EST-LP-FISE-ELEC-3910A-2025

BITACORA DE OBRA FECHA 08/12/2025 4

NOTA Nº (5) HOY SE LLEVA A CABO OTRA VISITA A ESTA OBRA DONDE SE APRECIA COMO YA SE TIENE CASI TODOS LOS REGISTROS PREFABRICADOS COLOCADOS A UNA DISTANCIA APROXIMADA ENTRE 65 y 70 MTS UNO DEL OTRO.
LA SEMANA PASADA LA CONTRATISTA SOLICITO A ESTA SUPERVISION SE CONSIDERARAN 3 CONCEPTOS EXTRAORDINARIOS QUE SON COMO Nº 1.- EL CAMBIO DEL CABLE, A SOLICITUD DE COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD YA QUE EL QUE SE TIENE EN PRESUPUESTO NO CUMPLE CON LA CAPACIDAD NECESARIA, EL Nº 2.- ES SUMINISTRO Y COLOCACION DE UN TUBO DE 8" DE PVC PARA SALIDA DE AGUA DE CANAL DE DESAGUE AL DREN Y EL Nº 3.- QUE LA HECHURA DE 3 M² DE BANQUETA PARA EL DREN DONDE SE COLOCARA EL TUBO DE DESAGÜE

POR LA SECRETARÍA

ING. JOSÉ ROSARIO VALENZUELA

POR LA CONTRATISTA

ING. ERNESTO BUSTILLOS MARTINEZ

NOTA Nº (6) CON ESTA MISMA FECHA LA CONTRATISTA PRESENTA A ESTA SUPERVISION LA ESTIMACION Nº (1) NORMAL POR UN IMPORTE LIQUIDO A PAGAR DE $579,578.88, SON: QUINIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS 88/100 M.N. YA CON EL 16% DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (IVA) APLICADO Y CON TODOS LOS DESCUENTOS CORRESPONDIENTES YA APLICADOS, DESPUES DE REVISARSE Y CHECAR QUE ESTA BIEN, SE FIRMA PARA SU PAGO

POR LA SECRETARIA

POR LA CONTRATISTA

NOTA Nº (7) DURANTE ~~ESTA~~ VISITA A LA OBRA SE APRECIA COMO SE ESTÁ TRABAJANDO EN LA HECHURA DE TRINCHERA PARA LA COLOCACION DE CABLEADO Y TAMBIEN EN EL SUMINISTRO Y COLOCACION DE GABINETE PARA OSEVADORES, DE ACERO AL CARBÓN DE 2.59X0.76X0.59 MTS; EN LA COLOCACION DEL SISTEMA DE TIERRA PARA OSERVADORES Y TAMBIEN EN LA COLOCACION DE LA TRANSICIÓN AEREA SUBTERRANEA A 33 KVA; INCLUYE TUBERÍA GALVANIZADA DE 4", 1 BOTA TERMOCONTRACTIL, FLEJE, HEBILLA, RIEL UNICANAL, CODOS, TERMINAL DE POTENCIA CAL 1/0 A 33 KVA, ZAPATA 1/0 Y CABLE CAL 4, SUMINISTRO y COLOCACIÓN DE BANCO DE DUCTOS P1 B4", SUMINISTRO y COLOCACIÓN DE CABLE DE COBRE DESNUDO DE 1/0, SUMINISTRO y COLOCACIÓN DE CABLE DE POTENCIA CAL 3/0 AWG XLP 15 KV ALUMINIO, SUMINISTRO y COLOCACIÓN DE ZAPATA BIMETALICA DOBLE BARRENO DE 1/2 CAL. 1/0 AWG CAÑON LARGO, TODOS INCLUYEN: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA y EQUIPO TAMBIEN SE SUMINISTRÓ Y SE INSTALÓ EMPALME CONTRACTIL EN FRIO MEDIA TENSIÓN PARA 34.5 KV.

POR LA SECRETARÍA: POR LA CONTRATISTA:

ING. ARQ. JOSÉ ROGELIO VALENZUELA ARROYO ING. ERNESTO BUSTILLOS MARTINEZ

15/DICIEMBRE/2025

NOTA Nº (8) CON ESTA FECHA LA CONTRATISTA A ESTA SUPERVISION, LA ESTIMACION Nº (2) NORMAL POR UN IMPORTE LIQUIDO A PAGAR POR $1'023,256.58/, SON: UN MILLON VEINTITRES MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS 58/100 M.N., YA CON EL 16% DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO INCLUIDO Y CON TODOS LOS DESCUENTOS CORRESPONDIENTES APLICADOS, SE REVISA Y SE FIRMA PARA MOSTRAR A COBRO

CONT. Nº-OPPV-EST-LP-FISE-ELEC-3010A-2025

BITACORA DE OBRA FECHA 19/12/2025 6

NOTA Nº (9) HOY SE LLEVA A CABO LA VISITA A ESTA OBRA DONDE SE PUEDE VER COMO SE ESTÁ TRABAJANDO EN LA COLOCACION (INTRODUCCION) DEL CABLEADO CON CABLE DE POTENCIA CAL 1/0 AWG XLP 33 KV ALUMINIO QUE SE CAMBIO POR EL QUE TRAIA EL PRESUPUESTO ORIGINAL QUE ERA 3/0 DE 15 KV, POR LO QUE SE HIZO LA SOLICITUD DEL CAMBIO, TAMBIEN SE TRABAJA EN LA COLOCACION DE HERRAJES TANTO EN EL POSTE QUE ESTA AFUERA DEL COBACH PARA BAJAR AL 1er REGISTRO DE LA LINEA SUBTERRANEA, COMO A LA LLEGADA AL TABLERO DE MEDICION AFUERA DEL CARCAMO

POR LA SECRETARIA

POR LA CONTRATISTA

ING. ARQ. JOSÉ ROBERTO VALENZUELA A.
SUPERVISOR SOP

ING. ERNESTO BUSTILLOS MARTINEZ
SUPERINTENDENTE

26/12/2025

NOTA Nº (10) CON ESTA FECHA LA CONTRATISTA PRESENTA A ESTA SUPERVISIÓN LA ESTIMACION Nº (3) EXTRAORDINARIA DONDE SE COBRA EL CABLE DE POTENCIA CAL 1/0 AWG XLP 33 KV ALUMINIO QUE SE AUTORIZO EN SUSTITUCION DEL CABLE DE POTENCIA CAL 3/0 AWG XLP 15 KV ALUMINIO, QUE SE DEDUJO YA QUE EN LA ESTIMACION Nº- SE HABIA COBRADO CON EL PRECIO QUE TRAIA EN EL PRESUPUESTO, SE LLEVO A CABO LA DEDUCTIVA Y NOS QUEDO PARA ESTIMAR EN ESTA ESTIMACION UN MONTO LIQUIDO A PAGAR POR $197,700.65 ; SON: CIENTO NOVENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS DOS 65/100 M.N., YA CON EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (IVA) 16% YA INCLUIDO Y CON TODOS LOS DESCUENTOS CORRESPONDIENTES APLICADOS

CONT. Nº OPPU-EST-LP-FISE-ELEC-3010A-2025

BITACORA DE OBRA FECHA 29/12/2025 7

NOTA Nº (11) CON ~~ESTA FECHA~~ SE VISITA LA OBRA OBSERVANDO COMO SE ENCUENTRA TERMINADA CON LOS GABINETES YA INSTALADOS Y EL CABLEADO Y A HASTA LAS CUCHILLAS, CON ESTO SOLO QUEDA PENDIENTE LA CONEXIÓN POR PARTE DE COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, TAMBIEN ESTE DIA LA CONTRATISTA PRESENTA A ESTA SUPERVISION LA ESTIMACION Nº (4) NORMAL POR EL PAGO DE LA VERIFICACION HECHO A C.F.E. POR UN MONTO NETO LIQUIDO A PAGAR DE $ 40,858.38 · SON: CUARENTA MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS 38/100 M.N., CON EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (IVA) 16% Y CON TODOS LOS DESCUENTOS CORRESPONDIENTES APLICADOS

POR LA SECRETARIA

ING. ARQ. JOSÉ ROSARIO VALENZUELA A.

POR LA CONTRATISTA

ING. ERNESTO BUSTILLOS MARTINEZ

CONT. Nº OPPU-EST-LP-FISE-ELEC-3010A-2025

BITACORA DE OBRA FECHA 31 /12 /2025

NOTA Nº (12) CON ESTA FECHA LA CONTRATISTA PRESENTA A ESTA SUPERVISION LA ESTIMACIÓN Nº (5) EXTRAORDINARIA FINIQUITO POR UN MONTO LIQUIDO A PAGAR POR $322,362.06; SON: TRESCIENTOS VEINTIDOS MIL TRESCIENTOS SESENTA Y DOS PESOS CON 06/100 M.N., CON EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO 16% (IVA) INCLUIDO Y CON TODOS LOS DESCUENTOS CORRESPONDIENTES APLICADOS, TODO ESTO AMPARADO CON UN CONVENIO DE INCREMENTO DE MONTO (MODIFICATORIO, EN TRAMITE, POR UN MONTO TOTAL DE $328,270.68; SON: TRESCIENTOS VEINTIOCHO MIL DOSCIENTOS SETENTA PESOS 68/100 M.N., DANDO POR TERMINADA CON ESTOS DATOS ESTA OBRA AL 100%, QUEDANDO EN ESPERA LA CONEXION POR PARTE DE C.F.E.

EL DIA 07 DE ENERO SE ENTREGARÁ LA OBRA Y SE FINIQUITARA EL 15 DE ENERO.

POR LA SECRETARÍA

ING. ADO. JOSÉ ROSARIO VALENZUELA A.

POR LA CONTRATISTA

ING. ERNESTO BUSTILLOS MARTINEZ
