Badiraguato
GENERANDO BUENOS RESULTADOS

OFICIO No. OPDUyE/622/2025
ASUNTO: SOLICITUD PAGO
ESTIMACIÓN 01 NORMAL UNICA
Badiraguato, Sin., a 01 de Diciembre de 2025

MTRO. GONZALO IRINEO CABALLERO TERRAZAS
TESORERO MUNICIPAL
P R E S E N T E.-

POR MEDIO DE LA PRESENTE, LE SOLICITO EL PAGO POR: CONCEPTO DE PAGO DE ESTIMACIÓN 01 NORMAL ÚNICA, DEL IMPORTE DEL CONTRATO, A FAVOR DE LA EMPRESA: SEIS-ONCE CONSTRUCTORA S. DE R.L. DE C.V., LA CUAL REALIZA LOS TRABAJOS APROBADOS POR EL CABILDO MUNICIPAL, CON EL ACTA DE CABILDO NÚMERO: 17 (DIECISIETE) CON FECHA DE 14 DE JUNIO DE 2025, A CONTINUACIÓN, SE DETALLA:

- NOMBRE DE LA OBRA: INSTALACIONES DIVERSAS PARA LA ARENA BADIRAGUATO, INCLUYE: SISTEMA ANTITERMITA, RED DE AGUA POTABLE, RED DE SISTEMA DE DRENAJE Y ALUMBRADO PÚBLICO, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE BADIRAGUATO, SINALOA.
- No. DE CONTRATO: MBGBR-AD-GC-005/2025
- IMPORTE DEL CONTRATO: $762,070.42 (SETECIENTOS SESENTA Y DOS MIL SETENTA PESOS 42/100 M.N)
- CONCEPTO DEL PAGO: PAGO DE ESTIMACIÓN 01 NORMAL ÚNICA
- IMPORTE A PAGAR: $475,637.05 (CUATROCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS 05/100 M.N)
- RECURSOS: FONDO DEL GASTO CORRIENTE MUNICIPAL, EJERCICIO 2025
- EMPRESA: SEIS-ONCE CONSTRUCTORA S. DE R.L. DE C.V.
- R.F.C. SCO-230519-155
- DOMICILIO FISCAL: CALLE NORTE 2 #2167, COLONIA PRADERAS DE VILLAS, LOS MOCHIS, AHOME, SINALOA, C.P. 81293
- No. DE FACTURA: # BDA4, DE FECHA 01 DE DICIEMBRE DE 2025

SE ANEXA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DE SOPORTE, COMO AMPARO DE DICHO PAGO.

AGRADECIENDO DE ANTEMANO LA ATENCIÓN QUE SE SIRVA DAR A LA PRESENTE, ME DESPIDO QUEDANDO A SUS ÓRDENES.

A T E N T A M E N T E

C. ING. RUBIEL RINCÓN RAMOS
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS,
DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS,
DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA.
BADIRAGUATO, SINALOA.

C.C.P. ARCHIVO.

MUNICIPIO DE BADIRAGUATO
TESORERÍA
Marlen Pz.
01 DIC 2025
05:24 PM
RECIBIDO

SEIS-ONCE CONSTRUCTORA
SCO230519155
NORTE 2 No. 2167 No. Int S/N ,
Los Mochis C.P. 81271Ahome
Sinaloa México
Régimen Fiscal: 626 - Régimen Simplificado de Confianza

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

FOLIO: 152

FECHA: 1/12/2025 14:48:13

CLIENTE:	MUNICIPIO DE BADIRAGUATO	**R.F.C.:**	MBA850101214
DOMICILIO:	Gabriel Leyva Solano No. SN **COLONIA:** Badiraguato **Uso CFDI:** I01 - Construcciones.		
CIUDAD:	, Badiraguato, Sinaloa, México **C.P.** 80500		
REGIMEN FISCAL:	603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos		

CANTIDAD	Unidad Clave SAT	Clave sat Descripción	Valor Unitario Impuesto	Importe
1.00	SERVICIO E48	81101500-SERVICIOS ESTIMACION 01 (NORMAL) UNICA OBRA: INSTALACIONES DIVERSAS PARA LA ARENA BADIRAGUATO, INCLUYE: SISTEMA ANTITERMITA, RED DE AGUA POTABLE, RED DE SISTEMA DE DRENAJE Y ALUMBRADO PÚBLICO, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE BADIRAGUATO, SINALOA. CONTRATO No.: MBGBR-AD-GC-005/2025 MONTO DEL CONTRATO NETO: $ 762,070.42 IMPORTE DE ESTA ESTIMACION: $ 656,957.26 (-) MENOS AMORTIZACION: $ 229,935.04 TOTAL: $ 427,022.22 (+) MAS 16% IVA: $ 68,323.56 TOTAL: $ 495,345.77 DEDUCCIONES 3% SVIFYC: $ 19,708.72 SALDO LIQUIDO: $ 475,637.05	427,022.22 002 - IVA - 68,323.56	427,022.22

CANTIDAD CON LETRA: (CUATROCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS 77/100

SUBTOTAL	**$427,022.22**
IVA 16%	**$68,323.56**
TOTAL	**$495,345.77**

"EFECTOS FISCALES AL PAGO"
FORMA DE PAGO: 99 - Por definir
METODO DE PAGO: PPD - Pago en parcialidades o diferido

CFDI Relacionado:
Tipo Relación: -
CFDI Relacionado:
Este documento es una representación impresa de un CFDI Lugar de Expedición: 81271 Moneda: MXN - Peso Mexicano

FOLIO FISCAL
45F3A55D-6E58-4240-B56F-AD472805BDA4

No. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT
00001000000709182898

FECHA Y HORA DE CERTIFICACION
Diciembre 1 2025 - 15:48:15

SERIE DEL CERTIFICADO
00001000000701105484

SELLO DIGITAL DEL CFDI

H6nH4/l61f6C1NagldRFr4LZbNoxP2af/0bczUhKfKOAgFBuxJtRNnOGc27ftHF6LLQ/VXxpJeTZaJXgWuPWodXzD8Tk2cESC2LQzKRBmgSt1Gi8fyc1OHYzT3vWWgfvCqTVji2G6lbEgYUsLTS3+5fmxdgknQwE7lom5q9bc7mmg+K+u6KpmeSLY3T/8v3EliuL773Qeu1Y3idnHPSkOdzW9AJ98QzTDNrEowc8bUgLcIlOlochZp2dUtKN+HKRS2AirzKftcSVLDKYxn6UJv53hQlWtZ3PimzvB7ru2NocwYDs3CrP7fdu6flQ0Y+HtQYdqfN8rDuTRI4gGUuvWnw==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|45F3A55D-6E58-4240-B56F-AD472805BDA4|2025-12-01T15:48:15|MAS0610247C0|H6nH4/l61f6C1NagldRFr4LZbNoxP2af/0bczUhKfKOAgFBuxJtRNnOGc27ftHF6LLQ/VXxpJeTZaJXgWuPWodXzD8Tk2cESC2LQzKRBmgSt1Gi8fyc1OHYzT3WWgfvCqTVji2G6lbEgYUsLTS3+5fmxdgknQwE7lom5q9bc7mmg+K+u6KpmeSLY3T/8v3EliuL773Qeu1Y3idnHPSkOdzW9AJ98QzTDNrEowc8bUgLcIlOlochZp2dUtKN+HKRS2AirzKftcSVLDKYxn6UJv53hQlWtZ3PimzvB7ru2NocwYDs3CrP7fdu6flQ0Y+HtQYdqfN8rDuTRI4gGUuvWnw==|00001000000709182898||

SELLO DEL SAT

YafkHOqR53ns4H2sUqoKad0C2DcxTzcozufKBPbMRrs2Mfy6FUoR98JbVuso2nVb4EYK4hjBJ3dcnrwGB7LkGaqJ6uu1uPGuS1fQjJeBQPgXsc4kg0Skuzfwi5bg6i0DpL+jj3wMNgz2TLC3puflSr1j3vs+RAVDhLL4FGqfbUkvG9OVrkwaXmdaZo6etoL8GFoEuSpFA8xO8QwuVnsNS1qOL1AF4y4mDZLyRx5U86Q5DZdnJuloCNYofPTQ5/3UD22nusqIasli19qm6eJWnvr5yKDEjGp9OHe6Z/AupkyAun4EP6oId3TIR3VzLdfMRREc7jZCawu94Q==

Debo (emos) y pagaré (mos) a la orden de **SEIS-ONCE CONSTRUCTORA.** En esta ciudad de LOS MOCHIS, SINALOA, la cantidad **CUATROCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS 77/100 M.N. M.N. (495,345.77 M.N.)** Valor de las mercancías arriba detalladas y que recibí (mos) de conformidad, este pagaré es mercantil y está regido por la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito en su Artículo 173 parte final y demás artículos correlativos por no ser pagaré domiciliado. Si este pagaré no fuera cubierto a su vencimiento me obligo a pagar intereses moratorios de 5% mensual hasta la fecha de su total liquidación.

Nombre y Firma

This XML file does not appear to have any style information associated with it. The document tree is shown below.


```
<cfdi:Comprobante xmlns:cfdi="http://www.sat.gob.mx/cfd/4" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/cfd/4 http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/4/cfdv40.xsd" Version="4.0" Folio="152" Fecha="2025-12-
01T14:48:13"
Sello="H8nH4/l61f6C1NagtdRFr4LZbNoxP2af/0bczUhKfKOAgFBuxJtRNnOGc27ftHF6LLQ/VXxpJeTZaJXgWuPWodXzD8Tk2cESC2LQzKRBmgSt1Gi8fyc1OHYzT3WWgfvCqTVji2G6lbEgYUsLTS
FormaPago="99" NoCertificado="00001000000701105484"
Certificado="MIIGJzCCBA+gAwIBAgIUMDAwMDEwMDAwMDA3MDExMDU0ODQwDQYJKoZIhvcNAQELBQAwggGVMTUwMwYDVQQDDCxBQyBERUwgU0VSVklDSU8gREUgQURNSU5JU1RSQUNJT04gVFJJQ1VU
SubTotal="427022.22" Moneda="MXN" Total="495345.78" TipoDeComprobante="I" Exportacion="01" MetodoPago="PPD" LugarExpedicion="81271">
  <cfdi:Emisor RegimenFiscal="626" Rfc="SCO230519155" Nombre="SEIS-ONCE CONSTRUCTORA"/>
  <cfdi:Receptor Rfc="MDA850101214" Nombre="MUNICIPIO DE BADIRAGUATO" DomicilioFiscalReceptor="80500" RegimenFiscalReceptor="603" UsoCFDI="I01"/>
  <cfdi:Conceptos>
    <cfdi:Concepto ClaveProdServ="81101500" ClaveUnidad="E48" Cantidad="1.00" Unidad="SERVICIO" NoIdentificacion="83101500" Descripcion="SERVICIOS
    ESTIMACION 01 (NORMAL) UNICA OBRA: INSTALACIONES DIVERSAS PARA LA ARENA BADIRAGUATO, INCLUYE: SISTEMA ANTITERMITA, RED DE AGUA POTABLE, RED DE
    SISTEMA DE DRENAJE Y ALUMBRADO PÚBLICO, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE BADIRAGUATO, SINALOA. CONTRATO No.: MBGBR-AD-GC-005/2025 MONTO DEL
    CONTRATO NETO: $ 762,070.42 IMPORTE DE ESTA ESTIMACION: $ 656,957.26 (-) MENOS AMORTIZACION: $ 229,935.04 TOTAL: $ 427,022.22 (+) MAS 16% IVA: $
    68,323.56 TOTAL: $ 495,345.77 DEDUCCIONES 3% SVIFYC: $ 19,708.72 SALDO LIQUIDO: $ 475,637.05" ValorUnitario="427022.22" Importe="427022.22"
    ObjetoImp="02">
      <cfdi:Impuestos>
        <cfdi:Traslados>
          <cfdi:Traslado Base="427022.22" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.160000" Importe="68323.56"/>
        </cfdi:Traslados>
      </cfdi:Impuestos>
    </cfdi:Concepto>
  </cfdi:Conceptos>
  <cfdi:Impuestos TotalImpuestosTrasladados="68323.56">
    <cfdi:Traslados>
      <cfdi:Traslado Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.160000" Importe="68323.56" Base="427022.22"/>
    </cfdi:Traslados>
  </cfdi:Impuestos>
  <cfdi:Complemento>
    <tfd:TimbreFiscalDigital xmlns:tfd="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
    xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital
    http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/TimbreFiscalDigital/TimbreFiscalDigitalv11.xsd" Version="1.1" UUID="45F3A55D-6E58-4240-B56F-AD472805BDA4"
    FechaTimbrado="2025-12-01T15:48:15" RfcProvCertif="MAS0810247C0"
    SelloCFD="H8nH4/l61f6C1NagtdRFr4LZbNoxP2af/0bczUhKfKOAgFBuxJtRNnOGc27ftHF6LLQ/VXxpJeTZaJXgWuPWodXzD8Tk2cESC2LQzKRBmgSt1Gi8fyc1OHYzT3WWgfvCqTVji2G6lbE
    NoCertificadoSAT="00001000000709182898"
    SelloSAT="YafkNOqR53ns4H2sUqoKacl0C2DcrTzcozufKBP9hM8rs2MfyGFUoR98JbVuso2nVb4EYK/4HjBJ3dcnrwGB7LkGaqd6uu1uPGzS1fQjJe8QPgXsc4kg0Siuzfwi5bg6t0DpL+jj3sr
  </cfdi:Complemento>
</cfdi:Comprobante>
```

SEIS-ONCE
CONSTRUCTORA

Control de Estimaciones

SEIS-ONCE CONSTRUCTORA S. DE R.L. DE C.V.

INSTALACIONES DIVERSAS PARA LA ARENA BADIRAGUATO, INCLUYE: SISTEMA ANTITERMITA, RED DE AGUA POTABLE, RED DE SISTEMA DE DRENAJE Y ALUMBRADO PÚBLICO, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE BADIRAGUATO, SINALOA.	**MUNICIPIO DE BADIRAGUATO DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA** Fecha: **19 de julio de 2025**	Estimacion: **01 (NORMAL) UNICA**
Periodo de la estimacion: **20/06/2025** al **19/07/2025** Periodo de Ejecución: **20/06/2025** al **19/07/2025**	Localidad: **BADIRAGUATO**	No. De contrato: **MBGBR-AD-GC-005/2025**

Importe del contrato con I.V.A:	Imp. Contratado sin I.V.A	Anticipo	Importe Anticipo sin I.V.A	% de Avance
$ 762,070.42	**$ 656,957.26**	**$ 266,724.65**	**$ 229,935.04**	**100%**
				% Avance Total **100%**

Control Del Anticipo		Liquidacion de Estimacion			Control de Estimacion	
AMORTIZA ESTA ESTIMACION	**$ 266,724.65**	Importe de la Estimacion (+)	$	656,957.26	ESTA ESTIMACION	**$ 762,070.42**
		16 % I.V.A (+)	$	105,113.16		
		Sub- Total **A** (=)	$	**762,070.42**		
AMORTIZACION ANTERIOR	**$ -**	Amortizacion Anticipo 35%	$	229,935.04	ACUMULADO ANTERIOR	**$ -**
		16 % I.V.A (+)	$	36,789.61		
		Total (=)	$	**266,724.65**		
TOTAL AMORTIZADO	**$ 266,724.65**	Importe TOTAL	$	**427,022.22**	TOTAL ACUMULADO.	**$ 762,070.42**
		16 % I.V.A (+)	$	68,323.56		
		Total (=)	$	**495,345.77**		
ANTICIPO OTORGADO	**$ 266,724.65**	3 % SVIFYC:	$	19,708.72	CONTRATADO	**$ 762,070.42**
		Total Deducciones (=)	$	**286,433.37**		
		Importe T O T A L	$	**475,637.05**		
SALDO DEL ANTICIPO	**$0.00**	NETO A PAGAR	$	**475,637.05**	SALDO	**$ -**
		Son: **(SON CUATROCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS 05/100 M.N.)**				

ELABORO
C. ANA MARCELA ALMADA E.
REPRESENTANTE LEGAL

REVISÓ
ING. JOSÉ R. CONTRERAS LÓPEZ
COORDINADOR DE PRESUPUESTOS Y COSTOS

AUTORIZO
ING. RUBIEL RINCÓN RAMOS
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS
DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA.

SEIS-ONCE
CONSTRUCTORA

Fecha: 19-jul-25

CARATULA DE ESTIMACIÓN

CONTRATISTA:	**SEIS-ONCE CONSTRUCTORA S. DE R.L. DE C.V.**
DOMICILIO:	**C. NORTE 2 # 2197 COL. PRADERAS DE VILLA C.P. 81293 LOS MOCHIS, AHOME SIN.**
TELÉFONO:	CEL:
0	**6681861376**
R.F.C.	
SCO-230519-155	

ESTIMACIÓN No: **01 (NORMAL) UNICA**

PERIODO DE ESTIMACION:	
DEL	**20-jun-25**
AL	**19-jul-25**
FECHA DE CONTRATO:	
	19-jun-25

DEPENDENCIA:	**MUNICIPIO DE BADIRAGUATO**	LOCALIDAD:	MUNICIPIO:
	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA.	**BADIRAGUATO**	**BADIRAGUATO**

PERIODO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO:	
INICIO:	**20-jun-25**
TERMINACIÓN:	**19-jul-25**

DESCRIPCIÓN:

INSTALACIONES DIVERSAS PARA LA ARENA BADIRAGUATO, INCLUYE: SISTEMA ANTITERMITA, RED DE AGUA POTABLE, RED DE SISTEMA DE DRENAJE Y ALUMBRADO PÚBLICO, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE BADIRAGUATO, SINALOA.

CONTRATO No:
MBGBR-AD-GC-005/2025

IMPORTE SIN IVA DE LA OBRA	IMPORTE CON IVA DE LA OBRA	35% ANTICIPO DE LA OBRA	IMPORTE TOTAL DE CONTRATO:
$656,957.26	**$762,070.42**	**$266,724.65**	**$762,070.42**

BUENO POR: **$ 475,637.05**

RECIBI DEL MUNICIPIO DE BADIRAGUATO:

$ 475,637.05 **(SON CUATROCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS 05/100 M.N.)**

EN PAGO DE ESTIMACIÓN: **01 (NORMAL) UNICA**

DEDUCCIONES:		
AMORTIZACIÓN ANTICIPO 35%	$	**229,935.04**
MAS I.V.A.:	$	**36,789.61**
TOTAL AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO:	$	**266,724.65**
3 % SVIFYC:	$	**19,708.72**
TOTAL DEDUCCIONES:	$	**286,433.37**

CALCULO DE ESTIMACIÓN		
IMPORTE DE LA OBRA EJECUTADA SIN IVA	$	**656,957.26**
MAS I.V.A 16 %	$	**105,113.16**
TOTAL DE LA OBRA EJECUTADA CON IVA	$	**762,070.42**
MENOS TOTAL DEDUCCIONES:	$	**286,433.37**
SALDO A PAGAR:	$	**475,637.05**

ELABORO
C. ANA MARCELA ALMADA E.
REPRESENTANTE LEGAL

REVISÓ
ING. JOSÉ R. CONTRERAS LÓPEZ
COORDINADOR DE PRESUPUESTOS Y COSTOS

AUTORIZO
ING. RUBIEL RINCÓN RAMOS
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS
DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA.

SEIS-ONCE
CONSTRUCTORA

FECHA: 19/07/2025

CONTRATISTA:	DEPENDENCIA:
SEIS-ONCE CONSTRUCTORA S. DE R.L. DE C.V.	MUNICIPIO DE BADIRAGUATO
DOMICILIO: C. NORTE 2 # 2197 COL. PRADERAS DE VILLA C.P. 81293 LOS MOCHIS, AHOME SIN.	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA.
R.F.C. SCO-230519-155	

ESTADO DE CUENTA

			LOCALIDAD:	BADIRAGUATO		ESTIMACIÓN:	01 (NORMAL) UNICA
DESCRIPCIÓN:	INSTALACIONES DIVERSAS PARA LA ARENA BADIRAGUATO, INCLUYE: SISTEMA ANTITERMITA, RED DE AGUA POTABLE, RED DE SISTEMA DE DRENAJE Y ALUMBRADO PÚBLICO, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE BADIRAGUATO, SINALOA.						
FECHA INICIO CONTRATO:	20-jun-25	FECHA TERMINACION CONTRATO:	19-jul-25	CONTRATO:	MBGBR-AD-GC-005/2025	FECHA CONTRATO:	19-jun-25

IMPORTE DE OBRA SIN IVA:	$656,957.26	CLAVE DE CONVENIO ADICIONAL:			
IMPORTE DE ANTICIPO DE OBRA	$266,724.65	PERIODO CONVENIO ADICIONAL:		AL	
IMPORTE TOTAL DE CONTRATO	$762,070.42	IMPORTE CONVENIO ADICIONAL:		IMPORTE TOTAL CONTRATADO:	$762,070.42

No. DE ESTIMACIÓN	PERIODO		IMPORTE C/IVA ESTIMACIÓN	IMPORTE SIN IVA	3 % SVIFYC:	AMORTIZACIÓN ANTICIPO 35%	TOTAL DEDUCCIONES	LIQUIDO A PAGAR
01 (NORMAL) UNICA	20-jun-25	19-jul-25	$ 762,070.42	$ 656,957.26	$ 19,708.72	$ 266,724.65	$ 286,433.37	$ 475,637.05
TOTALES:			$ 762,070.42	$ 656,957.26	$ 19,708.72	$ 266,724.65	$ 286,433.37	$ 475,637.05
		SALDO DEL CONTRATO:	$0.00		SALDO POR AMORTIZAR:	$0.00		

LABORO

ANA MARCELA ALMADA E.
EPRESENTANTE LEGAL

REVISÓ

ING. JOSÉ R. CONTRERAS LÓPEZ
COORDINADOR DE PRESUPUESTOS Y COSTOS

AUTORIZO

ING. RUBIEL RINCÓN RAMOS
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS
DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA

SEIS-ONCE
CONSTRUCTORA

FECHA 19/07/2025

CONTRATISTA:	DEPENDENCIA:
SEIS-ONCE CONSTRUCTORA S. DE R.L. DE C.V.	MUNICIPIO DE BADIRAGUATO
DOMICILIO: C. NORTE 2 # 2197 COL. PRADERAS DE VILLA C.P. 81293 LOS MOCHIS, AHOME SIN.	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA.
R.F.C. SCO-230519-155	

RESÚMEN DE ESTIMACIÓN

		LOCALIDAD:	BADIRAGUATO	ESTIMACIÓN:	01 (NORMAL) UNICA
DESCRIPCIÓN:	INSTALACIONES DIVERSAS PARA LA ARENA BADIRAGUATO, INCLUYE: SISTEMA ANTITERMITA, RED DE AGUA POTABLE, RED DE SISTEMA DE DRENAJE Y ALUMBRADO PÚBLICO, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE BADIRAGUATO, SINALOA.				

IMPORTE DE OBRA SIN IVA:	$656,957.26
IMPORTE DE ANTICIPO DE OBRA:	$266,724.65
IMPORTE TOTAL DE CONTRATO:	$762,070.42

OBRA	IMPORTE
INSTALACIONES	$ 656,957.26

SUBTOTAL ESTIMACIÓN:	$ 656,957.26
SUB TOTAL=	$ 656,957.26
I.V.A AL 16 %	$ 105,113.16
TOTAL =	$ 762,070.42

ELABORO
C. ANA MARCELA ALMADA E.
REPRESENTANTE LEGAL

REVISÓ
ING. JOSÉ R. CONTRERAS LÓPEZ
COORDINADOR DE PRESUPUESTOS Y COSTOS

AUTORIZO
ING. RUBIEL RINCÓN RAMOS
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS
DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA

FECHA 19/07/2025
HOJA: 1 de 3

CONTRATISTA:
SEIS-ONCE CONSTRUCTORA S. DE R.L. DE C.V.
DOMICILIO: C. NORTE 2 # 2197 COL. PRADERAS DE VILLA C.P. 81293 LOS MOCHIS, AHOME SIN.
R.F.C.
SCO-230519-155

DEPENDENCIA:
MUNICIPIO DE BADIRAGUATO
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA.

DESGLOSE DE CONCEPTOS DE ESTIMACIÓN

		LOCALIDAD	BADIRAGUATO	ESTIMACIÓN:	01 (NORMAL) UNICA
DESCRIPCIÓN:	**INSTALACIONES DIVERSAS PARA LA ARENA BADIRAGUATO, INCLUYE: SISTEMA ANTITERMITA, RED DE AGUA POTABLE, RED DE SISTEMA DE DRENAJE Y ALUMBRADO PÚBLICO, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE BADIRAGUATO, SINALOA.**				

IMPORTE DE OBRA SIN IVA:	**$656,957.26**
IMPORTE DE ANTICIPO DE OBRA:	**$266,724.65**
IMPORTE TOTAL DE CONTRATO:	**$762,070.42**

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	SEGUN PROYECTO			HASTA ESTA ESTIM	HASTA ESTIM ANT	EXCEDENTE	DE ESTA ESTIMACIÓN	IMPORTE
			CANT	P.U.	TOTAL					
	INSTALACIONES									
GBR20	FABRICACIÓN DE MURO PANTALLA DE BLOCK 15x20x40 CMS (4 HILADAS), EN ACCESO PRINCIPAL DE LA ARENA, TERMINADO APLANADO FINO EN DOS CARAS CON MORTERO CEMENTO ARENA INCLUYE: DOS PARCHES DE MALLA DE METAL DESPLEGADO DE 2.03mX4.00M PARA CUBRIR VIGAS IPR, MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	PZA	1.00	$ 60,693.98	$ 60,693.98	1.00	0.00	0.00	1.00	$ 60,693.98
GBR21	ZAPATA AISLADA DE 1.80X1.80X0.30 MTS DE ESPESOR ARMADA CON VARILLA DE 1/2" @ 20 EN AMBAS DIRECCIONES A DOS LECHOS (DOBLE PARRILLA), COLADA CON CONCRETO HECHO EN OBRA CON F´C=250 KG/CM, INCLUYE: PLANTILLA DE CONCRETO SIMPLE, MANO DE OBRA, MATERIALES, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	2.00	$ 9,412.29	$ 18,824.58	2.00	0.00	0.00	2.00	$ 18,824.58
GBR22	DADO DE 60X60 DE 0.90 MTS DE ALTURA ARMADO CON CON 8 VARILLAS DE 5/8" Y ESTRIBOS DE VARILLA DE 3/8" @ 15 CMS ACABADO APARENTE, CON CONCRETO HECHO EN OBRA CON UN F´C=250 KG/CM2, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTAS.	PZA	2.00	$ 3,643.00	$ 7,286.00	2.00	0.00	0.00	2.00	$ 7,286.00
GBR23	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE FACHALETA GENERICA DE 7x14 Cm EN MUROS DE LADRILLO, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M2	60.79	$ 967.39	$ 58,807.64	60.79	0.00	0.00	60.79	$ 58,807.64
GBR25	INSTALACION DE TUBERIA DE PVC SERIE 20 DE 10" PARA COLECTOR PLUVIAL, INCLUYE: TRAZO, EXCAVACION, INSTALACION ACOSTILLADO, RELLENO COMPACTADO, MANO DE OBRA Y EQUIPO	ML	271.66	$ 292.58	$ 79,482.28	271.66	0.00	0.00	271.66	$ 79,482.28
GBR26	SUMINISTRO E INSTALACION DE TEJA DE BARRO MODELO WINDSOR CROWN, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	M2	46.42	$ 1,212.77	$ 56,296.78	46.42	0.00	0.00	46.42	$ 56,296.78
GBR27	SUMINISTRO E INSTALACION DE CANALETA LATERAL PARA CAPTAR EL AGUA DE LLUVIA EN LAMINA GALVANIZADA CALIBRE 20 (SEGUN MUESTRA) A UNA ALTURA PROMEDIO DE 7.00 MTS INCLUYE: CORTE, ROLADO, MATERIAL, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	ML	91.20	$ 892.21	$ 81,369.55	91.20	0.00	0.00	91.20	$ 81,369.55

LABORO

. ANA MARCELA ALMADA E.
EPRESENTANTE LEGAL

REVISÓ

ING. JOSÉ R. CONTRERAS LÓPEZ
COORDINADOR DE PRESUPUESTOS Y COSTOS

AUTORIZÓ

ING. RUBIEL RINCÓN RAMOS
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS
DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA

FECHA 19/07/2025
HOJA: 2 de 3

CONTRATISTA:
SEIS-ONCE CONSTRUCTORA S. DE R.L. DE C.V.
DOMICILIO: C. NORTE 2 # 2197 COL. PRADERAS DE VILLA C.P. 81293 LOS MOCHIS, AHOME SIN.
R.F.C.
SCO-230519-155

DEPENDENCIA:
MUNICIPIO DE BADIRAGUATO
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA.

DESGLOSE DE CONCEPTOS DE ESTIMACIÓN

		LOCALIDAD	BADIRAGUATO	ESTIMACIÓN:	01 (NORMAL) UNICA
DESCRIPCIÓN:	**INSTALACIONES DIVERSAS PARA LA ARENA BADIRAGUATO, INCLUYE: SISTEMA ANTITERMITA, RED DE AGUA POTABLE, RED DE SISTEMA DE DRENAJE Y ALUMBRADO PÚBLICO, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE BADIRAGUATO, SINALOA.**				

IMPORTE DE OBRA SIN IVA:	**$656,957.26**
IMPORTE DE ANTICIPO DE OBRA:	**$266,724.65**
IMPORTE TOTAL DE CONTRATO:	**$762,070.42**

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	SEGUN PROYECTO			HASTA ESTA ESTIM	HASTA ESTIM ANT	EXCEDENTE	DE ESTA ESTIMACIÓN	IMPORTE
			CANT	P.U.	TOTAL					
GBR28	SUMINISTRO E INSTALACION DE BAJANTES PLUVIALES DE TUBERIA DE PVC DE 6" DE DIÁMETRO, PARA CONDUCIR EL AGUA DE LLUVIA HACIA LOS REGISTROS PLUVIALES, INCLUIYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMMIENTA Y EQUIPO	ML	68.80	$ 388.98	$ 26,761.82	68.80	0.00	0.00	68.80	$ 26,761.82
GBR29	FABRICACIÓN DE REGISTRO PLUVIAL DE 100x100x100 Cm, FABRICADO CON TABIQUE RECOCIDO 7X14X28 Cm, TAPA DE PTR DE 2", CONTRAMARCO DE ANGULAR DE 2 1/2"X3/16", Y UNA PLANTILLA DE CONCRETO f'C = 250 Kg/Cm2, DE 10 Cm DE ESPESOR, ACABADO PULIDO FINO EN EL INTERIOR, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO	PZA	3.00	$ 8,024.92	$ 24,074.76	3.00	0.00	0.00	3.00	$ 24,074.76
GBR30	FABRICACIÓN Y COLOCACIÓN DE BASE PARA TINA DE HIDROMASAJE DE 1.98X1.73 MTS Y 0.77 MTS DE ALTURA A BASE DE MURO DE BLOCK DE 15X20X40 CM CON UNA VAR. DE 3/8" @ 60 CM, RELLENA LAS CELDAS CON CONCRETO F'C= 150 KG/CM2 COLUMNA Y LOSA PERIMETRAL DE 20X7 CM COLADA CON CONCRETO F'C=250 KG/CM2, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	PZA	1.00	$ 7,128.40	$ 7,128.40	1.00	0.00	0.00	1.00	$ 7,128.40
GBR31	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TINA, INCLUYE: LLAVES, CONTROLES, EQUIPO ELECTRICO, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	1.00	$ 46,132.27	$ 46,132.27	1.00	0.00	0.00	1.00	$ 46,132.27
GBR32	SUMINISTRO DE HIDRANTE 2780 VALV 5 1/4", 3 TOMAS (2-2 1/2-1-4 1/2)	PZA	1.00	$ 64,583.80	$ 64,583.80	1.00	0.00	0.00	1.00	$ 64,583.80
GBR33	POLIDUCTO NARANJA REFORZADO DE 1-1/4" DE DIÁMETRO, INCLUYE: EXCAVACIÓN EN ZANJA EN TERRENO TIPO B, RELLENO CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	ML	206.10	$ 62.67	$ 12,916.29	206.10	0.00	0.00	206.10	$ 12,916.29
GBR34	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE XLP DS AL 3 CAL. 6 AWG, 600 VOLTS, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	ML	206.90	$ 85.62	$ 17,886.02	206.90	0.00	0.00	206.90	$ 17,886.02
GBR35	INSTALACIÓN DE LUMINARIA, INCLUYE: BASE DE CONCRETO PIRAMIDAL DE 0.30X0.70X0.90 M., MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	7.00	$ 8,118.85	$ 56,831.95	7.00	0.00	0.00	7.00	$ 56,831.95

LABORO
ANA MARCELA ALMADA E.
REPRESENTANTE LEGAL

REVISÓ
ING. JOSÉ R. CONTRERAS LÓPEZ
COORDINADOR DE PRESUPUESTOS Y COSTOS

AUTORIZÓ
ING. RUBIEL RINCÓN RAMOS
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS
DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA

FECHA 19/07/2025
HOJA: 3 de 3

CONTRATISTA:
SEIS-ONCE CONSTRUCTORA S. DE R.L. DE C.V.
DOMICILIO: C. NORTE 2 # 2197 COL. PRADERAS DE VILLA C.P. 81293 LOS MOCHIS, AHOME SIN.
R.F.C.
SCO-230519-155

DEPENDENCIA:
MUNICIPIO DE BADIRAGUATO
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA.

DESGLOSE DE CONCEPTOS DE ESTIMACIÓN

		LOCALIDAD	BADIRAGUATO	ESTIMACIÓN:	01 (NORMAL) UNICA
DESCRIPCIÓN:	**INSTALACIONES DIVERSAS PARA LA ARENA BADIRAGUATO, INCLUYE: SISTEMA ANTITERMITA, RED DE AGUA POTABLE, RED DE SISTEMA DE DRENAJE Y ALUMBRADO PÚBLICO, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE BADIRAGUATO, SINALOA.**				

IMPORTE DE OBRA SIN IVA:	**$656,957.26**
IMPORTE DE ANTICIPO DE OBRA:	**$266,724.65**
IMPORTE TOTAL DE CONTRATO:	**$762,070.42**

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	SEGUN PROYECTO CANT	P.U.	TOTAL	HASTA ESTA ESTIM	HASTA ESTIM ANT	EXCEDENTE	DE ESTA ESTIMACIÓN	IMPORTE
GBR36	REGISTRO PREFABRICADO DE CONCRETO DE 40X40X40 CM CON TAPA DE CONCRETO DE 6 CM DE ESPESOR, CON MARCO DE FIERRO GALVANIZADO DE 1 1/2"X1 1/2"X1/8" CONTRAMARCO DE ÁNGULO DE 1 1/4"X 1 1/4"X1/8", INCLUYE: SUMINISTRO, COLOCACIÓN, EXCAVACIÓN , RELLENO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	PZA	8.00	$ 1,264.12	$ 10,112.96	8.00	0.00	0.00	8.00	$ 10,112.96
GBR37	FABRICACION Y COLOCACION DE REJILLA PLUVIAL DE 1.90X0.50 M, INCLUYE: SOLDADURA, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTAS.	PZA	6.00	$ 4,628.03	$ 27,768.18	6.00	0.00	0.00	6.00	$ 27,768.18
								TOTAL DE INSTALACIONES:		$ 656,957.26

TOTAL ESTIMACION	$ 656,957.26
I.V.A.	$ 105,113.16
TOTAL	$ 762,070.42

LABORO
: ANA MARCELA ALMADA E.
:EPRESENTANTE LEGAL

REVISÓ
ING. JOSÉ R. CONTRERAS LÓPEZ
COORDINADOR DE PRESUPUESTOS Y COSTOS

AUTORIZ
ING. RUBIEL RINCÓN RAMOS
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICA
DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA

SEIS-ONCE
CONSTRUCTORA

NUMEROS GENERADORES DE VOLUMENES DE OBRA

OBRA: INSTALACIONES DIVERSAS PARA LA ARENA BADIRAGUATO, INCLUYE: SISTEMA ANTITERMITA, RED DE AGUA POTABLE, RED DE SISTEMA DE DRENAJE Y ALUMBRADO PÚBLICO, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE BADIRAGUATO, SINALOA.

GENERADORES ESTIMACION: 01 (NORMAL) UNICA

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	LARGO	ANCHO	ALTO	PIEZA	ACUMULADO PARCIAL	ACUMULADO TOTAL	OBSERVACIONES
1	INSTALACIONES								
GBR20	FABRICACIÓN DE MURO PANTALLA DE BLOCK 15x20x40 CMS (4 HILADAS), EN ACCESO PRINCIPAL DE LA ARENA, TERMINADO APLANADO FINO EN DOS CARAS CON MORTERO CEMENTO ARENA INCLUYE: DOS PARCHES DE MALLA DE METAL DESPLEGADO DE 2.03mX4.00M PARA CUBRIR VIGAS IPR, MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	PZA				1.00	1.00		
							TOTAL	1.00	
GBR21	ZAPATA AISLADA DE 1.80X1.80X0.30 MTS DE ESPESOR ARMADA CON VARILLA DE 1/2" @ 20 EN AMBAS DIRECCIONES A DOS LECHOS (DOBLE PARRILLA), COLADA CON CONCRETO HECHO EN OBRA CON F´C=250 KG/CM, INCLUYE: PLANTILLA DE CONCRETO SIMPLE, MANO DE OBRA, MATERIALES, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA				2.00	2.00		ESTRUCTURA METALICA (MEZANINE)
							TOTAL	2.00	
GBR22	DADO DE 60X60 DE 0.90 MTS DE ALTURA ARMADO CON CON 8 VARILLAS DE 5/8" Y ESTRIBOS DE VARILLA DE 3/8" @ 15 CMS ACABADO APARENTE, CON CONCRETO HECHO EN OBRA CON UN F´C=250 KG/CM2, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTAS.	PZA				2.00	2.00		ESTRUCTURA METALICA (MEZANINE)

ELABORO

ING. JESUS YOVANNY MONJE HEREDIA
SUPERINTENDENTE DE OBRA

REVISÓ

SUPERVISOR DE OBRA

AUTORIZO

ING. RUBIEL RINCÓN RAMOS
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS
DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA.

SEIS-ONCE
CONSTRUCTORA

NUMEROS GENERADORES DE VOLUMENES DE OBRA

OBRA: INSTALACIONES DIVERSAS PARA LA ARENA BADIRAGUATO, INCLUYE: SISTEMA ANTITERMITA, RED DE AGUA POTABLE, RED DE SISTEMA DE DRENAJE Y ALUMBRADO PÚBLICO, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE BADIRAGUATO, SINALOA.

GENERADORES ESTIMACION: 01 (NORMAL) UNICA

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	LARGO	ANCHO	ALTO	PIEZA	ACUMULADO PARCIAL	ACUMULADO TOTAL	OBSERVACIONES
							TOTAL	2.00	
GBR23	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE FACHALETA GENERICA DE 7x14 Cm EN MUROS DE LADRILLO, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M2	14.65	0.25		2.00	7.33		LOSA SOBRE ARCOS
			5.15	0.25		2.00	2.58		LOSA SOBRE ARCOS
			2.03	0.20		2.00	0.81		CASTILLOS SOBRE ARCOS
			1.70	0.20		4.00	1.36		CASTILLOS SOBRE ARCOS
			0.80	0.20		4.00	0.64		CASTILLOS EN PRETIL LOSA ARCOS
			14.25	0.20		2.00	5.70		CERRAMIENTO EN PRETIL LOSA ARCOS
			5.15	0.20		2.00	2.06		CERRAMIENTO EN PRETIL LOSA ARCOS
			2.80	0.20		1.00	0.56		CASTILLO LADO TAQUILLA
			2.40	0.20		1.00	0.48		CASTILLO LADO TAQUILLA
			5.15	0.20		1.00	1.03		CERRAMIENTO LADO TAQUILLA
			5.15	0.20		1.00	1.03		CERRAMIENTO LADO CAFETERIA
			10.23	0.20		1.00	2.05		CERRAMIENTO PRETIL LADO "D"CAFETERIA
			10.23	0.25		1.00	2.56		LOSA CAFETERIA LADO "D"
			2.08	0.20		4.00	1.66		CASTILLOS PRETIL CAFETERIA LADO "D"
			0.40	0.20		4.00	0.32		CASTILLOS ENRASE CAFETERIA LADO "D"
			5.07	0.20		1.00	1.01		CERRAMIENTO PRETIL LADO "C"CAFETERIA
			5.07	0.25		1.00	1.27		LOSA CAFETERIA LADO "C"

ELABORO

ING. JESUS YOVANNY MONJE HEREDIA
SUPERINTENDENTE DE OBRA

REVISÓ

SUPERVISOR DE OBRA

AUTORIZO

ING. RUBIEL RINCÓN RAMOS
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS
DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA.

SEIS-ONCE
CONSTRUCTORA

NUMEROS GENERADORES DE VOLUMENES DE OBRA

OBRA: INSTALACIONES DIVERSAS PARA LA ARENA BADIRAGUATO, INCLUYE: SISTEMA ANTITERMITA, RED DE AGUA POTABLE, RED DE SISTEMA DE DRENAJE Y ALUMBRADO PÚBLICO, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE BADIRAGUATO, SINALOA.

GENERADORES ESTIMACION: 01 (NORMAL) UNICA

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	LARGO	ANCHO	ALTO	PIEZA	ACUMULADO PARCIAL	ACUMULADO TOTAL	OBSERVACIONES
			2.08	0.20		3.00	1.25		CASTILLOS PRETIL CAFETERIA LADO "C"
			0.40	0.20		3.00	0.24		CASTILLOS ENRASE CAFETERIA LADO "D"
			1.30	0.28		1.00	0.36		MURO TAQUILLA-TECACAS SHOP
			2.25	0.28		3.00	1.89		
			0.31	4.00		1.00	1.24		
			0.23	0.98		1.00	0.23		
			0.15	3.86		1.00	0.58		
			1.52	0.14		1.00	0.21		ARCOS DE ACCESO (INTERIOR)
			1.37	0.28		2.00	0.77		
			1.30	0.14		1.00	0.18		
			2.50	0.28		6.00	4.20		CAFETERIA
			0.22	8.05		1.00	1.77		
			0.22	4.33		1.00	0.95		
			4.62	0.48		1.00	2.22		
			2.55	0.28		2.00	1.43		BODEGA
			2.55	0.15		2.00	0.77		
			0.22	4.74		1.00	1.04		
			0.30	6.32		1.00	1.90		
			2.50	0.28		4.00	2.80		
			0.15	5.33		1.00	0.80		
			0.15	6.34		1.00	0.95		
			0.22	5.33		1.00	1.17		
			0.22	6.34		1.00	1.39		
							TOTAL	**60.79**	

ELABORO

ING. JESUS YOVANNY MONJE HEREDIA
SUPERINTENDENTE DE OBRA

REVISÓ

SUPERVISOR DE OBRA

AUTORIZO

ING. RUBIEL RINCÓN RAMOS
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS
DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA.

SEIS-ONCE
CONSTRUCTORA

NUMEROS GENERADORES DE VOLUMENES DE OBRA

OBRA: INSTALACIONES DIVERSAS PARA LA ARENA BADIRAGUATO, INCLUYE: SISTEMA ANTITERMITA, RED DE AGUA POTABLE, RED DE SISTEMA DE DRENAJE Y ALUMBRADO PÚBLICO, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE BADIRAGUATO, SINALOA.

GENERADORES ESTIMACION: 01 (NORMAL) UNICA

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	LARGO	ANCHO	ALTO	PIEZA	ACUMULADO PARCIAL	ACUMULADO TOTAL	OBSERVACIONES
GBR25	INSTALACION DE TUBERIA DE PVC SERIE 20 DE 10" PARA COLECTOR PLUVIAL, INCLUYE: TRAZO, EXCAVACION, INSTALACION ACOSTILLADO, RELLENO COMPACTADO, MANO DE OBRA Y EQUIPO	ML	114.30			1.00	114.30		PLUVIAL DE 10" DE DIAMETRO
			67.80			1.00	67.80		
			13.90			1.00	13.90		
			54.00			1.00	54.00		
			21.66			1.00	21.66		
							TOTAL	271.66	
GBR26	SUMINISTRO E INSTALACION DE TEJA DE BARRO MODELO WINDSOR CROWN, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	M2							
		AREA TRAPEZOIDAL EN LOSA DE TAQUILLA:			((13.93+11.83)x3.1) /2		39.93		
		AREA TRAPEZOIDAL EN LOSA DE TAQUILLA:			((4.5+1.68)x2.1) /2		6.49		
							TOTAL	46.42	
GBR27	SUMINISTRO E INSTALACION DE CANALETA LATERAL PARA CAPTAR EL AGUA DE LLUVIA EN LAMINA GALVANIZADA CALIBRE 20 (SEGUN MUESTRA) A UNA ALTURA PROMEDIO DE 7.00 MTS INCLUYE: CORTE, ROLADO, MATERIAL, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	ML	45.60			2.00	91.20		LADOS "A" Y "C"
							TOTAL	91.20	

ELABORÓ

ING. JESUS YOVANNY MONJE HEREDIA
SUPERINTENDENTE DE OBRA

REVISÓ

SUPERVISOR DE OBRA

AUTORIZO

ING. RUBIEL RINCÓN RAMOS
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS
DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA.

SEIS-ONCE
CONSTRUCTORA

NUMEROS GENERADORES DE VOLUMENES DE OBRA

OBRA: INSTALACIONES DIVERSAS PARA LA ARENA BADIRAGUATO, INCLUYE: SISTEMA ANTITERMITA, RED DE AGUA POTABLE, RED DE SISTEMA DE DRENAJE Y ALUMBRADO PÚBLICO, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE BADIRAGUATO, SINALOA.

GENERADORES ESTIMACION: 01 (NORMAL) UNICA

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	LARGO	ANCHO	ALTO	PIEZA	ACUMULADO		OBSERVACIONES
							PARCIAL	TOTAL	
GBR28	SUMINISTRO E INSTALACION DE BAJANTES PLUVIALES DE TUBERIA DE PVC DE 6" DE DIÁMETRO, PARA CONDUCIR EL AGUA DE LLUVIA HACIA LOS REGISTROS PLUVIALES, INCLUIYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMMIENTA Y EQUIPO	ML	11.70			1.00	11.70		LADO "A"
			57.10			1.00	57.10		LADO "C"
							TOTAL	68.80	
GBR29	FABRICACIÓN DE REGISTRO PLUVIAL DE 100x100x100 Cm, FABRICADO CON TABIQUE RECOCIDO 7X14X28 Cm, TAPA DE PTR DE 2", CONTRAMARCO DE ANGULAR DE 2 1/2"X3/16", Y UNA PLANTILLA DE CONCRETO f'C = 250 Kg/Cm2, DE 10 Cm DE ESPESOR, ACABADO PULIDO FINO EN EL INTERIOR, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO	PZA				3.00	3.00		COLECTOR PLUVIAL DE 10"
							TOTAL	3.00	

ELABORO

ING. JESUS YOVANNY MONJE HEREDIA
SUPERINTENDENTE DE OBRA

REVISÓ

SUPERVISOR DE OBRA

AUTORIZO

ING. RUBIEL RINCÓN RAMOS
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS
DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA.

SEIS-ONCE
CONSTRUCTORA

NUMEROS GENERADORES DE VOLUMENES DE OBRA

OBRA: INSTALACIONES DIVERSAS PARA LA ARENA BADIRAGUATO, INCLUYE: SISTEMA ANTITERMITA, RED DE AGUA POTABLE, RED DE SISTEMA DE DRENAJE Y ALUMBRADO PÚBLICO, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE BADIRAGUATO, SINALOA.

GENERADORES ESTIMACION: 01 (NORMAL) UNICA

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	LARGO	ANCHO	ALTO	PIEZA	ACUMULADO		OBSERVACIONES
							PARCIAL	TOTAL	
GBR30	FABRICACIÓN Y COLOCACIÓN DE BASE PARA TINA DE HIDROMASAJE DE 1.98X1.73 MTS Y 0.77 MTS DE ALTURA A BASE DE MURO DE BLOCK DE 15X20X40 CM CON UNA VAR. DE 3/8" @ 60 CM, RELLENA LAS CELDAS CON CONCRETO F'C= 150 KG/CM2 COLUMNA Y LOSA PERIMETRAL DE 20X7 CM COLADA CON CONCRETO F'C=250 KG/CM2, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	PZA				1.00	1.00		
							TOTAL	1.00	
GBR31	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TINA, INCLUYE: LLAVES, CONTROLES, EQUIPO ELECTRICO, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA				1.00	1.00		
							TOTAL	1.00	
GBR32	SUMINISTRO DE HIDRANTE 2780 VALV 5 1/4", 3 TOMAS (2-2 1/2-1-4 1/2)	PZA				1.00	1.00		
							TOTAL	1.00	
GBR33	POLIDUCTO NARANJA REFORZADO DE 1-1/4" DE DIÁMETRO, INCLUYE: EXCAVACIÓN EN ZANJA EN TERRENO TIPO B, RELLENO CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	ML	21.91			1.00	21.91		L1-L2
			30.23			1.00	30.23		L2-L3

ELABORO

ING. JESUS YOVANNY MONJE HEREDIA
SUPERINTENDENTE DE OBRA

REVISÓ

SUPERVISOR DE OBRA

AUTORIZO

ING. RUBIEL RINCÓN RAMOS
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS
DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA.

SEIS-ONCE
CONSTRUCTORA

NUMEROS GENERADORES DE VOLUMENES DE OBRA

OBRA: INSTALACIONES DIVERSAS PARA LA ARENA BADIRAGUATO, INCLUYE: SISTEMA ANTITERMITA, RED DE AGUA POTABLE, RED DE SISTEMA DE DRENAJE Y ALUMBRADO PÚBLICO, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE BADIRAGUATO, SINALOA.

GENERADORES ESTIMACION: 01 (NORMAL) UNICA

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	LARGO	ANCHO	ALTO	PIEZA	ACUMULADO PARCIAL	ACUMULADO TOTAL	OBSERVACIONES
			27.00			1.00	27.00		L3-L4
			31.40			1.00	31.40		L4-L5
			35.08			1.00	35.08		L5-L6
			35.63			1.00	35.63		L6-L7
			24.85			1.00	24.85		
							TOTAL	206.10	
GBR34	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE XLP DS AL 3 CAL. 6 AWG, 600 VOLTS, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	ML	21.91			1.00	21.91		
			30.23			1.00	30.23		
			27.00			1.00	27.00		
			31.40			1.00	31.40		
			35.08			1.00	35.08		
			35.63			1.00	35.63		
			24.85			1.00	24.85		
			0.40			7.00	2.80		
							TOTAL	208.90	
GBR35	INSTALACIÓN DE LUMINARIA, INCLUYE: BASE DE CONCRETO PIRAMIDAL DE 0.30X0.70X0.90 M., MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA				7.00	7.00		
							TOTAL	7.00	

ELABORÓ

ING. JESUS YOVANNY MONJE HEREDIA
SUPERINTENDENTE DE OBRA

REVISÓ

SUPERVISOR DE OBRA

AUTORIZO

ING. RUBIEL RINCÓN RAMOS
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS
DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA.

SEIS-ONCE
CONSTRUCTORA

NUMEROS GENERADORES DE VOLUMENES DE OBRA

OBRA: INSTALACIONES DIVERSAS PARA LA ARENA BADIRAGUATO, INCLUYE: SISTEMA ANTITERMITA, RED DE AGUA POTABLE, RED DE SISTEMA DE DRENAJE Y ALUMBRADO PÚBLICO, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE BADIRAGUATO, SINALOA.

GENERADORES ESTIMACION: 01 (NORMAL) UNICA

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	LARGO	ANCHO	ALTO	PIEZA	ACUMULADO		OBSERVACIONES
							PARCIAL	TOTAL	
GBR36	REGISTRO PREFABRICADO DE CONCRETO DE 40X40X40 CM CON TAPA DE CONCRETO DE 6 CM DE ESPESOR, CON MARCO DE FIERRO GALVANIZADO DE 1 1/2"X1 1/2"X1/8" CONTRAMARCO DE ÁNGULO DE 1 1/4"X 1 1/4"X1/8", INCLUYE: SUMINISTRO, COLOCACIÓN, EXCAVACIÓN , RELLENO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	PZA				8.00	8.00		
							TOTAL	8.00	
GBR37	FABRICACION Y COLOCACION DE REJILLA PLUVIAL DE 1.90X0.50 M, INCLUYE: SOLDADURA, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTAS.	PZA				6.00	6.00		
							TOTAL	6.00	

ELABORO

ING. JESUS YOVANNY MONJE HEREDIA
SUPERINTENDENTE DE OBRA

REVISÓ

SUPERVISOR DE OBRA

AUTORIZO

ING. RUBIEL RINCÓN RAMOS
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS
DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA.

FECHA: 19/07/2025

DEPENDENCIA: **MUNICIPIO DE BADIRAGUATO**
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA

CROQUIS


CONTRATISTA: **SEIS-ONCE CONSTRUCTORA S. DE R.L. DE C.V.**

OBRA: INSTALACIONES DIVERSAS PARA LA ARENA BADIRAGUATO, INCLUYE: SISTEMA ANTITERMITA, RED DE AGUA POTABLE, RED DE SISTEMA DE DRENAJE Y ALUMBRADO PÚBLICO, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE BADIRAGUATO, SINALOA.

ESTIMACION: **01 (NORMAL) UNICA**

INSTALACIONES

GBR20 FABRICACIÓN DE MURO PANTALLA DE BLOCK 15x20x40 CMS (4 HILADAS), EN ACCESO PRINCIPAL DE LA ARENA, TERMINADO APLANADO FINO EN DOS CARAS CON MORTERO CEMENTO ARENA INCLUYE: DOS PARCHES DE MALLA DE METAL DESPLEGADO DE 2.03mX4.00M PARA CUBRIR VIGAS IPR, MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.

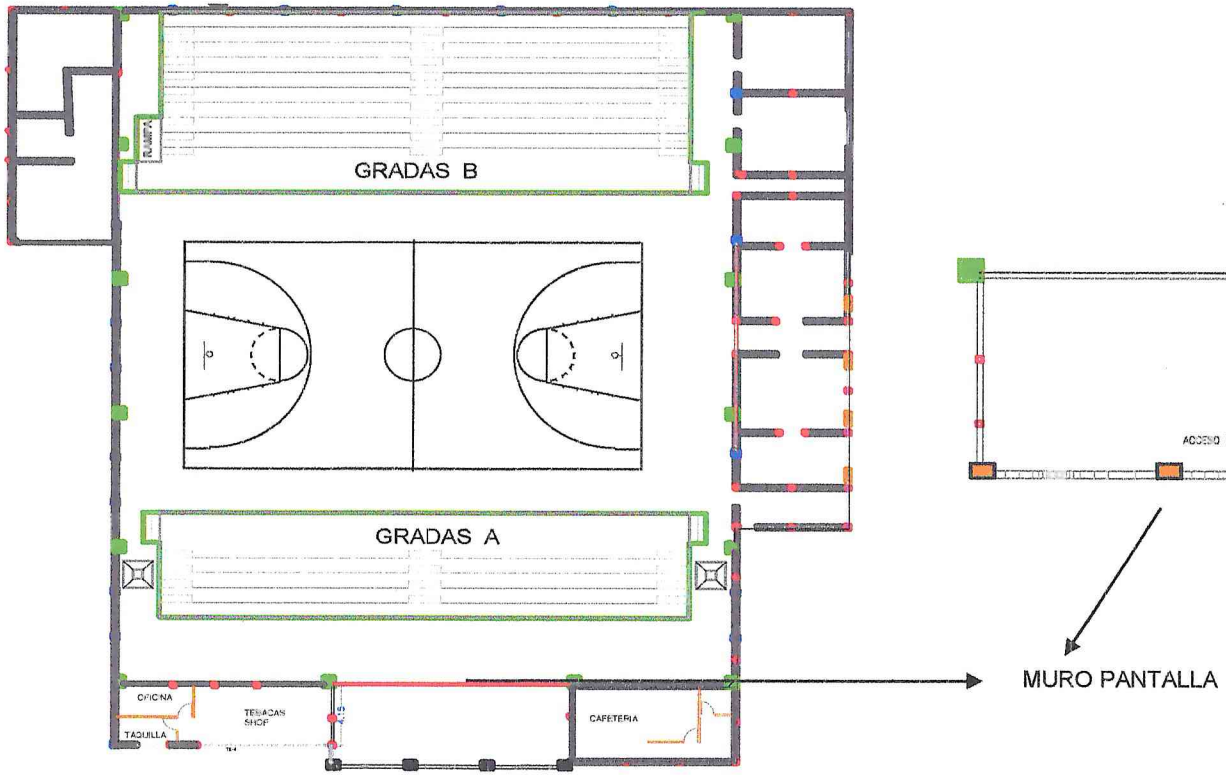

ELABORO

ING. JESUS YOVANNY MONJE HEREDIA
SUPERINTENDENTE DE OBRA

REVISÓ

SUPERVISOR DE OBRA

AUTORIZO

ING. RUBIEL RINCÓN RAMOS
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS
DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA.

FECHA: 19/07/2025

DEPENDENCIA: **MUNICIPIO DE BADIRAGUATO**
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA

CROQUIS


CONTRATISTA: **SEIS-ONCE CONSTRUCTORA S. DE R.L. DE C.V.**

OBRA: INSTALACIONES DIVERSAS PARA LA ARENA BADIRAGUATO, INCLUYE: SISTEMA ANTITERMITA, RED DE AGUA POTABLE, RED DE SISTEMA DE DRENAJE Y ALUMBRADO PÚBLICO, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE BADIRAGUATO, SINALOA.

ESTIMACION: **01 (NORMAL) UNICA**

GBR21 ZAPATA AISLADA DE 1.80X1.80X0.30 MTS DE ESPESOR ARMADA CON VARILLA DE 1/2" @ 20 EN AMBAS DIRECCIONES A DOS LECHOS (DOBLE PARRILLA), COLADA CON CONCRETO HECHO EN OBRA CON F´C=250 KG/CM, INCLUYE: PLANTILLA DE CONCRETO SIMPLE, MANO DE OBRA, MATERIALES, HERRAMIENTA Y EQUIPO.

GBR22 DADO DE 60X60 DE 0.90 MTS DE ALTURA ARMADO CON CON 8 VARILLAS DE 5/8" Y ESTRIBOS DE VARILLA DE 3/8" @ 15 CMS ACABADO APARENTE, CON CONCRETO HECHO EN OBRA CON UN F´C=250 KG/CM2, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTAS.

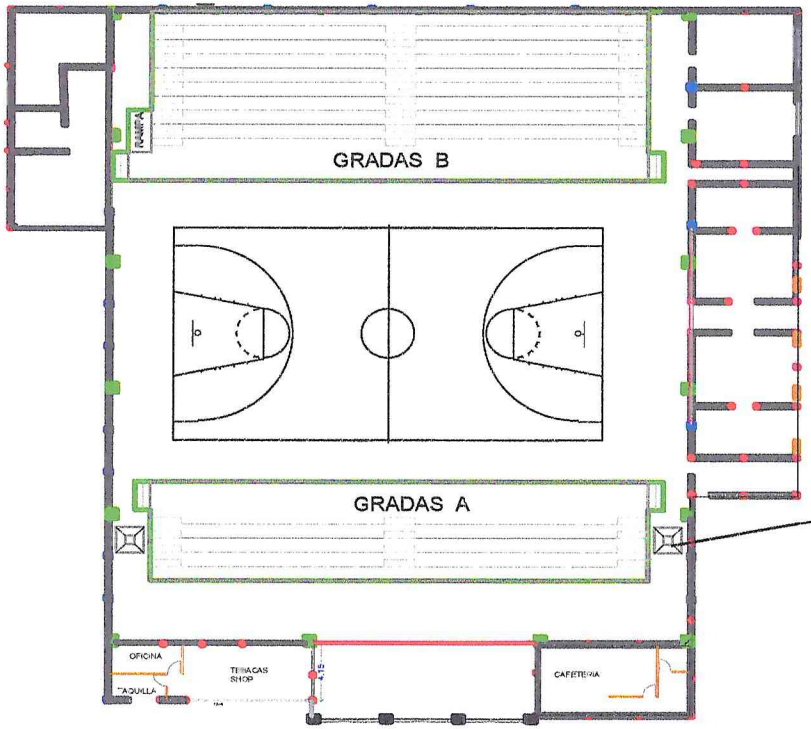

ELABORO

ING. JESUS YOVANNY MONJE HEREDIA
SUPERINTENDENTE DE OBRA

REVISÓ

SUPERVISOR DE OBRA

AUTORIZO

ING. RUBIEL RINCÓN RAMOS
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS
DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA.

FECHA: 19/07/2025

DEPENDENCIA: **MUNICIPIO DE BADIRAGUATO**
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA

CROQUIS


CONTRATISTA: **SEIS-ONCE CONSTRUCTORA S. DE R.L. DE C.V.**

OBRA: INSTALACIONES DIVERSAS PARA LA ARENA BADIRAGUATO, INCLUYE: SISTEMA ANTITERMITA, RED DE AGUA POTABLE, RED DE SISTEMA DE DRENAJE Y ALUMBRADO PÚBLICO, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE BADIRAGUATO, SINALOA.


ESTIMACION: **01 (NORMAL) UNICA**

GBR23 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE FACHALETA GENERICA DE 7x14 Cm EN MUROS DE LADRILLO, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.

CAFETERIA

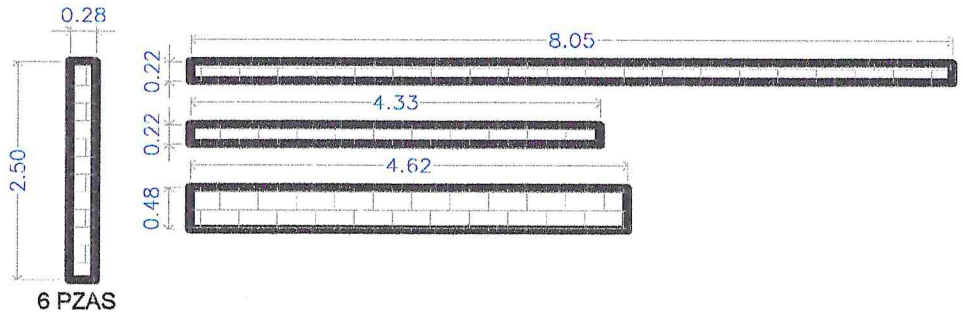


6 PZAS

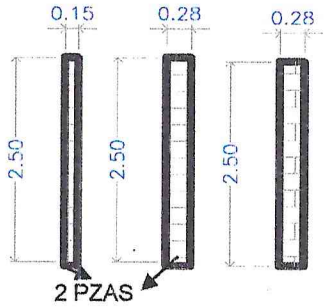


2 PZAS

4 PZAS

BODEGA

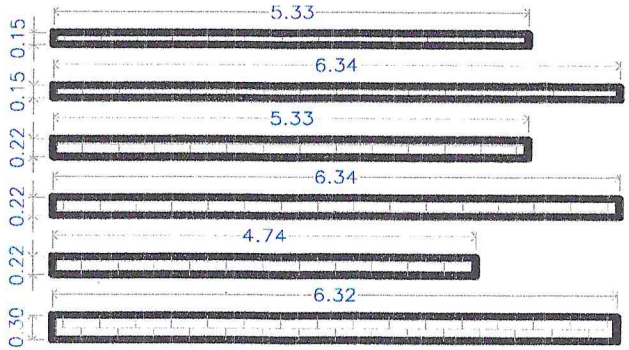


TAQUILLA-TEBACA SHOPS

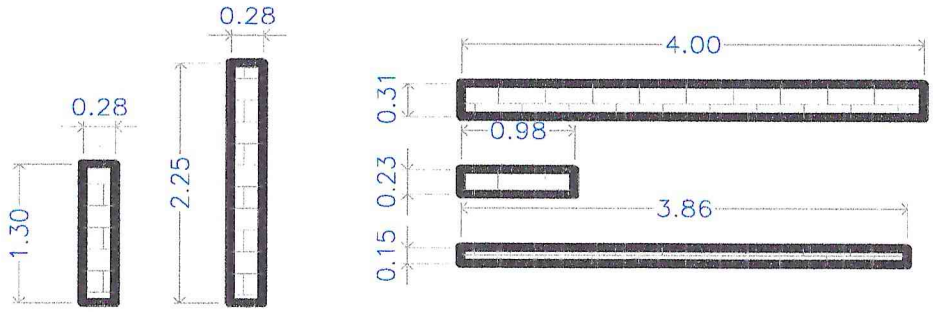

3 PZAS

ARCOS DE ACCESO INTERIOR

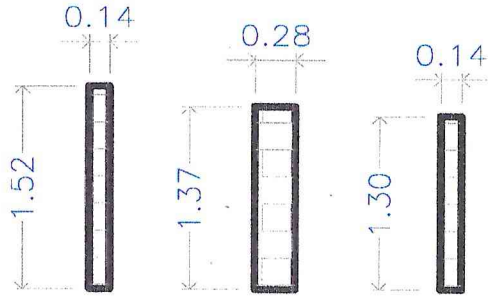

2 PZAS

ELABORO

ING. JESUS YOVANNY MONJE HEREDIA
SUPERINTENDENTE DE OBRA

REVISÓ

SUPERVISOR DE OBRA

AUTORIZO

ING. RUBIEL RINCÓN RAMOS
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS
DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA.

FECHA: 19/07/2025

DEPENDENCIA: **MUNICIPIO DE BADIRAGUATO**
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA


CROQUIS

CONTRATISTA: **SEIS-ONCE CONSTRUCTORA S. DE R.L. DE C.V.**

OBRA: INSTALACIONES DIVERSAS PARA LA ARENA BADIRAGUATO, INCLUYE: SISTEMA ANTITERMITA, RED DE AGUA POTABLE, RED DE SISTEMA DE DRENAJE Y ALUMBRADO PÚBLICO, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE BADIRAGUATO, SINALOA.

ESTIMACION: **01 (NORMAL) UNICA**

GBR25 INSTALACION DE TUBERIA DE PVC SERIE 20 DE 10" PARA COLECTOR PLUVIAL, INCLUYE: TRAZO, EXCAVACION, INSTALACION ACOSTILLADO, RELLENO COMPACTADO, MANO DE OBRA Y EQUIPO

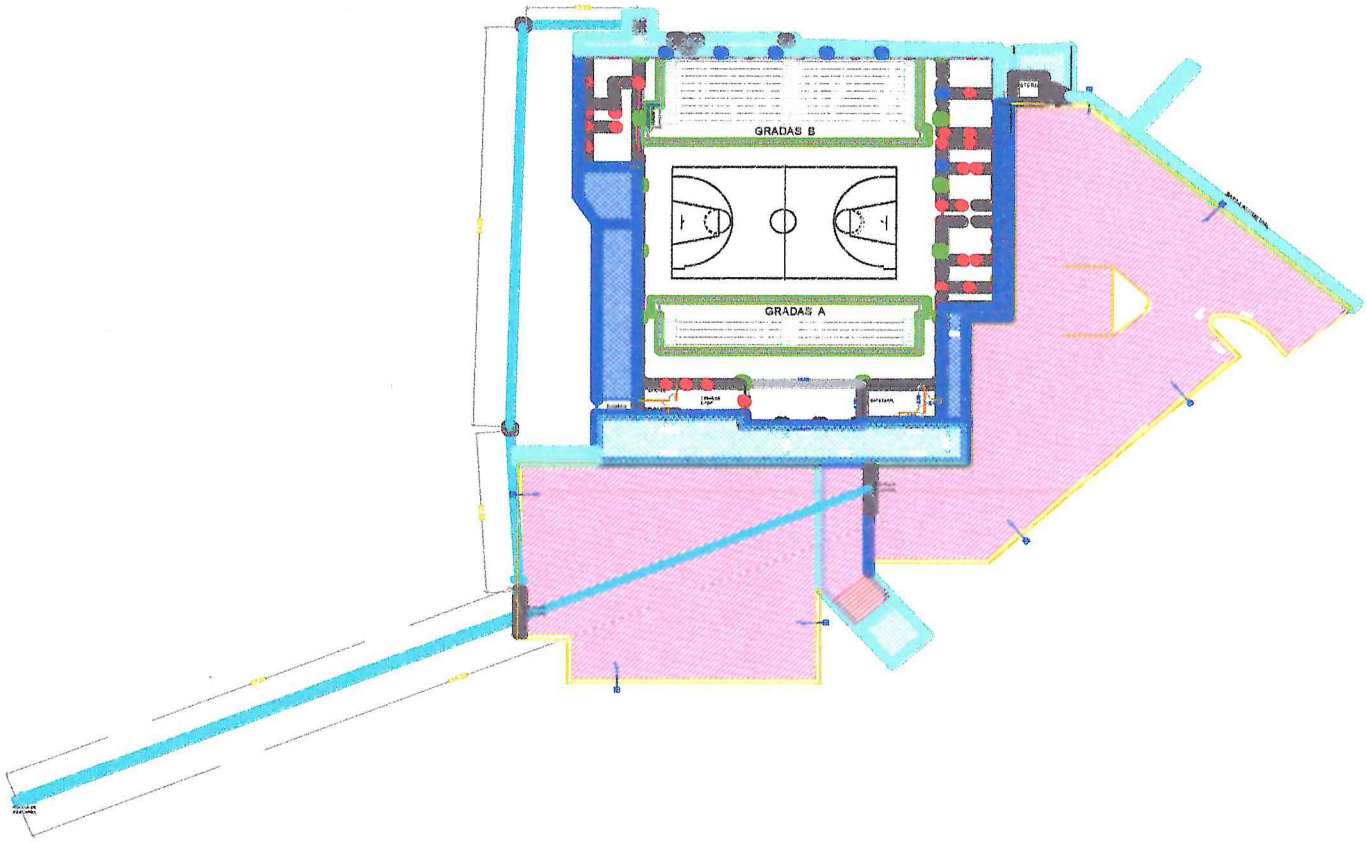

ELABORO

ING. JESUS YOVANNY MONJE HEREDIA
SUPERINTENDENTE DE OBRA

REVISÓ

SUPERVISOR DE OBRA

AUTORIZO

ING. RUBIEL RINCÓN RAMOS
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS
DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA.

FECHA: 19/07/2025

DEPENDENCIA: **MUNICIPIO DE BADIRAGUATO**
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA

CROQUIS

CONTRATISTA: **SEIS-ONCE CONSTRUCTORA S. DE R.L. DE C.V.**


OBRA: INSTALACIONES DIVERSAS PARA LA ARENA BADIRAGUATO, INCLUYE: SISTEMA ANTITERMITA, RED DE AGUA POTABLE, RED DE SISTEMA DE DRENAJE Y ALUMBRADO PÚBLICO, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE BADIRAGUATO, SINALOA.

ESTIMACION: **01 (NORMAL) UNICA**

GBR26 SUMINISTRO E INSTALACION DE TEJA DE BARRO MODELO WINDSOR CROWN, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.

GBR27 SUMINISTRO E INSTALACION DE CANALETA LATERAL PARA CAPTAR EL AGUA DE LLUVIA EN LAMINA GALVANIZADA CALIBRE 20 (SEGUN MUESTRA) A UNA ALTURA PROMEDIO DE 7.00 MTS INCLUYE: CORTE, ROLADO, MATERIAL, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.

GBR28 SUMINISTRO E INSTALACION DE BAJANTES PLUVIALES DE TUBERIA DE PVC DE 6" DE DIÁMETRO, PARA CONDUCIR EL AGUA DE LLUVIA HACIA LOS REGISTROS PLUVIALES, INCLUIYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMMIENTA Y EQUIPO

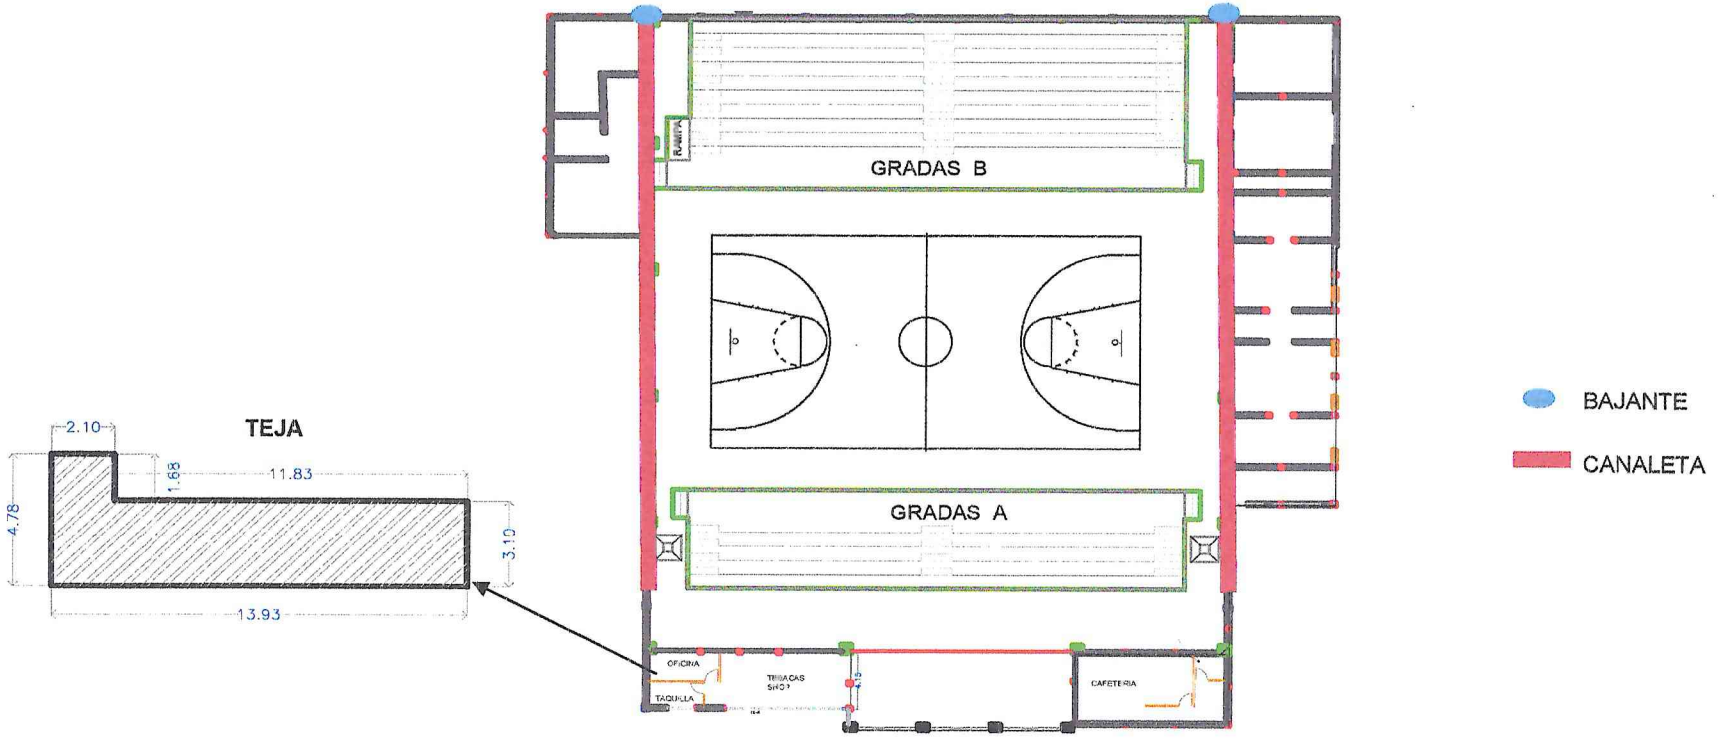

ELABORO

ING. JESUS YOVANNY MONJE HEREDIA
SUPERINTENDENTE DE OBRA

REVISÓ

SUPERVISOR DE OBRA

AUTORIZO

ING. RUBIEL RINCÓN RAMOS
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS
DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA.

FECHA: 19/07/2025

DEPENDENCIA: **MUNICIPIO DE BADIRAGUATO**
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA


CROQUIS

CONTRATISTA: **SEIS-ONCE CONSTRUCTORA S. DE R.L. DE C.V.**

OBRA: INSTALACIONES DIVERSAS PARA LA ARENA BADIRAGUATO, INCLUYE: SISTEMA ANTITERMITA, RED DE AGUA POTABLE, RED DE SISTEMA DE DRENAJE Y ALUMBRADO PÚBLICO, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE BADIRAGUATO, SINALOA.

ESTIMACION: **01 (NORMAL) UNICA**

GBR29 FABRICACIÓN DE REGISTRO PLUVIAL DE 100x100x100 Cm, FABRICADO CON TABIQUE RECOCIDO 7X14X28 Cm, TAPA DE PTR DE 2", CONTRAMARCO DE ANGULAR DE 2 1/2"X3/16", Y UNA PLANTILLA DE CONCRETO f'C = 250 Kg/Cm2, DE 10 Cm DE ESPESOR, ACABADO PULIDO FINO EN EL INTERIOR, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO

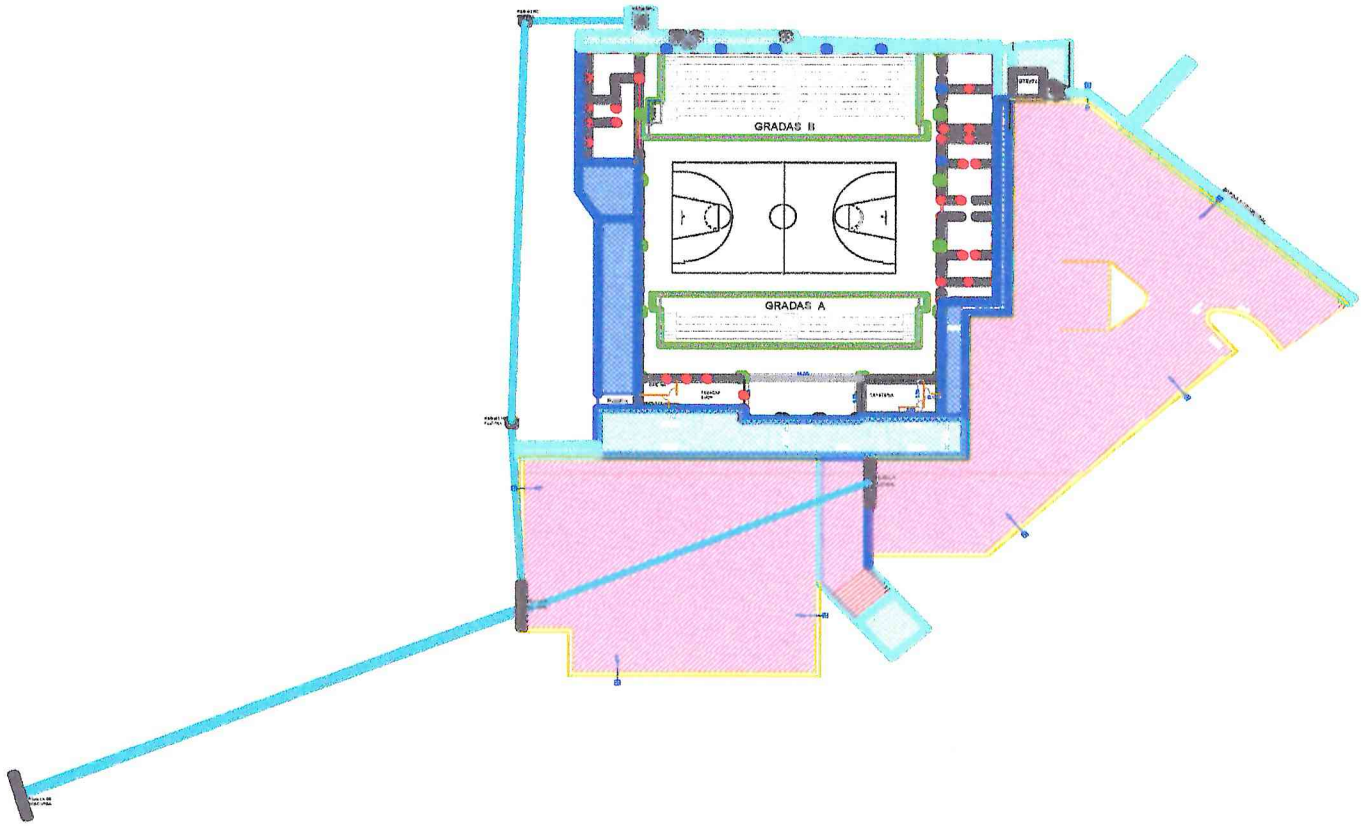

ELABORO

ING. JESUS YOVANNY MONJE HEREDIA
SUPERINTENDENTE DE OBRA

REVISÓ

SUPERVISOR DE OBRA

AUTORIZO

ING. RUBIEL RINCÓN RAMOS
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS
DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA.

FECHA: 19/07/2025

DEPENDENCIA: **MUNICIPIO DE BADIRAGUATO**
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA

CROQUIS

CONTRATISTA: **SEIS-ONCE CONSTRUCTORA S. DE R.L. DE C.V.**


OBRA: INSTALACIONES DIVERSAS PARA LA ARENA BADIRAGUATO, INCLUYE: SISTEMA ANTITERMITA, RED DE AGUA POTABLE, RED DE SISTEMA DE DRENAJE Y ALUMBRADO PÚBLICO, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE BADIRAGUATO, SINALOA.


ESTIMACION: **01 (NORMAL) UNICA**


GBR30 FABRICACIÓN Y COLOCACIÓN DE BASE PARA TINA DE HIDROMASAJE DE 1.98X1.73 MTS Y 0.77 MTS DE ALTURA A BASE DE MURO DE BLOCK DE 15X20X40 CM CON UNA VAR. DE 3/8" @ 60 CM, RELLENA LAS CELDAS CON CONCRETO F'C= 150 KG/CM2 COLUMNA Y LOSA PERIMETRAL DE 20X7 CM COLADA CON CONCRETO F'C=250 KG/CM2, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.

GBR31 SUMINISTRO Y COLOCACION DE TINA, INCLUYE: LLAVES, CONTROLES, EQUIPO ELECTRICO, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.

GBR32 SUMINISTRO DE HIDRANTE 2780 VALV 5 1/4", 3 TOMAS (2-2 1/2-1-4 1/2)

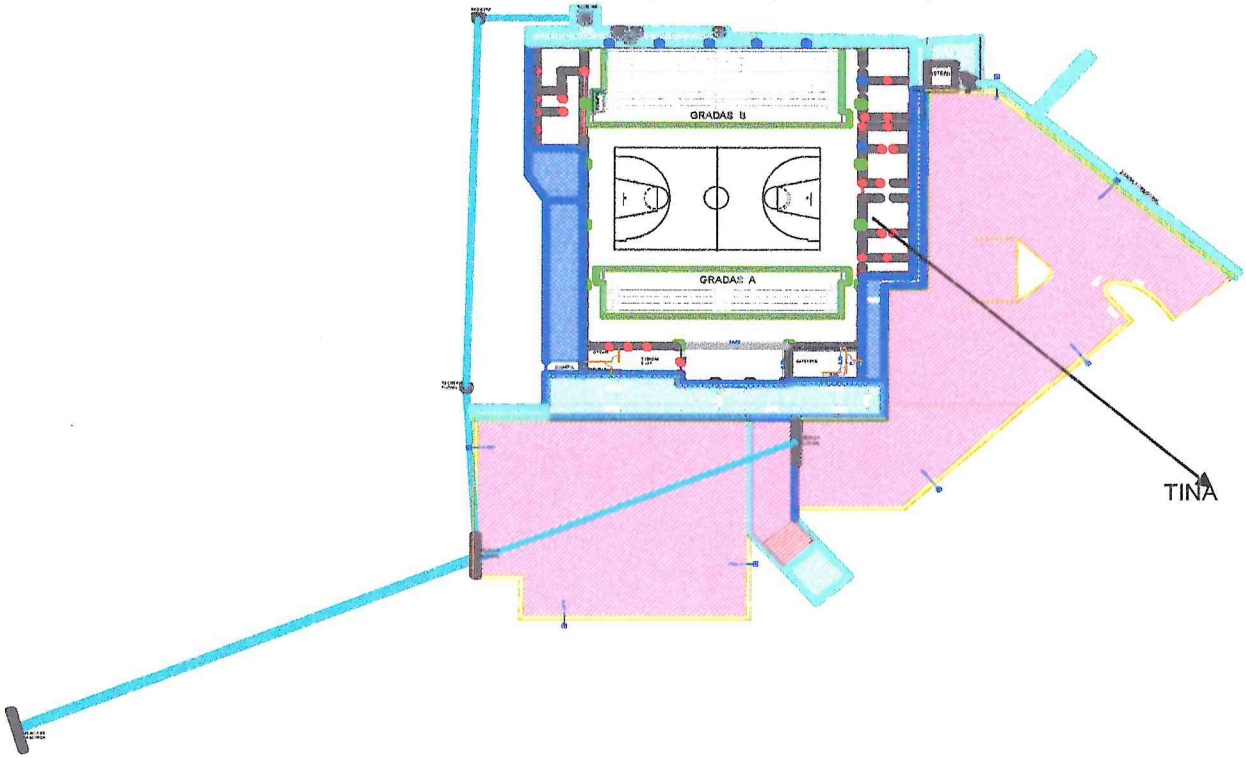





ELABORO

ING. JESUS YOVANNY MONJE HEREDIA
SUPERINTENDENTE DE OBRA

REVISÓ

SUPERVISOR DE OBRA

AUTORIZO

ING. RUBIEL RINCÓN RAMOS
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS
DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA.

FECHA: 19/07/2025

DEPENDENCIA: **MUNICIPIO DE BADIRAGUATO**
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA

CROQUIS

CONTRATISTA: **SEIS-ONCE CONSTRUCTORA S. DE R.L. DE C.V.**

OBRA: INSTALACIONES DIVERSAS PARA LA ARENA BADIRAGUATO, INCLUYE: SISTEMA ANTITERMITA, RED DE AGUA POTABLE, RED DE SISTEMA DE DRENAJE Y ALUMBRADO PÚBLICO, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE BADIRAGUATO, SINALOA.


ESTIMACION: **01 (NORMAL) UNICA**

GBR33 POLIDUCTO NARANJA REFORZADO DE 1-1/4" DE DIÁMETRO, INCLUYE: EXCAVACIÓN EN ZANJA EN TERRENO TIPO B, RELLENO CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.

GBR34 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE XLP DS AL 3 CAL. 6 AWG, 600 VOLTS, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.

GBR35 INSTALACIÓN DE LUMINARIA, INCLUYE: BASE DE CONCRETO PIRAMIDAL DE 0.30X0.70X0.90 M., MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.

GBR36 REGISTRO PREFABRICADO DE CONCRETO DE 40X40X40 CM CON TAPA DE CONCRETO DE 6 CM DE ESPESOR, CON MARCO DE FIERRO GALVANIZADO DE 1 1/2"X1 1/2"X1/8" CONTRAMARCO DE ÁNGULO DE 1 1/4"X 1 1/4"X1/8", INCLUYE: SUMINISTRO, COLOCACIÓN, EXCAVACIÓN , RELLENO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.

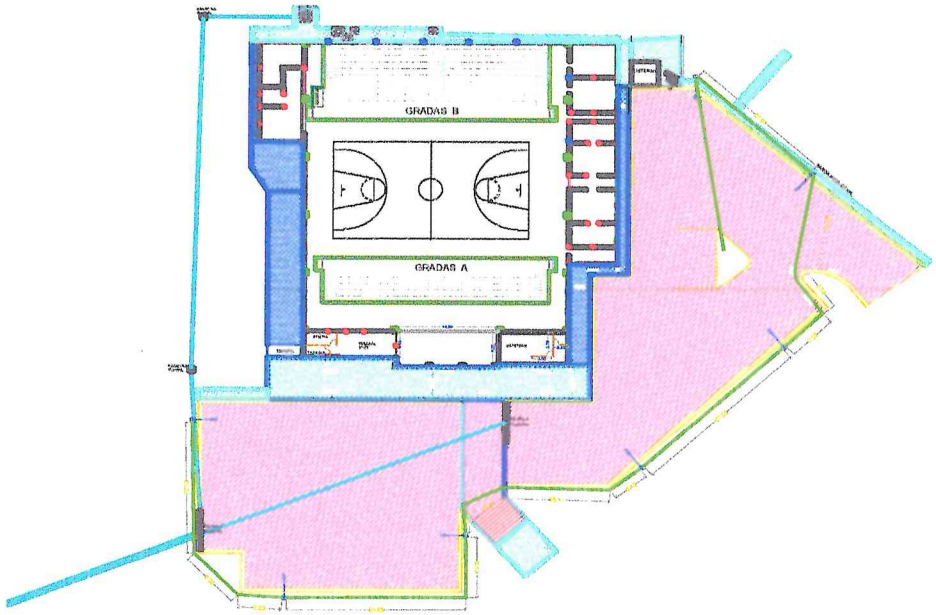

ELABORO

ING. JESUS YOVANNY MONJE HEREDIA
SUPERINTENDENTE DE OBRA

REVISÓ

SUPERVISOR DE OBRA

AUTORIZO

ING. RUBIEL RINCÓN RAMOS
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS
DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA.

FECHA: 19/07/2025

DEPENDENCIA: **MUNICIPIO DE BADIRAGUATO**
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA


CROQUIS

CONTRATISTA: **SEIS-ONCE CONSTRUCTORA S. DE R.L. DE C.V.**

OBRA: INSTALACIONES DIVERSAS PARA LA ARENA BADIRAGUATO, INCLUYE: SISTEMA ANTITERMITA, RED DE AGUA POTABLE, RED DE SISTEMA DE DRENAJE Y ALUMBRADO PÚBLICO, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE BADIRAGUATO, SINALOA.

ESTIMACION: **01 (NORMAL) UNICA**

GBR37 FABRICACION Y COLOCACION DE REJILLA PLUVIAL DE 1.90X0.50 M, INCLUYE: SOLDADURA, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTAS.

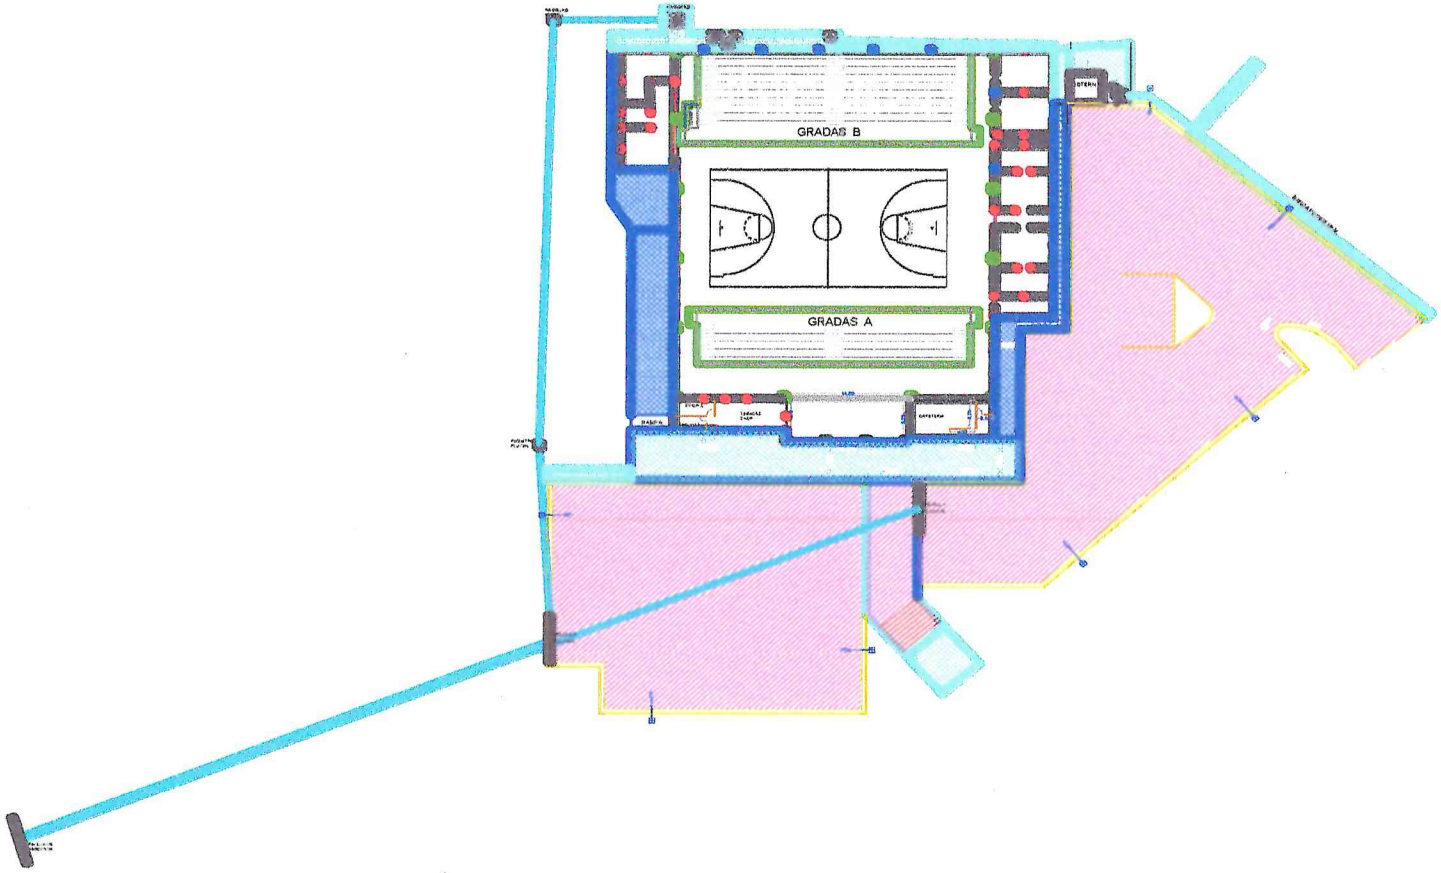

ELABORO

ING. JESUS YOVANNY MONJE HEREDIA
SUPERINTENDENTE DE OBRA

REVISÓ

SUPERVISOR DE OBRA

AUTORIZO

ING. RUBIEL RINCÓN RAMOS
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS
DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA.

FECHA: 19/07/2025

DEPENDENCIA: **MUNICIPIO DE BADIRAGUATO**
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA

REPORTE FOTOGRAFICO

CONTRATISTA: **SEIS-ONCE CONSTRUCTORA S. DE R.L. DE C.V.**

OBRA: INSTALACIONES DIVERSAS PARA LA ARENA BADIRAGUATO, INCLUYE: SISTEMA ANTITERMITA, RED DE AGUA POTABLE, RED DE SISTEMA DE DRENAJE Y ALUMBRADO PÚBLICO, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE BADIRAGUATO, SINALOA.


ESTIMACION: **01 (NORMAL) UNICA**

INSTALACIONES

GBR20 FABRICACIÓN DE MURO PANTALLA DE BLOCK 15x20x40 CMS (4 HILADAS), EN ACCESO PRINCIPAL DE LA ARENA, TERMINADO APLANADO FINO EN DOS CARAS CON MORTERO CEMENTO ARENA INCLUYE: DOS PARCHES DE MALLA DE METAL DESPLEGADO DE 2.03mX4.00M PARA CUBRIR VIGAS IPR, MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.

GBR21 ZAPATA AISLADA DE 1.80X1.80X0.30 MTS DE ESPESOR ARMADA CON VARILLA DE 1/2" @ 20 EN AMBAS DIRECCIONES A DOS LECHOS (DOBLE PARRILLA), COLADA CON CONCRETO HECHO EN OBRA CON F´C=250 KG/CM, INCLUYE: PLANTILLA DE CONCRETO SIMPLE, MANO DE OBRA, MATERIALES, HERRAMIENTA Y EQUIPO.

GBR22 DADO DE 60X60 DE 0.90 MTS DE ALTURA ARMADO CON CON 8 VARILLAS DE 5/8" Y ESTRIBOS DE VARILLA DE 3/8" @ 15 CMS ACABADO APARENTE, CON CONCRETO HECHO EN OBRA CON UN F´C=250 KG/CM2, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTAS.

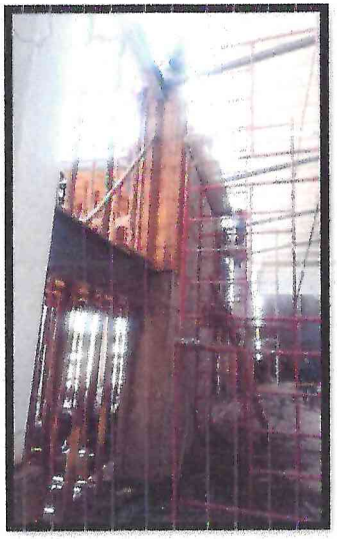





ELABORO

ING. JESUS YOVANNY MONJE HEREDIA
SUPERINTENDENTE DE OBRA

REVISÓ

SUPERVISOR DE OBRA

AUTORIZO

ING. RUBIEL RINCÓN RAMOS
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS
DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA.

FECHA: 19/07/2025

DEPENDENCIA: **MUNICIPIO DE BADIRAGUATO**
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA

REPORTE FOTOGRAFICO

CONTRATISTA: **SEIS-ONCE CONSTRUCTORA S. DE R.L. DE C.V.**

OBRA: INSTALACIONES DIVERSAS PARA LA ARENA BADIRAGUATO, INCLUYE: SISTEMA ANTITERMITA, RED DE AGUA POTABLE, RED DE SISTEMA DE DRENAJE Y ALUMBRADO PÚBLICO, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE BADIRAGUATO, SINALOA.


ESTIMACION: **01 (NORMAL) UNICA**


GBR23 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE FACHALETA GENERICA DE 7x14 Cm EN MUROS DE LADRILLO, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.

GBR25 INSTALACION DE TUBERIA DE PVC SERIE 20 DE 10" PARA COLECTOR PLUVIAL, INCLUYE: TRAZO, EXCAVACION, INSTALACION ACOSTILLADO, RELLENO COMPACTADO, MANO DE OBRA Y EQUIPO

GBR26 SUMINISTRO E INSTALACION DE TEJA DE BARRO MODELO WINDSOR CROWN, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.



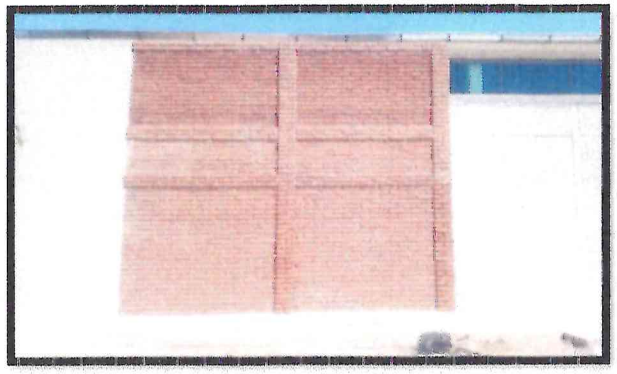



ELABORO

ING. JESUS YOVANNY MONJE HEREDIA
SUPERINTENDENTE DE OBRA

REVISÓ

SUPERVISOR DE OBRA

AUTORIZO

ING. RUBIEL RINCÓN RAMOS
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS
DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA.

FECHA: 19/07/2025

DEPENDENCIA: **MUNICIPIO DE BADIRAGUATO**
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA

REPORTE FOTOGRAFICO

CONTRATISTA: **SEIS-ONCE CONSTRUCTORA S. DE R.L. DE C.V.**

OBRA: INSTALACIONES DIVERSAS PARA LA ARENA BADIRAGUATO, INCLUYE: SISTEMA ANTITERMITA, RED DE AGUA POTABLE, RED DE SISTEMA DE DRENAJE Y ALUMBRADO PÚBLICO, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE BADIRAGUATO, SINALOA.

ESTIMACION: **01 (NORMAL) UNICA**

GBR27 SUMINISTRO E INSTALACION DE CANALETA LATERAL PARA CAPTAR EL AGUA DE LLUVIA EN LAMINA GALVANIZADA CALIBRE 20 (SEGUN MUESTRA) A UNA ALTURA PROMEDIO DE 7.00 MTS INCLUYE: CORTE, ROLADO, MATERIAL, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.

GBR28 SUMINISTRO E INSTALACION DE BAJANTES PLUVIALES DE TUBERIA DE PVC DE 6" DE DIÁMETRO, PARA CONDUCIR EL AGUA DE LLUVIA HACIA LOS REGISTROS PLUVIALES, INCLUIYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMMIENTA Y EQUIPO

GBR29 FABRICACIÓN DE REGISTRO PLUVIAL DE 100x100x100 Cm, FABRICADO CON TABIQUE RECOCIDO 7X14X28 Cm, TAPA DE PTR DE 2", CONTRAMARCO DE ANGULAR DE 2 1/2"X3/16", Y UNA PLANTILLA DE CONCRETO f'C = 250 Kg/Cm2, DE 10 Cm DE ESPESOR, ACABADO PULIDO FINO EN EL INTERIOR, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO

GBR30 FABRICACIÓN Y COLOCACIÓN DE BASE PARA TINA DE HIDROMASAJE DE 1.98X1.73 MTS Y 0.77 MTS DE ALTURA A BASE DE MURO DE BLOCK DE 15X20X40 CM CON UNA VAR. DE 3/8" @ 60 CM, RELLENA LAS CELDAS CON CONCRETO F'C= 150 KG/CM2 COLUMNA Y LOSA PERIMETRAL DE 20X7 CM COLADA CON CONCRETO F'C=250 KG/CM2, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.

GBR31 SUMINISTRO Y COLOCACION DE TINA, INCLUYE: LLAVES, CONTROLES, EQUIPO ELECTRICO, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.

GBR32 SUMINISTRO DE HIDRANTE 2780 VALV 5 1/4", 3 TOMAS (2-2 1/2-1-4 1/2)



ELABORO

ING. JESUS YOVANNY MONJE HEREDIA
SUPERINTENDENTE DE OBRA

REVISÓ

SUPERVISOR DE OBRA

AUTORIZO

ING. RUBIEL RINCÓN RAMOS
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS
DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA.

FECHA: 19/07/2025

DEPENDENCIA: **MUNICIPIO DE BADIRAGUATO**
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA

REPORTE FOTOGRAFICO

CONTRATISTA: **SEIS-ONCE CONSTRUCTORA S. DE R.L. DE C.V.**

OBRA: INSTALACIONES DIVERSAS PARA LA ARENA BADIRAGUATO, INCLUYE: SISTEMA ANTITERMITA, RED DE AGUA POTABLE, RED DE SISTEMA DE DRENAJE Y ALUMBRADO PÚBLICO, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE BADIRAGUATO, SINALOA.

ESTIMACION: **01 (NORMAL) UNICA**

GBR33 POLIDUCTO NARANJA REFORZADO DE 1-1/4" DE DIÁMETRO, INCLUYE: EXCAVACIÓN EN ZANJA EN TERRENO TIPO B, RELLENO CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.


GBR34 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE XLP DS AL 3 CAL. 6 AWG, 600 VOLTS, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.

GBR35 INSTALACIÓN DE LUMINARIA, INCLUYE: BASE DE CONCRETO PIRAMIDAL DE 0.30X0.70X0.90 M., MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.

GBR36 REGISTRO PREFABRICADO DE CONCRETO DE 40X40X40 CM CON TAPA DE CONCRETO DE 6 CM DE ESPESOR, CON MARCO DE FIERRO GALVANIZADO DE 1 1/2"X1 1/2"X1/8" CONTRAMARCO DE ÁNGULO DE 1 1/4"X 1 1/4"X1/8", INCLUYE: SUMINISTRO, COLOCACIÓN, EXCAVACIÓN , RELLENO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.

GBR37 FABRICACION Y COLOCACION DE REJILLA PLUVIAL DE 1.90X0.50 M, INCLUYE: SOLDADURA, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTAS.






ELABORO

ING. JESUS YOVANNY MONJE HEREDIA
SUPERINTENDENTE DE OBRA

REVISÓ

SUPERVISOR DE OBRA

AUTORIZO

ING. RUBIEL RINCÓN RAMOS
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS
DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA.

Cerrar Guardar Imprimir

BBVA

Fecha y hora de consulta 02/12/2025 2:54:36 PM

Contrato 00798320
Nombre del Cliente MUNICIPIO DE BADIRAGUATO

BBVA Net Cash - Pagos Interbancarios

Operación autorizada

Transferencia en proceso de validación y aplicación.

Datos del firmante

Usuario: ADMIN1 **Poder:** 100%

Datos de la operación

Tipo de operación: Pago Interbancario

Descripción: EST 01 NOR AD 005 **Importe de la operación:** 475,637.05 MXP

Cuenta de retiro: 0117899181 **Cuenta de depósito:** 030743900036659975

Divisa de la cuenta: MXP **Divisa de la cuenta:** MXP

Titular de la cuenta: MUNICIPIO DE BADIRAGUATO **Titular de la cuenta:** SEIS ONCE CONTRUCTORA S DE RL DE CV

Nombre banco destino: BAJIO

Fecha de creación: 02/12/2025 **Fecha de aplicación:** 02/12/2025

Concepto de pago: EST 01 NOR AD 005 **Referencia numérica:**

Instrumento de seguridad: ASD 6551749382 **Hora de captura en el canal:** 14:54:34

Datos de confirmación de la transferencia

Folio interbancario: 0000450522 **Clave de rastreo:** 0026010025120200000450522

Folio de firma: 0036619022 **Folio único:** I401202512021454340036619028

Estado operación

Porcentaje Firmado: 100% **Estado:** Operado

Detalle de firmas

Acción	Usuario	Porcentaje aportado	Fecha
CREO	ADMIN1	— %	02/12/2025
FIRMO	ADMIN1	100 %	02/12/2025
