SINALOA
GOBIERNO DEL ESTADO

ISIFE INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

0 FECHA 07/05/2026

CONTRATISTA:	DEPENDENCIA:
MARIO ERNESTO ORDUÑO ARMENTA	GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
DOMICILIO: BLVD.: ROSENDO G CASTRO, NO. 1753, COL. EL REALITO, LOS MOCHIS, AHOME,	INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
R.F.C. OUAM940929283	

RESÚMEN DE ESTIMACIÓN

No. DE PGO:	26201	No. DE OBRA:	260009	C.C.T.	25DPR1057N	ESTIMACIÓN:	02 (FINIQUITO)
PLANTEL:	PRIMARIA DIA DEL TRABAJO			LOCALIDAD:	PRIMERO DE MAYO	MUNICIPIO:	AHOME
DESCRIPCIÓN:	SUBESTACION ELECTRICA DE 150 KVA CON MEDIA Y BAJA TENSION EN PRIMARIA DIA DEL TRABAJO, UBICADA EN PRIMERO DE MAYO, MUNICIPIO DE AHOME, ESTADO DE SINALOA.						

IMPORTE DE OBRA:	$1,254,472.70
IMPORTE DE ANTICIPO DE OBRA:	$439,065.45
IMPORTE TOTAL DE CONTRATO:	$1,254,472.70

OBRA	IMPORTE
RECONSTRUCCION DE LOSAS Y REFORZAMIENTO DE EDIFICIO A	
RECONSTRUCCION DE LOSAS Y REFORZAMIENTO DE EDIFICIO A	
REHABILITACION ELECTRICA	$ 176,341.50
EXTRAORDINARIOS	$ 65,260.06
SUBTOTAL ESTIMACIÓN:	$ 241,601.56

POR CIERRE DE CONTRATO SOLO SE COBRARA LA CANTIDAD DE:

SUB TOTAL=	$ 241,601.56	SUB TOTAL=	$ 197,960.16
I.V.A AL 16 %	$ 38,656.25	I.V.A AL 16 %	$ 31,673.62
TOTAL =	$ 280,257.81	TOTAL =	$ 229,633.78

Mario Orduño

MARIO ERNESTO ORDUÑO ARMENTA
CONTRATISTA

Sandro Castro Madero

ING. SANDRO CASTRO MADERO
SUPERVISOR

SINALOA
GOBIERNO DEL ESTADO

ISIFE INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

FECHA 07/05/2026
HOJA:

CONTRATISTA:
MARIO ERNESTO ORDUÑO ARMENTA
DOMICILIO: BLVD.: ROSENDO G CASTRO, NO. 1753, COL. EL REALITO, LOS MOCHIS, AHOME, SINALOA. C.P. 81260.
R.F.C. OUAM940929283

DEPENDENCIA:
GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

DESGLOSE DE CONCEPTOS DE ESTIMACIÓN

No. DE PGO:	26201	No. DE OBRA:	260009	C.C.T.	25DPR1057N	ESTIMACIÓN:	02 (FINIQUITO)
PLANTEL:	PRIMARIA DIA DEL TRABAJO			LOCALIDAD:	PRIMERO DE MAYO	MUNICIPIO:	AHOME
DESCRIPCIÓN:	SUBESTACION ELECTRICA DE 150 KVA CON MEDIA Y BAJA TENSION EN PRIMARIA DIA DEL TRABAJO, UBICADA EN PRIMERO DE MAYO, MUNICIPIO DE AHOME, ESTADO DE SINALOA.						

IMPORTE DE OBRA:	$1,254,472.70
IMPORTE DE ANTICIPO DE OBRA:	$439,065.45
IMPORTE TOTAL DE CONTRATO:	$1,254,472.70

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	SEGUN PROYECTO VOL	PU	$	HASTA ESTA ESTIM	HASTA ESTIM ANT	EXCEDENTE	DE ESTA ESTIMACIÓN	IMPORTE
SUBESTACION ELECTRICA DE 150 KVA CON MEDIA Y BAJA TENSION EN PRIMARIA DIA DEL TRABAJO, UBICADA EN PRIMERO DE MAYO, MUNICIPIO DE AHOME, ESTADO DE SINALOA. "25DPR1057N"										
	REHABILITACION ELECTRICA									
XLP3+1CAL.3/0	SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE DE ALUMINIO XLP3+1CAL.3/0 +1 1/0, INCLUYE: CABLE DE ALUMINIO XLP3+1CAL.3/0+ 1 1/0, CINTA AISLANTE, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA,, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.	ML	225.00	416.4	93,690.00	204.00	0.00	-21.00	204.00	$84,945.60
51477	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE DE COBRE CON AISLAMIENTO THW CAL. #8	ML	390.00	92.01	35,883.90	217.50	0.00	-172.50	217.50	$20,012.18
ELEC.Q-20	SUMINISTRO E INSTALACION DE CENTRO DE CARGA 20 CIRC., INCLUYE: CENTRO DE CARGA 20 CIRC., MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.	PZA	5.00	14,326.14	71,630.70	4.00	0.00	-1.00	4.00	$57,304.56
51471	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE DE COBRE CON AISLAMIENTO CAL. # 4	ML	15.00	188.46	2,826.90	15.00	0.00	0.00	15.00	$2,826.90
51041	SUMINSTRO Y COLOCACION DE FOTOCELDA ELECTRICA, SENSOR DE LUZ.	PZA	15.00	906.39	13,595.85	5.00	0.00	-10.00	5.00	$4,531.95
SIS.T	SUMINISTRO Y COLOCACION DE SISTEMA DE TIERRA INCLUYE: VARILLA CADWELD DE 1.0 MTS SOLDADURA DE PLATA. MANO DE OBRA YHERRAMIENTA .	PZA	10.00	894.27	8,942.70	5.00	0.00	-5.00	5.00	$4,471.35
ALERPEL	LEYANDA ALERTA PELIGRO ALTO VOLTAJE	PZA	10.00	562.24	5,622.40	4.00	0.00	-6.00	4.00	$2,248.96
	EXTRAORDINARIOS					SUBTOTAL REHABILITACION ELECTRICA				$176,341.50
EXT01	SUMINISTRO E INSTALACION DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DE 3X125 AMPS. INCLUYE: INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 3X125 AMP., MANO DE OBRA HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION	PZA	0.00	11131.69	0.00	1.00	0.00	1.00	1.00	$11,131.69
EXT02	SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE DE COBRE THW CAL. 1/0 AWG. INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	ML	0.00	238.94	0.00	40.50	0.00	40.50	40.50	$9,677.07
EXT03	SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE DE COBRE THW CAL. 3/0 AWG. INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	ML	0.00	356.41	0.00	30.00	0.00	30.00	30.00	$10,692.30
EXT04	SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE DE COBRE THW CAL. 4/0 AWG. INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	ML	0.00	375.1	0.00	90.00	0.00	90.00	90.00	$33,759.00
							SUBTOTAL EXTRAORDINARIOS			$65,260.06
									TOTAL:	$241,601.56
								SUBTOTAL ESTIMACION		$241,601.56

Mario Orduño
MARIO ERNESTO ORDUÑO ARMENTA
Contratista

Sandro Castro Madero
ING. SANDRO CASTRO MADERO
Supervisor

SINALOA
GOBIERNO DEL ESTADO

FINIQUITO DE OBRA

ISIFE INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

0 HOJA: Fecha: 07-may-26

CONTRATISTA:
MARIO ERNESTO ORDUÑO ARMENTA
DIRECCION: BLVD.: ROSENDO G CASTRO, NO. 1753, COL. EL REALITO, LOS MOCHIS, AHOME, SINALOA. C.P. 81260.
R.F.C.
OUAM940929283

DEPENDENCIA:
GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

FINIQUITO DE OBRA

PGO: 26201 No DE OBRA: 260009
PLANTEL: PRIMARIA DIA DEL TRABAJO LOCALIDAD: PRIMERO DE MAYO MUNICIPIO: AHOME
DESCRIPCIÓN: SUBESTACION ELECTRICA DE 150 KVA CON MEDIA Y BAJA TENSION EN PRIMARIA DIA DEL TRABAJO, UBICADA EN PRIMERO DE MAYO, MUNICIPIO DE AHOME, ESTADO DE SINALOA.
PERIODO DE CONTRATO: DEL: 09-mar-26 AL: 07-may-26 CONTRATO: ISIFE-FAM-ADE-EPR-013-2026 FECHA DE CONTRATO: 02-mar-26

IMPORTE DE OBRA: $ 1,254,472.70 CONVENIO ADICIONAL:
IMPORTE DE ANTICIPO DE OBRA: $ 439,065.45 PERÍODO CONVENIO ADICIO DEL: AL:
IMPORTE TOTAL DE CONTRATO: $ 1,254,472.70 TOTAL CONTRATO MÁS CONVENIO:

CLAVE	CONCEPTO	U	SEGUN PROYECTO			OBRA NORMAL		OBRA ADICIONAL		OBRA EXTRAORDINARIA		CANT. TOTALES	IMPORTE TOTALES
			VOL	PU	IMORTE	CANT.	IMPORTE	CANT.	IMPORTE	CANT.	IMPORTE		
	SUBESTACION ELECTRICA DE 150 KVA CON MEDIA Y BAJA TENSION EN PRIMARIA DIA DEL TRABAJO, UBICADA EN PRIMERO DE MAYO, MUNICIPIO DE AHOME, ESTADO DE SINALOA. "26DPR1057N"												
	REHABILITACION ELECTRICA												
DCX.TRNSF	DESCONEXION DE LINEAS DE ALIMENTACION A TRANSFORMADOR EXISTENTE, INCLUYE: MAQUINARIA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	1.00	6,615.09	6,615.09	1.00	$6,615.09	0.00	$0.00	0.00	$0.00	1.00	$6,615.09
RET.CABLSEC	RETIRO DE CABLEADO DE RED SECUNDARIA EN MAL ESTADO INCLUYE: RETIRO DE CABLEADO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y	ML	125.00	79.27	9,908.75	125.00	$9,908.75	0.00	$0.00	0.00	$0.00	125.00	$9,908.75
80035	REORDENAMIENTO Y BALANCEO DE CARGA DE MURETE DE ACOMETIDA, INCL. CONEXIÓN Y PRUEBA.	PZA	1.00	7,581.32	7,581.32	1.00	$7,581.32	0.00	$0.00	0.00	$0.00	1.00	$7,581.32
83127	REVISION GENERAL DE INSTALACION ELECTRICA INCLUYE: CHECAR CORTOS CIRCUITOS Y TODO LONECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.	SAL	1.00	2,940.51	2,940.51	1.00	$2,940.51	0.00	$0.00	0.00	$0.00	1.00	$2,940.51
DST.TRANSF	DESINSTALACION DE TRANSFORMADOR EXISTENTE CON LINEAS DE ALIMENTACION A INTERRUPTOR PRINCIPAL, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.	PZA	1.00	11,083.37	11,083.37	1.00	$11,083.37	0.00	$0.00	0.00	$0.00	1.00	$11,083.37
TRANSF-150	INSTALAR TRANSFORMADOR 150 KVA TRIFASICO TIPO POSTE 13 200/220/127.	PZA	1.00	189,239.92	189,239.92	1.00	$189,239.92	0.00	$0.00	0.00	$0.00	1.00	$189,239.92
POSTE	INSTALAR POSTE DE CONCRETO 9-450 SIN PROTOCOLO	PZA	1.00	14,906.18	14,906.18	1.00	$14,906.18	0.00	$0.00	0.00	$0.00	1.00	$14,906.18
PARRILLA	INSTALAR PARRILLA GALVANIZADA DE 1.30 X 0.60 MTS.	PZA	1.00	14,401.44	14,401.44	1.00	$14,401.44	0.00	$0.00	0.00	$0.00	1.00	$14,401.44
XLP3+1CAL 3/0	SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE DE ALUMINIO XLP3+1CAL 3/0 +1 1/0, INCLUYE: CABLE DE ALUMINIO XLP3+1CAL 3/0+ 1 1/0, CINTA AISLANTE, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA,, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.	ML	225.00	416.4	93,690.00	204.00	$84,945.60	0.00	$0.00	0.00	$0.00	204.00	$84,945.60
51477	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE DE COBRE CON AISLAMIENTO THW CAL. #8	ML	390.00	92.01	35,883.90	217.50	$20,012.18	0.00	$0.00	0.00	$0.00	217.50	$20,012.18
3	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ALAMBRE DE COBRE CAL 4	KG	5.00	398.28	1,991.40	5.00	$1,991.40	0.00	$0.00	0.00	$0.00	5.00	$1,991.40
INT.D3X300	SUMINISTRO E INSTALACION DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 3X300 AMP, INCLUYE: INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 3X300 AMP, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.	PZA	1.00	28,682.15	28,682.15	1.00	$28,682.15	0.00	$0.00	0.00	$0.00	1.00	$28,682.15
INT.D3X100	SUMINISTRO E INSTALACION DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DE 3X100 AMPS. INCLUYE: INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 3X100 AMP., MANO DE OBRA HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION	PZA	4.00	11,131.69	44,526.76	2.00	$22,263.38	0.00	$0.00	0.00	$0.00	2.00	$22,263.38

Mario Orduño

ELEC. 095	SUMINISTRO E INSTALACION DE BARRA DE COBRE PARA LA CONEXION DE CABLES DE NEUTROS Y DE TIERRAS FISICAS. INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	1.00	489.89	489.89	1.00	$489.89	0.00	$0.00	0.00	$0.00	1.00	$489.89
ELEC. M5	MURETE DE MEDICIÓN CON GABINETE M-5 PARA INTEMPERIE DE LAMINA ANTICORROSIVA	PZA	1.00	22,752.70	22,752.70	1.00	$22,752.70	0.00	$0.00	0.00	$0.00	1.00	$22,752.70
ELEC. M10	MURETE DE MEDICIÓN CON GABINETE M-10 PARA INTEMPERIE DE LAMINA ANTICORROSIVA	PZA	1.00	25,618.14	25,618.14	1.00	$25,618.14	0.00	$0.00	0.00	$0.00	1.00	$25,618.14
PWE.B LOCK	SUMINISTRO Y COLOCACION DE POWER BLOCK DE DISTRIBUCION. INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	1.00	19,101.35	19,101.35	1.00	$19,101.35	0.00	$0.00	0.00	$0.00	1.00	$19,101.35
BM.13-200	SUMINISTRO E INSTALACION DE BASE PARA MEDICION 13-200, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	PZA	1.00	18,105.86	18,105.86	1.00	$18,105.86	0.00	$0.00	0.00	$0.00	1.00	$18,105.86
ELEC. Q-20	SUMINISTRO E INSTALACION DE CENTRO DE CARGA 20 CIRC., INCLUYE: CENTRO DE CARGA 20 CIRC., MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.	PZA	5.00	14,326.14	71,630.70	4.00	$57,304.56	0.00	$0.00	0.00	$0.00	4.00	$57,304.56
51471	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE DE COBRE CON AISLAMIENTO CAL. # 4	ML	15.00	188.46	2,826.90	15.00	$2,826.90	0.00	$0.00	0.00	$0.00	15.00	$2,826.90
DSINT. LUM	DESCONEXION Y RETIRO DE LUMINARIAS EN MAL ESTADO POR DAÑO EN AULA, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	60.00	406.61	24,396.60	60.00	$24,396.60	1.00	$406.61	0.00	$0.00	61.00	$24,803.21
EXC.T P-B	EXCAVACIÓN A MANO EN TERRENO TIPO "B" PARA ZANJA DE 30X40 CMS, INCLUYE: NIVELACIÓN AFINE, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	ML	150.00	137.91	20,686.50	150.00	$20,686.50	50.40	$6,950.66	0.00	$0.00	200.40	$27,637.16
RELL. EXC	RELLENO Y COMPACTACION DE MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION. INCLUYE: MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION,MANO DE OBRA, HERRAMIENTA YTOD LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	ML	150.00	114.92	17,238.00	150.00	$17,238.00	50.40	$5,791.97	0.00	$0.00	200.40	$23,029.97
ELEC. POL2"-1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE POLIDUCTO ALTA DENSIDAD DE 2" O 3" PARA ALIMENTADOR PRINCIPAL, INCLUYE: POLIDUCTO ALTA DENSIDAD, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	MTS	150.00	235.52	35,328.00	150.00	$35,328.00	50.40	$11,870.21	0.00	$0.00	200.40	$47,198.21
ELEC. SALLUM	SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA DE ALUMBRADO (CONEXIÓN LUMINARIOS) PARA AULAS, INCLUYE: CABLE DE COBRE THW-LS CAL 12, CABLE DE COBRE CAL 14, MATERIAL DE FIJACION, CINTA AISLANTE, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.	PZA	75.00	1,667.18	125,038.50	75.00	$125,038.50	1.00	$1,667.18	0.00	$0.00	76.00	$126,705.68
REG.P 60X60	SUMINISTRO E INSTALACION DE REGISTRO DE CONCRETO PREFABRICADO 60X60 CM, INCLUYE; REGISTRO DE CONCRETO PREFABRICADO 60X60 CM, NIVELADO DE TERRENO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.	PZA	1.00	5,422.45	5,422.45	1.00	$5,422.45	5.00	$27,112.25	0.00	$0.00	6.00	$32,534.70
ELEC. LUM17 W	SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIO 2X17 W A PRUEBA DE POLVO Y HUMEDAD, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.	PZA	60.00	2,696.80	161,808.00	60.00	$161,808.00	1.00	$2,696.80	0.00	$0.00	61.00	$164,504.80
REFLE C.100 W	SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIA DE 100 W, INCLUYE: LUMINARIA DE 100 W, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.	PZA	15.00	2,759.11	41,386.65	15.00	$41,386.65	0.00	$0.00	0.00	$0.00	15.00	$41,386.65

Mario Arduto

51041	SUMINSTRO Y COLOCACION DE FOTOCELDA ELECTRICA, SENSOR DE LUZ.	PZA	15.00	906.39	13,595.85	5.00	$4,531.95	0.00	$0.00	0.00	$0.00	5.00	$4,531.95
SIS.T	SUMINISTRO Y COLOCACION DE SISTEMA DE TIERRA INCLUYE: VARILLA CADWELD DE 1.0 MTS SOLDADURA DE PLATA. MANO DE OBRA YHERRAMIENTA .	PZA	10.00	894.27	8,942.70	5.00	$4,471.35	0.00	$0.00	0.00	$0.00	5.00	$4,471.35
ALERPEL	LEYANDA ALERTA PELIGRO ALTO VOLTAJE	PZA	10.00	562.24	5,622.40	4.00	$2,248.96	0.00	$0.00	0.00	$0.00	4.00	$2,248.96
	EXTRAORDINARIOS												
EXT01	SUMINISTRO E INSTALACION DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DE 3X125 AMPS. INCLUYE: INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 3X125 AMP., MANO DE OBRA HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION	PZA	0.00	11131.69	0.00	0.00	$0.00	0.00	$0.00	1.00	$11,131.69	1.00	$11,131.69
EXT02	SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE DE COBRE THW CAL. 1/0 AWG. INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	ML	0.00	238.94	0.00	0.00	$0.00	0.00	$0.00	40.50	$9,677.07	40.50	$9,677.07
EXT03	SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE DE COBRE THW CAL. 3/0 AWG. INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	ML	0.00	356.41	0.00	0.00	$0.00	0.00	$0.00	30.00	$10,692.30	30.00	$10,692.30
EXT04	SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE DE COBRE THW CAL. 4/0 AWG. INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	ML	0.00	375.1	0.00	0.00	$0.00	0.00	$0.00	90.00	$33,759.00	90.00	$33,759.00
					$1,081,441.98		**$1,003,327.65**		**$56,495.69**		**$65,260.06**		**$1,125,083.39**
		IVA 16%			**$173,030.72**		**$160,532.42**		**$9,039.31**		**$10,441.61**		**$180,013.34**
		TOTAL:			**$1,254,472.70**		**$1,163,860.07**		**$65,534.99**		**$75,701.67**		**$1,305,096.73**
				SALDO DE CONTRATO:	$50,624.03								

C. MARIO ERNESTO ORDUÑO ARMENTA
MARIO ERNESTO ORDUÑO ARMENTA
Contratista

ING. SANDRO CASTRO MADERO
Supervisor

SINALOA
GOBIERNO DEL ESTADO

ISIFE INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

ACTA ADMINISTRATIVA DE EXTINCIÓN DE DERECHOS Y OBLIGACIONES
CONTRATO No. ISIFE-FAM-ADE-EPR-013-2025.

En la ciudad de Culiacán, Sinaloa, siendo las 12:00 horas del día viernes 8 de mayo de 2026, se reunieron en las Oficinas del Instituto Sinaloense de la Infraestructura Física Educativa ubicadas en Bahía de Navachiste 609 Pte., Col. Balcones del Nuevo Culiacán, Culiacán, Sinaloa, las personas físicas y/o morales y servidores públicos, cuyos nombres, cargos, representaciones y firmas figuran al final de la presente acta, con el propósito de dar por extinguidos los derechos y obligaciones del contrato No. **ISIFE-FAM-ADE-EPR-013-2026.**

Con fundamento en el artículo 86 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Sinaloa, y en los artículos 120 último párrafo y 122 de su Reglamento, así como en la cláusula Vigésima Sexta del contrato **ISIFE-FAM-ADE-EPR-013-2026**; cuyo objeto se describe a continuación, así como los trabajos realizados por la contratista **Mario Ernesto Orduño Armenta**, adjudicada del contrato y algunos datos que se consideran relevantes:

P.G.O.	NO. DE OBRA	IMPORTE	OBJETO DEL CONTRATO
26201	260009	$ 1'254,472.70	SUBESTACION ELECTRICA DE 150 KVA CON MEDIA Y BAJA TENSION EN PRIMARIA DIA DEL TRABAJO, UBICADA EN PRIMERO DE MAYO, MUNICIPIO DE AHOME, ESTADO DE SINALOA.

(260009). Recursos aportados por el Gobierno del Estado de Sinaloa, mediante Oficio de Autorización No. SAF-agf-002/2026, de fecha 11 de febrero de 2026, con cargo al programa fondo de aportaciones múltiples 2026 nivel básica.

Los trabajos que por este acto se entregan, son todos aquellos relacionados con el Contrato de Obra Pública a Base de Precios Unitarios y Tiempo Determinado, celebrado con fecha 02 de marzo de 2026, entre el Instituto Sinaloense de la Infraestructura Física Educativa y la contratista **Mario Ernesto Orduño Armenta**, relacionando forma y fecha de cumplimiento de obligaciones correspondientes.

A) El importe contratado fue por la cantidad de $ 1'254,472.70

B) El plazo contractual para la ejecución de los trabajos, fue de 60 días naturales, con fecha de inicio el 9 de marzo de 2026 y conclusión el 7 de mayo de 2026.

C) La Entrega –Recepción formal de los trabajos realizados en la obra **260009,** se llevó a cabo el día 7 de mayo de 2026.

D) Con fechas 7 de mayo DE 2026 se llevó a cabo la elaboración de los finiquitos correspondientes a la obra **260009**

E) La Póliza de Fianza (3510-03270-7) emitida por Aseguradora Aserta, S.A. de C.V., además de garantizar ante el ISIFE, por la contratista **Mario Ernesto Orduño Armenta**, el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones pactadas en el contrato, garantiza la Buena Calidad, Defectos de Construcción, Vicios Ocultos y cualquier otra Responsabilidad en que incurra la contratista, por lo que esta Póliza de Fianza permanecerá vigente de acuerdo a la normatividad aplicable.

F) Los pagos efectuados a la empresa contratista, por la ejecución de los trabajos, se realizaron como se indica:

No. DE OBRA	EST. No.	PERIODO QUE COMPRENDE		MONTO ESTIMADO Y PAGADO (CON IVA)
		DEL	AL	
260009	**ANTICIPO**			**$ 439,065.45**
260009	01	09/03/2026	08/04/2026	$ 666,145.30
260009	02 finiquito	09/04/2026	07/05/2026	$ 149,261.95
			Subtotal:	$ 1'254,472.70
			TOTAL:	$ 1'254,472.70

Ambas partes manifiestan en este acto, que a la fecha en que se firma el presente documento, no existen adeudos y, por lo tanto, se dan por terminadas las obligaciones que genero el contrato **ISIFE-FAM-ADE-EPR-013-2026 sin** derecho a ulterior reclamación, por lo que se podrán cancelar las garantías correspondientes, sin perjuicio del derecho del Instituto Sinaloense de la Infraestructura Física Educativa de hacer valer las que garanticen los Defectos, Vicios Ocultos y demás responsabilidades que pudieran resultar.

Visto lo anterior, se da por terminada esta diligencia, siendo las 14:00 catorce horas del día 08 de mayo de 2026, en la ciudad de Culiacán, municipio de Culiacán, estado de Sinaloa, levantándose la presente Acta Administrativa de Extinción de Derechos y Obligaciones del contrato **ISIFE-FAM-ADE-EPR-013-2026.**

, firmando al calce los que en ella intervinieron.

Sandro Castro Madero

Ing. Sandro Castro Madero

ING. JOAQUIN OMAR MURRIETA CASTRO

SINALOA
GOBIERNO DEL ESTADO

ISIFE INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

Supervisor de Obra

Director de Infraestructura

Mario Orduño

Lic. Mario Ernesto Orduño Armenta
Contratista

Sandra Castro Madon

Esta hoja forma parte integrante Acta Administrativa de Extinción de Derechos y Obligaciones del Contrato No. **ISIFE-FAM-ADE-EPR-013-2026 de** fecha 02 DE marzo de 2026.

SINALOA
GOBIERNO DEL ESTADO

INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

ISIFE INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

ACTA DE RECEPCIÓN CONTRATISTA-ISIFE

NOMBRE DE LA OBRA DE ACUERDO AL CONTRATO:	SUBESTACION ELECTRICA DE 150 KVA CON MEDIA Y BAJA TENSION EN PRIMARIA DIA DEL TRABAJO, UBICADA EN PRIMERO DE MAYO, MUNICIPIO DE AHOME, ESTADO DE SINALOA.				
PROGRAMA	FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES 2026 NIVEL BASICA				
Nº DE OBRA:	260009		AUTORIZACIÓN SAF:	SAF-AGF-002/2026	
NOMBRE DE ESCUELA:	PRIMARIA DIA DEL TRABAJO		CLAVE DE ESCUELA:	25DPR1057N	
MUNICIPIO:	AHOME		LOCALIDAD:	PRIMERO DE MAYO	
NÚMERO DE CONTRATO:	ISIFE-FAM-ADE-EPR-013-2026		MONTO:	$	1,254,472.70
CONTRATISTA:	MARIO ERNESTO ORDUÑO ARMENTA				
COMPAÑÍA AFIANZADORA:	ASEGURADORA ASERTA SA DE CV	ANTICIPO	$439,065.45	CUMPLIMIENTO	$125,447.27
PERIODO CONTRATO:	INICIO: 09-03-26		TÉRMINO:	07-05-26	
NÚMERO DE CONVENIO:			MONTO:		
PERIODO CONVENIO:	INICIO:		TÉRMINO:		

IMPORTE:		RESUMEN DE ESTIMACIONES:			
CONTRATADO:	$1,254,472.70	PERIODO:		NÚMERO:	MONTO:
CONVENIDO:	$0.00	9 de marzo de 2026	8 de abril de 2026	ESTIMACION 01	$1,024,838.92
EJERCIDO:	$1,254,472.70	9 de abril de 2026	7 de mayo de 2026	ESTIMACION 2 (FINIQUITO)	$229,633.78
SALDO QUE SE CANCELA:	$0.00				
			TOTALES:	2	$1,254,472.70

EN LA LOCALIDAD DE PRIMERO DE MAYO MUNICIPIO DE AHOME ESTADO DE SINALOA, SIENDO LAS 12:00 HORAS DEL DÍA 7 DEL MES DE MAYO DEL AÑO 2026

SE REUNIERON LOS ASISTENTES PARA PROCEDER A REALIZAR LA INSPECCIÓN FÍSICA DE LA OBRA EN CUESTIÓN, EL ISIFE DENTRO DE LOS TÉRMINOS DEL CONTRATO Y DE SUS DISPOSICIONES GENERALES, RECIBE A SU ENTERA SATISFACCIÓN, LO CUAL NO EXIME A LA EMPRESA EJECUTORA DE RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS. POR SU PARTE EL CONTRATISTA MANIFIESTA NO TENER RECLAMACIÓN ALGUNA.

SIN OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DEJA CONSTANCIA DE LO ANTES SEÑALADO Y SE FIRMA EN TRES FOJAS ÚTILES, POR QUIENES INTERVINIERON EN ESTE ACTO.

RECIBE POR ISIFE:

Sandro Castro Madero

ING. SANDRO CASTRO MADERO
SUPERVISOR

ENTREGA POR LA EMPRESA:

Mario Orduño

MARIO ERNESTO ORDUÑO ARMENTA
CONTRATISTA

T E S T I G O S

ING. JOAQUIN OMAR MURRIETA CASTRO
DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA

SINALOA
GOBIERNO DEL ESTADO

INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

ISIFE INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

ACTA DE ENTREGA
ISIFE-PLANTEL-SEPyC

M.S.V

NOMBRE DE LA OBRA DE ACUERDO AL CONTRATO:	SUBESTACION ELECTRICA DE 150 KVA CON MEDIA Y BAJA TENSION EN PRIMARIA DIA DEL TRABAJO, UBICADA EN PRIMERO DE MAYO, MUNICIPIO DE AHOME, ESTADO DE SINALOA.				
PROGRAMA:	FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES 2026 NIVEL BASICA				
Nº DE OBRA:	260009		AUTORIZACIÓN SAF:	SAF-AGF-002/2026	
NOMBRE DE ESCUELA:	PRIMARIA DIA DEL TRABAJO		CLAVE DE ESCUELA:	25DPR1057N	
MUNICIPIO:	AHOME		LOCALIDAD:	PRIMERO DE MAYO	
NÚMERO DE CONTRATO:	ISIFE-FAM-ADE-EPR-013-2026		MONTO:	$1,254,472.70	
CONTRATISTA:	MARIO ERNESTO ORDUÑO ARMENTA				
COMPAÑÍA AFIANZADORA:	ASEGURADORA ASERTA SA DE CV	ANTICIPO	$439,065.45	CUMPLIMIENTO	$125,447.27
PERIODO CONTRATO:	INICIO: 9 de marzo de 2026		TÉRMINO:	7 de mayo de 2026	
NÚMERO DE CONVENIO:			MONTO:		
PERIODO CONVENIO:	INICIO:		TÉRMINO:		

IMPORTE:		RESUMEN DE ESTIMACIONES:			
CONTRATADO:	$1,254,472.70	PERIODO:		NÚMERO:	MONTO:
CONVENIDO:	$0.00	9 de marzo de 2026	8 de abril de 2026	ESTIMACION 01	$1,024,838.92
EJERCIDO:	$1,254,472.70	9 de abril de 2026	7 de mayo de 2026	ESTIMACION 2 (FINIQUITO)	$229,633.78
SALDO QUE SE CANCELA:	$0.00				
			TOTALES:	2	$1,254,472.70

EN LA LOCALIDAD DE PRIMERO DE MAYO MUNICIPIO DE AHOME ESTADO DE SINALOA, SIENDO LAS 12:00 HORAS DEL DÍA 7 DEL MES DE MAYO DEL AÑO 2026 SE REUNIERON LOS ASISTENTES PARA PROCEDER A REALIZAR LA INSPECCIÓN FÍSICA DE LA OBRA EN CUESTIÓN, EL DIRECTOR DEL PLANTEL, RECIBE A SU ENTERA SATISFACCIÓN, LO CUAL NO EXIME A LA EMPRESA EJECUTORA DE RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS. POR SU PARTE EL CONTRATISTA MANIFIESTA NO TENER RECLAMACIÓN ALGUNA.

SIN OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DEJA CONSTANCIA DE LO ANTES SEÑALADO Y SE FIRMA EN TRES FOJAS ÚTILES, POR QUIENES INTERVINIERON EN ESTE ACTO.

ENTREGA POR ISIFE:

ARQ. HUGO ECHAVE MENESES
DIRECTOR GENERAL DEL ISIFE

ING. JOAQUIN OMAR MURRIETA CASTRO
DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA

RECIBE POR PLANTEL:

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA Y CULTURA
SINALOA
ESCUELA PRIMARIA URBANA MAT. "DÍA DEL TRABAJO" Clave: 25DPR1057N Ejido 1ro. de Mayo Ahome, Sinaloa

PROFR. ALEJANDRO MENDOZA ARMENTA
DIRECTOR DEL PLANTEL

RECIBE POR SEPyC:

MC. PAULINA PEÑA PAYAN
SUBSECRETARIA DE PLANEACIÓN EDUCATIVA

SINALOA
GOBIERNO DEL ESTADO

RDI-03-09

ISIFE-FAM-ADE-EPR-013-2026

SUBESTACION ELECTRICA DE 150 KVA CON MEDIA Y BAJA TENSION EN PRIMARIA DIA DEL TRABAJO, UBICADA EN PRIMERO DE MAYO, MUNICIPIO DE AHOME, ESTADO DE SINALOA.

OBRA: 260009 PGO: 26201

CONTRATISTA: MARIO ERNESTO ORDUÑO ARMENTA

BITÁCORA

IMPORTE DE C.$1'254,172.70

INICIO: 9/03/2026

TERMINO: 7/05/2026

ISIFE INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

Archivo:	Retención:	Versión:
Dirección de Infraestructura	Dos Años	02

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

PROGRAMA: FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES 2026 NIVEL BASICA

DATOS GENERALES:

NOMBRE DE LA ESCUELA: PRIM. DIA DEL TRABAJO

CLAVE DEL CENTRO DE TRABAJO: 25DPR1057H

ZONA ESCOLAR:

UBICACIÓN:

DOMICILIO:

LOCALIDAD: PRIMERO DE MAYO

MUNICIPIO: AHOME

TIPO DE OBRA:

OBRA ELECTRICA ☐

☐

REGISTRO DE FIRMAS

COORDINACIÓN

NOMBRE	DEPENDENCIA	FIRMA
ING. SANDRO CASTRO MADERO	ISIFE	
	Sandro Castro Madero	

SUPERVISIÓN

NOMBRE	DEPENDENCIA	FIRMA
ING. SANDRO CASTRO MADERO	ISIFE	
	Sandro Castro Madero	

BITÁCORA DE OBRA

PGO No. 26201 OBRA No. 260009 No. 001

FECHA 9/03/2026

CON ESTA FECHA SE VISITO EL PLANTEL EN COMPAÑIA DE LA CONTRATISTA PARA DAR INICIO A LOS TRABAJOS DEL CONTRATO DE ACUERDO AL CATALOGO DE CONCEPTOS AUTORIZADOS

CONTRATO: ISIFE-FAM-ADE-EPR-013-2026

Mario Ochoa

CONTRATISTA

Sandra Castro Maden

SUPERVISOR

BITÁCORA DE OBRA

PGO No. 26201 OBRA No. 260009 No. 002

FECHA 19/3/26

EN VISITA DE OBRA SE OBSERVAN LOS TRABAJOS DE RETIRO Y DESCONEXION DE TRANSFORMADOR EXISTENTE, ASI COMO LA COLOCACION DE POSTE DE CONCRETO, PARRILLA P/TRANSFORMADOR ASI COMO INSTALACION DE TRANSFORMADOR NUEVO DE 150 KVA, ASI TAMBIEN EL CABLEADO NUEVO DE TRANSFORMADOR A BASE DE MEDICIÓN.

Mario Ochoa
CONTRATISTA

Santin Castro Madera
SUPERVISOR

BITÁCORA DE OBRA

PGO No. 26201 OBRA No. 260009 No. 003

FECHA 30/3/26

EN VISITA DE OBRA SE OBSERVA QUE SE ENCUENTRAN INSTALADOS LOS GABINETES MS y M10 ASI COMO LA BASE DE MEDICION 13-200, TC's, INTERRUPTORES 3x300 AMPS (UNA PIEZA) 3x100 AMPS (3 PIEZAS) BARRA DE COBRE.

SE ENCUENTRA TAMBIEN LA EXCAVACION Y COLOCACION DE REGISTROS 60X60 ASI COMO LA TUBERIA DE 3" SE ENCUENTRA RETIRANDO LAS LAMPARAS EN MAL ESTADO.

Mario Ordaz
CONTRATISTA

Sandra Castro Madon
SUPERVISOR

BITÁCORA DE OBRA

PGO No. 26201 OBRA No. 760009 No. 005

FECHA 9/4/26

CON ESTA FECHA SE EFECTUA VISITA AL PLANTEL LA CONTRATISTA SE ENCUENTRA INSTALANDO EL CABLE XLP 3#1 CAL 1/0 Y EL CABLE DE COBRE #8.

SE HACE REVISION FISICA DEL PLANTEL.

Maira Octavo

Sandra Castro Madera

contratista.

BITÁCORA DE OBRA

PGO No. 26201 **OBRA No.** 260009 **No. 006**

FECHA 18/4/26

CON ESTA FECHA SE HACE REVISION FISICA DE LOS TRABAJOS EN EL PLANTEL.
LA CONTRATISTA ESTA LLEVANDO A CABO LA INSTALACION DE CENTROS DE CARGA DE 20 CIRCUITOS EN LOS DIFERENTES MODULOS DE AULAS EN TOTAL SE INSTALARON 4 CENTROS DE CARGAS

Mario Ortuno

Sandra Castro Maden

BITÁCORA DE OBRA

PGO No. 26201 OBRA No. 260009 No. 007

FECHA 23/4/26

SE LLEVA A CABO VISITA AL PLANTEL PARA VER EL AVANCE QUE SE TIENE A LA FECHA, LA CONTRATISTA ESTA LLEVANDO A CABO LA INSTALACION DE VARILLAS DE TIERRA (5 PZAS) Y FOTOCELDAS EN LAS LUMINARIAS DE 100 WATTS (5 PZAS). TAMBIEN SE TIENEN COLOCADAS LAS CALCOMANIAS CON LA LEYENDA DE PELIGRO (4 PZAS).

Mario Oidano

Contratista

Sandra Castro Maden

BITÁCORA DE OBRA

PGO No. 26201 OBRA No. 260009 No. 008

FECHA 30/1/26

CON LA PRESENCIA DE LA CONTRATISTA SE LLEVA A CABO VISITA AL PLANTEL

LA CONTRATISTA ESTA LLEVANDO A CABO LA INSTALACION DE (1 PZA) INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 3x125 AMP. ASI TAMBIEN LA INSTALACION DEL CABLEADO DE M5-R1 Y DE TRANSFORMADOR A INTERRUPTOR PPAL CON CABLE 1/0, 3/0 y 4/0.

Mario Olmo

Contratista

Sandra Castro Madera

SUPERVISOR

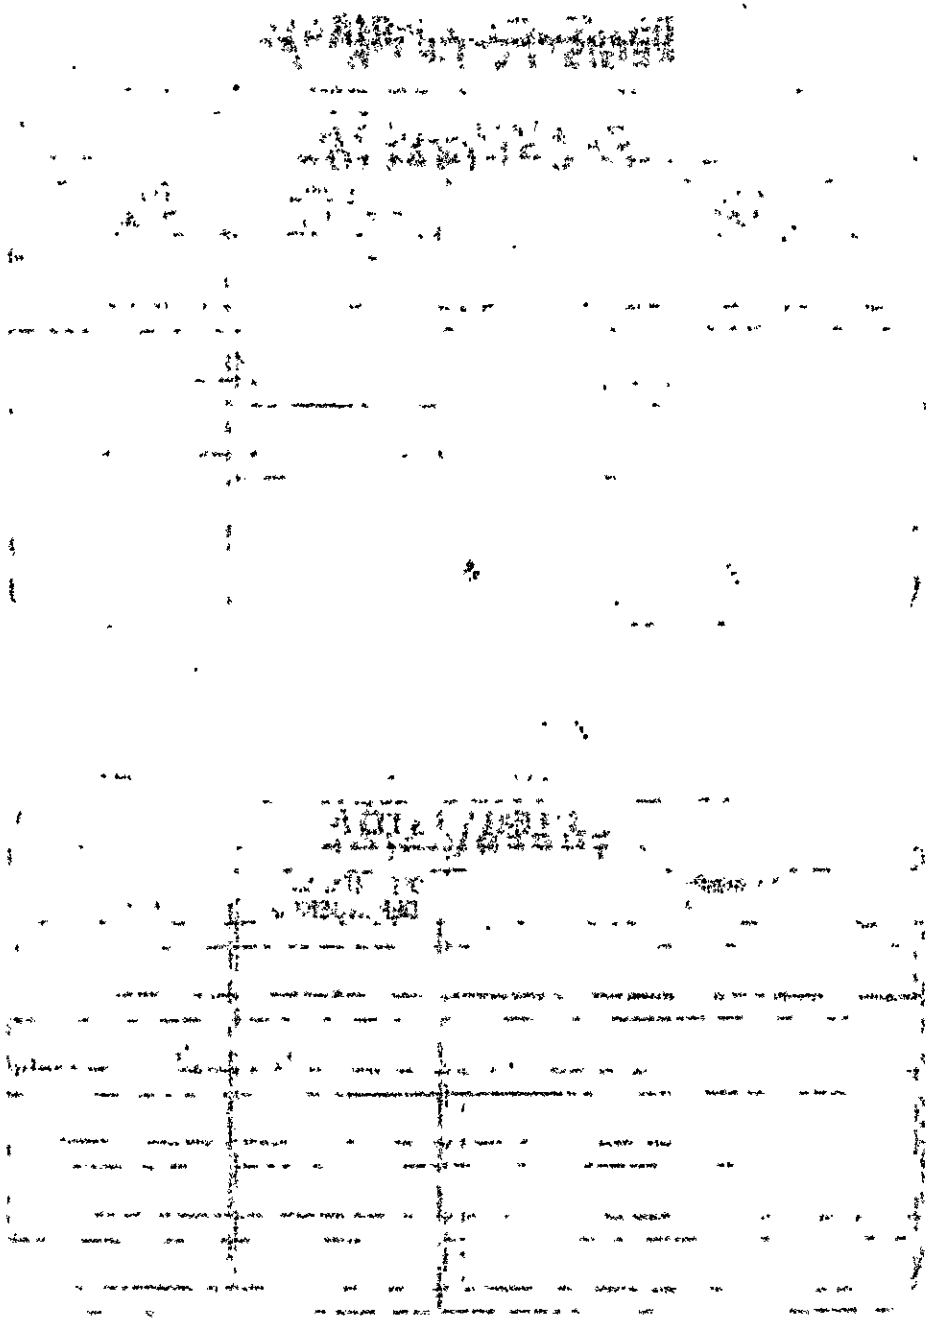

BITÁCORA DE OBRA

PGO No. 26201 **OBRA No.** 260009 **No. 009**

FECHA 7/5/26

CON ESTA FECHA SE RECIBE DE PARTE DE LA CONTRATISTA ESTIMACION No. 02 (FINIQUITO) PARA SU REVISION.

SE EFECTUA REVISION FISICA DE TODOS LOS CONCEPTOS DEL PRESENTE CONTRATO.

LA OBRA SE ENCUENTRA CONCLUIDA AL 100% Y SE AUTORIZA PARA SU TRAMITE DE PAGO CORRESPONDIENTE

OBRA FINALIZADA

Mario Ochoa

Sandra Castro Maden

BITÁCORA DE OBRA

PGO No. _____ OBRA No. _____ No. 010

FECHA _____
