COLEÓN S.A DE C.V.

DOMICILIO - CALLE HIDALGO Nº. 46 PONIENTE COLONIA CENTRO, ESCUINAPA, SINALOA.

R.F.C. I.M.S.S.

COL11012631A

DEPENDENCIA:
H. AYUNTAMIENTO DE ESCUINAPA, SINALOA.

DIRECCION DE OBRAS, SERVICIOS PUBLICOS Y ECOLOGIA

ESTIMACION

CONTRATO	ESC-FAISMUN-2025-035
LOCALIDAD	ESCUINAPA, SINALOA
DESCRIPCION:	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN CALLE FRANCISCO PEREZ ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y FRANCISCO I. MADERO, COL. CENTRO, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ESCUINAPA

ESTIMACION:	01
MUNICIPIO:	ESCUINAPA

IMPORTE DE OBRA:	$2,114,658.06
IMPORTE DE ANTICIPO DE OBRA (35%):	$740,130.32
IMPORTE TOTAL DE CONTRATO:	$2,453,003.35

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	SEGUN PROYECTO			HASTA ESTA ESTIM.	HASTA ESTIM ANT.	EXCEDENTE	DE ESTA ESTIMACION	IMPORTE
			VOL	PU	$					
	PAVIMENTO HIDRAULICO									
	PRELIMINARES									
PU-01	LIMPIEZA, TRAZO Y NIVELACION DE TERRENO NATURAL	M2	1582.90	$13.04	$20,641.02	1208.04	0.00	-374.86	1208.04	$15,752.86
PU-01.1	DEMOLICIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO CON EQUIPO, INCLUYE; MAQUINARIA CON DEMOLEDOR HIDRÁULICO, HERRAMIENTAS.	M2	1582.90	$111.74	$176,873.25	1208.04	0.00	-374.86	1208.04	$134,986.53
	DESPALME Y CORTE									
PU-02	EXCAVACION EN MATERIAL TIPO II PARA ALOJAR BASE, SUB-BASE Y PAVIMENTO. NOTA: (EN ESTE CONCEPTO SE REALIZA LA EXCAVACION A BASE DEL PROYECTO EJECUTIVO PARA REALIZAR LOS TRABAJOS CORRESPONDIENTE DEL PROYECTO, ESTO PARA DAR LOS NIVELES ADECUADOS A LA EJECUCION).	M3	949.74	$22.48	$21,350.16	1234.28	0.00	284.54	1234.28	$27,746.60
	ACARREOS PARA TERRACERIAS									
PU-03	CARGA Y ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION A 1ER. KM.	M3	949.74	$32.71	$31,066.00	1234.28	0.00	284.54	1234.28	$40,373.27
PU-04	ACARREO DE MATERIAL A KM. SUB A 3 KM.	M3/KM	2849.22	$8.74	$24,902.18	3702.84	0.00	853.62	3702.84	$32,362.80
	TERRAPLENES									
PU-05	AFINE Y COMPACTADO PROCTOR AL 85% PROCTOR, DE TERRRENO NATURAL PARA RECIBIR TERRACERIAS.	M2	1582.90	$23.55	$37,277.30	1208.04	0.00	-374.86	1208.04	$28,449.37
PU-06	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MATERIAL DE BANCO PARA BASE, DE 20 CM DE ESPESOR.	M3	316.58	$586.89	$185,797.64	241.61	0.00	-74.97	241.61	$141,797.47
PU-07	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MATERIAL DE BANCO PARA SUB-BASE DE 20 CM DE ESPESOR	M3	316.58	$522.17	$165,308.58	241.61	0.00	-74.97	241.61	$126,160.58
PU-08	SUMINISTRO Y COLOCACION DE RIEGO DE IMPREGNACION A RAZON DE 1.5 LTS/M2 PARA PROTEGER TERRACERIA, INCLUYE ARENA PARA SU PROTECCION.	M2	1582.90	$47.17	$74,665.39	1208.04	0.00	-374.86	1208.04	$56,983.31

COLEO[illegible].A DE C.V.

DOMICILIO - CALLE HIDALGO N°. 46 PONIENTE COLONIA CENTRO, ESCUINAPA, SINALOA.

R.F.C. I.M.S.S.

COL11012631A

DEPENDENCIA:
H. AYUNTAMIENTO DE ESCUINAPA, SINALOA.

DIRECCION DE OBRAS, SERVICIOS PUBLICOS Y ECOLOGIA

ESTIMACION

CONTRATO	ESC-FAISMUN-2025-035
LOCALIDAD	ESCUINAPA, SINALOA
DESCRIPCION:	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN CALLE FRANCISCO PEREZ ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y FRANCISCO I. MADERO, COL. CENTRO, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ESCUINAPA

ESTIMACION:	01
MUNICIPIO:	ESCUINAPA

IMPORTE DE OBRA:	$2,114,658.06
IMPORTE DE ANTICIPO DE OBRA (35%):	$740,130.32
IMPORTE TOTAL DE CONTRATO:	$2,453,003.35

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	SEGUN PROYECTO VOL	PU	$	HASTA ESTA ESTIM.	HASTA ESTIM ANT.	EXCEDENTE	DE ESTA ESTIMACION	IMPORTE
	CONCRETO HIDRAULICO									
PU-10	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LOSA DE CONCRETO F'C=250 KG/CM2 DE 20 CM DE ESPESOR INCLUYE CIMBRA, DESCIMBRA Y MANO DE OBRA. NOTA: (LOS PRECIOS DE ESTE CONCEPTOS ESTAN SUJETOS AL MERCADO DEL COSTO DE LOS INSUMOS EN ESTA ZONA, COMO TAMBIEN LA MANO DE OBRA)	M2	1582.90	$806.25	$1,276,213.13	1208.04	0.00	-374.86	1208.04	$973,983.26
PU-11	CALAFATEO CON EMULSION ASFALTICA EN CALIENTE ENJUNTAS DE CONTRACCION , INCLUYE MATERIAL Y MANO DE OBRA.	ML	515.82	$40.02	$20,643.12	794.68	0.00	278.86	794.68	$31,802.89
	OBRAS COMPLEMENTARIAS									
PU-11.1	RENIVELACION DE POZO DE VISITA EXISTENTE; INCLUYE: TAPA Y BROCAL DE FIERRO FUNDIDO DE ALTA DENSIDAD NUEVOS.	PZA	6.00	$8,491.89	$50,951.34	4.00	0.00	-2.00	4.00	$33,967.56
PU-14	PINTURA DE ESMALTE EN GUARNICIONES HASTA 40 CM DE DESARROLLO, TRABAJO TERMINADO, INCLUYE: LIMPIEZA Y PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, SUMINISTRO Y APLICACIÓN.	ML	343.88	$33.93	$11,667.85	0.00	0.00	-343.88	0.00	$0.00
PU-13	LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA, INCLUYE ACARREO DEL SOBRANTE DENTRO Y FUERA DE LA OBRA, A TIRO LIBRE.	M2	1582.9	10.93	$17,301.10	0.00	0.00	-1582.90	0.00	$0.00
								TOTAL DE PAVIMENTO HIDRAULICO :		$1,644,366.49

TOTAL DE PAVIMENTO HIDRAULICO :	$1,644,366.49
AMORTIZACION ANTICIPO (35%) :	$575,528.27
TOTAL DE PAVIMENTO HIDRAULICO AMORTIZADO:	$1,068,838.22
TOTAL I.V.A. (16%) :	$171,014.12
TOTAL DE ESTIMACION CON IVA.	$1,239,852.34

REVISO

Arq. Cesar Guadalupe Medina Contreras
Supervisor de Obras Publicas

AUTORIZO

M. de Arq. Graciela Elizalde Santos
Directora de Obras, Servicios Publicos Y Ecologia

CONTRATISTA

Ing. Marco Pelo Arroyo Prado
COLEON S.A. DE C.V.
Representante Legal

COLEON S.A DE C.V.

DOMICILIO - CALLE HIDALGO N°. 46 PONIENTE COLONIA CENTRO, ESCUINAPA, SINALOA.

R.F.C. I.M.S.S.

COL11012631A

DEPENDENCIA:
H. AYUNTAMIENTO DE ESCUINAPA, SINALOA.

DIRECCION DE OBRAS, SERVICIOS PUBLICOS Y ECOLOGIA

RESUMEN DE ESTIMACION

CONTRATO: ESC-FAISMUN-2025-035

ESTIMACION: 01

LOCALIDAD: MUNICIPIO DE ESCUINAPA

MUNICIPIO: ESCUINAPA

DESCRIPCION: CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN CALLE FRANCISCO PEREZ ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y FRANCISCO I. MADERO, COL. CENTRO, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ESCUINAPA

IMPORTE DE OBRA:	$2,114,658.06
IMPORTE DE ANTICIPO DE OBRA:	$740,130.32
IMPORTE TOTAL DE CONTRATO:	$2,453,003.35

PAVIMENTO HIDRAULICO	$ 1,068,838.22
TOTAL =	$ 1,068,838.22
TOTAL CON IVA =	$ 1,239,852.34

CONTRATISTA

Ing. Marco Polo Arroyo Prado
COLEON S.A. DE C.V.
Representante Legal

AUTORIZO

M. de Arq. Graciela Elizalde Santos
Directora de Obras, Servicios Publicos Y Ecologia

SUPERVISOR DE OBRA

Arq. Cesar Guadalupe Medina Contreras
Supervisor de Obras Publicas

CONTRATISTA: COLEON S.A DE C.V.

DOMICILIO - CALLE HIDALGO N°. 46 PONIENTE COLONIA CENTRO, ESCUINAPA, SINALOA.

R.F.C. COL11012631A

I.M.S.S.

DEPENDENCIA:
H. AYUNTAMIENTO DE ESCUINAPA, SINALOA.

DIRECCION DE OBRAS, SERVICIOS PUBLICOS Y ECOLOGIA

ESTADO DE CUENTA

CONTRATO: ESC-FAISMUN-2025-035

ESTIMACION: 01

LOCALIDAD: MUNICIPIO DE ESCUINAPA

MUNICIPIO: ESCUINAPA

DESCRIPCION: CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN CALLE FRANCISCO PEREZ ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y FRANCISCO I. MADERO, COL. CENTRO, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ESCUINAPA

OF. APROB.

FECHA APROB.

PERIODO DE CONTRATO DEL: 22-oct-25 AL 31-dic-25

IMPORTE DE OBRA: $2,114,658.06

IMPORTE DE ANTICIPO DE OBRA: $740,130.32

IMPORTE TOTAL DE CONTRATO: $2,453,003.35

CONVENIO ADICIONAL:

PERIODO CONVENIO ADICIONAL: DEL AL

No. DE ESTIMACION	PERIODO		IMPORTE ESTIMACION $	IMPORTE SIN IVA $	3% A INSP DE OBRAS $	AMORTIZACION ANTICIPO	TOTAL DEDUCCIONES SIN IVA	TOTAL DE MONTO CON IVA:	LIQUIDO A PAGAR
01	22-oct-25	21-nov-25	$1,907,465.13	$ 1,644,366.49	$ 49,330.99	$575,528.27	1,068,838.22	$1,239,852.336	$1,190,521.341
TOTALES:			$ 1,907,465.13	$ 1,644,366.49	$ 49,330.99	$ 575,528.27	$ 1,068,838.22	$1,239,852.336	$1,190,521.341

SALDO DEL CONTRATO: $545,538.22

SALDO DE ANTICIPO POR AMORTIZAR: $164,602.05

AUTORIZO

M. de Arq. Graciela Elizalde Santos
Directora de Obras, Servicios Publicos Y Ecologia

CONTRATISTA

Ing. Marco Polo Arroyo Prado
COLEON S.A. DE C.V.
Representante Legal

SUPERVISOR DE OBRA

Arq. Cesar Guadalupe Medina Contreras

RECIBO No: 01

CONTRATISTA:	COLEON S.A DE C.V.
DOMICILIO:	DOMICILIO - CALLE HIDALGO N°. 46 PONIENTE COLONIA CENTRO, ESCUINAPA, SINALOA.
UBICACION:	ESCUINAPA, SINALOA.
R.F.C.	COL11012631A
I.M.S.S.	

FECHA :	21-nov-25
ESTIMACION No:	01
PERIODO:	
DEL	22-oct-25
AL	21-nov-25

CONTRATO:	ESC-FAISMUN-2025-035
FECHA DE CONTRATO:	22-oct-25
PERIODO DE EJECUCION DEL CONTRATO:	
INICIO:	22-oct-25
TERMINACION:	31-dic-25

DESCRIPCION:
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN CALLE FRANCISCO PEREZ ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y FRANCISCO I. MADERO, COL. CENTRO, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ESCUINAPA

CONTRATO N0:
ESC-FAISMUN-2025-035

IMPORTE SIN IVA	IMPORTE CON IVA	35% ANTICIPO	TOTAL DE CONTRATO:
$2,114,658.06	$2,453,003.35	$740,130.32	$2,453,003.35

BUENO POR: $ 1,190,521.34

RECIBI DEL H. AYUNTAMIENTO DE ESCUINAPA LA CANTIDAD DE:

$ 1,190,521.34 (SON: UN MILLON CIENTO NOVENTA MIL QUINIENTOS VEINTIUN PESOS 34/100 M. N.)

EN PAGO DE ESTIMACION 01

DEDUCCIONES:		CALCULO DE ESTIMACION	
AMORTIZACION ANTICIPO 35% (*)	$ 740,130.32	TOTAL DE LA OBRA EJECUTADA SIN IVA	1,068,838.22
MAS I.V.A.	$ 118,420.85	MAS I.V.A 16 %	$ 171,014.12
TOTAL AMORTIZACION DE ANTICIPO	575,528.27	TOTAL DE LA OBRA EJECUTADA CON IVA	$ 1,239,852.34
3 % SFP INSP. OBRAS: (*)	$ 49,330.99	MENOS DEDUCCIONES 3% DE INSPECCION Y VIGILANCIA:	$ 49,330.99
2 AL MILLAR C.M.I.C.	$ -		
TOTAL DEDUCCIONES	49,330.99		
(*) DEL IMPORTE EJECUTADO CON IVA		SALDO A PAGAR:	1,190,521.34

AUTORIZO

M. de Arq. Graciela Elizalde Santos
Directora de Obras, Servicios Publicos Y Ecologia

CONTRATISTA

Ing. Marco Polo Arroyo Prado
COLEON S.A. DE C.V.
Representante Legal

SUPERVISOR DE OBRA

Arq. Cesar Guadalupe Medina Contreras

COLEON S.A DE C.V.
NOMBRE

DOMICILIO - CALLE HIDALGO N°. 46 PONIENTE COLONIA CENTRO, ESCUINAPA, SINALOA.

R.F.C. COL11012631A

I.M.S.S.

DEPENDENCIA:
H. AYUNTAMIENTO DE ESCUINAPA, SINALOA.

DIRECCION DE OBRAS, SERVICIOS PUBLICOS Y ECOLOGIA

NUMEROS GENERADORES

CONTRATO: ESC-FAISMUN-2025-035

ESTIMACION: 01

LOCALIDAD: MUNICIPIO DE ESCUINAPA

MUNICIPIO: ESCUINAPA

DESCRIPCION: CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN CALLE FRANCISCO PEREZ ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y FRANCISCO I. MADERO, COL. CENTRO, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ESCUINAPA

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	LOCALIZACION		LARGO	ANCHO	ALTO	RESULTADO	OBSERVACION
			TRAMO	PZAS					
	PAVIMENTO HIDRAULICO								
	PRELIMINARES		C. INDEPENDENCIA - C. FCO. I. MADERO						
PU-01	LIMPIEZA, TRAZO Y NIVELACION DE TERRENO NATURAL	M2	0+000 al 0+010		10.00	8.00		80.00	
			0+010 al 0+020		10.00	8.00		80.00	
			0+020 al 0+030		10.00	8.00		80.00	
			0+030 al 0+040		10.00	8.00		80.00	
			0+040 al 0+050		10.00	8.00		80.00	
			0+050 al 0+060		10.00	8.00		80.00	
			0+060 al 0+070		10.00	8.00		80.00	
			0+070 al 0+080		10.00	8.00		80.00	
			0+080 al 0+090		10.00	8.00		80.00	
			0+090 al 0+100		10.00	8.00		80.00	
			0+100 al 0+110		10.00	8.00		80.00	
			0+110 al 0+120		10.00	8.00		80.00	
			0+120 al 0+130		10.00	8.00		80.00	
			0+130 al 0+140		10.00	8.00		80.00	
			0+140 al 0+144.40		4.40	8.00		35.20	
			BOCACALLE SEVERIANO MORENO		11.55	4.58		52.84	
						TOTAL DE PU-01 :		1208.04	M2

REVISO

Arq. Cesar Guadalupe Medina Contreras
Supervisor de Obras Publicas

AUTORIZO

M. de Arq. Graciela Elizalde Santos
Directora de Obras, Servicios Publicos Y Ecologia

CONTRATISTA

Ing. Marco Polo Arroyo Prado
COLEON S.A. DE C.V.
Representante Legal

COLEON S.A DE C.V.
NOMBRE

DOMICILIO - CALLE HIDALGO N°. 46 PONIENTE COLONIA CENTRO, ESCUINAPA, SINALOA.

R.F.C. COL11012631A

I.M.S.S.

DEPENDENCIA:
H. AYUNTAMIENTO DE ESCUINAPA, SINALOA.

DIRECCION DE OBRAS, SERVICIOS PUBLICOS Y ECOLOGIA

NUMEROS GENERADORES

CONTRATO ESC-FAISMUN-2025-035

ESTIMACION: 01

LOCALIDAD: MUNICIPIO DE ESCUINAPA

MUNICIPIO: ESCUINAPA

DESCRIPCION: CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN CALLE FRANCISCO PEREZ ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y FRANCISCO I. MADERO, COL. CENTRO, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ESCUINAPA

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	LOCALIZACION		LARGO	ANCHO	ALTO	RESULTADO	OBSERVACION
			TRAMO	PZAS					
	PAVIMENTO HIDRAULICO								
	PRELIMINARES		C. INDEPENDENCIA - C. FCO. I. MADERO						
PU-01.1	DEMOLICIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO CON EQUIPO, INCLUYE: MAQUINARIA CON DEMOLEDOR HIDRÁULICO, HERRAMIENTAS.	M2	0+000 al 0+010		10.00	8.00		80.00	
			0+010 al 0+020		10.00	8.00		80.00	
			0+020 al 0+030		10.00	8.00		80.00	
			0+030 al 0+040		10.00	8.00		80.00	
			0+040 al 0+050		10.00	8.00		80.00	
			0+050 al 0+060		10.00	8.00		80.00	
			0+060 al 0+070		10.00	8.00		80.00	
			0+070 al 0+080		10.00	8.00		80.00	
			0+080 al 0+090		10.00	8.00		80.00	
			0+090 al 0+100		10.00	8.00		80.00	
			0+100 al 0+110		10.00	8.00		80.00	
			0+110 al 0+120		10.00	8.00		80.00	
			0+120 al 0+130		10.00	8.00		80.00	
			0+130 al 0+140		10.00	8.00		80.00	
			0+140 al 0+144.40		4.40	8.00		35.20	
			BOCACALLE SEVERIANO MORENO		11.55	4.58		52.84	
						TOTAL DE PU-01.1 :		1208.04	M2

REVISO

Arq. Cesar Guadalupe Medina Contreras
Supervisor de Obras Publicas

AUTORIZO

M. de Arq. Graciela Elizalde Santos
Directora de Obras, Servicios Publicos Y Ecologia

CONTRATISTA

Ing. Marco Polo Arroyo Prado
COLEON S.A. DE C.V.
Representante Legal

COLEON S.A DE C.V.
NOMBRE

DOMICILIO - CALLE HIDALGO N°. 46 PONIENTE COLONIA CENTRO, ESCUINAPA, SINALOA.

R.F.C. COL11012631A

I.M.S.S.

DEPENDENCIA:
H. AYUNTAMIENTO DE ESCUINAPA, SINALOA.

DIRECCION DE OBRAS, SERVICIOS PUBLICOS Y ECOLOGIA

NUMEROS GENERADORES

CONTRATO: ESC-FAISMUN-2025-035

ESTIMACION: 01

LOCALIDAD: MUNICIPIO DE ESCUINAPA

MUNICIPIO: ESCUINAPA

DESCRIPCION: CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN CALLE FRANCISCO PEREZ ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y FRANCISCO I. MADERO, COL. CENTRO, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ESCUINAPA

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	LOCALIZACION		LARGO	ANCHO	ALTO	RESULTADO	OBSERVACION
			TRAMO	PZAS					
	PAVIMENTO HIDRAULICO								
	DESPALME Y CORTE		C. INDEPENDENCIA - C. FCO. I. MADERO						
PU-02	EXCAVACION EN MATERIAL TIPO II PARA ALOJAR BASE, SUB-BASE Y PAVIMENTO. NOTA: (EN ESTE CONCEPTO SE REALIZA LA EXCAVACION A BASE DEL PROYECTO EJECUTIVO PARA REALIZAR LOS TRABAJOS CORRESPONDIENTE DEL PROYECTO, ESTO PARA DAR LOS NIVELES ADECUADOS A LA EJECUCION).	M3	0+000 al 0+010		10.00	8.00	0.60	48.00	
			0+010 al 0+020		10.00	8.00	0.60	48.00	
			0+020 al 0+030		10.00	8.00	0.60	48.00	
			0+030 al 0+040		10.00	8.00	0.60	48.00	
			0+040 al 0+050		10.00	8.00	0.60	48.00	
			0+050 al 0+060		10.00	8.00	0.60	48.00	
			0+060 al 0+070		10.00	8.00	0.60	48.00	
			0+070 al 0+080		10.00	8.00	0.60	48.00	
			0+080 al 0+090		10.00	8.00	0.60	48.00	
			0+090 al 0+100		10.00	8.00	0.60	48.00	
			0+100 al 0+110		10.00	8.00	0.60	48.00	
			0+110 al 0+120		10.00	8.00	0.60	48.00	
			0+120 al 0+130		10.00	8.00	0.60	48.00	
			0+130 al 0+140		10.00	8.00	0.60	48.00	
			0+140 al 0+144.40		4.40	8.00	0.60	21.12	
		BACHE 01	0+000 al 0+005.20		5.20	8.00	0.55	22.88	
		BACHE 02	0+005.20 al 0+045.60		40.40	8.00	0.65	210.08	
		BACHE 03	0+045.60 al 0+130		84.40	3.60	0.91	276.49	
			BOCACALLE SEVERIANO MORENO		11.55	4.58	0.60	31.70	
							TOTAL DE PU-02 :	1234.28	M3

REVISO

Arq. Cesar Guadalupe Medina Contreras
Supervisor de Obras Publicas

AUTORIZO

M. de Arq. Graciela Elizalde Santos
Directora de Obras, Servicios Publicos Y Ecologia

CONTRATISTA

Ing. Marco Polo Arroyo Prado
COLEON S.A. DE C.V.
Representante Legal

COLEON S.A DE C.V.
NOMBRE

DOMICILIO - CALLE HIDALGO N°. 46 PONIENTE COLONIA CENTRO, ESCUINAPA, SINALOA.

R.F.C. COL11012631A

I.M.S.S.

DEPENDENCIA:
H. AYUNTAMIENTO DE ESCUINAPA, SINALOA.

DIRECCION DE OBRAS, SERVICIOS PUBLICOS Y ECOLOGIA

NUMEROS GENERADORES

CONTRATO ESC-FAISMUN-2025-035

ESTIMACION: 01

LOCALIDAD: MUNICIPIO DE ESCUINAPA

MUNICIPIO: ESCUINAPA

DESCRIPCION: CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN CALLE FRANCISCO PEREZ ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y FRANCISCO I. MADERO, COL. CENTRO, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ESCUINAPA

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	LOCALIZACION		LARGO	ANCHO	ALTO	RESULTADO	OBSERVACION
			TRAMO	PZAS					
	PAVIMENTO HIDRAULICO								
	ACARREOS PARA TERRACERIAS		C. INDEPENDENCIA - C. FCO. I. MADERO						
PU-03	CARGA Y ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION A 1ER. KM.	M3							
			EXCAVACION M3						
			SUBTOTAL 0+000 al 0+143.2		693.12			693.12	
			SUBTOTAL BACHES 1, 2, 3 =		509.45			509.45	
			SUBTOTAL BOCACALLE SEVERIANO MORENO =		31.70			31.70	
							TOTAL DE PU-03 :	1234.28	M3
PU-04	ACARREO DE MATERIAL A KM. SUB A 3 KM.	M3/KM							
			TOTAL CARGA Y ACARREO 1ER KM M3 =		1234.28		3.00	3702.84	
							TOTAL DE PU-04 :	3702.84	M3/KM

REVISO

Arq. Cesar Guadalupe Medina Contreras
Supervisor de Obras Publicas

AUTORIZO

M. de Arq. Graciela Elizalde Santos
Directora de Obras, Servicios Publicos Y Ecologia

CONTRATISTA

Ing. Marco Polo Arroyo Prado
COLEON S.A. DE C.V.
Representante Legal

COLEON S.A DE C.V.
NOMBRE

DOMICILIO - CALLE HIDALGO N°. 46 PONIENTE COLONIA CENTRO, ESCUINAPA, SINALOA.

R.F.C. COL11012631A

I.M.S.S.

DEPENDENCIA:
H. AYUNTAMIENTO DE ESCUINAPA, SINALOA.

DIRECCION DE OBRAS, SERVICIOS PUBLICOS Y ECOLOGIA

NUMEROS GENERADORES

CONTRATO ESC-FAISMUN-2025-035

ESTIMACION: 01

LOCALIDAD: MUNICIPIO DE ESCUINAPA

MUNICIPIO: ESCUINAPA

DESCRIPCION: CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN CALLE FRANCISCO PEREZ ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y FRANCISCO I. MADERO, COL. CENTRO, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ESCUINAPA

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	LOCALIZACION		LARGO	ANCHO	ALTO	RESULTADO	OBSERVACION
			TRAMO	PZAS					
	PAVIMENTO HIDRAULICO								
	TERRAPLENES		C. INDEPENDENCIA - C. FCO. I. MADERO						
PU-05	AFINE Y COMPACTADO PROCTOR AL 85% PROCTOR, DE TERRRENO NATURAL PARA RECIBIR TERRACERIAS.	M2	0+000 al 0+010		10.00	8.00		80.00	
			0+010 al 0+020		10.00	8.00		80.00	
			0+020 al 0+030		10.00	8.00		80.00	
			0+030 al 0+040		10.00	8.00		80.00	
			0+040 al 0+050		10.00	8.00		80.00	
			0+050 al 0+060		10.00	8.00		80.00	
			0+060 al 0+070		10.00	8.00		80.00	
			0+070 al 0+080		10.00	8.00		80.00	
			0+080 al 0+090		10.00	8.00		80.00	
			0+090 al 0+100		10.00	8.00		80.00	
			0+100 al 0+110		10.00	8.00		80.00	
			0+110 al 0+120		10.00	8.00		80.00	
			0+120 al 0+130		10.00	8.00		80.00	
			0+130 al 0+140		10.00	8.00		80.00	
			0+140 al 0+144.40		4.40	8.00		35.20	
			BOCACALLE SEVERIANO MORENO		11.55	4.58		52.84	
							TOTAL DE PU-05 :	1208.04	M2

REVISO

Arq. Cesar Guadalupe Medina Contreras
Supervisor de Obras Publicas

AUTORIZO

M. de Arq. Graciela Elizalde Santos
Directora de Obras, Servicios Publicos Y Ecologia

CONTRATISTA

Ing. Marco Polo Arroyo Prado
COLEON S.A. DE C.V.
Representante Legal

COLEON S.A DE C.V.
NOMBRE

DOMICILIO - CALLE HIDALGO N°. 46 PONIENTE COLONIA CENTRO, ESCUINAPA, SINALOA.

R.F.C. COL11012631A

I.M.S.S.

DEPENDENCIA:
H. AYUNTAMIENTO DE ESCUINAPA, SINALOA.

DIRECCION DE OBRAS, SERVICIOS PUBLICOS Y ECOLOGIA

NUMEROS GENERADORES

CONTRATO: ESC-FAISMUN-2025-035

ESTIMACION: 01

LOCALIDAD: MUNICIPIO DE ESCUINAPA

MUNICIPIO: ESCUINAPA

DESCRIPCION: CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN CALLE FRANCISCO PEREZ ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y FRANCISCO I. MADERO, COL. CENTRO, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ESCUINAPA

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	LOCALIZACION		LARGO	ANCHO	ALTO	RESULTADO	OBSERVACION
			TRAMO	PZAS					
	PAVIMENTO HIDRAULICO								
	TERRAPLENES		C. INDEPENDENCIA - C. FCO. I. MADERO						
PU-06	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MATERIAL DE BANCO PARA BASE, DE 20 CM DE ESPESOR.	M3	0+000 al 0+010		10.00	8.00	0.20	16.00	
			0+010 al 0+020		10.00	8.00	0.20	16.00	
			0+020 al 0+030		10.00	8.00	0.20	16.00	
			0+030 al 0+040		10.00	8.00	0.20	16.00	
			0+040 al 0+050		10.00	8.00	0.20	16.00	
			0+050 al 0+060		10.00	8.00	0.20	16.00	
			0+060 al 0+070		10.00	8.00	0.20	16.00	
			0+070 al 0+080		10.00	8.00	0.20	16.00	
			0+080 al 0+090		10.00	8.00	0.20	16.00	
			0+090 al 0+100		10.00	8.00	0.20	16.00	
			0+100 al 0+110		10.00	8.00	0.20	16.00	
			0+110 al 0+120		10.00	8.00	0.20	16.00	
			0+120 al 0+130		10.00	8.00	0.20	16.00	
			0+130 al 0+140		10.00	8.00	0.20	16.00	
			0+140 al 0+144.40		4.40	8.00	0.20	7.04	
			BOCACALLE SEVERIANO MORENO		11.55	4.58	0.20	10.57	
							TOTAL DE PU-06 :	241.61	M3

REVISO

Arq. Cesar Guadalupe Medina Contreras
Supervisor de Obras Publicas

AUTORIZO

M. de Arq. Graciela Elizalde Santos
Directora de Obras, Servicios Publicos Y Ecologia

CONTRATISTA

Ing. Marco Polo Arroyo Prado
COLEON S.A. DE C.V.
Representante Legal

COLEON S.A DE C.V.
NOMBRE

DOMICILIO - CALLE HIDALGO N°. 46 PONIENTE COLONIA CENTRO, ESCUINAPA, SINALOA.

R.F.C. COL11012631A

I.M.S.S.

DEPENDENCIA:
H. AYUNTAMIENTO DE ESCUINAPA, SINALOA.

DIRECCION DE OBRAS, SERVICIOS PUBLICOS Y ECOLOGIA

NUMEROS GENERADORES

CONTRATO ESC-FAISMUN-2025-035

ESTIMACION: 01

LOCALIDAD: MUNICIPIO DE ESCUINAPA

MUNICIPIO: ESCUINAPA

DESCRIPCION: CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN CALLE FRANCISCO PEREZ ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y FRANCISCO I. MADERO, COL. CENTRO, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ESCUINAPA

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	LOCALIZACION		LARGO	ANCHO	ALTO	RESULTADO	OBSERVACION
			TRAMO	PZAS					
	PAVIMENTO HIDRAULICO								
	TERRAPLENES		**C. INDEPENDENCIA - C. FCO. I. MADERO**						
PU-07	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MATERIAL DE BANCO PARA SUB-BASE DE 20 CM DE ESPESOR	M3	0+000 al 0+010		10.00	8.00	0.20	16.00	
			0+010 al 0+020		10.00	8.00	0.20	16.00	
			0+020 al 0+030		10.00	8.00	0.20	16.00	
			0+030 al 0+040		10.00	8.00	0.20	16.00	
			0+040 al 0+050		10.00	8.00	0.20	16.00	
			0+050 al 0+060		10.00	8.00	0.20	16.00	
			0+060 al 0+070		10.00	8.00	0.20	16.00	
			0+070 al 0+080		10.00	8.00	0.20	16.00	
			0+080 al 0+090		10.00	8.00	0.20	16.00	
			0+090 al 0+100		10.00	8.00	0.20	16.00	
			0+100 al 0+110		10.00	8.00	0.20	16.00	
			0+110 al 0+120		10.00	8.00	0.20	16.00	
			0+120 al 0+130		10.00	8.00	0.20	16.00	
			0+130 al 0+140		10.00	8.00	0.20	16.00	
			0+140 al 0+144.40		4.40	8.00	0.20	7.04	
			BOCACALLE SEVERIANO MORENO		11.55	4.58	0.20	10.57	
							TOTAL DE PU-07 :	241.61	M3

REVISO

Arq. Cesar Guadalupe Medina Contreras
Supervisor de Obras Publicas

AUTORIZO

M. de Arq. Graciela Elizalde Santos
Directora de Obras, Servicios Publicos Y Ecologia

CONTRATISTA

Ing. Marco Polo Arroyo Prado
COLEON S.A. DE C.V.
Representante Legal

COLEON S.A DE C.V.
NOMBRE

DOMICILIO - CALLE HIDALGO N°. 46 PONIENTE COLONIA CENTRO, ESCUINAPA, SINALOA.

R.F.C. COL11012631A

I.M.S.S.

DEPENDENCIA:
H. AYUNTAMIENTO DE ESCUINAPA, SINALOA.

DIRECCION DE OBRAS, SERVICIOS PUBLICOS Y ECOLOGIA

NUMEROS GENERADORES

CONTRATO ESC-FAISMUN-2025-035

ESTIMACION: 01

LOCALIDAD: MUNICIPIO DE ESCUINAPA

MUNICIPIO: ESCUINAPA

DESCRIPCION: CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN CALLE FRANCISCO PEREZ ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y FRANCISCO I. MADERO, COL. CENTRO, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ESCUINAPA

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	LOCALIZACION		LARGO	ANCHO	ALTO	RESULTADO	OBSERVACION
			TRAMO	PZAS					
	PAVIMENTO HIDRAULICO								
	TERRAPLENES		**C. INDEPENDENCIA - C. FCO. I. MADERO**						
PU-08	SUMINISTRO Y COLOCACION DE RIEGO DE IMPREGNACION A RAZON DE 1.5 LTS/M2 PARA PROTEGER TERRACERIA, INCLUYE ARENA PARA SU PROTECCION.	M2	0+000 al 0+010		10.00	8.00		80.00	
			0+010 al 0+020		10.00	8.00		80.00	
			0+020 al 0+030		10.00	8.00		80.00	
			0+030 al 0+040		10.00	8.00		80.00	
			0+040 al 0+050		10.00	8.00		80.00	
			0+050 al 0+060		10.00	8.00		80.00	
			0+060 al 0+070		10.00	8.00		80.00	
			0+070 al 0+080		10.00	8.00		80.00	
			0+080 al 0+090		10.00	8.00		80.00	
			0+090 al 0+100		10.00	8.00		80.00	
			0+100 al 0+110		10.00	8.00		80.00	
			0+110 al 0+120		10.00	8.00		80.00	
			0+120 al 0+130		10.00	8.00		80.00	
			0+130 al 0+140		10.00	8.00		80.00	
			0+140 al 0+144.40		4.40	8.00		35.20	
			BOCACALLE SEVERIANO MORENO		11.55	4.58		52.84	
							TOTAL DE PU-08 :	1208.04	M2

REVISO

Arq. Cesar Guadalupe Medina Contreras
Supervisor de Obras Publicas

AUTORIZO

M. de Arq. Graciela Elizalde Santos
Directora de Obras, Servicios Publicos Y Ecologia

CONTRATISTA

Ing. Marco Polo Arroyo Prado
COLEON S.A. DE C.V.
Representante Legal

COLEON S.A DE C.V.
NOMBRE

DOMICILIO - CALLE HIDALGO N°. 46 PONIENTE COLONIA CENTRO, ESCUINAPA, SINALOA.

R.F.C. COL11012631A

I.M.S.S.

DEPENDENCIA:
H. AYUNTAMIENTO DE ESCUINAPA, SINALOA.

DIRECCION DE OBRAS, SERVICIOS PUBLICOS Y ECOLOGIA

NUMEROS GENERADORES

CONTRATO: ESC-FAISMUN-2025-035

ESTIMACION: 01

LOCALIDAD: MUNICIPIO DE ESCUINAPA

MUNICIPIO: ESCUINAPA

DESCRIPCION: CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN CALLE FRANCISCO PEREZ ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y FRANCISCO I. MADERO, COL. CENTRO, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ESCUINAPA

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	LOCALIZACION		LARGO	ANCHO	ALTO	RESULTADO	OBSERVACION
			TRAMO	PZAS					
	PAVIMENTO HIDRAULICO								
	CONCRETO HIDRAULICO		C. INDEPENDENCIA - C. FCO. I. MADERO						
PU-10	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LOSA DE CONCRETO F'C=250 KG/CM2 DE 20 CM DE ESPESOR INCLUYE CIMBRA, DESCIMBRA Y MANO DE OBRA. NOTA: (LOS PRECIOS DE ESTE CONCEPTOS ESTAN SUJETOS AL MERCADO DEL COSTO DE LOS INSUMOS EN ESTA ZONA, COMO TAMBIEN LA MANO DE OBRA)	M2	0+000 al 0+010		10.00	8.00		80.00	
			0+010 al 0+020		10.00	8.00		80.00	
			0+020 al 0+030		10.00	8.00		80.00	
			0+030 al 0+040		10.00	8.00		80.00	
			0+040 al 0+050		10.00	8.00		80.00	
			0+050 al 0+060		10.00	8.00		80.00	
			0+060 al 0+070		10.00	8.00		80.00	
			0+070 al 0+080		10.00	8.00		80.00	
			0+080 al 0+090		10.00	8.00		80.00	
			0+090 al 0+100		10.00	8.00		80.00	
			0+100 al 0+110		10.00	8.00		80.00	
			0+110 al 0+120		10.00	8.00		80.00	
			0+120 al 0+130		10.00	8.00		80.00	
			0+130 al 0+140		10.00	8.00		80.00	
			0+140 al 0+144.40		4.40	8.00		35.20	
			BOCACALLE SEVERIANO MORENO		11.55	4.58		52.84	
							TOTAL DE PU-10 :	1208.04	M2

REVISO

Arq. Cesar Guadalupe Medina Contreras
Supervisor de Obras Publicas

AUTORIZO

M. de Arq. Graciela Elizalde Santos
Directora de Obras, Servicios Publicos Y Ecologia

CONTRATISTA

Ing. Marco Polo Arroyo Prado
COLEON S.A. DE C.V.
Representante Legal

COLEON S.A DE C.V.
NOMBRE

DOMICILIO - CALLE HIDALGO Nº. 46 PONIENTE COLONIA CENTRO, ESCUINAPA, SINALOA.

R.F.C. COL11012631A

I.M.S.S.

DEPENDENCIA:
H. AYUNTAMIENTO DE ESCUINAPA, SINALOA.

DIRECCION DE OBRAS, SERVICIOS PUBLICOS Y ECOLOGIA

NUMEROS GENERADORES

CONTRATO: ESC-FAISMUN-2025-035

ESTIMACION: 01

LOCALIDAD: MUNICIPIO DE ESCUINAPA

MUNICIPIO: ESCUINAPA

DESCRIPCION: CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN CALLE FRANCISCO PEREZ ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y FRANCISCO I. MADERO, COL. CENTRO, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ESCUINAPA

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	LOCALIZACION		LARGO	ANCHO	ALTO	RESULTADO	OBSERVACION
			TRAMO	PZAS					
	PAVIMENTO HIDRAULICO								
	CONCRETO HIDRAULICO		C. INDEPENDENCIA - C. FCO. I. MADERO						
PU-11	CALAFATEO CON EMULSION ASFALTICA EN CALIENTE ENJUNTAS DE CONTRACCION , INCLUYE MATERIAL Y MANO DE OBRA.	ML	0+000 al 0+144.4	5.00	144.40			722.00	
			0+000	1.00		8.00		8.00	
			0+007.3	1.00		8.00		8.00	
			0+035.4	2.00		1.00		2.00	
			0+050.6	1.00		3.00		3.00	
			0+080.6	1.00		8.00		8.00	
			0+119.7	1.00		8.00		8.00	
			0+144.4	1.00		8.00		8.00	
			BOCACALLE SEVERIANO MORENO	1.00	12.45			12.45	
			BOCACALLE SEVERIANO MORENO	1.00	10.65			10.65	
			BOCACALLE SEVERIANO MORENO	1.00		4.58		4.58	
							TOTAL DE PU-11 :	794.68	M2

REVISO

Arq. Cesar Guadalupe Medina Contreras
Supervisor de Obras Publicas

AUTORIZO

M. de Arq. Graciela Elizalde Santos
Directora de Obras, Servicios Publicos Y Ecologia

CONTRATISTA

Ing. Marco Polo Arroyo Prado
COLEON S.A. DE C.V.
Representante Legal

COLEON S.A DE C.V.
NOMBRE

DOMICILIO - CALLE HIDALGO Nº. 46 PONIENTE COLONIA CENTRO, ESCUINAPA, SINALOA.

R.F.C. COL11012631A

I.M.S.S.

DEPENDENCIA:
H. AYUNTAMIENTO DE ESCUINAPA, SINALOA.

DIRECCION DE OBRAS, SERVICIOS PUBLICOS Y ECOLOGIA

NUMEROS GENERADORES

CONTRATO: ESC-FAISMUN-2025-035

ESTIMACION: 01

LOCALIDAD: MUNICIPIO DE ESCUINAPA

MUNICIPIO: ESCUINAPA

DESCRIPCION: CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN CALLE FRANCISCO PEREZ ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y FRANCISCO I. MADERO, COL. CENTRO, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ESCUINAPA

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	LOCALIZACION		LARGO	ANCHO	ALTO	RESULTADO	OBSERVACION
			TRAMO	PZAS					
	PAVIMENTO HIDRAULICO								
	OBRAS COMPLEMENTARIAS		C. INDEPENDENCIA - C. FCO. I. MADERO						
PU-11.1	RENIVELACION DE POZO DE VISITA EXISTENTE: INCLUYE: TAPA Y BROCAL DE FIERRO FUNDIDO DE ALTA DENSIDAD NUEVOS.	PZA	PV.1: 0+003.1	1.00				1.00	
			PV.2: 0+045.2	1.00				1.00	
			PV.3: 0+138.3	1.00				1.00	
			PV.4: BOCACALLE SEV. MORENO	1.00				1.00	
			BOCACALLE SEVERIANO MORENO						
							TOTAL DE PU-11.1 :	4.00	M2

REVISO

Arq. Cesar Guadalupe Medina Contreras
Supervisor de Obras Publicas

AUTORIZO

M. de Arq. Graciela Elizalde Santos
Directora de Obras, Servicios Publicos Y Ecologia

CONTRATISTA

Ing. Marco Polo Arroyo Prado
COLEON S.A. DE C.V.
Representante Legal


COLEON S.A. DE C.V.		DEPENDENCIA: H. AYUNTAMIENTO DE ESCUINAPA, SINALOA DIRECCION DE OBRAS, SERVICIOS PUBLICOS Y ECOLOGIA.
DOMICILIO. CALLE HIDALGO N°. 46 PONIENTE COLONIA CENTRO, ESCUINAPA, SINALOA.		
R.F.C. COL11012631A	I.M.S.S.	

UBICACIÓN DE LA OBRA

CONTRATO	ESC-FAISMUN-2025-035	ESTIMACION:	01
ESCUINAPA, SINALOA	ESCUINAPA, SINALOA.		ESCUINAPA, SINALOA

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN CALLE FRANCISCO PEREZ ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y FRANCISCO I. MADERO, COL. CENTRO, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ESCUINAPA

CLAVE	DESCRIPCION
PU-02	EXCAVACION EN MATERIAL TIPO II PARA ALOJAR BASE, SUB-BASE Y PAVIMENTO. NOTA: (EN ESTE CONCEPTO SE REALIZA LA EXCAVACION A BASE DEL PROYECTO EJECUTIVO PARA REALIZAR LOS TRABAJOS CORRESPONDIENTE DEL PROYECTO, ESTO PARA DAR LOS NIVELES ADECUADOS A LA EJECUCION).

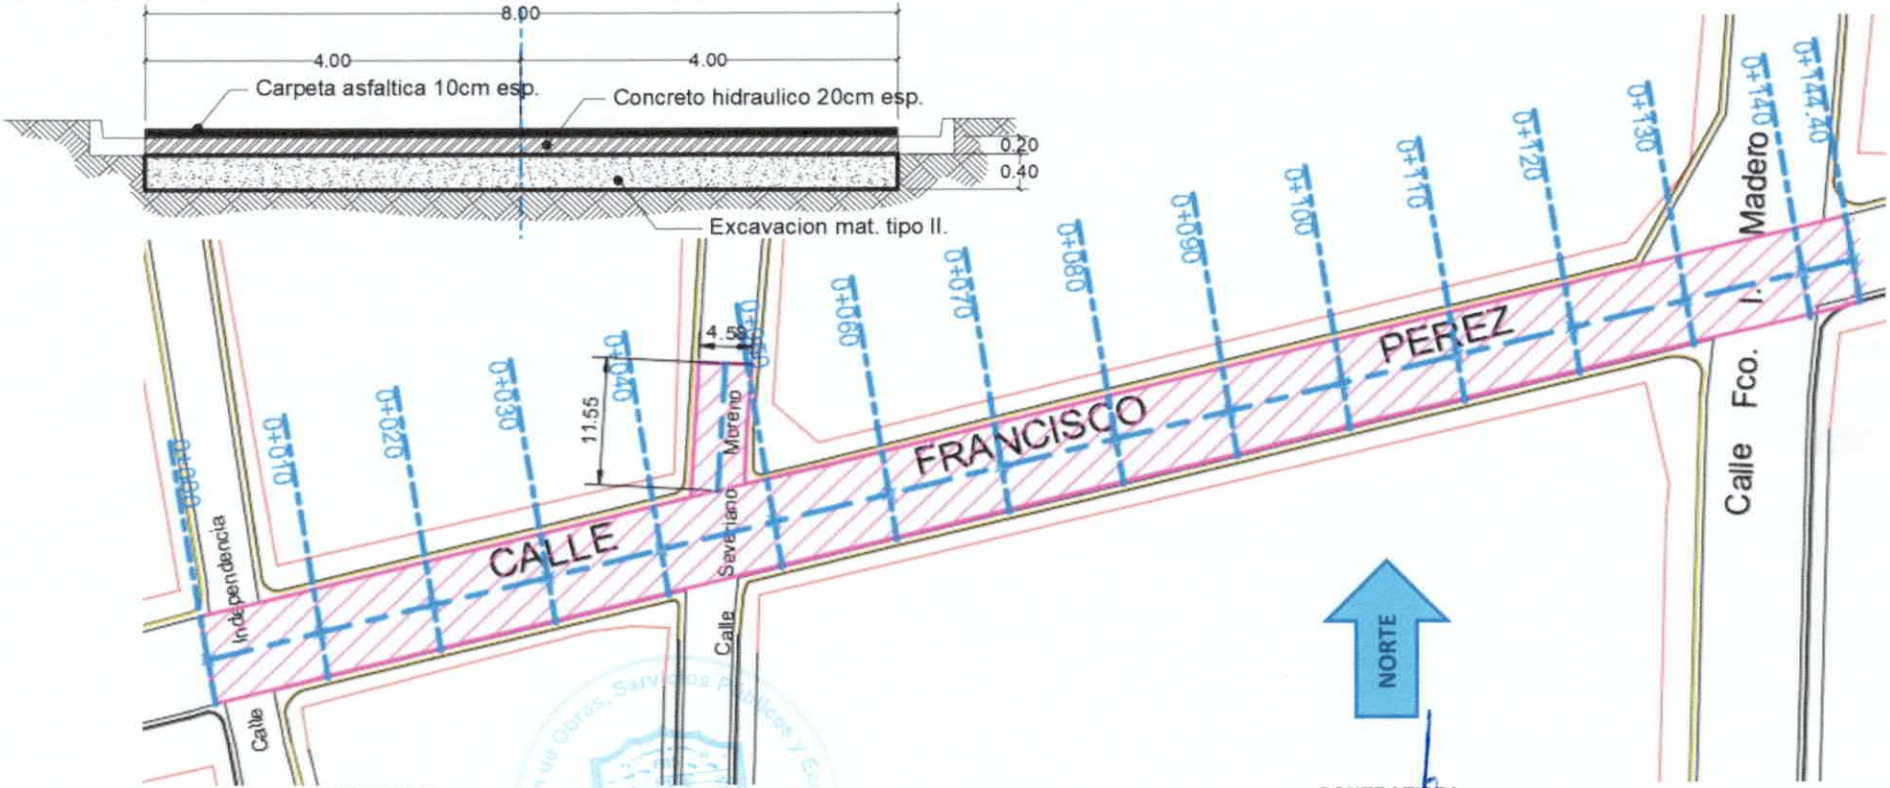

AUTORIZO

M. en Arq. Graciela Elizalde Santos
Directora de Obras, Servicios Publicos Y Ecologia

CONTRATISTA

Ing. Marco Polo Arroyo Prado
COLEON S.A. DE C.V.
Representante Legal


COLEON S.A. DE C.V.		DEPENDENCIA:
DOMICILIO. CALLE HIDALGO N°. 46 PONIENTE COLONIA CENTRO, ESCUINAPA, SINALOA.		H. AYUNTAMIENTO DE ESCUINAPA, SINALOA
R.F.C. COL11012631A	I.M.S.S.	DIRECCION DE OBRAS, SERVICIOS PUBLICOS Y ECOLOGIA.

UBICACIÓN DE LA OBRA

CONTRATO	ESC-FAISMUN-2025-035	ESTIMACION:	01
ESCUINAPA, SINALOA	ESCUINAPA, SINALOA.		ESCUINAPA, SINALOA

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN CALLE FRANCISCO PEREZ ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y FRANCISCO I. MADERO, COL. CENTRO, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ESCUINAPA

CLAVE	CONCEPTO
PU-01.1	DEMOLICIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO CON EQUIPO, INCLUYE; MAQUINARIA CON DEMOLEDOR HIDRÁULICO, HERRAMIENTAS.

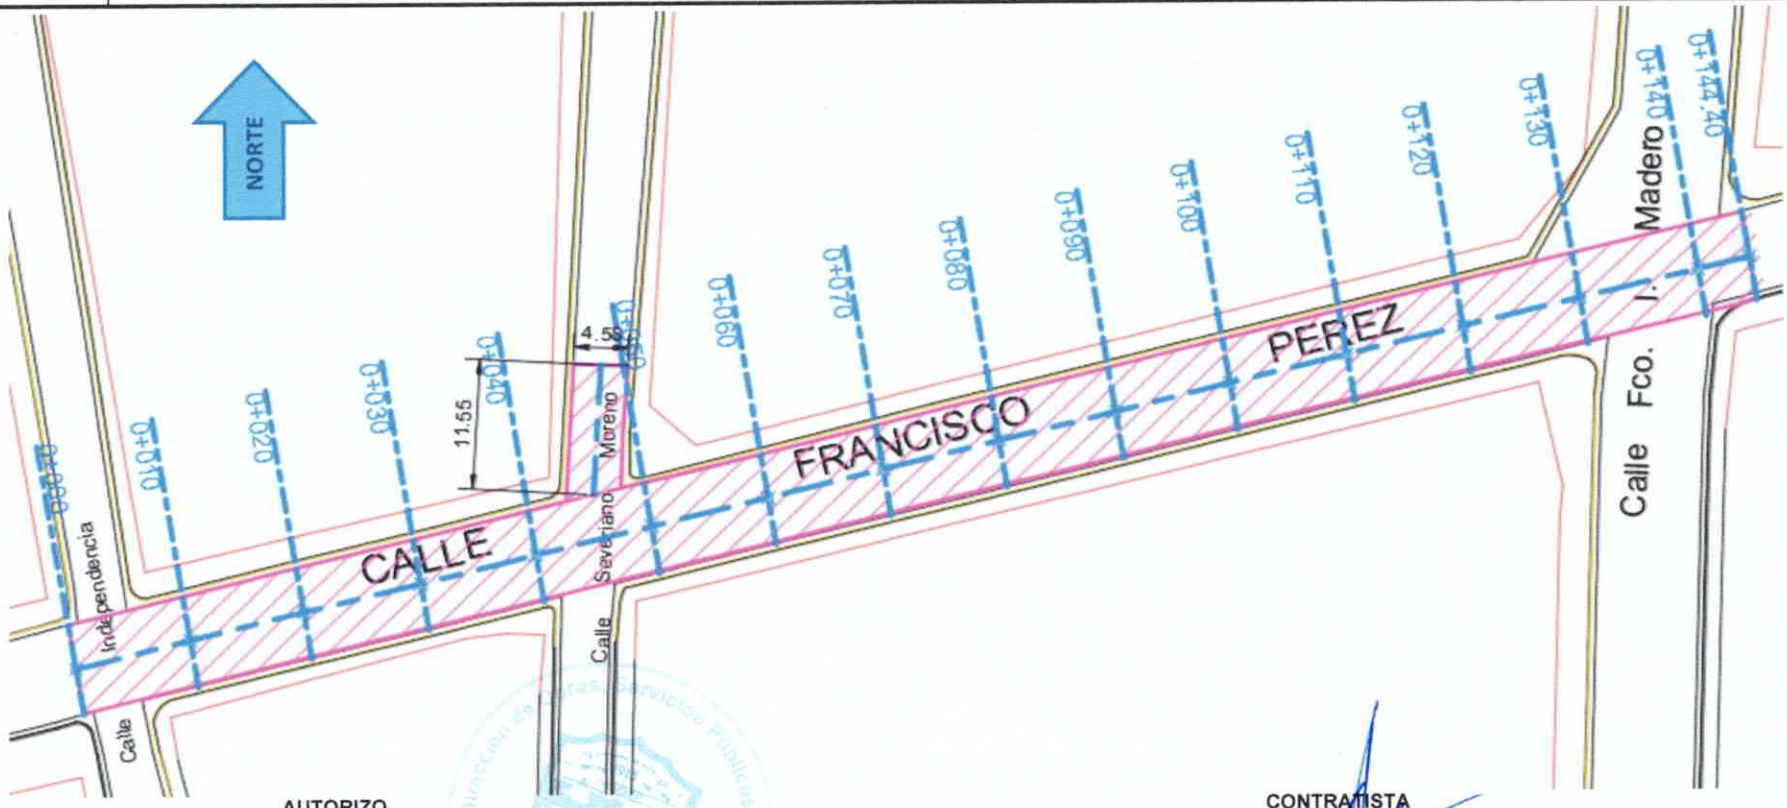

AUTORIZO

M. en Arq. Graciela Elizalde Santos
Directora de Obras, Servicios Publicos Y Ecologia

CONTRATISTA

Ing. Marco Polo Arroyo Prado
COLEON S.A. DE C.V.
Representante Legal


COLEON S.A. DE C.V.		DEPENDENCIA: H. AYUNTAMIENTO DE ESCUINAPA, SINALOA
DOMICILIO. CALLE HIDALGO N°. 46 PONIENTE COLONIA CENTRO, ESCUINAPA, SINALOA.		DIRECCION DE OBRAS, SERVICIOS PUBLICOS Y ECOLOGIA.
R.F.C. COL11012631A	I.M.S.S.	

UBICACIÓN DE LA OBRA

CONTRATO	ESC-FAISMUN-2025-035	ESTIMACION:	01
ESCUINAPA, SINALOA	ESCUINAPA, SINALOA.		ESCUINAPA, SINALOA

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN CALLE FRANCISCO PEREZ ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y FRANCISCO I. MADERO, COL. CENTRO, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ESCUINAPA

CLAVE	DESCRIPCION
PU-05	AFINE Y COMPACTADO PROCTOR AL 85% PROCTOR, DE TERRRENO NATURAL PARA RECIBIR TERRACERIAS.

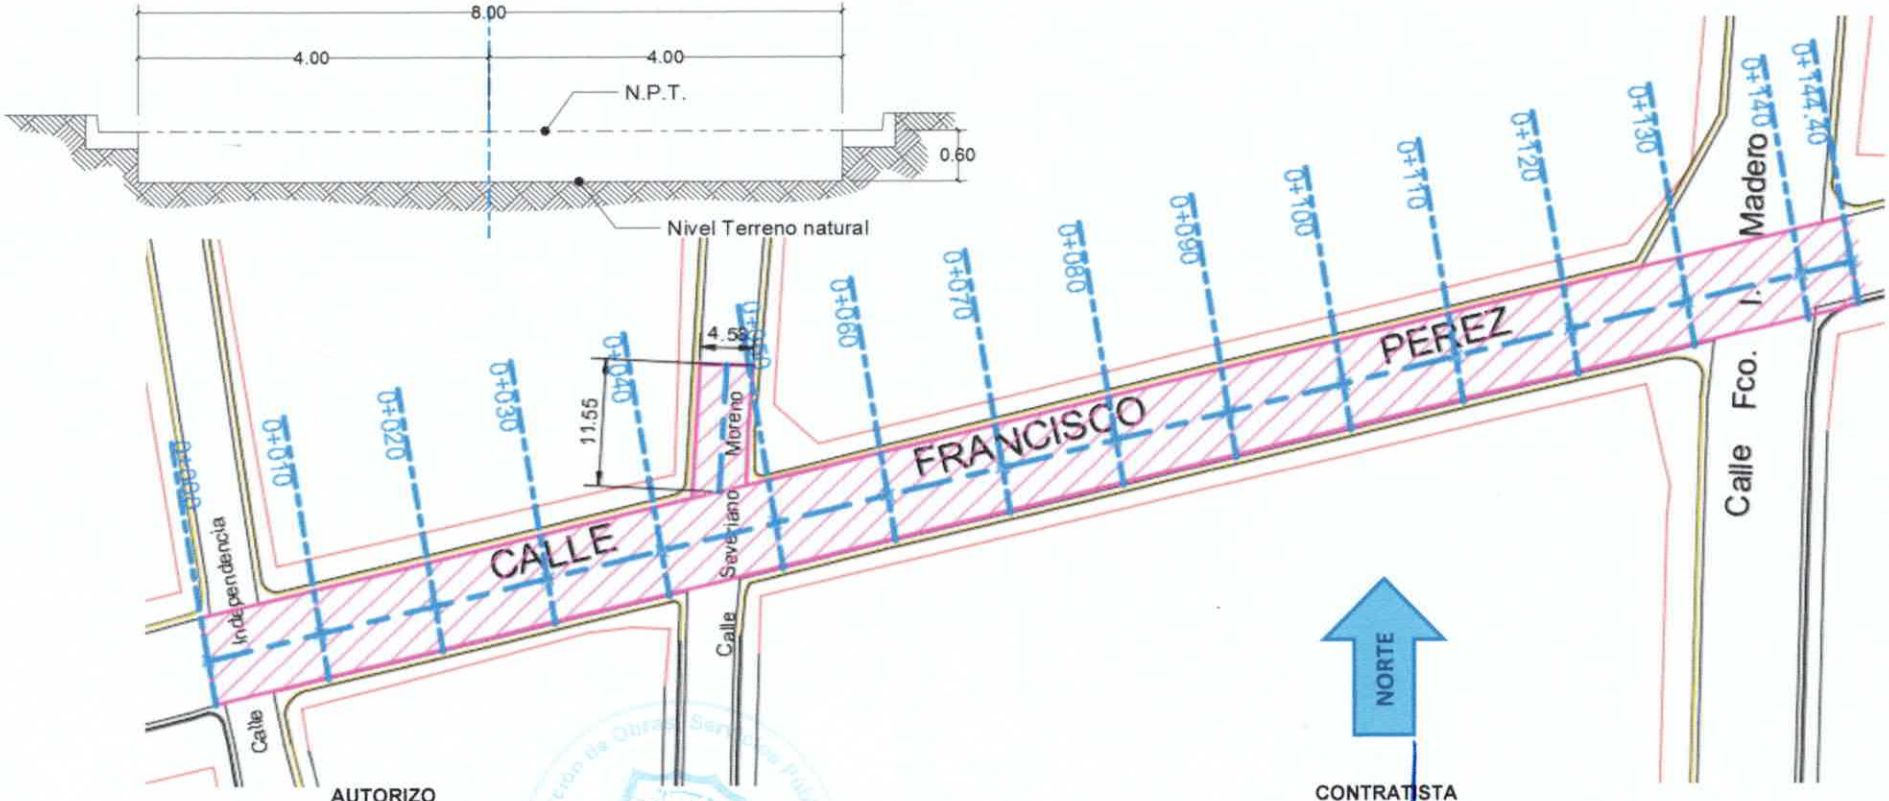

AUTORIZO

M. en Arq. Graciela Elizalde Santos
Directora de Obras, Servicios Publicos Y Ecologia

CONTRATISTA

Ing. Marco Pablo Arroyo Prado
COLEON S.A. DE C.V.
Representante Legal


COLEON S.A. DE C.V.		DEPENDENCIA: H. AYUNTAMIENTO DE ESCUINAPA, SINALOA
DOMICILIO. CALLE HIDALGO N°. 46 PONIENTE COLONIA CENTRO, ESCUINAPA, SINALOA.		DIRECCION DE OBRAS, SERVICIOS PUBLICOS Y ECOLOGIA.
R.F.C. COL11012631A	I.M.S.S.	

UBICACIÓN DE LA OBRA

CONTRATO	ESC-FAISMUN-2025-035	ESTIMACION:	01
ESCUINAPA, SINALOA	ESCUINAPA, SINALOA.		ESCUINAPA, SINALOA

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN CALLE FRANCISCO PEREZ ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y FRANCISCO I. MADERO, COL. CENTRO, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ESCUINAPA

CLAVE	DESCRIPCION
PU-11	CALAFATEO CON EMULSION ASFALTICA EN CALIENTE ENJUNTAS DE CONTRACCION , INCLUYE MATERIAL Y MANO DE OBRA.

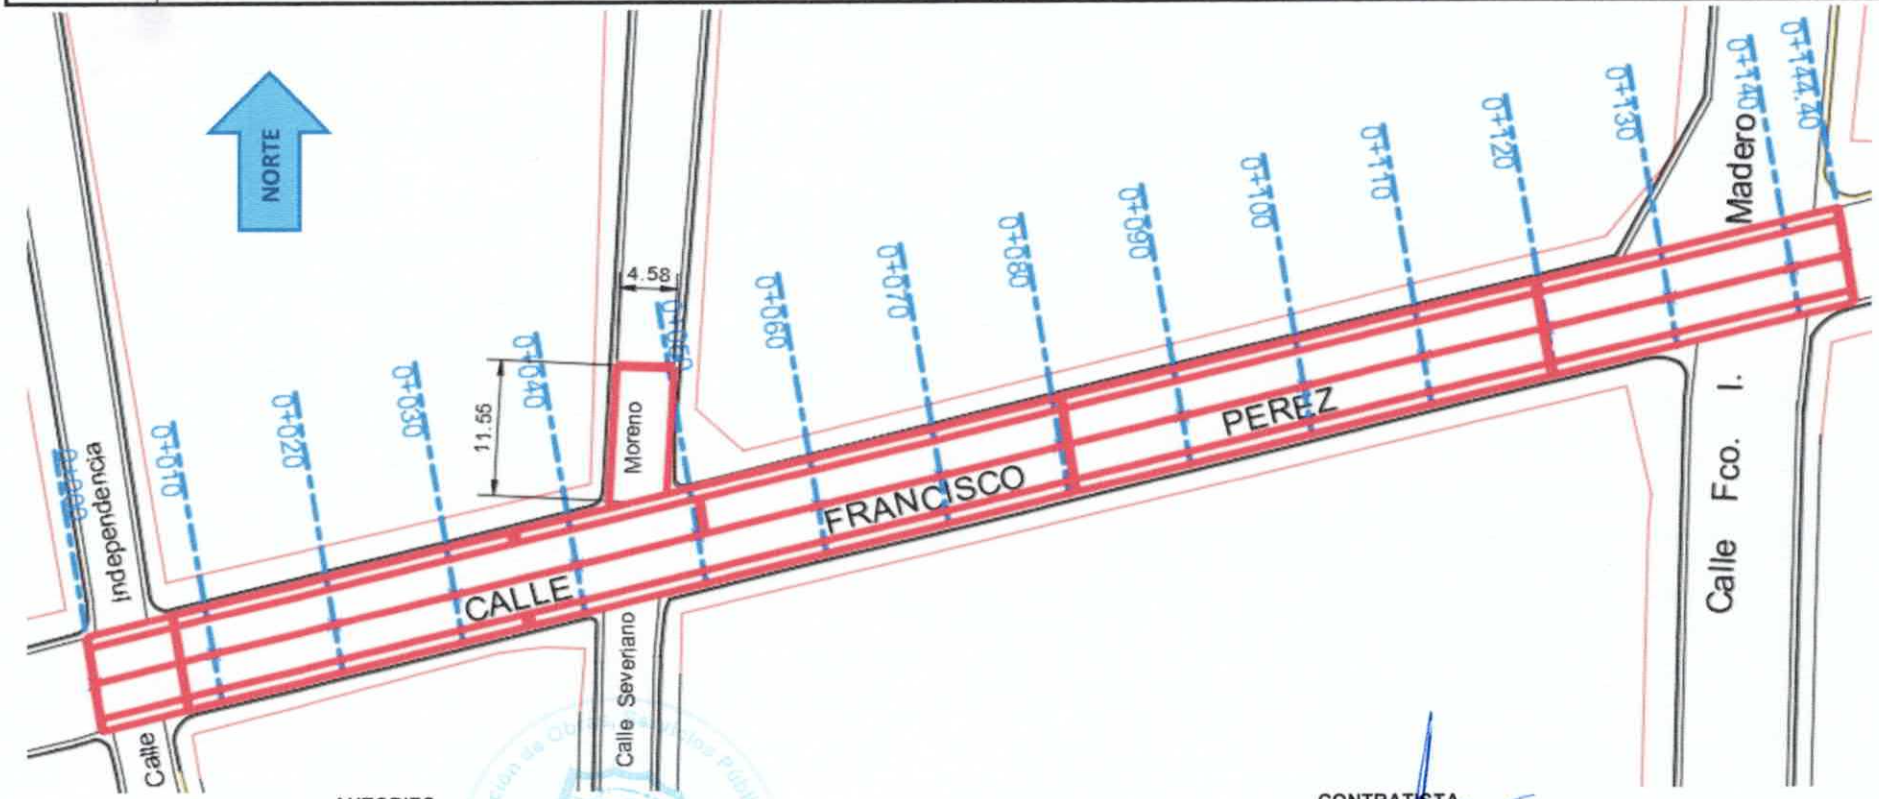

AUTORIZO

M. en Arq. Graciela Elizalde Santos
Directora de Obras, Servicios Publicos Y Ecologia

CONTRATISTA

Ing. Marco Polo Arroyo Prado
COLEON S.A. DE C.V.
Representante Legal

COLEON S.A. DE C.V.		DEPENDENCIA: H. AYUNTAMIENTO DE ESCUINAPA, SINALOA DIRECCION DE OBRAS, SERVICIOS PUBLICOS Y ECOLOGIA.
DOMICILIO. CALLE HIDALGO N°. 46 PONIENTE COLONIA CENTRO, ESCUINAPA, SINALOA.		
R.F.C. COL11012631A	I.M.S.S.	

UBICACIÓN DE LA OBRA

CONTRATO	ESC-FAISMUN-2025-035	ESTIMACION:	01
ESCUINAPA, SINALOA	ESCUINAPA, SINALOA.		ESCUINAPA, SINALOA

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN CALLE FRANCISCO PEREZ ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y FRANCISCO I. MADERO, COL. CENTRO, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ESCUINAPA

CLAVE	DESCRIPCION
PU-11.1	RENIVELACION DE POZO DE VISITA EXISTENTE; INCLUYE; TAPA Y BROCAL DE FIERRO FUNDIDO DE ALTA DENSIDAD NUEVOS.



AUTORIZO

M. en Arq. Graciela Elizalde Santos
Directora de Obras, Servicios Publicos Y Ecologia

CONTRATISTA

Ing. Marco Polo Arroyo Prado
COLEON S.A. DE C.V.
Representante Legal

COLEON S.A. DE C.V.		DEPENDENCIA:
DOMICILIO. CALLE HIDALGO N°. 46 PONIENTE COLONIA CENTRO, ESCUINAPA, SINALOA.		H. AYUNTAMIENTO DE ESCUINAPA, SINALOA
R.F.C. COL11012631A	I.M.S.S.	DIRECCION DE OBRAS, SERVICIOS PUBLICOS Y ECOLOGIA.

UBICACIÓN DE LA OBRA

CONTRATO	ESC-FAISMUN-2025-035	ESTIMACION:	01
ESCUINAPA, SINALOA	ESCUINAPA, SINALOA.		ESCUINAPA, SINALOA

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN CALLE FRANCISCO PEREZ ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y FRANCISCO I. MADERO, COL. CENTRO, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ESCUINAPA

CLAVE	DESCRIPCION
PU-04	ACARREO DE MATERIAL A KM. SUB A 3 KM.



AUTORIZO

M. en Arq. Graciela Elizalde Santos
Directora de Obras, Servicios Publicos Y Ecologia

CONTRATISTA

Ing. Marco Polo Arroyo Prado
COLEON S.A. DE C.V.
Representante Legal


COLEON S.A. DE C.V.		DEPENDENCIA:
DOMICILIO. CALLE HIDALGO N°. 46 PONIENTE COLONIA CENTRO, ESCUINAPA, SINALOA.		H. AYUNTAMIENTO DE ESCUINAPA, SINALOA
R.F.C. COL11012631A	I.M.S.S.	DIRECCION DE OBRAS, SERVICIOS PUBLICOS Y ECOLOGIA.

UBICACIÓN DE LA OBRA

CONTRATO	ESC-FAISMUN-2025-035	ESTIMACION:	01
ESCUINAPA, SINALOA	ESCUINAPA, SINALOA.		ESCUINAPA, SINALOA

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN CALLE FRANCISCO PEREZ ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y FRANCISCO I. MADERO, COL. CENTRO, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ESCUINAPA

CLAVE	DESCRIPCION
PU-10	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LOSA DE CONCRETO F'C=250 KG/CM2 DE 20 CM DE ESPESOR INCLUYE CIMBRA, DESCIMBRA Y MANO DE OBRA. NOTA: (LOS PRECIOS DE ESTE CONCEPTOS ESTAN SUJETOS AL MERCADO DEL COSTO DE LOS INSUMOS EN ESTA ZONA, COMO TAMBIEN LA MANO DE OBRA)



AUTORIZO

M. en Arq. Graciela Elizalde Santos
Directora de Obras, Servicios Publicos Y Ecologia

CONTRATISTA

Ing. Marco Polo Arroyo Prado
COLEON S.A. DE C.V.
Representante Legal


COLEON S.A. DE C.V.		DEPENDENCIA:
DOMICILIO. CALLE HIDALGO N°. 46 PONIENTE COLONIA CENTRO, ESCUINAPA, SINALOA.		**H. AYUNTAMIENTO DE ESCUINAPA, SINALOA**
R.F.C. **COL11012631A**	I.M.S.S.	**DIRECCION DE OBRAS, SERVICIOS PUBLICOS Y ECOLOGIA.**

UBICACIÓN DE LA OBRA


CONTRATO	**ESC-FAISMUN-2025-035**	ESTIMACION:	**01**
ESCUINAPA, SINALOA	**ESCUINAPA, SINALOA.**		**ESCUINAPA, SINALOA**

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN CALLE FRANCISCO PEREZ ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y FRANCISCO I. MADERO, COL. CENTRO, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ESCUINAPA


CLAVE	DESCRIPCION
PU-02	EXCAVACION EN MATERIAL TIPO II PARA ALOJAR BASE, SUB-BASE Y PAVIMENTO. NOTA: (EN ESTE CONCEPTO SE REALIZA LA EXCAVACION A BASE DEL PROYECTO EJECUTIVO PARA REALIZAR LOS TRABAJOS CORRESPONDIENTE DEL PROYECTO, ESTO PARA DAR LOS NIVELES ADECUADOS A LA EJECUCION).



Del 0+000 al 0+005.2



Del 0+005.2 al 0+045.6

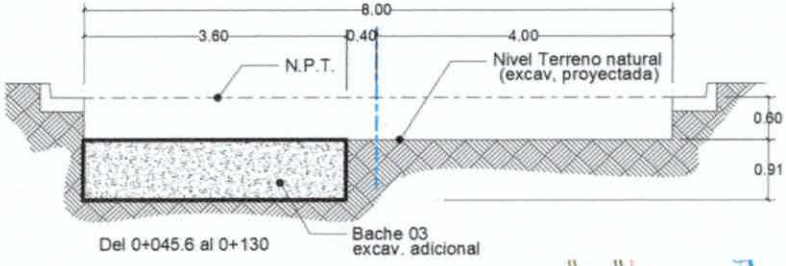

Del 0+045.6 al 0+130



AUTORIZO

M. en Arq. Graciela Elizalde Santos
Directora de Obras, Servicios Publicos Y Ecologia

CONTRATISTA

Ing. Marco Polo Arroyo Prado
COLEON S.A. DE C.V.
Representante Legal


COLEON S.A. DE C.V.	DEPENDENCIA: **H. AYUNTAMIENTO DE ESCUINAPA, SINALOA** **DIRECCION DE OBRAS, SERVICIOS PUBLICOS Y ECOLOGIA.**
DOMICILIO. CALLE HIDALGO N°. 46 PONIENTE COLONIA CENTRO, ESCUINAPA, SINALOA.	
R.F.C. **COL11012631A**	I.M.S.S.

UBICACIÓN DE LA OBRA

CONTRATO	**ESC-FAISMUN-2025-035**	ESTIMACION:	**01**
ESCUINAPA, SINALOA	**ESCUINAPA, SINALOA.**		**ESCUINAPA, SINALOA**

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN CALLE FRANCISCO PEREZ ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y FRANCISCO I. MADERO, COL. CENTRO, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ESCUINAPA

CLAVE	DESCRIPCION
PU-03	CARGA Y ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION A 1ER. KM.

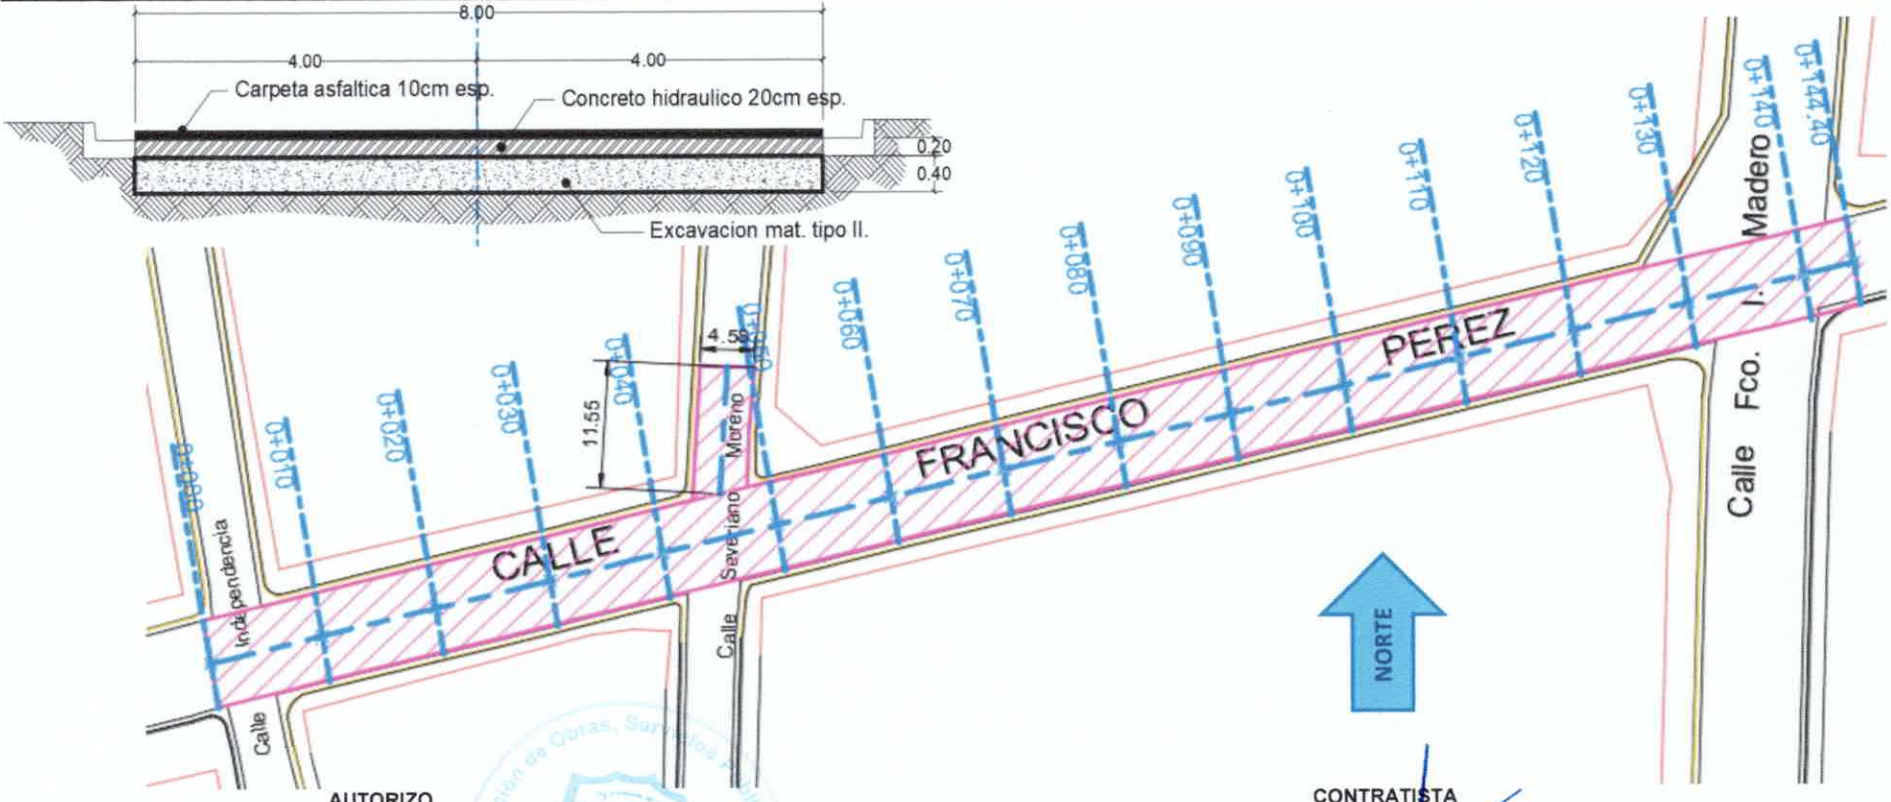

AUTORIZO

M. en Arq. Graciela Elizalde Santos
Directora de Obras, Servicios Publicos Y Ecologia

CONTRATISTA

Ing. Marco Polo Arroyo Prado
COLEON S.A. DE C.V.
Representante Legal


COLEON S.A. DE C.V.		DEPENDENCIA: **H. AYUNTAMIENTO DE ESCUINAPA, SINALOA** **DIRECCION DE OBRAS, SERVICIOS PUBLICOS Y ECOLOGIA.**
DOMICILIO. CALLE HIDALGO N°. 46 PONIENTE COLONIA CENTRO, ESCUINAPA, SINALOA.		
R.F.C. **COL11012631A**	I.M.S.S.	

UBICACIÓN DE LA OBRA

CONTRATO **ESC-FAISMUN-2025-035** **ESCUINAPA, SINALOA**	**ESCUINAPA, SINALOA.**	ESTIMACION:	01 **ESCUINAPA, SINALOA**

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN CALLE FRANCISCO PEREZ ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y FRANCISCO I. MADERO, COL. CENTRO, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ESCUINAPA

CLAVE	DESCRIPCION
PU-07	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MATERIAL DE BANCO PARA SUB-BASE DE 20 CM DE ESPESOR

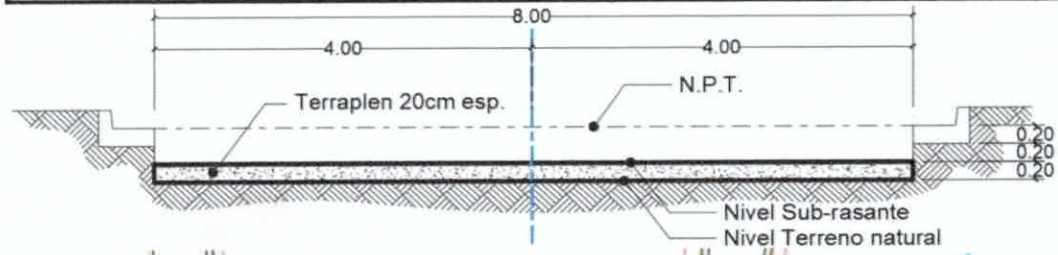

AUTORIZO

M. en Arq. Graciela Elizalde Santos
Directora de Obras, Servicios Publicos Y Ecologia

CONTRATISTA

Ing. Marco Polo Arroyo Prado
COLEON S.A. DE C.V.
Representante Legal


COLEON S.A. DE C.V.		DEPENDENCIA:
DOMICILIO. CALLE HIDALGO N°. 46 PONIENTE COLONIA CENTRO, ESCUINAPA, SINALOA.		**H. AYUNTAMIENTO DE ESCUINAPA, SINALOA**
R.F.C. **COL11012631A**	I.M.S.S.	**DIRECCION DE OBRAS, SERVICIOS PUBLICOS Y ECOLOGIA.**

UBICACIÓN DE LA OBRA

CONTRATO	**ESC-FAISMUN-2025-035**	ESTIMACION:	01
ESCUINAPA, SINALOA	**ESCUINAPA, SINALOA.**		**ESCUINAPA, SINALOA**

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN CALLE FRANCISCO PEREZ ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y FRANCISCO I. MADERO, COL. CENTRO, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ESCUINAPA

CLAVE	DESCRIPCION
PU-08	SUMINISTRO Y COLOCACION DE RIEGO DE IMPREGNACION A RAZON DE 1.5 LTS/M2 PARA PROTEGER TERRACERIA, INCLUYE ARENA PARA SU PROTECCION.

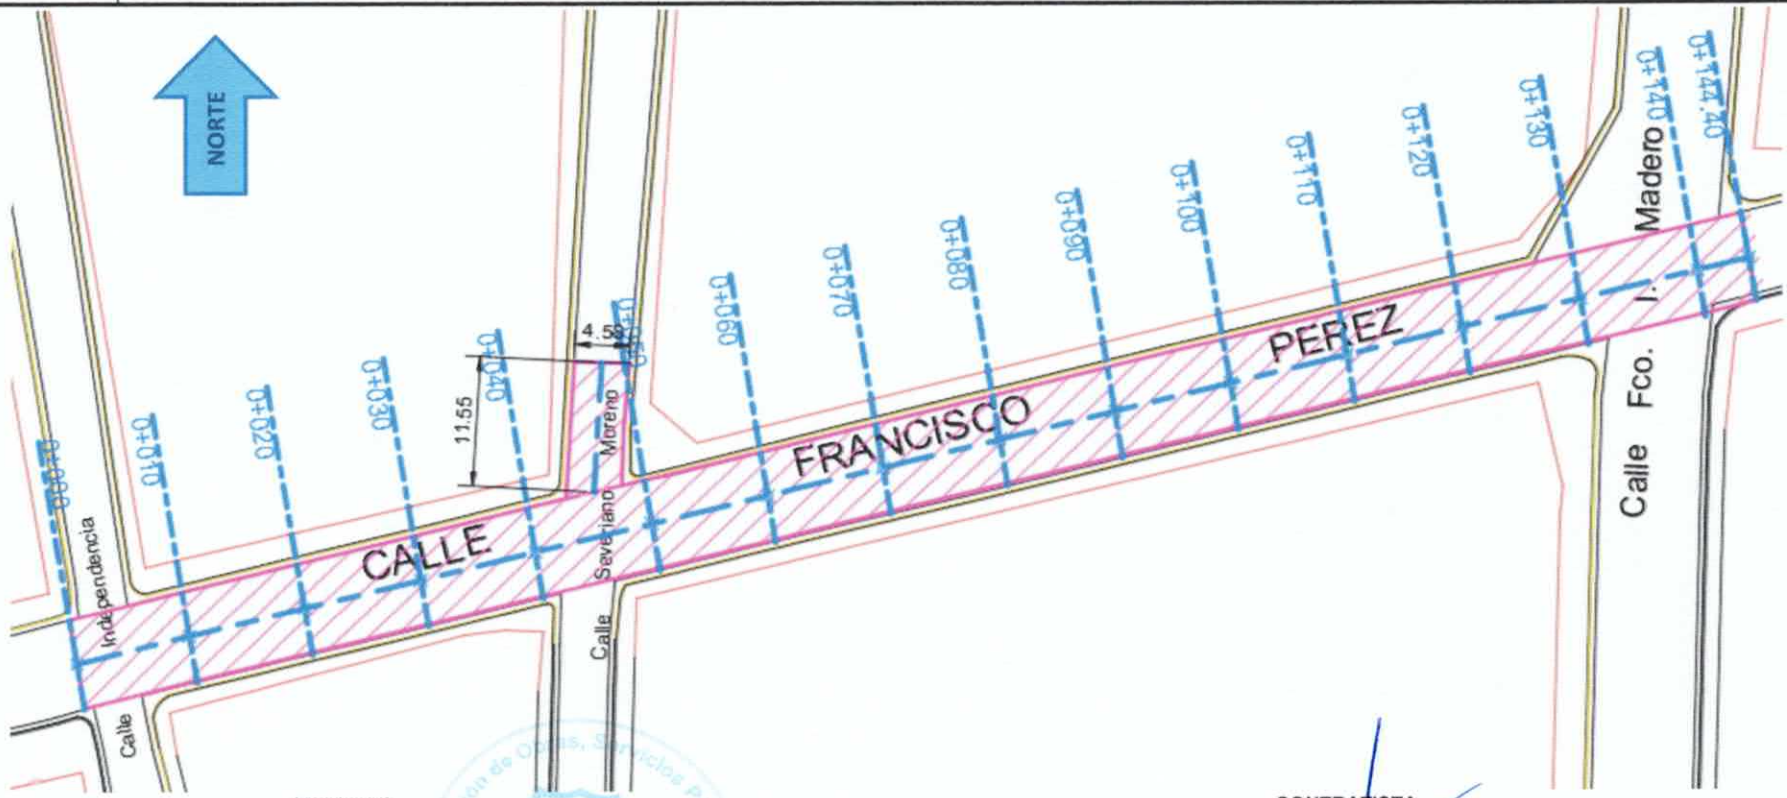

AUTORIZO

M. en Arq. Graciela Elizalde Santos
Directora de Obras, Servicios Publicos Y Ecologia

CONTRATISTA

Ing. Marco Polo Arroyo Prado
COLEON S.A. DE C.V.
Representante Legal


COLEON S.A. DE C.V.		DEPENDENCIA:
DOMICILIO. CALLE HIDALGO N°. 46 PONIENTE COLONIA CENTRO, ESCUINAPA, SINALOA.		**H. AYUNTAMIENTO DE ESCUINAPA, SINALOA**
R.F.C. **COL11012631A**	I.M.S.S.	**DIRECCION DE OBRAS, SERVICIOS PUBLICOS Y ECOLOGIA.**

UBICACIÓN DE LA OBRA

CONTRATO	**ESC-FAISMUN-2025-035**	ESTIMACION:	**01**
ESCUINAPA, SINALOA	**ESCUINAPA, SINALOA.**		**ESCUINAPA, SINALOA**

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN CALLE FRANCISCO PEREZ ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y FRANCISCO I. MADERO, COL. CENTRO, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ESCUINAPA

CLAVE	DESCRIPCION
PU-06	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MATERIAL DE BANCO PARA BASE, DE 20 CM DE ESPESOR.

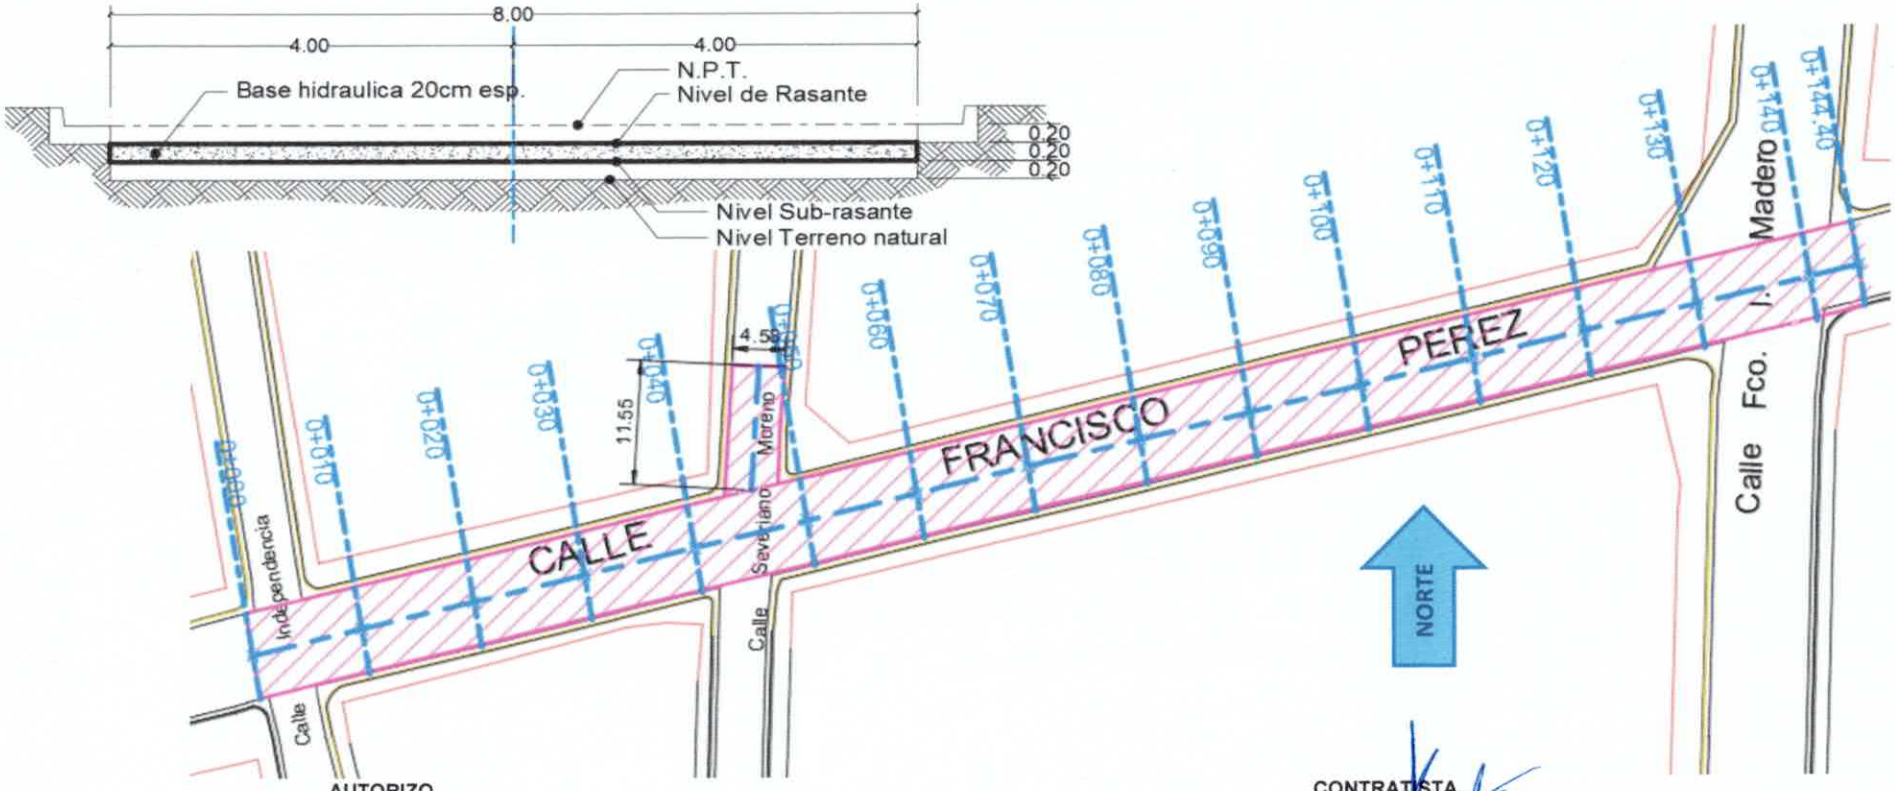

AUTORIZO

M. en Arq. Graciela Elizalde Santos
Directora de Obras, Servicios Publicos Y Ecologia

CONTRATISTA

Ing. Marco Polo Arroyo Prado
COLEON S.A. DE C.V.
Representante Legal

COLEON S.A DE C.V. DOMICILIO - CALLE HIDALGO N°. 46 PONIENTE COLONIA CENTRO, ESCUINAPA, SINALOA. R.F.C. I.M.S.S. COL11012631A	DEPENDENCIA H. AYUNTAMIENTO DE ESCUINAPA, SINALOA DIRECCION DE OBRAS, SERVICIOS PUBLICOS Y ECOLOGIA

REPORTE FOTOGRAFICO

DESCRIPCION:	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN CALLE FRANCISCO PEREZ ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y FRANCISCO I. MADERO, COL. CENTRO, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ESCUINAPA			FECHA:	19/11/2025
CONTRATO:	ESC-FAISMUN-2025-035	LOCALIDAD:	ESCUINAPA, SINALOA	ESTIMACION:	1

CLAVE:	CONCEPTO
PU-01	LIMPIEZA, TRAZO Y NIVELACION DE TERRENO NATURAL









AUTORIZO

M. de Arq. Graciela Elizalde Santos
Directora de Obras, Servicios Publicos Y Ecologia

CONTRATISTA

Ing. Marco Polo Arroyo Prado
COLEON S.A. DE C.V.
Representante Legal

Arq. Cesar Guadalupe Medina Contreras
Supervisor de Obras Publicas
Obras, Servicios Publicos Y Ecologia

COLEON S.A DE C.V. **DOMICILIO - CALLE HIDALGO N°. 46 PONIENTE COLONIA CENTRO, ESCUINAPA, SINALOA.** R.F.C. I.M.S.S. **COL11012631A**	DEPENDENCIA **H. AYUNTAMIENTO DE ESCUINAPA, SINALOA** **DIRECCION DE OBRAS, SERVICIOS PUBLICOS Y ECOLOGIA**

REPORTE FOTOGRAFICO

DESCRIPCION:	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN CALLE FRANCISCO PEREZ ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y FRANCISCO I. MADERO, COL. CENTRO, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ESCUINAPA			FECHA:	19/11/2025
CONTRATO:	ESC-FAISMUN-2025-035	LOCALIDAD:	ESCUINAPA, SINALOA	ESTIMACION:	1

CLAVE:	CONCEPTO
PU-01.1	DEMOLICIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO CON EQUIPO, INCLUYE; MAQUINARIA CON DEMOLEDOR HIDRÁULICO, HERRAMIENTAS.









AUTORIZO

M. de Arq. Graciela Elizalde Santos
Directora de Obras, Servicios Publicos Y Ecologia

CONTRATISTA

Ing. Marco Polo Arroyo Prado
COLEON S.A. DE C.V.
Representante Legal

Arq. Cesar Guadalupe Medina Contreras
Supervisor de Obras Publicas
Obras, Servicios Publicos Y Ecologia

COLEON S.A DE C.V. DOMICILIO - CALLE HIDALGO N°. 46 PONIENTE COLONIA CENTRO, ESCUINAPA, SINALOA. R.F.C. I.M.S.S. COL11012631A	DEPENDENCIA H. AYUNTAMIENTO DE ESCUINAPA, SINALOA DIRECCION DE OBRAS, SERVICIOS PUBLICOS Y ECOLOGIA

REPORTE FOTOGRAFICO

DESCRIPCION:	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN CALLE FRANCISCO PEREZ ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y FRANCISCO I. MADERO, COL. CENTRO, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ESCUINAPA			FECHA:	19/11/2025
CONTRATO:	ESC-FAISMUN-2025-035	LOCALIDAD:	ESCUINAPA, SINALOA	ESTIMACION:	1

CLAVE:	CONCEPTO
PU-02	EXCAVACION EN MATERIAL TIPO II PARA ALOJAR BASE, SUB-BASE Y PAVIMENTO. NOTA: (EN ESTE CONCEPTO SE REALIZA LA EXCAVACION A BASE DEL PROYECTO EJECUTIVO PARA REALIZAR LOS TRABAJOS CORRESPONDIENTE DEL PROYECTO, ESTO PARA DAR LOS NIVELES ADECUADOS A LA EJECUCION).









AUTORIZO

M. de Arq. Graciela Elizalde Santos
Directora de Obras, Servicios Publicos Y Ecologia

CONTRATISTA

Ing. Marco Polo Arroyo Prado
COLEON S.A. DE C.V.
Representante Legal

Arq. Cesar Guadalupe Medina Contreras
Supervisor de Obras Publicas
Obras, Servicios Publicos Y Ecologia

COLEON S.A DE C.V. **DOMICILIO - CALLE HIDALGO N°. 46 PONIENTE COLONIA CENTRO, ESCUINAPA, SINALOA.** R.F.C. I.M.S.S. **COL11012631A**	DEPENDENCIA **H. AYUNTAMIENTO DE ESCUINAPA, SINALOA** **DIRECCION DE OBRAS, SERVICIOS PUBLICOS Y ECOLOGIA**

REPORTE FOTOGRAFICO

DESCRIPCION:	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN CALLE FRANCISCO PEREZ ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y FRANCISCO I. MADERO, COL. CENTRO, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ESCUINAPA			FECHA:	19/11/2025
CONTRATO:	ESC-FAISMUN-2025-035	LOCALIDAD:	ESCUINAPA, SINALOA	ESTIMACION:	1

CLAVE:	CONCEPTO
PU-03	CARGA Y ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION A 1ER. KM.









AUTORIZO

M. de Arq. Graciela Elizalde Santos
Directora de Obras, Servicios Publicos Y Ecologia

CONTRATISTA

Ing. Marco Polo Arroyo Prado
COLEON S.A. DE C.V.
Representante Legal

Arq. Cesar Guadalupe Medina Contreras
Supervisor de Obras Publicas
Obras, Servicios Publicos Y Ecologia

COLEON S.A DE C.V. **DOMICILIO - CALLE HIDALGO N°. 46 PONIENTE COLONIA CENTRO, ESCUINAPA, SINALOA.** R.F.C. I.M.S.S. **COL11012631A**	DEPENDENCIA **H. AYUNTAMIENTO DE ESCUINAPA, SINALOA** **DIRECCION DE OBRAS, SERVICIOS PUBLICOS Y ECOLOGIA**

REPORTE FOTOGRAFICO

DESCRIPCION:	**CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN CALLE FRANCISCO PEREZ ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y FRANCISCO I. MADERO, COL. CENTRO, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ESCUINAPA**			**FECHA:**	**19/11/2025**
CONTRATO:	**ESC-FAISMUN-2025-035**	LOCALIDAD:	**ESCUINAPA, SINALOA**	**ESTIMACION:**	**1**

CLAVE:	CONCEPTO
PU-05	AFINE Y COMPACTADO PROCTOR AL 85% PROCTOR, DE TERRRENO NATURAL PARA RECIBIR TERRACERIAS.









AUTORIZO

M. de Arq. Graciela Elizalde Santos
Directora de Obras, Servicios Publicos Y Ecologia

CONTRATISTA

Ing. Marco Polo Arroyo Prado
COLEON S.A. DE C.V.
Representante Legal

Arq. Cesar Guadalupe Medina Contreras
Supervisor de Obras Publicas
Obras, Servicios Publicos Y Ecologia

COLEON S.A DE C.V. **DOMICILIO - CALLE HIDALGO N°. 46 PONIENTE COLONIA CENTRO, ESCUINAPA, SINALOA.** R.F.C. I.M.S.S. **COL11012631A**	DEPENDENCIA **H. AYUNTAMIENTO DE ESCUINAPA, SINALOA** **DIRECCION DE OBRAS, SERVICIOS PUBLICOS Y ECOLOGIA**

REPORTE FOTOGRAFICO

DESCRIPCION:	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN CALLE FRANCISCO PEREZ ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y FRANCISCO I. MADERO, COL. CENTRO, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ESCUINAPA			FECHA:	19/11/2025
CONTRATO:	ESC-FAISMUN-2025-035	LOCALIDAD:	ESCUINAPA, SINALOA	ESTIMACION:	1

CLAVE:	CONCEPTO
PU-06	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MATERIAL DE BANCO PARA BASE, DE 20 CM DE ESPESOR.









AUTORIZO

M. de Arq. Graciela Elizalde Santos
Directora de Obras, Servicios Publicos Y Ecologia

CONTRATISTA

Ing. Marco Polo Arroyo Prado
COLEON S.A. DE C.V.
Representante Legal

Arq. Cesar Guadalupe Medina Contreras
Supervisor de Obras Publicas
Obras, Servicios Publicos Y Ecologia

COLEON S.A DE C.V. **DOMICILIO - CALLE HIDALGO N°. 46 PONIENTE COLONIA CENTRO, ESCUINAPA, SINALOA.** R.F.C. I.M.S.S. **COL11012631A**	DEPENDENCIA **H. AYUNTAMIENTO DE ESCUINAPA, SINALOA** **DIRECCION DE OBRAS, SERVICIOS PUBLICOS Y ECOLOGIA**

REPORTE FOTOGRAFICO

DESCRIPCION:	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN CALLE FRANCISCO PEREZ ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y FRANCISCO I. MADERO, COL. CENTRO, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ESCUINAPA			FECHA:	19/11/2025
CONTRATO:	ESC-FAISMUN-2025-035	LOCALIDAD:	ESCUINAPA, SINALOA	ESTIMACION:	1

CLAVE:	CONCEPTO
PU-07	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MATERIAL DE BANCO PARA SUB-BASE DE 20 CM DE ESPESOR









AUTORIZO

M. de Arq. Graciela Elizalde Santos
Directora de Obras, Servicios Publicos Y Ecologia

CONTRATISTA

Ing. Marco Polo Arroyo Prado
COLEON S.A. DE C.V.
Representante Legal

Arq. Cesar Guadalupe Medina Contreras
Supervisor de Obras Publicas
Obras, Servicios Publicos Y Ecologia

COLEON S.A DE C.V. **DOMICILIO - CALLE HIDALGO N°. 46 PONIENTE COLONIA CENTRO, ESCUINAPA, SINALOA.** R.F.C. I.M.S.S. **COL11012631A**	DEPENDENCIA **H. AYUNTAMIENTO DE ESCUINAPA, SINALOA** **DIRECCION DE OBRAS, SERVICIOS PUBLICOS Y ECOLOGIA**

REPORTE FOTOGRAFICO

DESCRIPCION:	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN CALLE FRANCISCO PEREZ ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y FRANCISCO I. MADERO, COL. CENTRO, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ESCUINAPA			FECHA:	19/11/2025
CONTRATO:	ESC-FAISMUN-2025-035	LOCALIDAD:	ESCUINAPA, SINALOA	ESTIMACION:	1

CLAVE:	CONCEPTO
PU-08	SUMINISTRO Y COLOCACION DE RIEGO DE IMPREGNACION A RAZON DE 1.5 LTS/M2 PARA PROTEGER TERRACERIA, INCLUYE ARENA PARA SU PROTECCION.









AUTORIZO

M. de Arq. Graciela Elizalde Santos
Directora de Obras, Servicios Publicos Y Ecologia

CONTRATISTA

Ing. Marco Polo Arroyo Prado
COLEON S.A. DE C.V.
Representante Legal

Arq. Cesar Guadalupe Medina Contreras
Supervisor de Obras Publicas
Obras, Servicios Publicos Y Ecologia

COLEON S.A DE C.V. **DOMICILIO - CALLE HIDALGO N°. 46 PONIENTE COLONIA CENTRO, ESCUINAPA, SINALOA.** R.F.C. I.M.S.S. **COL11012631A**	DEPENDENCIA **H. AYUNTAMIENTO DE ESCUINAPA, SINALOA** **DIRECCION DE OBRAS, SERVICIOS PUBLICOS Y ECOLOGIA**

REPORTE FOTOGRAFICO

DESCRIPCION:	**CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN CALLE FRANCISCO PEREZ ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y FRANCISCO I. MADERO, COL. CENTRO, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ESCUINAPA**			**FECHA:**	**19/11/2025**
CONTRATO:	**ESC-FAISMUN-2025-035**	LOCALIDAD:	**ESCUINAPA, SINALOA**	**ESTIMACION:**	**1**

CLAVE:	CONCEPTO
PU-10	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LOSA DE CONCRETO F'C=250 KG/CM2 DE 20 CM DE ESPESOR INCLUYE CIMBRA, DESCIMBRA Y MANO DE OBRA. NOTA: (LOS PRECIOS DE ESTE CONCEPTOS ESTAN SUJETOS AL MERCADO DEL COSTO DE LOS INSUMOS EN ESTA ZONA, COMO TAMBIEN LA MANO DE OBRA)









AUTORIZO

M. de Arq. Graciela Elizalde Santos
Directora de Obras, Servicios Publicos Y Ecologia

CONTRATISTA

Ing. Marco Polo Arroyo Prado
COLEON S.A. DE C.V.
Representante Legal

Arq. Cesar Guadalupe Medina Contreras
Supervisor de Obras Publicas
Obras, Servicios Publicos Y Ecologia

COLEON S.A DE C.V. **DOMICILIO - CALLE HIDALGO N°. 46 PONIENTE COLONIA CENTRO, ESCUINAPA, SINALOA.** R.F.C. I.M.S.S. **COL11012631A**	DEPENDENCIA **H. AYUNTAMIENTO DE ESCUINAPA, SINALOA** **DIRECCION DE OBRAS, SERVICIOS PUBLICOS Y ECOLOGIA**

REPORTE FOTOGRAFICO

DESCRIPCION:	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN CALLE FRANCISCO PEREZ ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y FRANCISCO I. MADERO, COL. CENTRO, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ESCUINAPA			FECHA:	19/11/2025
CONTRATO:	ESC-FAISMUN-2025-035	LOCALIDAD:	ESCUINAPA, SINALOA	ESTIMACION:	1

CLAVE:	CONCEPTO
PU-11	CALAFATEO CON EMULSION ASFALTICA EN CALIENTE ENJUNTAS DE CONTRACCION , INCLUYE MATERIAL Y MANO DE OBRA.









AUTORIZO

M. de Arq. Graciela Elizalde Santos
Directora de Obras, Servicios Publicos Y Ecologia

CONTRATISTA

Ing. Marco Polo Arroyo Prado
COLEON S.A. DE C.V.
Representante Legal

Arq. Cesar Guadalupe Medina Contreras
Supervisor de Obras Publicas
Obras, Servicios Publicos Y Ecologia

COLEON S.A DE C.V. **DOMICILIO - CALLE HIDALGO N°. 46 PONIENTE COLONIA CENTRO, ESCUINAPA, SINALOA.** R.F.C. I.M.S.S. **COL11012631A**	DEPENDENCIA **H. AYUNTAMIENTO DE ESCUINAPA, SINALOA** **DIRECCION DE OBRAS, SERVICIOS PUBLICOS Y ECOLOGIA**

REPORTE FOTOGRAFICO

DESCRIPCION:	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN CALLE FRANCISCO PEREZ ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y FRANCISCO I. MADERO, COL. CENTRO, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ESCUINAPA			FECHA:	19/11/2025
CONTRATO:	ESC-FAISMUN-2025-035	LOCALIDAD:	ESCUINAPA, SINALOA	ESTIMACION:	1

CLAVE:	CONCEPTO
PU-11.1	RENIVELACION DE POZO DE VISITA EXISTENTE; INCLUYE; TAPA Y BROCAL DE FIERRO FUNDIDO DE ALTA DENSIDAD NUEVOS.









AUTORIZO

M. de Arq. Graciela Elizalde Santos
Directora de Obras, Servicios Publicos Y Ecologia

CONTRATISTA

Ing. Marco Polo Arroyo Prado
COLEON S.A. DE C.V.
Representante Legal

Arq. Cesar Guadalupe Medina Contreras
Supervisor de Obras Publicas
Obras, Servicios Publicos Y Ecologia

COLEON S.A DE C.V.

DOMICILIO - CALLE HIDALGO N°. 46 PONIENTE COLONIA CENTRO, ESCUINAPA, SINALOA.
R.F.C. I.M.S.S.
COL11012631A

DEPENDENCIA:
H. AYUNTAMIENTO DE ESCUINAPA, SINALOA.

DIRECCION DE OBRAS, SERVICIOS PUBLICOS Y ECOLOGIA

ESTIMACION

CONTRATO	ESC-FAISMUN-2025-035
LOCALIDAD	ESCUINAPA, SINALOA
DESCRIPCION:	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN CALLE FRANCISCO PEREZ ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y FRANCISCO I. MADERO, COL. CENTRO, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ESCUINAPA

ESTIMACION: 1 EXTRAORDINARIOS

MUNICIPIO: ESCUINAPA

IMPORTE DE OBRA EXTRAORDINARIA:	$2,114,658.06
IMPORTE DE ANTICIPO DE OBRA:	$740,130.32
IMPORTE TOTAL DE CONTRATO:	$2,453,003.35

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	SEGUN PROYECTO			HASTA ESTA ESTIM.	HASTA ESTIM ANT.	EXCEDENTE	DE ESTA ESTIMACION	IMPORTE
			VOL	PU	$					
1.0	REPOSICION DE RED DE AGUA POTABLE CON TUBERIA PVC 3" CALLE FCO. PEREZ									
1.1	PRELIMINARES									
1.1.1	Trazo y nivelación con equipo topografico para tendido de tuberia para red hidraulica. Incluye: personal de topografia, materiales (pinturas, cal, cintas, clavos, estacas, etc.) transporte y acarreos. Así mismo la revisión de las cotas del proyecto; verificando del perfil del terreno natural durante el proceso necesario de la obra.	ML	149.00	$16.46	$2,452.54	141.30	0.00	-7.70	141.30	$2,325.80
1.1.2	Sondeo para localizar tubería existente en campo. Incluye: mano de obra, maquinaria, equipo menor y herramientas, pago de permisos y todo lo necesario para correcta ejecución.	PZA	1.00	$2,652.14	$2,652.14	2.00	0.00	1.00	2.00	$5,304.28
1.1.4	Bombeo de achique con bomba autocebante, propiedad del contratista. Incluye: mano de obra, equipo menor y herramientas.	HR	40.00	$90.12	$3,604.80	24.00	0.00	-16.00	24.00	$2,162.88
EXT-01	Remoción de carpeta asfáltica existente de 10cm espesor sobre el área de rodamiento del pavimento hidráulico existente. Incluye: corte, raspado con máquina y manual, equipo, mano de obra y herramienta.	M2	1208.04	$50.69	$61,235.61	1208.04	0.00	0.00	1208.04	$61,235.61
1.2	EXCAVACIONES Y RELLENOS									
1.2.2	Excavacion de zanja a mano en material tipo I - II, excepto roca, de 0.00 hasta 2.00 mts de profundidad en seco. Incluye: afloje y extracción del material, amacize y limpieza de plantilla y taludes, remoción traspaleos y conservación de la zanja hasta la instalación satisfactoria de la tubería. En seco.	M3	23.54	$301.46	$7,096.37	3.30	0.00	-20.24	3.30	$993.61
1.2.1	Excavacion de zanja por medios mecanico en material tipo I - II, excepto roca, de 0.00 hasta 2.00 mts de profundidad en seco. Incluye: afloje y extracción del material, amacize y limpieza de plantilla y taludes, remoción traspaleos y conservación de la zanja hasta la instalación satisfactoria de la tubería. En seco.	M3	164.76	$90.30	$14,877.83	149.52	0.00	-15.24	149.52	$13,501.66
1.2.3	Excavacion de zanja por medios mecanico en material tipo I - II, excepto roca, de 0.00 hasta 2.00 mts de profundidad en presencia de Agua. Incluye: afloje y extracción del material, amacize y limpieza de plantilla y taludes, remoción traspaleos y conservación de la zanja hasta la instalación satisfactoria de la tubería. En presencia de agua.	M3	47.07	$120.46	$5,670.05	19.00	0.00	-28.07	19.00	$2,288.74
1.2.5	Encofrado con arena de rio aplicando agua, hasta 15cm arriba del lomo del tubo, medido colocado. Incluye: mano de obra, equipo y herraminetas.	M3	44.80	$499.09	$22,359.23	59.81	0.00	15.01	59.81	$29,849.57

Gracieta ES

COLEON S.A DE C.V.

DOMICILIO - CALLE HIDALGO N°. 46 PONIENTE COLONIA CENTRO, ESCUINAPA, SINALOA.
R.F.C. I.M.S.S.
COL11012631A

DEPENDENCIA:
H. AYUNTAMIENTO DE ESCUINAPA, SINALOA.

DIRECCION DE OBRAS, SERVICIOS PUBLICOS Y ECOLOGIA

ESTIMACION

CONTRATO	ESC-FAISMUN-2025-035
LOCALIDAD	ESCUINAPA, SINALOA
DESCRIPCION:	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN CALLE FRANCISCO PEREZ ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y FRANCISCO I. MADERO, COL. CENTRO, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ESCUINAPA

ESTIMACION: 1 EXTRAORDINARIOS

MUNICIPIO: ESCUINAPA

IMPORTE DE OBRA EXTRAORDINARIA:	$2,114,658.06
IMPORTE DE ANTICIPO DE OBRA:	$740,130.32
IMPORTE TOTAL DE CONTRATO:	$2,453,003.35

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	SEGUN PROYECTO			HASTA ESTA ESTIM.	HASTA ESTIM ANT.	EXCEDENTE	DE ESTA ESTIMACION	IMPORTE
			VOL	PU	$					
1.2.6	Relleno con material balastre compactado con equipo menor al 90% de la prueba PROCTOR y aplicando agua, medido colocado. Incluye: mano de obra, equipo y herraminetas.	M3	99.42	$203.50	$20,231.97	89.71	0.00	-9.71	89.71	$18,256.39
EXT-02	Estabilización de terreno natural saturado con Pedraplen de piedra incada y material de banco balastre para relleno compactado al 95% Proctor, incluye: acarreo del material, conformación, afine, maquinaria, material, mano de obra y herramienta.	M3	509.450	$367.54	$187,243.25	509.45	0.00	0.00	509.45	$187,244.87
1.3	TENDIDO DE TUBERIA									
1.3.1	TUBERIA Y PIEZAS ESPECIALES									
1.3.1.1	Suministro e Instalación de Tuberia PVC Hidraulico ANG SI 3" Ø RD-32.5. Incluye: Suministro de material, Junteo, mano de obra especializada, Prueba Hidrostatica sugún Norma Oficial Mexicana NOM-013-CNA-2000 ó vigente, acarreos, suministro de agua para prueba de Campo, carga, maniobras para tendido a lo largo de la zanja, bajado, acoplamiento de atraques, equipo, herramientas y tapones en los extremos de 3" (75mm) de Ø RD-26	M	149.00	$195.98	$29,201.02	141.30	0.00	-7.70	141.30	$27,691.97
1.3.1.2	Suministro e Instalación de CRUZ PVC Hidráulico ANG SI 3" Ø. Incluye: Materiales, mano de obra especializada y herramientas.	PZA	3.00	$1,299.89	$3,899.67	3.00	0.00	0.00	3.00	$3,899.67
1.3.1.3	Suministro e Instalación de Reduccion campana PVC Hidráulico ANG SI 3" x 2" Ø. Incluye: Materiales, Anillos de hule, Limpieza, acarreos, prueba hidroestatica junto con la tuberia, mano de obra especializada y herramientas.	PZA	4.00	$475.70	$1,902.80	8.00	0.00	4.00	8.00	$3,805.60
1.5	TOMAS DOMICILIARIAS									
1.5.1	Toma domiciliaria Tipo AP-19-A de 3.00 a 9.00 m. de Longitud, con Tuberia Extrupack o similar de polietileno de alta densidad y alto peso molecular tipo II de 13 mm de Ø interior RD-9 Termofusionable (Norma NMX-E-018-SCFI-2002 o vigente), incluye: material, camisa de tubo pvc 2" RD-41, suministro de tuberia, abrazadera de insercion de pvc 3x1/2", llave de insercion, excavación a mano, equipo y herramientas.	PZA	20.00	$2,715.82	$54,316.40	19.00	0.00	-1.00	19.00	$51,600.58
1.5.2	Limpieza final de la obra. Incluye: recolección de basura generada por la obra, retiro de escombro y del material sobrante, acarreo fuera del lugar de la obra, mano de obra y herramientas.	LOTE	1.00	$6,709.33	$6,709.33	1.00	0.00	0.00	1.00	$6,709.33

COLEON S.A DE C.V.

DOMICILIO - CALLE HIDALGO N°. 46 PONIENTE COLONIA CENTRO, ESCUINAPA, SINALOA.
R.F.C. I.M.S.S.
COL11012631A

DEPENDENCIA:
H. AYUNTAMIENTO DE ESCUINAPA, SINALOA.

DIRECCION DE OBRAS, SERVICIOS PUBLICOS Y ECOLOGIA

ESTIMACION

CONTRATO	ESC-FAISMUN-2025-035
LOCALIDAD	ESCUINAPA, SINALOA
DESCRIPCION:	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN CALLE FRANCISCO PEREZ ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y FRANCISCO I. MADERO, COL. CENTRO, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ESCUINAPA

ESTIMACION: 1 EXTRAORDINARIOS

MUNICIPIO: ESCUINAPA

IMPORTE DE OBRA EXTRAORDINARIA:	$2,114,658.06
IMPORTE DE ANTICIPO DE OBRA:	$740,130.32
IMPORTE TOTAL DE CONTRATO:	$2,453,003.35

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	SEGUN PROYECTO VOL	PU	$	HASTA ESTA ESTIM.	HASTA ESTIM ANT.	EXCEDENTE	DE ESTA ESTIMACION	IMPORTE
1.4	ALBAÑILERIAS									
1.4.1	Reparacion de guarnicion y banqueta de 5cm esp en area de caja de medidore, con concreto hecho en obra F'c=150 kg/cm2, acabado escabillado fino. Incluye: demolicion de banqueta existente, compactacion, colado y curado de concreto, mano de obra y herramienta.	M2	50.00	$775.55	$38,777.50	39.75	0.00	-10.25	39.75	$30,828.11
									TOTAL DE RED DE AGUA POTABLE:	$447,698.68

TOTAL DE RED DE AGUA POTABLE:	$447,698.68
AMORTIZACION ANTICIPO (35%) :	$164,602.05
TOTAL DE RED DE AGUA POTABLE:	$283,096.63
TOTAL I.V.A. (16%) :	$45,295.46
TOTAL DE ESTIMACION CON IVA.	$328,392.09

REVISO

Arq. Cesar Guadalupe Medina Contreras
Supervisor de Obras Publicas

AUTORIZO

M. de Arq. Graciela Elizalde Santos
Directora de Obras, Servicios Publicos Y Ecologia

CONTRATISTA

Ing. Marco Polo Arroyo Prado
COLEON S.A. DE C.V.
Representante Legal

CONTRATISTA: COLEON S.A DE C.V.

DOMICILIO - CALLE HIDALGO N°. 46 PONIENTE COLONIA CENTRO, ESCUINAPA, SINALOA.

R.F.C. COL11012631A

I.M.S.S.

HOJA:

DEPENDENCIA:
H. AYUNTAMIENTO DE ESCUINAPA, SINALOA.

DIRECCION DE OBRAS, SERVICIOS PUBLICOS Y ECOLOGIA

ESTADO DE CUENTA

CONTRATO: ESC-FAISMUN-2025-035

ESTIMACION: 1 EXTRAORDINARIO

LOCALIDAD: MUNICIPIO DE ESCUINAPA

MUNICIPIO: ESCUINAPA

DESCRIPCION: CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN CALLE FRANCISCO PEREZ ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y FRANCISCO I. MADERO, COL. CENTRO, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ESCUINAPA

OF. APROB.

FECHA APROB.

PERIODO DE CONTRATO DEL: 22-oct-25 AL 31-dic-25

IMPORTE DE OBRA: $2,114,658.06

IMPORTE DE ANTICIPO DE OBRA: $740,130.32

IMPORTE TOTAL DE CONTRATO: $2,453,003.35

CONVENIO ADICIONAL:

PERIODO CONVENIO ADICIONAL: DEL AL

No. DE ESTIMACION	PERIODO		IMPORTE ESTIMACION $	IMPORTE $ SIN IVA	3% A INSP DE OBRAS $	AMORTIZACION ANTICIPO	TOTAL DEDUCCIONES SIN IVA	TOTAL DE MONTO CON IVA:	LIQUIDO A PAGAR
01	22-oct-25	21-nov-25	$1,907,465.13	$ 1,644,366.49	$ 49,330.99	$575,528.27	1,068,838.22	$1,239,852.33	$1,190,521.34
01 EXT.	22-oct-25	21-nov-25	$519,330.47	$ 447,698.68	$ 13,430.96	$164,602.05	283,096.63	$328,392.09	$314,961.13
TOTALES:			$ 2,426,795.60	$ 2,092,065.17	$ 62,761.96	$ 740,130.32	$ 1,351,934.85	$1,568,244.421	$1,505,482.466
SALDO DEL CONTRATO:			$26,207.75	SALDO DE ANTICIPO POR AMORTIZAR:		$0.00			

AUTORIZO

M. de Arq. Graciela Elizalde Santos
Directora de Obras, Servicios Publicos Y Ecologia

CONTRATISTA

Ing. Marco Polo Arroyo Prado
COLEON S.A. DE C.V.
Representante Legal

SUPERVISOR DE OBRA

Arq. Cesar Guadalupe Medina Contreras

COL S.A DE C.V.

DOMICILIO - CALLE HIDALGO N°. 46 PONIENTE COLONIA CENTRO, ESCUINAPA, SINALOA.

R.F.C. COL11012631A

I.M.S.S.

DEPENDENCIA:
H. AYUNTAMIENTO DE ESCUINAPA, SINALOA.

DIRECCION DE OBRAS, SERVICIOS PUBLICOS Y ECOLOGIA

RESUMEN DE ESTIMACION

CONTRATO: ESC-FAISMUN-2025-035

LOCALIDAD: MUNICIPIO DE ESCUINAPA

ESTIMACION: 1 EXTRAORDINARIOS

MUNICIPIO: ESCUINAPA

DESCRIPCION: CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN CALLE FRANCISCO PEREZ ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y FRANCISCO I. MADERO, COL. CENTRO, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ESCUINAPA

IMPORTE OBRA EXTRAORDINARIA:	$2,114,658.06
IMPORTE DE ANTICIPO DE OBRA:	$740,130.32
IMPORTE TOTAL DE CONTRATO:	$2,453,003.35

RED DE AGUA POTABLE CON TUBERIA PVC 3"	$ 283,096.63
TOTAL =	$ 283,096.63
TOTAL CON IVA =	$ 328,392.09

CONTRATISTA

Ing. Marco Polo Arroyo Prado
COLEON S.A. DE C.V.
Representante Legal

AUTORIZO

M. de Arq. Graciela Elizalde Santos
Directora de Obras, Servicios Publicos Y Ecologia

SUPERVISOR DE OBRA

Arq. Cesar Guadalupe Medina Contreras
Supervisor de Obras Publicas

RECIBO No: 01

CONTRATISTA:	COLEON S.A DE C.V.
DOMICILIO:	DOMICILIO - CALLE HIDALGO N°. 46 PONIENTE COLONIA CENTRO, ESCUINAPA, SINALOA.
R.F.C.	COL11012631A
UBICACION:	ESCUINAPA, SINALOA.
I.M.S.S.	

FECHA :	21-nov-25
ESTIMACION No:	01
PERIODO:	
DEL	22-oct-25
AL	21-nov-25

CONTRATO: ESC-FAISMUN-2025-035

FECHA DE CONTRATO:	22-oct-25
PERIODO DE EJECUCION DEL CONTRATO:	
INICIO:	22-oct-25
TERMINACION:	31-dic-25

DESCRIPCION:
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN CALLE FRANCISCO PEREZ ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y FRANCISCO I. MADERO, COL. CENTRO, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ESCUINAPA

CONTRATO N0: ESC-FAISMUN-2025-035

IMPORTE SIN IVA	IMPORTE CON IVA	35% ANTICIPO	TOTAL DE CONTRATO:
$2,114,658.06	$2,453,003.35	$740,130.32	$2,453,003.35

BUENO POR: $ 314,961.13

RECIBI DEL H. AYUNTAMIENTO DE ESCUINAPA LA CANTIDAD DE:

$ 314,961.13 (SON: QUINIENTOS VEINTIUN MIL NOVECIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS 33/100 M. N.)

EN PAGO DE ESTIMACION 01 EXTRAORDINARIOS: REPOSICION DE RED DE AGUA POTABLE CON TUBERIA PVC 3" CALLE FCO. PEREZ

DEDUCCIONES:		CALCULO DE ESTIMACION	
AMORTIZACION ANTICIPO 35% (*)	$ 740,130.32	TOTAL DE LA OBRA EJECUTADA SIN IVA	283,096.63
MAS I.V.A.	$ 118,420.85	MAS I.V.A 16 %	$ 45,295.46
TOTAL AMORTIZACION DE ANTICIPO	$164,602.05	TOTAL DE LA OBRA EJECUTADA CON IVA	$ 328,392.09
3 % SFP INSP. OBRAS: (*)	$ 13,430.96	MENOS DEDUCCIONES 3% DE INSPECCION Y VIGILANCIA:	$ 13,430.96
2 AL MILLAR C.M.I.C.	$ -		
TOTAL DEDUCCIONES	13,430.96		
(*) DEL IMPORTE EJECUTADO CON IVA		SALDO A PAGAR:	314,961.13

AUTORIZO

M. de Arq. Graciela Elizalde Santos
Directora de Obras, Servicios Publicos Y Ecologia

CONTRATISTA

Ing. Marco Polo Arroyo Prado
COLEON S.A. DE C.V.
Representante Legal

SUPERVISOR DE OBRA

Arq. Cesar Guadalupe Medina Contreras

CO[illegible]N S.A DE C.V.
NOMBRE

DOMICILIO - CALLE HIDALGO N°. 46 PONIENTE COLONIA CENTRO, ESCUINAPA, SINALOA.

R.F.C. COL11012631A

I.M.S.S.

DEPENDENCIA:
H. AYUNTAMIENTO DE ESCUINAPA, SINALOA.

DIRECCION DE OBRAS, SERVICIOS PUBLICOS Y ECOLOGIA

NUMEROS GENERADORES

CONTRATO: ESC-FAISMUN-2025-035

ESTIMACION: 1 EXTRAORDINARIOS

LOCALIDAD: MUNICIPIO DE ESCUINAPA

MUNICIPIO: ESCUINAPA

DESCRIPCION: CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN CALLE FRANCISCO PEREZ ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y FRANCISCO I. MADERO, COL. CENTRO, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ESCUINAPA

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	LOCALIZACION		LARGO	ANCHO	ALTO	RESULTADO	OBSERVACION
			TRAMO	PZAS					
	REPOSICION DE RED DE AGUA POTABLE CON TUBERIA PVC 3" CALLE FCO. PEREZ								
	PRELIMINARES		C. INDEPENDENCIA - C. FCO. I. MADERO						
1.1.1	Trazo y nivelación con equipo topografico para tendido de tuberia para red hidraulica. Incluye: personal de topografía, materiales (pinturas, cal, cintas, clavos, estacas, etc.) transporte y acarreos. Así mismo la revisión de las cotas del proyecto; verificando del perfil del terreno natural durante el proceso necesario de la obra..	ML	0+000.8 al 0+010		9.20			9.20	
			0+010 al 0+020		10.00			10.00	
			0+030 al 0+040		20.00			20.00	
			0+050 al 0+060		20.00			20.00	
			0+070 al 0+080		20.00			20.00	
			0+090 al 0+100		20.00			20.00	
			0+110 al 0+120		20.00			20.00	
			0+130 al 0+140		20.00			20.00	
			0+140 al 0+142.1		2.10			2.10	
							TOTAL DE 1.1.1.:	141.30	ML

REVISO

Arq. Cesar Guadalupe Medina Contreras
Supervisor de Obras Publicas

AUTORIZO

M. de Arq. Graciela Elizalde Santos
Directora de Obras, Servicios Publicos Y Ecologia

CONTRATISTA

Ing. Marco Polo Arroyo Prado
COLEON S.A. DE C.V.
Representante Legal

CO[illegible]ON S.A DE C.V.
NOMBRE

DOMICILIO - CALLE HIDALGO N°. 46 PONIENTE COLONIA CENTRO, ESCUINAPA, SINALOA.

R.F.C. COL11012631A

I.M.S.S.

DEPENDENCIA:
H. AYUNTAMIENTO DE ESCUINAPA, SINALOA.

DIRECCION DE OBRAS, SERVICIOS PUBLICOS Y ECOLOGIA

NUMEROS GENERADORES

CONTRATO: ESC-FAISMUN-2025-035

ESTIMACION: 1 EXTRAORDINARIOS

LOCALIDAD: MUNICIPIO DE ESCUINAPA

MUNICIPIO: ESCUINAPA

DESCRIPCION: CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN CALLE FRANCISCO PEREZ ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y FRANCISCO I. MADERO, COL. CENTRO, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ESCUINAPA

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	LOCALIZACION		LARGO	ANCHO	ALTO	RESULTADO	OBSERVACION
			TRAMO	PZAS					
	REPOSICION DE RED DE AGUA POTABLE CON TUBERIA PVC 3" CALLE FCO. PEREZ								
	PRELIMINARES		C. INDEPENDENCIA - C. FCO. I. MADERO						
1.1.2	Sondeo para localizar tuberia existente en campo. Incluye: mano de obra, maquinaria, equipo menor y herramientas, pago de permisos y todo lo necesario para correcta ejecución.	PZA	0+000	1.00				1.00	
			0+133	1.00				1.00	
							TOTAL DE 1.1.2 :	2.00	PZA

REVISO

Arq. Cesar Guadalupe Medina Contreras
Supervisor de Obras Publicas

AUTORIZO

M. de Arq. Graciela Elizalde Santos
Directora de Obras, Servicios Publicos Y Ecologia

CONTRATISTA

Ing. Marco Polo Arroyo Prado
COLEON S.A. DE C.V.
Representante Legal

CO...ON S.A DE C.V.
NOMBRE

DOMICILIO - CALLE HIDALGO N°. 46 PONIENTE COLONIA CENTRO, ESCUINAPA, SINALOA.

R.F.C. COL11012631A

I.M.S.S.

DEPENDENCIA:
H. AYUNTAMIENTO DE ESCUINAPA, SINALOA.

DIRECCION DE OBRAS, SERVICIOS PUBLICOS Y ECOLOGIA

NUMEROS GENERADORES

CONTRATO: ESC-FAISMUN-2025-035

ESTIMACION: 1 EXTRAORDINARIOS

LOCALIDAD: MUNICIPIO DE ESCUINAPA

MUNICIPIO: ESCUINAPA

DESCRIPCION: CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN CALLE FRANCISCO PEREZ ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y FRANCISCO I. MADERO, COL. CENTRO, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ESCUINAPA

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	LOCALIZACION		LARGO	ANCHO	ALTO	RESULTADO	OBSERVACION
			TRAMO	PZAS					
	REPOSICION DE RED DE AGUA POTABLE CON TUBERIA PVC 3" CALLE FCO. PEREZ								
	PRELIMINARES		C. INDEPENDENCIA - C. FCO. I. MADERO						
1.1.4	Bombeo de achique con bomba autocebante, propiedad del contratista. Incluye: mano de obra, equipo menor y herramientas.	HR	0+000	4.00				4.00	
			0+042	7.00				7.00	
			0+142.1	13.00				13.00	
							TOTAL DE 1.1.4 :	24.00	HR

REVISO

Arq. Cesar Guadalupe Medina Contreras
Supervisor de Obras Publicas

AUTORIZO

M. de Arq. Graciela Elizalde Santos
Directora de Obras, Servicios Publicos Y Ecologia

CONTRATISTA

Ing. Marco Polo Arroyo Prado
COLEON S.A. DE C.V.
Representante Legal

C[illegible]ON S.A DE C.V.
NOMBRE

DOMICILIO - CALLE HIDALGO N°. 46 PONIENTE COLONIA CENTRO, ESCUINAPA, SINALOA.

R.F.C. COL11012631A

I.M.S.S.

DEPENDENCIA:
H. AYUNTAMIENTO DE ESCUINAPA, SINALOA.

DIRECCION DE OBRAS, SERVICIOS PUBLICOS Y ECOLOGIA

NUMEROS GENERADORES

CONTRATO: ESC-FAISMUN-2025-035

LOCALIDAD: MUNICIPIO DE ESCUINAPA

ESTIMACION: 1 EXTRAORDINARIOS

MUNICIPIO: ESCUINAPA

DESCRIPCION: CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN CALLE FRANCISCO PEREZ ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y FRANCISCO I. MADERO, COL. CENTRO, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ESCUINAPA

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	LOCALIZACION		LARGO	ANCHO	ALTO	RESULTADO	OBSERVACION
			TRAMO	PZAS					
	REPOSICION DE RED DE AGUA POTABLE CON TUBERIA PVC 3" CALLE FCO. PEREZ								
	PRELIMINARES		C. INDEPENDENCIA - C. FCO. I. MADERO						
EXT-01	Remoción de carpeta asfáltica existente de 10cm espesor sobre el área de rodamiento del pavimento hidráulico existente. Incluye: corte, raspado con máquina y manual, equipo, mano de obra y herramienta.	M2	0+000 al 0+010		10.00	8.00		80.00	
			0+010 al 0+020		10.00	8.00		80.00	
			0+020 al 0+030		10.00	8.00		80.00	
			0+030 al 0+040		10.00	8.00		80.00	
			0+040 al 0+050		10.00	8.00		80.00	
			0+050 al 0+060		10.00	8.00		80.00	
			0+060 al 0+070		10.00	8.00		80.00	
			0+070 al 0+080		10.00	8.00		80.00	
			0+080 al 0+090		10.00	8.00		80.00	
			0+090 al 0+100		10.00	8.00		80.00	
			0+100 al 0+110		10.00	8.00		80.00	
			0+110 al 0+120		10.00	8.00		80.00	
			0+120 al 0+130		10.00	8.00		80.00	
			0+130 al 0+140		10.00	8.00		80.00	
			0+140 al 0+144.40		4.40	8.00		35.20	
			BOCACALLE SEVERIANO MORENO		11.55	4.58		52.84	
							TOTAL DE EXT-02 :	1208.04	HR

REVISO

Arq. Cesar Guadalupe Medina Contreras
Supervisor de Obras Publicas

AUTORIZO

M. de Arq. Graciela Elizalde Santos
Directora de Obras, Servicios Publicos Y Ecologia

CONTRATISTA

Ing. Marco Polo Arroyo Prado
COLEON S.A. DE C.V.
Representante Legal

COLEON S.A DE C.V.
NOMBRE

DOMICILIO - CALLE HIDALGO N°. 46 PONIENTE COLONIA CENTRO, ESCUINAPA, SINALOA.

R.F.C. COL11012631A

I.M.S.S.

DEPENDENCIA:
H. AYUNTAMIENTO DE ESCUINAPA, SINALOA.

DIRECCION DE OBRAS, SERVICIOS PUBLICOS Y ECOLOGIA

NUMEROS GENERADORES

CONTRATO: ESC-FAISMUN-2025-035

ESTIMACION: 1 EXTRAORDINARIOS

LOCALIDAD: MUNICIPIO DE ESCUINAPA

MUNICIPIO: ESCUINAPA

DESCRIPCION: CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN CALLE FRANCISCO PEREZ ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y FRANCISCO I. MADERO, COL. CENTRO, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ESCUINAPA

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	LOCALIZACION		LARGO	ANCHO	ALTO	RESULTADO	OBSERVACION
			TRAMO	PZAS					
	REPOSICION DE RED DE AGUA POTABLE CON TUBERIA PVC 3" CALLE FCO. PEREZ								
	EXCAVACIONES Y RELLENOS		C. INDEPENDENCIA - C. FCO. I. MADERO						
1.2.2	Excavacion de zanja a mano en material tipo I - II, excepto roca, de 0.00 hasta 2.00 mts de profundidad en seco. Incluye: afloje y extracción del material, amacize y limpieza de plantilla y taludes, remoción traspaleos y conservación de la zanja hasta la instalación satisfactoria de la tubería. En seco.	M3	0+012		1.10	0.40	0.40	0.18	
			0+018		1.30	0.40	0.40	0.21	
			0+020		1.30	0.40	0.40	0.21	
			0+028		1.30	0.40	0.40	0.21	
			0+030		1.30	0.40	0.40	0.21	
			0+056		1.10	0.40	0.40	0.18	
			0+058		1.10	0.40	0.40	0.18	
			0+059		1.10	0.40	0.40	0.18	
			0+064		1.10	0.40	0.40	0.18	
			0+065		1.10	0.40	0.40	0.18	
			0+076.5		1.10	0.40	0.40	0.18	
			0+082		1.10	0.40	0.40	0.18	
			0+087.5		1.10	0.40	0.40	0.18	
			0+093		1.10	0.40	0.40	0.18	
			0+094		1.10	0.40	0.40	0.18	
			0+100		1.10	0.40	0.40	0.18	
			0+104		1.10	0.40	0.40	0.18	
			0+113		1.10	0.40	0.40	0.18	
					TOTAL DE 1.2.2			3.30	M3

REVISO

Arq. Cesar Guadalupe Medina Contreras
Supervisor de Obras Publicas

AUTORIZO

M. de Arq. Graciela Elizalde Santos
Directora de Obras, Servicios Publicos Y Ecologia

CONTRATISTA

Ing. Marco Polo Arroyo Prado
COLEON S.A. DE C.V.
Representante Legal

LEON S.A DE C.V.
MBRE

DOMICILIO - CALLE HIDALGO N°. 46 PONIENTE COLONIA CENTRO, ESCUINAPA, SINALOA.

R.F.C. COL11012631A

I.M.S.S.

DEPENDENCIA:
H. AYUNTAMIENTO DE ESCUINAPA, SINALOA.

DIRECCION DE OBRAS, SERVICIOS PUBLICOS Y ECOLOGIA

NUMEROS GENERADORES

CONTRATO: ESC-FAISMUN-2025-035

LOCALIDAD: MUNICIPIO DE ESCUINAPA

ESTIMACION: 1 EXTRAORDINARIOS

MUNICIPIO: ESCUINAPA

DESCRIPCION: CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN CALLE FRANCISCO PEREZ ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y FRANCISCO I. MADERO, COL. CENTRO, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ESCUINAPA

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	LOCALIZACION		LARGO	ANCHO	ALTO	RESULTADO	OBSERVACION
			TRAMO	PZAS					
	REPOSICION DE RED DE AGUA POTABLE CON TUBERIA PVC 3" CALLE FCO. PEREZ								
	EXCAVACIONES Y RELLENOS								
1.2.1	Excavacion de zanja por medios mecanico en material tipo I - II, excepto roca, de 0.00 hasta 2.00 mts de profundidad en seco. Incluye: afloje y extracción del material, amacize y limpieza de plantilla y taludes, remoción traspaleos y conservación de la zanja hasta la instalación satisfactoria de la tubería. En seco.		**C. INDEPENDENCIA - C. FCO. I. MADERO**						
		M3	0+000 al 0+143		143.00	0.80	1.00	114.40	
			0+012		1.60	0.80	1.00	1.28	
			0+018		6.10	0.80	1.00	4.88	
			0+020		6.10	0.80	1.00	4.88	
			0+028		1.60	0.80	1.00	1.28	
			0+030		6.10	0.80	1.00	4.88	
			0+056		1.60	0.80	1.00	1.28	
			0+058		1.60	0.80	1.00	1.28	
			0+058.5		1.60	0.80	1.00	1.28	
			0+059		1.60	0.80	1.00	1.28	
			0+064		1.60	0.80	1.00	1.28	
			0+065		1.60	0.80	1.00	1.28	
			0+076.5		1.60	0.80	1.00	1.28	
			0+082		1.60	0.80	1.00	1.28	
			0+087.5		1.60	0.80	1.00	1.28	
			0+093		1.60	0.80	1.00	1.28	
			0+094		1.60	0.80	1.00	1.28	
			0+100		1.60	0.80	1.00	1.28	
			0+104		1.60	0.80	1.00	1.28	
			0+113		1.60	0.80	1.00	1.28	
							TOTAL DE 1.2.1 :	149.52	M3

REVISO

Arq. Cesar Guadalupe Medina Contreras
Supervisor de Obras Publicas

AUTORIZO

M. de Arq. Graciela Elizalde Santos
Directora de Obras, Servicios Publicos Y Ecologia

CONTRATISTA

Ing. Marco Polo Arroyo Prado
COLEON S.A. DE C.V.
Representante Legal

ON S.A DE C.V.
NOMBRE

DOMICILIO - CALLE HIDALGO N°. 46 PONIENTE COLONIA CENTRO, ESCUINAPA, SINALOA.

R.F.C. COL11012631A

I.M.S.S.

DEPENDENCIA:
H. AYUNTAMIENTO DE ESCUINAPA, SINALOA.

DIRECCION DE OBRAS, SERVICIOS PUBLICOS Y ECOLOGIA

NUMEROS GENERADORES

CONTRATO: ESC-FAISMUN-2025-035

LOCALIDAD: MUNICIPIO DE ESCUINAPA

ESTIMACION: 1 EXTRAORDINARIOS

MUNICIPIO: ESCUINAPA

DESCRIPCION: CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN CALLE FRANCISCO PEREZ ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y FRANCISCO I. MADERO, COL. CENTRO, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ESCUINAPA

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	LOCALIZACION		LARGO	ANCHO	ALTO	RESULTADO	OBSERVACION
			TRAMO	PZAS					
	REPOSICION DE RED DE AGUA POTABLE CON TUBERIA PVC 3" CALLE FCO. PEREZ								
	EXCAVACIONES Y RELLENOS		C. INDEPENDENCIA - C. FCO. I. MADERO						
1.2.3	Excavacion de zanja por medios mecanico en material tipo I - II, excepto roca, de 0.00 hasta 2.00 mts de profundidad en presencia de Agua. Incluye: afloje y extracción del material, amacize y limpieza de plantilla y taludes, remoción traspaleos y conservación de la zanja hasta la instalación satisfactoria de la tubería. En presencia de agua.	M3	0+000		2.00	1.00	1.00	2.00	
			0+002 (cruce c. Independencia)		5.00	1.00	1.00	5.00	
			0+042 (cruce c. Severiano Moreno)		5.00	1.00	1.00	5.00	
			0+124 (cruce c. Fco. I. Madero)		5.00	1.00	1.00	5.00	
			0+143		2.00	1.00	1.00	2.00	
							TOTAL DE 1.2.3 :	19.00	M3

REVISO

Arq. Cesar Guadalupe Medina Contreras
Supervisor de Obras Publicas

AUTORIZO

M. de Arq. Graciela Elizalde Santos
Directora de Obras, Servicios Publicos Y Ecologia

CONTRATISTA

Ing. Marco Polo Arroyo Prado
COLEON S.A. DE C.V.
Representante Legal

C ON S.A DE C.V.
NOMBRE

DOMICILIO - CALLE HIDALGO N°. 46 PONIENTE COLONIA CENTRO, ESCUINAPA, SINALOA.

R.F.C. COL11012631A

I.M.S.S.

DEPENDENCIA:
H. AYUNTAMIENTO DE ESCUINAPA, SINALOA.

DIRECCION DE OBRAS, SERVICIOS PUBLICOS Y ECOLOGIA

NUMEROS GENERADORES

CONTRATO: ESC-FAISMUN-2025-035

LOCALIDAD: MUNICIPIO DE ESCUINAPA

ESTIMACION: 1 EXTRAORDINARIOS

MUNICIPIO: ESCUINAPA

DESCRIPCION: CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN CALLE FRANCISCO PEREZ ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y FRANCISCO I. MADERO, COL. CENTRO, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ESCUINAPA

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	LOCALIZACION		LARGO	ANCHO	ALTO	RESULTADO	OBSERVACION
			TRAMO	PZAS					
	REPOSICION DE RED DE AGUA POTABLE CON TUBERIA PVC 3" CALLE FCO. PEREZ								
	EXCAVACIONES Y RELLENOS		C. INDEPENDENCIA - C. FCO. I. MADERO						
1.2.5	Encofrado con arena de rio aplicando agua, hasta 15cm arriba del lomo del tubo, medido colocado. Incluye: mano de obra, equipo y herraminetas.	M3	0+000 al 0+143		143.00	0.80	0.40	45.76	
			0+012		1.60	0.80	0.40	0.51	
			0+018		6.10	0.80	0.40	1.95	
			0+020		6.10	0.80	0.40	1.95	
			0+028		1.60	0.80	0.40	0.51	
			0+030		6.10	0.80	0.40	1.95	
			0+056		1.60	0.80	0.40	0.51	
			0+058		1.60	0.80	0.40	0.51	
			0+058.5		1.60	0.80	0.40	0.51	
			0+059		1.60	0.80	0.40	0.51	
			0+064		1.60	0.80	0.40	0.51	
			0+065		1.60	0.80	0.40	0.51	
			0+076.5		1.60	0.80	0.40	0.51	
			0+082		1.60	0.80	0.40	0.51	
			0+087.5		1.60	0.80	0.40	0.51	
			0+093		1.60	0.80	0.40	0.51	
			0+094		1.60	0.80	0.40	0.51	
			0+100		1.60	0.80	0.40	0.51	
			0+104		1.60	0.80	0.40	0.51	
			0+113		1.60	0.80	0.40	0.51	
							TOTAL DE 1.2.5 :	59.81	M3

REVISO

Arq. Cesar Guadalupe Medina Contreras
Supervisor de Obras Publicas

AUTORIZO

M. de Arq. Graciela Elizalde Santos
Directora de Obras, Servicios Publicos Y Ecologia

CONTRATISTA

Ing. Marco Polo Arroyo Prado
COLEON S.A. DE C.V.
Representante Legal

NOMBRE: ON S.A DE C.V.

DOMICILIO - CALLE HIDALGO N°. 46 PONIENTE COLONIA CENTRO, ESCUINAPA, SINALOA.

R.F.C. COL11012631A

I.M.S.S.

DEPENDENCIA:
H. AYUNTAMIENTO DE ESCUINAPA, SINALOA.

DIRECCION DE OBRAS, SERVICIOS PUBLICOS Y ECOLOGIA

NUMEROS GENERADORES

CONTRATO: ESC-FAISMUN-2025-035

LOCALIDAD: MUNICIPIO DE ESCUINAPA

ESTIMACION: 1 EXTRAORDINARIOS

MUNICIPIO: ESCUINAPA

DESCRIPCION: CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN CALLE FRANCISCO PEREZ ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y FRANCISCO I. MADERO, COL. CENTRO, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ESCUINAPA

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	LOCALIZACION		LARGO	ANCHO	ALTO	RESULTADO	OBSERVACION
			TRAMO	PZAS					
	REPOSICION DE RED DE AGUA POTABLE CON TUBERIA PVC 3" CALLE FCO. PEREZ								
	TENDIDO DE TUBERIA		C. INDEPENDENCIA - C. FCO. I. MADERO						
1.2.6	Relleno con material balastre compactado con equipo menor al 90% de la prueba PROCTOR y aplicando agua, medido colocado. Incluye: mano de obra, equipo y herraminetas.	M3	0+000 al 0+143		143.00	0.80	0.60	68.64	
			0+012		1.60	0.80	0.60	0.77	
			0+018		6.10	0.80	0.60	2.93	
			0+020		6.10	0.80	0.60	2.93	
			0+028		1.60	0.80	0.60	0.77	
			0+030		6.10	0.80	0.60	2.93	
			0+056		1.60	0.80	0.60	0.77	
			0+058		1.60	0.80	0.60	0.77	
			0+058.5		1.60	0.80	0.60	0.77	
			0+059		1.60	0.80	0.60	0.77	
			0+064		1.60	0.80	0.60	0.77	
			0+065		1.60	0.80	0.60	0.77	
			0+076.5		1.60	0.80	0.60	0.77	
			0+082		1.60	0.80	0.60	0.77	
			0+087.5		1.60	0.80	0.60	0.77	
			0+093		1.60	0.80	0.60	0.77	
			0+094		1.60	0.80	0.60	0.77	
			0+100		1.60	0.80	0.60	0.77	
			0+104		1.60	0.80	0.60	0.77	
			0+113		1.60	0.80	0.60	0.77	
					TOTAL DE 1.2.6 :			89.71	M3

REVISO

Arq. Cesar Guadalupe Medina Contreras
Supervisor de Obras Publicas

AUTORIZO

M. de Arq. Graciela Elizalde Santos
Directora de Obras, Servicios Publicos Y Ecologia

CONTRATISTA

Ing. Marco Polo Arroyo Prado
COLEON S.A. DE C.V.
Representante Legal

C ON S.A DE C.V.
NOMBRE

DOMICILIO - CALLE HIDALGO N°. 46 PONIENTE COLONIA CENTRO, ESCUINAPA, SINALOA.

R.F.C. COL11012631A

I.M.S.S.

DEPENDENCIA:
H. AYUNTAMIENTO DE ESCUINAPA, SINALOA.

DIRECCION DE OBRAS, SERVICIOS PUBLICOS Y ECOLOGIA

NUMEROS GENERADORES

CONTRATO: ESC-FAISMUN-2025-035

LOCALIDAD: MUNICIPIO DE ESCUINAPA

ESTIMACION: 1 EXTRAORDINARIOS

MUNICIPIO: ESCUINAPA

DESCRIPCION: CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN CALLE FRANCISCO PEREZ ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y FRANCISCO I. MADERO, COL. CENTRO, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ESCUINAPA

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	LOCALIZACION		LARGO	ANCHO	ALTO	RESULTADO	OBSERVACION
			TRAMO	PZAS					
	REPOSICION DE RED DE AGUA POTABLE CON TUBERIA PVC 3" CALLE FCO. PEREZ								
	EXCAVACIONES Y RELLENOS		C. INDEPENDENCIA - C. FCO. I. MADERO						
EXT-02	Estabilización de terreno natural saturado con Pedraplen de piedra incada y material de banco balastre para relleno compactado al 95% Proctor, incluye: acarreo del material, conformación, afine, maquinaria, material, mano de obra y herramienta.	M3							
		BACHE 01	0+000 al 0+005.20		5.20	8.00	0.65	22.88	
		BACHE 02	0+005.20 al 0+045.60		40.40	8.00	0.65	210.08	
		BACHE 03	0+045.60 al 0+130		84.40	3.60	0.91	276.49	
							TOTAL DE EXT-02 :	509.45	M3

REVISO

Arq. Cesar Guadalupe Medina Contreras
Supervisor de Obras Publicas

AUTORIZO

M. de Arq. Graciela Elizalde Santos
Directora de Obras, Servicios Publicos Y Ecologia

CONTRATISTA

Ing. Marco Polo Arroyo Prado
COLEON S.A. DE C.V.
Representante Legal

NOMBRE: ON S.A DE C.V.

DOMICILIO - CALLE HIDALGO N°. 46 PONIENTE COLONIA CENTRO, ESCUINAPA, SINALOA.

R.F.C. COL11012631A

I.M.S.S.

DEPENDENCIA:
H. AYUNTAMIENTO DE ESCUINAPA, SINALOA.

DIRECCION DE OBRAS, SERVICIOS PUBLICOS Y ECOLOGIA

NUMEROS GENERADORES

CONTRATO: ESC-FAISMUN-2025-035

LOCALIDAD: MUNICIPIO DE ESCUINAPA

ESTIMACION: 1 EXTRAORDINARIOS

MUNICIPIO: ESCUINAPA

DESCRIPCION: CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN CALLE FRANCISCO PEREZ ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y FRANCISCO I. MADERO, COL. CENTRO, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ESCUINAPA

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	LOCALIZACION		LARGO	ANCHO	ALTO	RESULTADO	OBSERVACION
			TRAMO	PZAS					
	REPOSICION DE RED DE AGUA POTABLE CON TUBERIA PVC 3" CALLE FCO. PEREZ								
	TUBERIA Y PIEZAS ESPECIALES		C. INDEPENDENCIA - C. FCO. I. MADERO						
1.3.1.1	Suministro e Instalación de Tuberia PVC Hidraulico ANG SI 3" Ø RD-32.5. Incluye: Suministro de material, Junteo, mano de obra especializada, Prueba Hidrostatica sugún Norma Oficial Mexicana NOM-013-CNA-2000 ó vigente, acarreos, suministro de agua para prueba de Campo, carga, maniobras para tendido a lo largo de la zanja, bajado, acoplamiento de atraques, equipo, herramientas y tapones en los extremos de 3" (75mm) de Ø RD-26	M	0+000.8 al 0+142.1		141.30			141.30	
							TOTAL DE 1.3.1.1 :	141.30	M

REVISO

Arq. Cesar Guadalupe Medina Contreras
Supervisor de Obras Publicas

AUTORIZO

M. de Arq. Graciela Elizalde Santos
Directora de Obras, Servicios Publicos Y Ecologia

CONTRATISTA

Ing. Marco Polo Arroyo Prado
COLEON S.A. DE C.V.
Representante Legal

ON S.A DE C.V.
NOMBRE

DOMICILIO - CALLE HIDALGO N°. 46 PONIENTE COLONIA CENTRO, ESCUINAPA, SINALOA.

R.F.C. COL11012631A

I.M.S.S.

DEPENDENCIA:
H. AYUNTAMIENTO DE ESCUINAPA, SINALOA.

DIRECCION DE OBRAS, SERVICIOS PUBLICOS Y ECOLOGIA

NUMEROS GENERADORES

CONTRATO: ESC-FAISMUN-2025-035

LOCALIDAD: MUNICIPIO DE ESCUINAPA

ESTIMACION: 1 EXTRAORDINARIOS

MUNICIPIO: ESCUINAPA

DESCRIPCION: CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN CALLE FRANCISCO PEREZ ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y FRANCISCO I. MADERO, COL. CENTRO, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ESCUINAPA

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	LOCALIZACION		LARGO	ANCHO	ALTO	RESULTADO	OBSERVACION
			TRAMO	PZAS					
	REPOSICION DE RED DE AGUA POTABLE CON TUBERIA PVC 3" CALLE FCO. PEREZ								
	TUBERIA Y PIEZAS ESPECIALES	C. INDEPENDENCIA - C. FCO. I. MADERO							
1.3.1.2	Suministro e Instalación de CRUZ PVC Hidráulico ANG SI 3" Ø. Incluye: Materiales, mano de obra especializada y herramientas.	PZA							
		1 .- 0+002 (cruce c. Independencia)			1.00			1.00	
		2 .- 0+042 (cruce c. Severiano Moreno)			1.00			1.00	
		3 .- 0+124 (cruce c. Fco. I. Madero)			1.00			1.00	
							TOTAL DE 1.3.1.2 :	3.00	PZA

REVISO

Arq. Cesar Guadalupe Medina Contreras
Supervisor de Obras Publicas

AUTORIZO

M. de Arq. Graciela Elizalde Santos
Directora de Obras, Servicios Publicos Y Ecologia

CONTRATISTA

Ing. Marco Polo Arroyo Prado
COLEON S.A. DE C.V.
Representante Legal

ON S.A DE C.V.
NOMBRE

DOMICILIO - CALLE HIDALGO N°. 46 PONIENTE COLONIA CENTRO, ESCUINAPA, SINALOA.

R.F.C. COL11012631A

I.M.S.S.

DEPENDENCIA:
H. AYUNTAMIENTO DE ESCUINAPA, SINALOA.

DIRECCION DE OBRAS, SERVICIOS PUBLICOS Y ECOLOGIA

NUMEROS GENERADORES

CONTRATO: ESC-FAISMUN-2025-035

LOCALIDAD: MUNICIPIO DE ESCUINAPA

ESTIMACION: 1 EXTRAORDINARIOS

MUNICIPIO: ESCUINAPA

DESCRIPCION: CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN CALLE FRANCISCO PEREZ ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y FRANCISCO I. MADERO, COL. CENTRO, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ESCUINAPA

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	LOCALIZACION		LARGO	ANCHO	ALTO	RESULTADO	OBSERVACION
			TRAMO	PZAS					
	REPOSICION DE RED DE AGUA POTABLE CON TUBERIA PVC 3" CALLE FCO. PEREZ								
	TUBERIA Y PIEZAS ESPECIALES		C. INDEPENDENCIA - C. FCO. I. MADERO						
1.3.1.3	Suministro e Instalación de Reduccion campana PVC Hidráulico ANG SI 3" x 2" Ø. Incluye: Materiales, Anillos de hule, Limpieza, acarreos, prueba hidroestatica junto con la tubería, mano de obra especializada y herramientas.	PZA	0+000		1.00			1.00	
			1 .- 0+002 (cruce c. Independencia)		2.00			2.00	
			2 .- 0+042 (cruce c. Severiano Moreno)		2.00			2.00	
			3 .- 0+124 (cruce c. Fco. I. Madero)		2.00			2.00	
			0+143		1.00			1.00	
							TOTAL DE 1.3.1.3 :	8.00	PZA

REVISO

Arq. Cesar Guadalupe Medina Contreras
Supervisor de Obras Publicas

AUTORIZO

M. de Arq. Graciela Elizalde Santos
Directora de Obras, Servicios Publicos Y Ecologia

CONTRATISTA

Ing. Marco Polo Arroyo Prado
COLEON S.A. DE C.V.
Representante Legal

EON S.A DE C.V.
BRE

DOMICILIO - CALLE HIDALGO N°. 46 PONIENTE COLONIA CENTRO, ESCUINAPA, SINALOA.

R.F.C. COL11012631A

I.M.S.S.

DEPENDENCIA:
H. AYUNTAMIENTO DE ESCUINAPA, SINALOA.

DIRECCION DE OBRAS, SERVICIOS PUBLICOS Y ECOLOGIA

NUMEROS GENERADORES

CONTRATO: ESC-FAISMUN-2025-035

LOCALIDAD: MUNICIPIO DE ESCUINAPA

ESTIMACION: 1 EXTRAORDINARIOS

MUNICIPIO: ESCUINAPA

DESCRIPCION: CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN CALLE FRANCISCO PEREZ ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y FRANCISCO I. MADERO, COL. CENTRO, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ESCUINAPA

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	LOCALIZACION		LARGO	ANCHO	ALTO	RESULTADO	OBSERVACION
			TRAMO	PZAS					
	REPOSICION DE RED DE AGUA POTABLE CON TUBERIA PVC 3" CALLE FCO. PEREZ								
	TOMAS DOMICILIARIAS								
1.6.1	Toma domiciliaria Tipo AP-19-A de 3.00 a 9.00 m. de Longitud, con Tubería Extrupack o similar de polietileno de alta densidad y alto peso molecular tipo II de 13 mm de Ø interior RD-9 Termofusionable (Norma NMX-E-018-SCFI-2002 o vigente), incluye: material, camisa de tubo pvc 2" RD-41, suministro de tubería, abrazadera de inserción de pvc 3x1/2", llave de inserción, excavación a mano, equipo y herramientas.		C. INDEPENDENCIA - C. FCO. I. MADERO						
		PZA	0+012	1.00				1.00	
			0+018	1.00				1.00	
			0+020	1.00				1.00	
			0+028	1.00				1.00	
			0+030	1.00				1.00	
			0+056	1.00				1.00	
			0+058	1.00				1.00	
			0+058.5	1.00				1.00	
			0+059	1.00				1.00	
			0+064	1.00				1.00	
			0+065	1.00				1.00	
			0+076.5	1.00				1.00	
			0+082	1.00				1.00	
			0+087.5	1.00				1.00	
			0+093	1.00				1.00	
			0+094	1.00				1.00	
			0+100	1.00				1.00	
			0+104	1.00				1.00	
			0+113	1.00				1.00	
							TOTAL DE 1.6.1 :	19.00	PZA

REVISO

Arq. Cesar Guadalupe Medina Contreras
Supervisor de Obras Publicas

AUTORIZO

M. de Arq. Graciela Elizalde Santos
Directora de Obras, Servicios Publicos Y Ecologia

CONTRATISTA

Ing. Marco Polo Arroyo Prado
COLEON S.A. DE C.V.
Representante Legal

EON S.A DE C.V.
BRE

DOMICILIO - CALLE HIDALGO N°. 46 PONIENTE COLONIA CENTRO, ESCUINAPA, SINALOA.

R.F.C. COL11012631A

I.M.S.S.

DEPENDENCIA:
H. AYUNTAMIENTO DE ESCUINAPA, SINALOA.

DIRECCION DE OBRAS, SERVICIOS PUBLICOS Y ECOLOGIA

NUMEROS GENERADORES

CONTRATO: ESC-FAISMUN-2025-035

LOCALIDAD: MUNICIPIO DE ESCUINAPA

ESTIMACION: 1 EXTRAORDINARIOS

MUNICIPIO: ESCUINAPA

DESCRIPCION: CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN CALLE FRANCISCO PEREZ ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y FRANCISCO I. MADERO, COL. CENTRO, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ESCUINAPA

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	LOCALIZACION		LARGO	ANCHO	ALTO	RESULTADO	OBSERVACION
			TRAMO	PZAS					
	REPOSICION DE RED DE AGUA POTABLE CON TUBERIA PVC 3" CALLE FCO. PEREZ								
	TOMAS DOMICILIARIAS		C. INDEPENDENCIA - C. FCO. I. MADERO						
1.5.2	Limpieza final de la obra. Incluye: recolección de basura generada por la obra, retiro de escombro y del material sobrante, acarreo fuera del lugar de la obra, mano de obra y herramientas.	LOTE	0+000.8 al 0+142.1	1.00				1.00	
							TOTAL DE 1.5.2 :	1.00	LOTE

REVISO

Arq. Cesar Guadalupe Medina Contreras
Supervisor de Obras Publicas

AUTORIZO

M. de Arq. Graciela Elizalde Santos
Directora de Obras, Servicios Publicos Y Ecologia

CONTRATISTA

Ing. Marco Polo Arroyo Prado
COLEON S.A. DE C.V.
Representante Legal

C[illegible]ON S.A DE C.V.
N[illegible]RE

DOMICILIO - CALLE HIDALGO N°. 46 PONIENTE COLONIA CENTRO, ESCUINAPA, SINALOA.

R.F.C. COL11012631A

I.M.S.S.

DEPENDENCIA:
H. AYUNTAMIENTO DE ESCUINAPA, SINALOA.

DIRECCION DE OBRAS, SERVICIOS PUBLICOS Y ECOLOGIA

NUMEROS GENERADORES

CONTRATO: ESC-FAISMUN-2025-035

LOCALIDAD: MUNICIPIO DE ESCUINAPA

ESTIMACION: 1 EXTRAORDINARIOS

MUNICIPIO: ESCUINAPA

DESCRIPCION: CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN CALLE FRANCISCO PEREZ ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y FRANCISCO I. MADERO, COL. CENTRO, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ESCUINAPA

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	LOCALIZACION		LARGO	ANCHO	ALTO	RESULTADO	OBSERVACION
			TRAMO	PZAS					
	REPOSICION DE RED DE AGUA POTABLE CON TUBERIA PVC 3" CALLE FCO. PEREZ								
	ALBAÑILERIAS		**C. INDEPENDENCIA - C. FCO. I. MADERO**						
1.4.1	Reparacion de guarnicion y banqueta de 5cm esp en area de caja de medidore, con concreto hecho en obra F'c=150 kg/cm2, acabado escabillado fino. Incluye: demolicion de banqueta existente, compactacion, colado y curado de concreto, mano de obra y herramienta.	M2	0+012		1.00	1.50		1.50	
			0+018		1.50	1.50		2.25	
			0+020		1.50	1.50		2.25	
			0+028		1.50	1.50		2.25	
			0+030		1.50	1.50		2.25	
			0+056		1.50	1.50		2.25	
			0+058		1.50	1.50		2.25	
			0+059		1.50	1.50		2.25	
			0+064		1.50	1.50		2.25	
			0+065		1.50	1.50		2.25	
			0+076.5		1.50	1.50		2.25	
			0+082		1.50	1.50		2.25	
			0+087.5		1.50	1.50		2.25	
			0+093		1.50	1.50		2.25	
			0+094		1.50	1.50		2.25	
			0+100		1.50	1.50		2.25	
			0+104		1.50	1.50		2.25	
			0+113		1.50	1.50		2.25	
							TOTAL DE 1.4.1 :	39.75	M2

REVISO

Arq. Cesar Guadalupe Medina Contreras
Supervisor de Obras Publicas

AUTORIZO

M. de Arq. Graciela Elizalde Santos
Directora de Obras, Servicios Publicos Y Ecologia

CONTRATISTA

Ing. Marco Polo Arroyo Prado
COLEON S.A. DE C.V.
Representante Legal

COLE A. DE C.V.		
DOMICILIO. CALLE HIDALGO N°. 46 PONIENTE COLONIA CENTRO, ESCUINAPA, SINALOA.		
R.F.C. COL11012631A		I.M.S.S.

DEPENDENCIA:

H. AYUNTAMIENTO DE ESCUINAPA, SINALOA

DIRECCION DE OBRAS, SERVICIOS PUBLICOS Y ECOLOGIA.

UBICACIÓN DE LA OBRA

CONTRATO ESC-FAISMUN-2025-035

ESCUINAPA, SINALOA

ESCUINAPA, SINALOA.

ESTIMACION: 1 EXTRAORDINARIOS

ESCUINAPA, SINALOA

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN CALLE FRANCISCO PEREZ ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y FRANCISCO I. MADERO, COL. CENTRO, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ESCUINAPA

CLAVE	CONCEPTO
1.1.2	Sondeo para localizar tuberia existente en campo. Incluye: mano de obra, maquinaria, equipo menor y herramientas, pago de permisos y todo lo necesario para correcta ejecución.



AUTORIZO

M. en Arq. Graciela Elizalde Santos
Directora de Obras, Servicios Publicos Y Ecologia

CONTRATISTA

Ing. Marco Polo Arroyo Prado
COLEON S.A. DE C.V.
Representante Legal

COLEO[illegible]A. DE C.V.		DEPENDENCIA: H. AYUNTAMIENTO DE ESCUINAPA, SINALOA DIRECCION DE OBRAS, SERVICIOS PUBLICOS Y ECOLOGIA.
DOMICILIO. CALLE HIDALGO N°. 46 PONIENTE COLONIA CENTRO, ESCUINAPA, SINALOA.		
R.F.C. COL11012631A	I.M.S.S.	

UBICACIÓN DE LA OBRA

CONTRATO ESC-FAISMUN-2025-035

ESCUINAPA, SINALOA


ESCUINAPA, SINALOA.

ESTIMACION: 1 EXTRAORDINARIOS

ESCUINAPA, SINALOA

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN CALLE FRANCISCO PEREZ ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y FRANCISCO I. MADERO, COL. CENTRO, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ESCUINAPA

CLAVE	DESCRIPCION
1.2.2	Excavacion de zanja a mano en material tipo I - II, excepto roca, de 0.00 hasta 2.00 mts de profundidad en seco. Incluye: afloje y extracción del material, amacize y limpieza de plantilla y taludes, remoción traspaleos y conservación de la zanja hasta la instalación satisfactoria de la tubería. En seco.

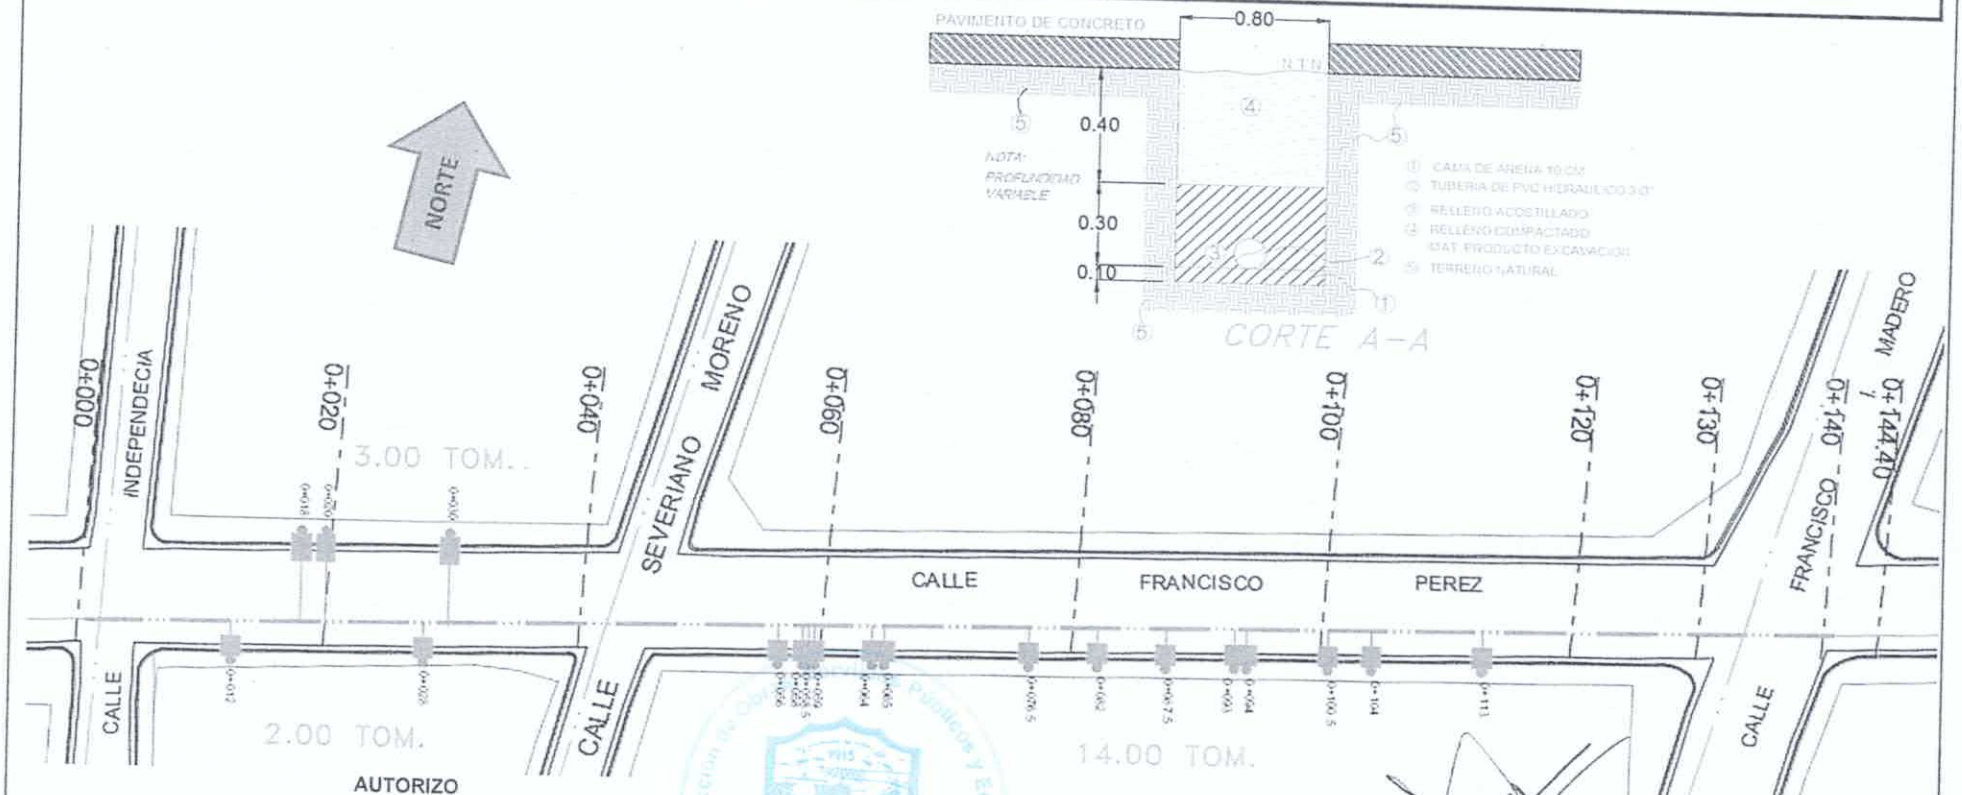

AUTORIZO

M. en Arq. Graciela Elizalde Santos
Directora de Obras, Servicios Publicos Y Ecologia

CONTRATISTA

Ing. Marco Polo Arroyo Prado
COLEON S.A. DE C.V.
Representante Legal

COLEO[illegible]. DE C.V.		
DOMICILIO. CALLE HIDALGO N°. 46 PONIENTE COLONIA CENTRO, ESCUINAPA, SINALOA.		
R.F.C. COL11012631A		I.M.S.S.

DEPENDENCIA:

H. AYUNTAMIENTO DE ESCUINAPA, SINALOA

DIRECCION DE OBRAS, SERVICIOS PUBLICOS Y ECOLOGIA.

UBICACIÓN DE LA OBRA

CONTRATO ESC-FAISMUN-2025-035

ESCUINAPA, SINALOA


ESCUINAPA, SINALOA.

ESTIMACION: 1 EXTRAORDINARIOS

ESCUINAPA, SINALOA

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN CALLE FRANCISCO PEREZ ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y FRANCISCO I. MADERO, COL. CENTRO, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ESCUINAPA

CLAVE	DESCRIPCION
EXT-01	Remoción de carpeta asfáltica existente de 10cm espesor sobre el área de rodamiento del pavimento hidráulico existente. Incluye: corte, raspado con máquina y manual, equipo, mano de obra y herramienta.

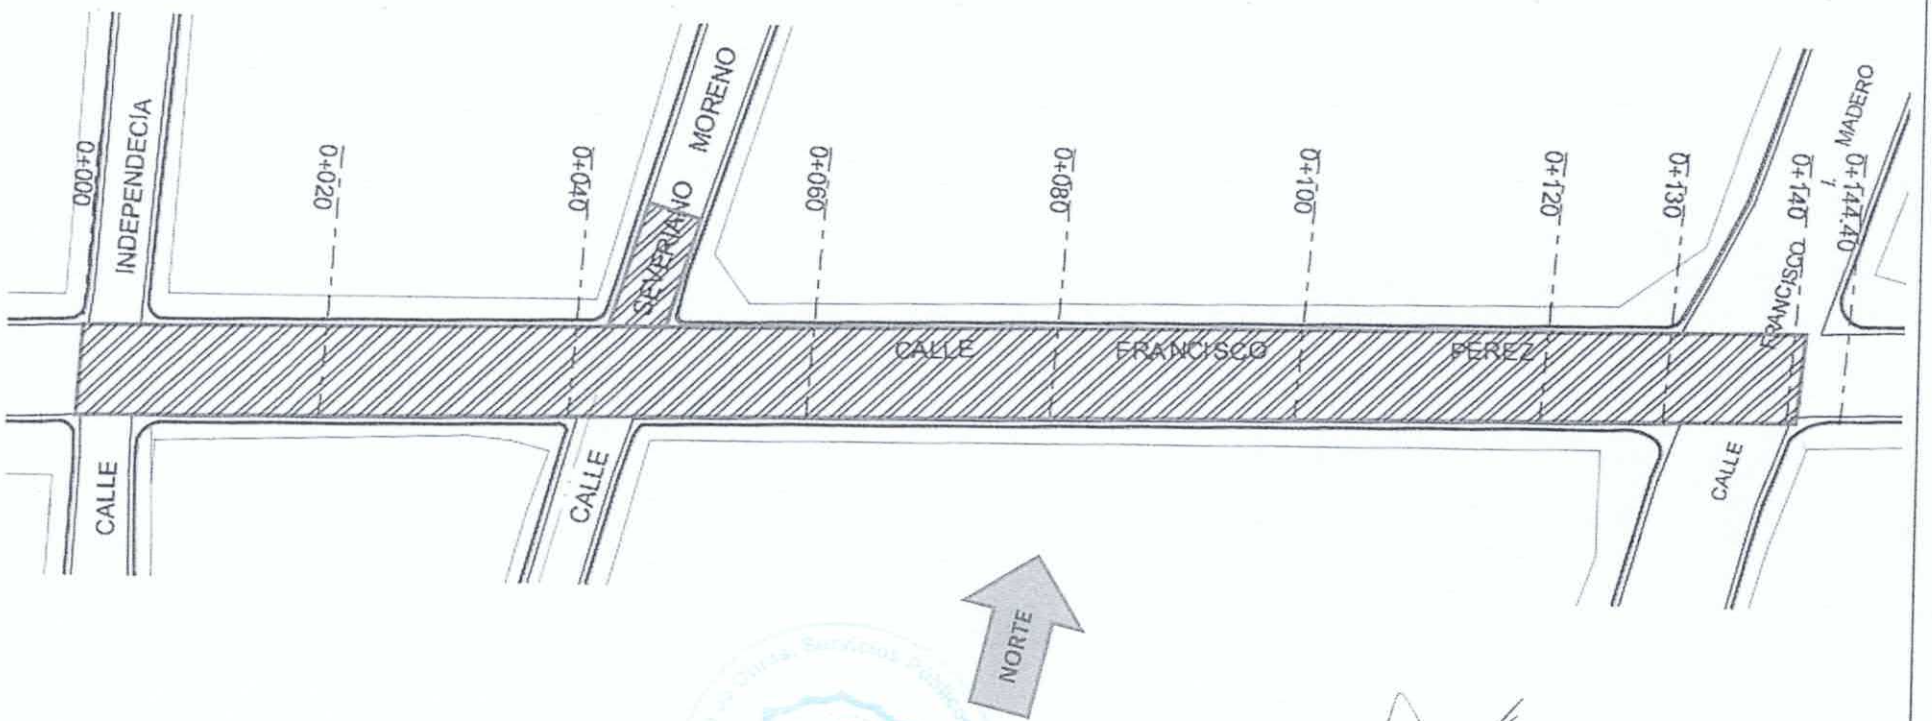

AUTORIZO

M. en Arq. Graciela Elizalde Santos
Directora de Obras, Servicios Publicos Y Ecologia

CONTRATISTA

Ing. Marco Polo Arroyo Prado
COLEON S.A. DE C.V.
Representante Legal

COLEC A. DE C.V.	
DOMICILIO. CALLE HIDALGO N°. 46 PONIENTE COLONIA CENTRO, ESCUINAPA, SINALOA.	
R.F.C. COL11012631A	I.M.S.S.

DEPENDENCIA:

H. AYUNTAMIENTO DE ESCUINAPA, SINALOA

DIRECCION DE OBRAS, SERVICIOS PUBLICOS Y ECOLOGIA.

UBICACIÓN DE LA OBRA

CONTRATO ESC-FAISMUN-2025-035

ESCUINAPA, SINALOA


ESCUINAPA, SINALOA.

ESTIMACION: 1 EXTRAORDINARIOS

ESCUINAPA, SINALOA

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN CALLE FRANCISCO PEREZ ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y FRANCISCO I. MADERO, COL. CENTRO, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ESCUINAPA

CLAVE	DESCRIPCION
1.2.1	Excavacion de zanja por medios mecanico en material tipo I - II, excepto roca, de 0.00 hasta 2.00 mts de profundidad en seco. Incluye: afloje y extracción del material, amacize y limpieza de plantilla y taludes, remoción traspaleos y conservación de la zanja hasta la instalación satisfactoria de la tubería. En seco.

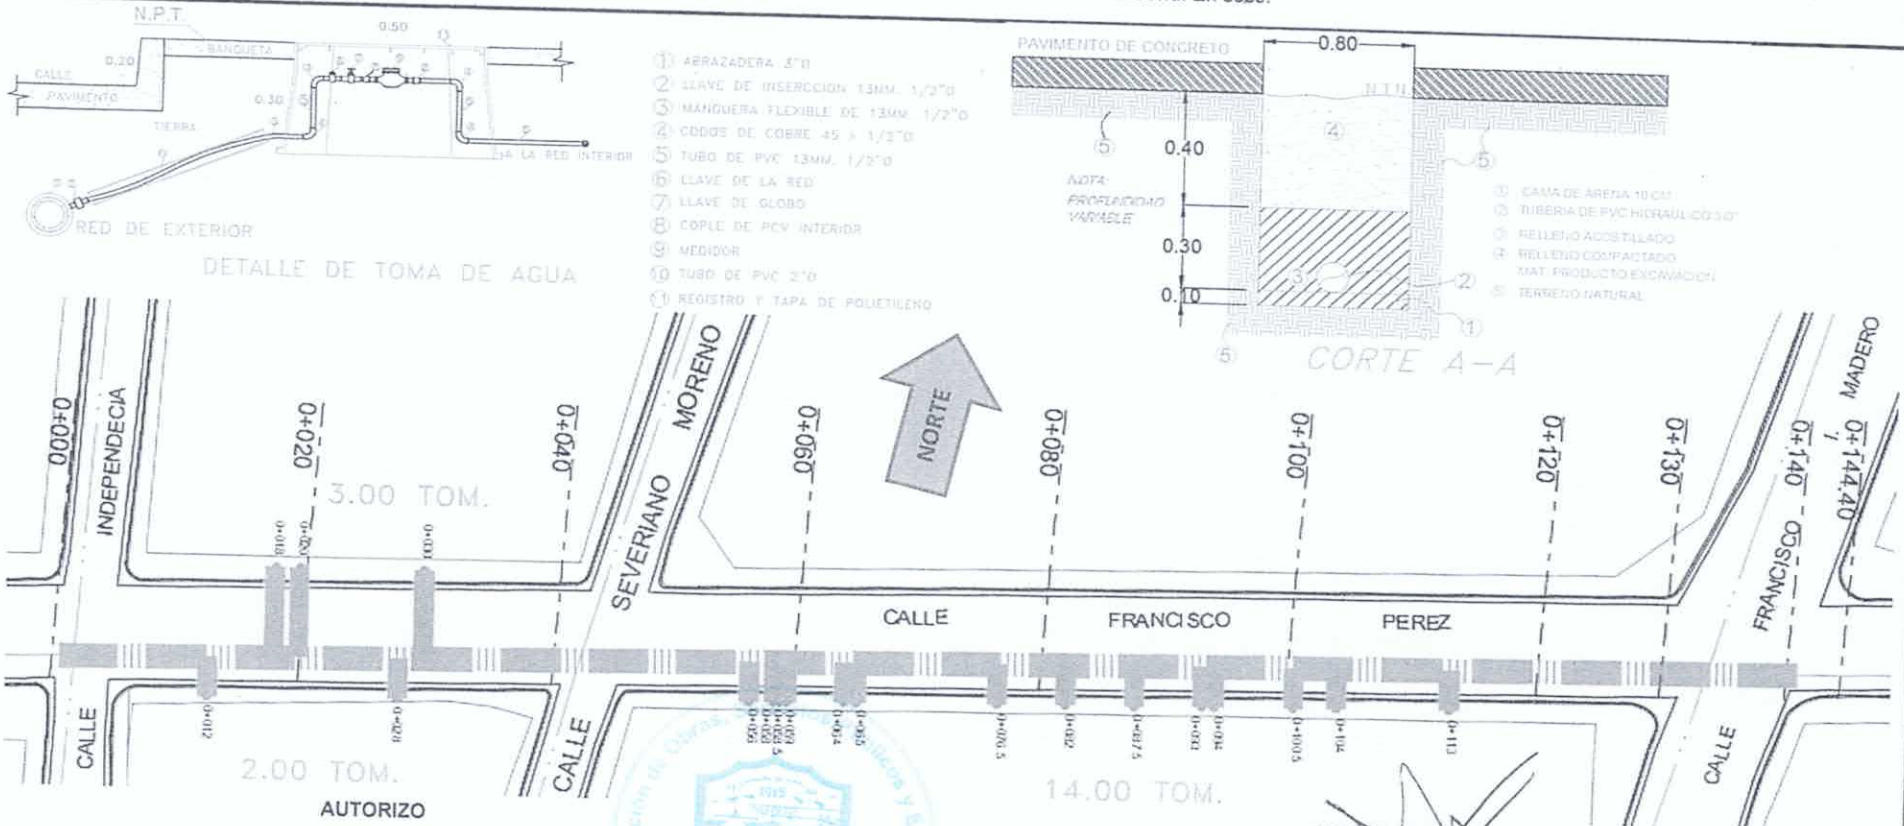

AUTORIZO

M. en Arq. Graciela Elizalde Santos
Directora de Obras, Servicios Publicos Y Ecologia

CONTRATISTA

Ing. Marco Polo Arroyo Prado
COLEON S.A. DE C.V.
Representante Legal


COLEON S.A. DE C.V.	DEPENDENCIA: H. AYUNTAMIENTO DE ESCUINAPA, SINALOA DIRECCION DE OBRAS, SERVICIOS PUBLICOS Y ECOLOGIA.
DOMICILIO. CALLE HIDALGO N°. 46 PONIENTE COLONIA CENTRO, ESCUINAPA, SINALOA.	
R.F.C. COL11012631A / I.M.S.S.	

UBICACIÓN DE LA OBRA

CONTRATO	ESC-FAISMUN-2025-035	ESTIMACION:	1 EXTRAORDINARIOS
ESCUINAPA, SINALOA	ESCUINAPA, SINALOA.		ESCUINAPA, SINALOA

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN CALLE FRANCISCO PEREZ ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y FRANCISCO I. MADERO, COL. CENTRO, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ESCUINAPA

CLAVE	DESCRIPCION
1.2.3	Excavacion de zanja por medios mecanico en material tipo I - II, excepto roca, de 0.00 hasta 2.00 mts de profundidad en presencia de Agua. Incluye: afloje y extracción del material, amacize y limpieza de plantilla y taludes, remoción traspaleos y conservación de la zanja hasta la instalación satisfactoria de la tubería. En presencia de agua.

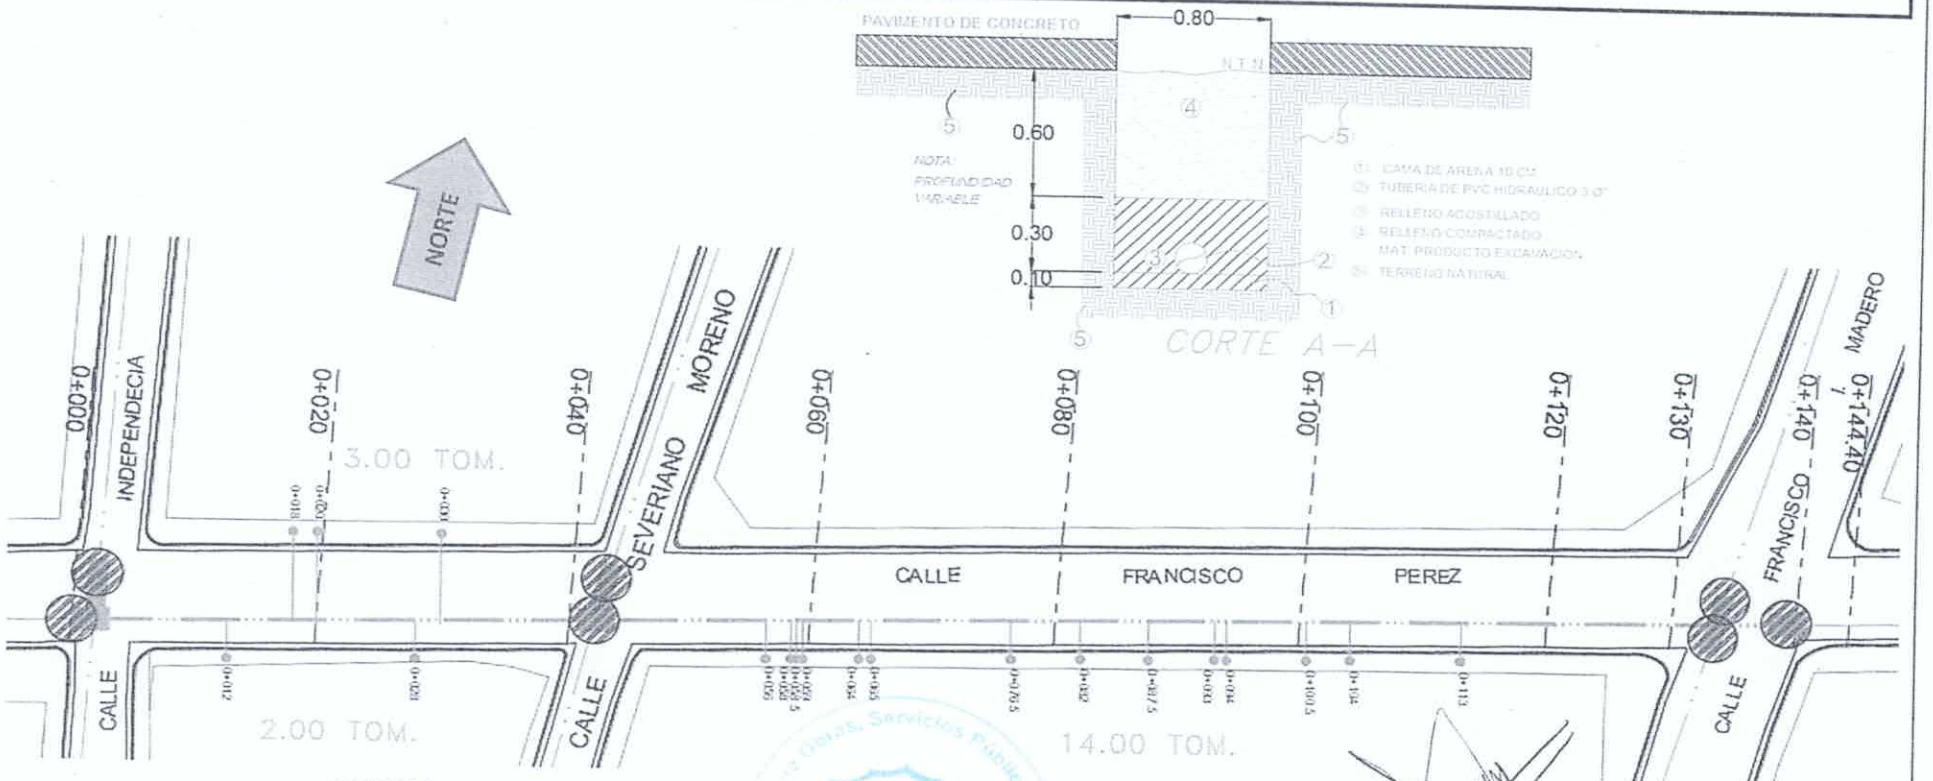

AUTORIZO

M. en Arq. Graciela Elizalde Santos
Directora de Obras, Servicios Publicos Y Ecologia

CONTRATISTA

Ing. Marco Polo Arroyo Prado
COLEON S.A. DE C.V.
Representante Legal

COLEO[illegible]. DE C.V.

DOMICILIO. CALLE HIDALGO N°. 46 PONIENTE COLONIA CENTRO, ESCUINAPA, SINALOA.

R.F.C. COL11012631A

I.M.S.S.

DEPENDENCIA:

H. AYUNTAMIENTO DE ESCUINAPA, SINALOA

DIRECCION DE OBRAS, SERVICIOS PUBLICOS Y ECOLOGIA.

UBICACIÓN DE LA OBRA

CONTRATO ESC-FAISMUN-2025-035

ESCUINAPA, SINALOA


ESCUINAPA, SINALOA.

ESTIMACION: 1 EXTRAORDINARIOS

ESCUINAPA, SINALOA

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN CALLE FRANCISCO PEREZ ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y FRANCISCO I. MADERO, COL. CENTRO, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ESCUINAPA

CLAVE	DESCRIPCION
1.2.5	Encofrado con arena de rio aplicando agua, hasta 15cm arriba del lomo del tubo, medido colocado. Incluye: mano de obra, equipo y herraminetas.

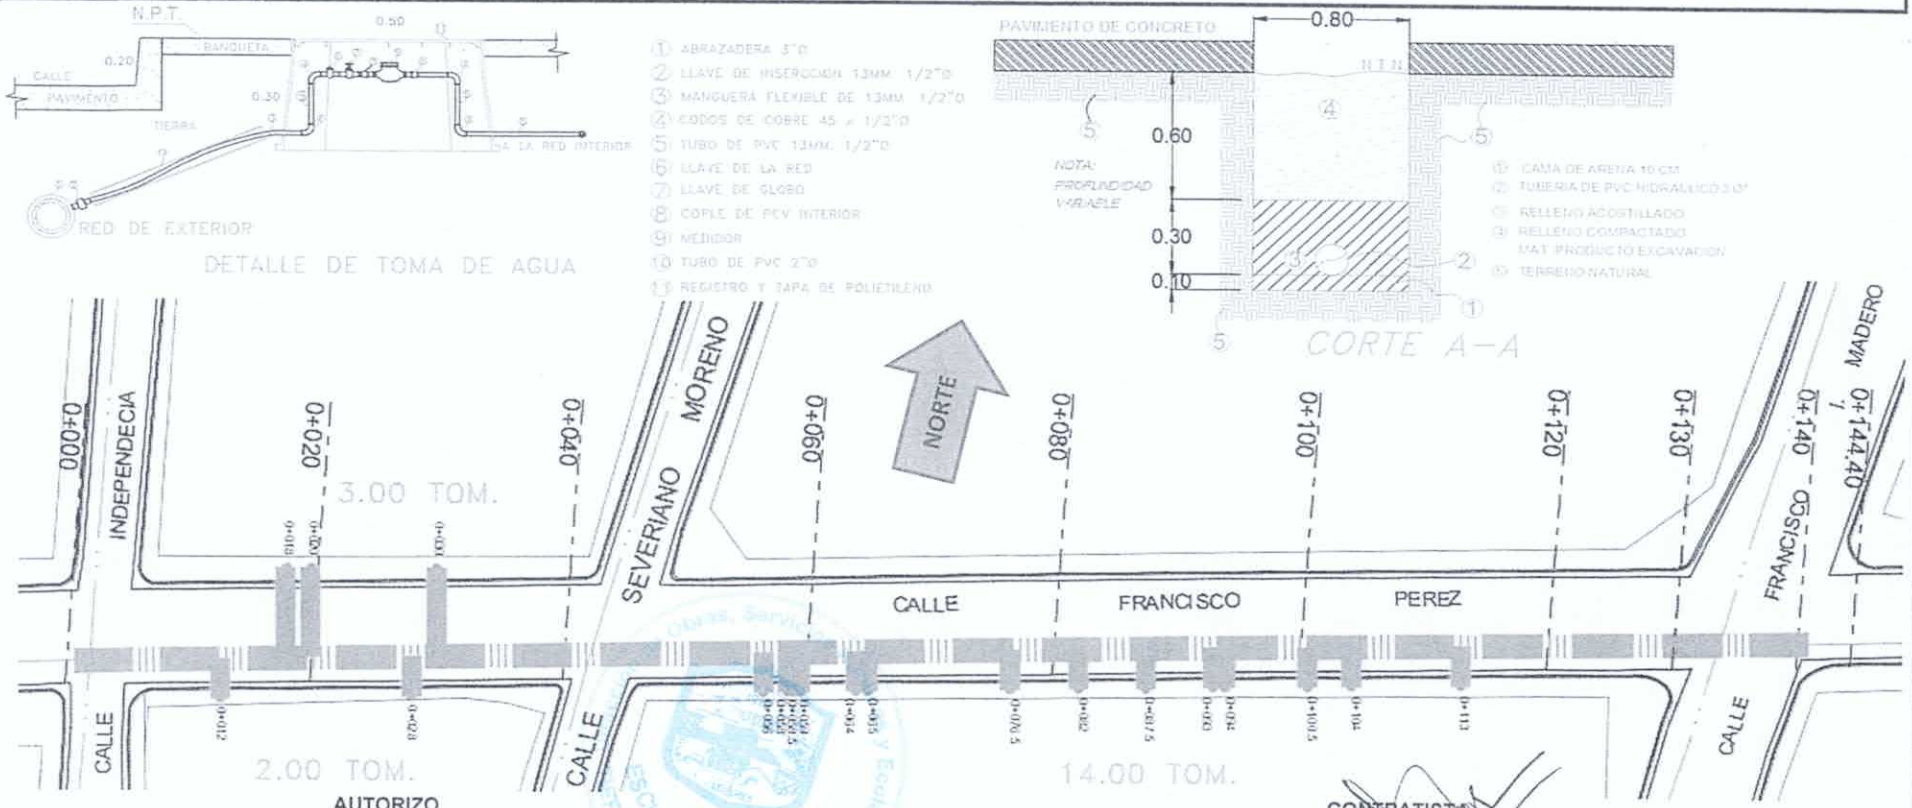

AUTORIZO

M. en Arq. Graciela Elizalde Santos
Directora de Obras, Servicios Publicos Y Ecologia

CONTRATISTA

Ing. Marco Polo Arroyo Prado
COLEON S.A. DE C.V.
Representante Legal

COLEO[illegible] DE C.V.

DOMICILIO. CALLE HIDALGO N°. 46 PONIENTE COLONIA CENTRO, ESCUINAPA, SINALOA.

R.F.C. COL11012631A

I.M.S.S.

DEPENDENCIA:

H. AYUNTAMIENTO DE ESCUINAPA, SINALOA

DIRECCION DE OBRAS, SERVICIOS PUBLICOS Y ECOLOGIA.

UBICACIÓN DE LA OBRA

CONTRATO ESC-FAISMUN-2025-035

ESCUINAPA, SINALOA


ESCUINAPA, SINALOA.

ESTIMACION: 1 EXTRAORDINARIOS

ESCUINAPA, SINALOA

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN CALLE FRANCISCO PEREZ ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y FRANCISCO I. MADERO, COL. CENTRO, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ESCUINAPA

CLAVE	DESCRIPCION
1.2.6	Relleno con material balastre compactado con equipo menor al 90% de la prueba PROCTOR y aplicando agua, medido colocado. Incluye: mano de obra, equipo y herraminetas.

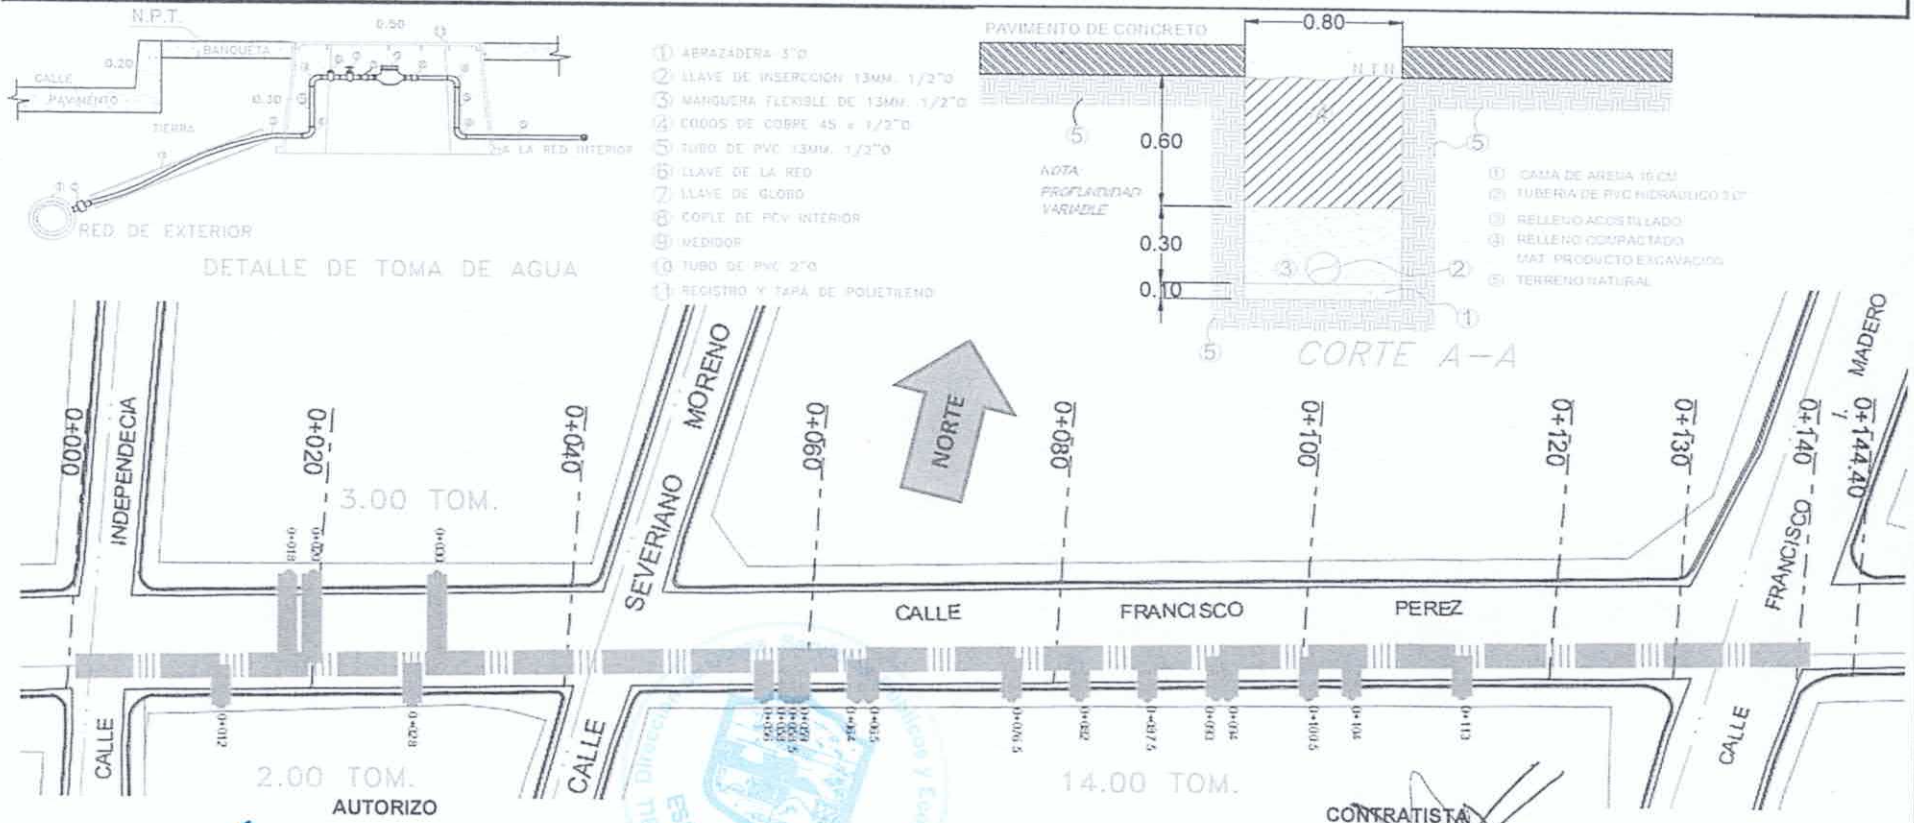

AUTORIZO

M. en Arq. Graciela Elizalde Santos
Directora de Obras, Servicios Publicos Y Ecologia

CONTRATISTA

Ing. Marco Polo Arroyo Prado
COLEON S.A. DE C.V.
Representante Legal

COLEC . DE C.V.	
DOMICILIO. CALLE HIDALGO N°. 46 PONIENTE COLONIA CENTRO, ESCUINAPA, SINALOA.	
R.F.C. COL11012631A	I.M.S.S.

DEPENDENCIA:

H. AYUNTAMIENTO DE ESCUINAPA, SINALOA

DIRECCION DE OBRAS, SERVICIOS PUBLICOS Y ECOLOGIA.

UBICACIÓN DE LA OBRA

CONTRATO ESC-FAISMUN-2025-035

ESCUINAPA, SINALOA


ESCUINAPA, SINALOA.

ESTIMACION: 1 EXTRAORDINARIOS

ESCUINAPA, SINALOA

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN CALLE FRANCISCO PEREZ ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y FRANCISCO I. MADERO, COL. CENTRO, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ESCUINAPA

CLAVE	DESCRIPCION
EXT-02	Estabilización de terreno natural saturado con Pedraplen de piedra incada y material de banco balastre para relleno compactado al 95% Proctor, incluye: acarreo del material, conformación, afine, maquinaria, material, mano de obra y herramienta.

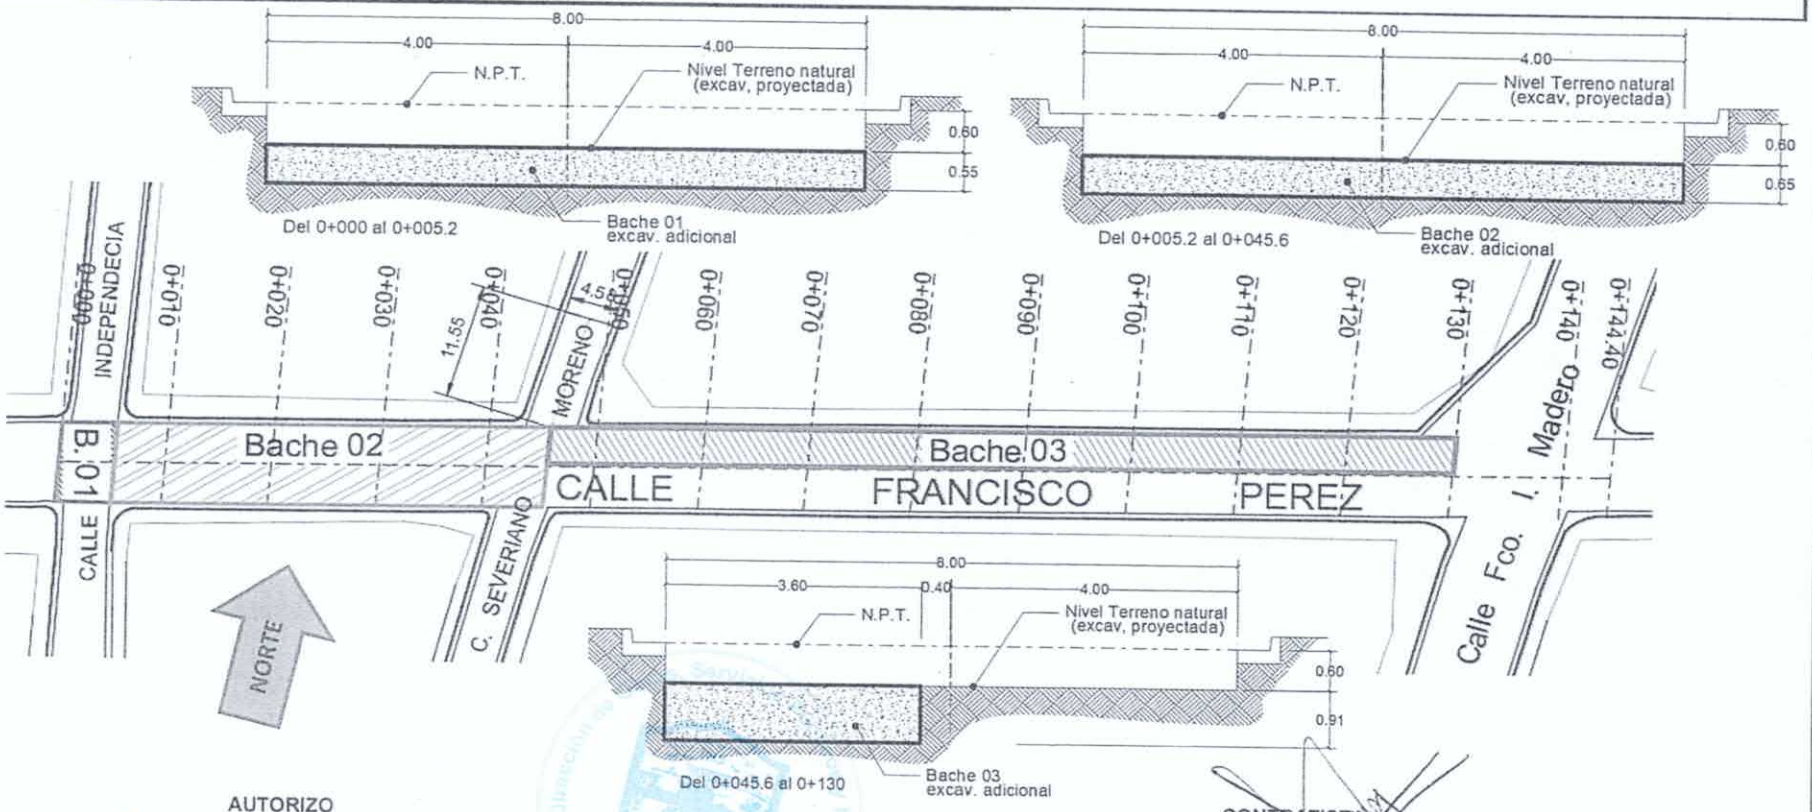

AUTORIZO

M. en Arq. Graciela Elizalde Santos
Directora de Obras, Servicios Publicos Y Ecologia

CONTRATISTA

Ing. Marco Polo Arroyo Prado
COLEON S.A. DE C.V.
Representante Legal


COLE(A. DE C.V.	DEPENDENCIA: H. AYUNTAMIENTO DE ESCUINAPA, SINALOA DIRECCION DE OBRAS, SERVICIOS PUBLICOS Y ECOLOGIA.
DOMICILIO. CALLE HIDALGO N°. 46 PONIENTE COLONIA CENTRO, ESCUINAPA, SINALOA.	
R.F.C. COL11012631A / I.M.S.S.	

UBICACIÓN DE LA OBRA

CONTRATO	ESC-FAISMUN-2025-035	ESTIMACION:	1 EXTRAORDINARIOS
ESCUINAPA, SINALOA	ESCUINAPA, SINALOA.		ESCUINAPA, SINALOA

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN CALLE FRANCISCO PEREZ ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y FRANCISCO I. MADERO, COL. CENTRO, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ESCUINAPA

CLAVE	DESCRIPCION
1.3.1.1	Suministro e Instalación de Tuberia PVC Hidraulico ANG SI 3" Ø RD-32.5. Incluye: Suministro de material, Junteo, mano de obra especializada, Prueba Hidrostatica sugún Norma Oficial Mexicana NOM-013-CNA-2000 ó vigente, acarreos, suministro de agua para prueba de Campo, carga, maniobras para tendido a lo largo de la zanja, bajado, acoplamiento de atraques, equipo, herramientas y tapones en los extremos de 3" (75mm) de Ø RD-26

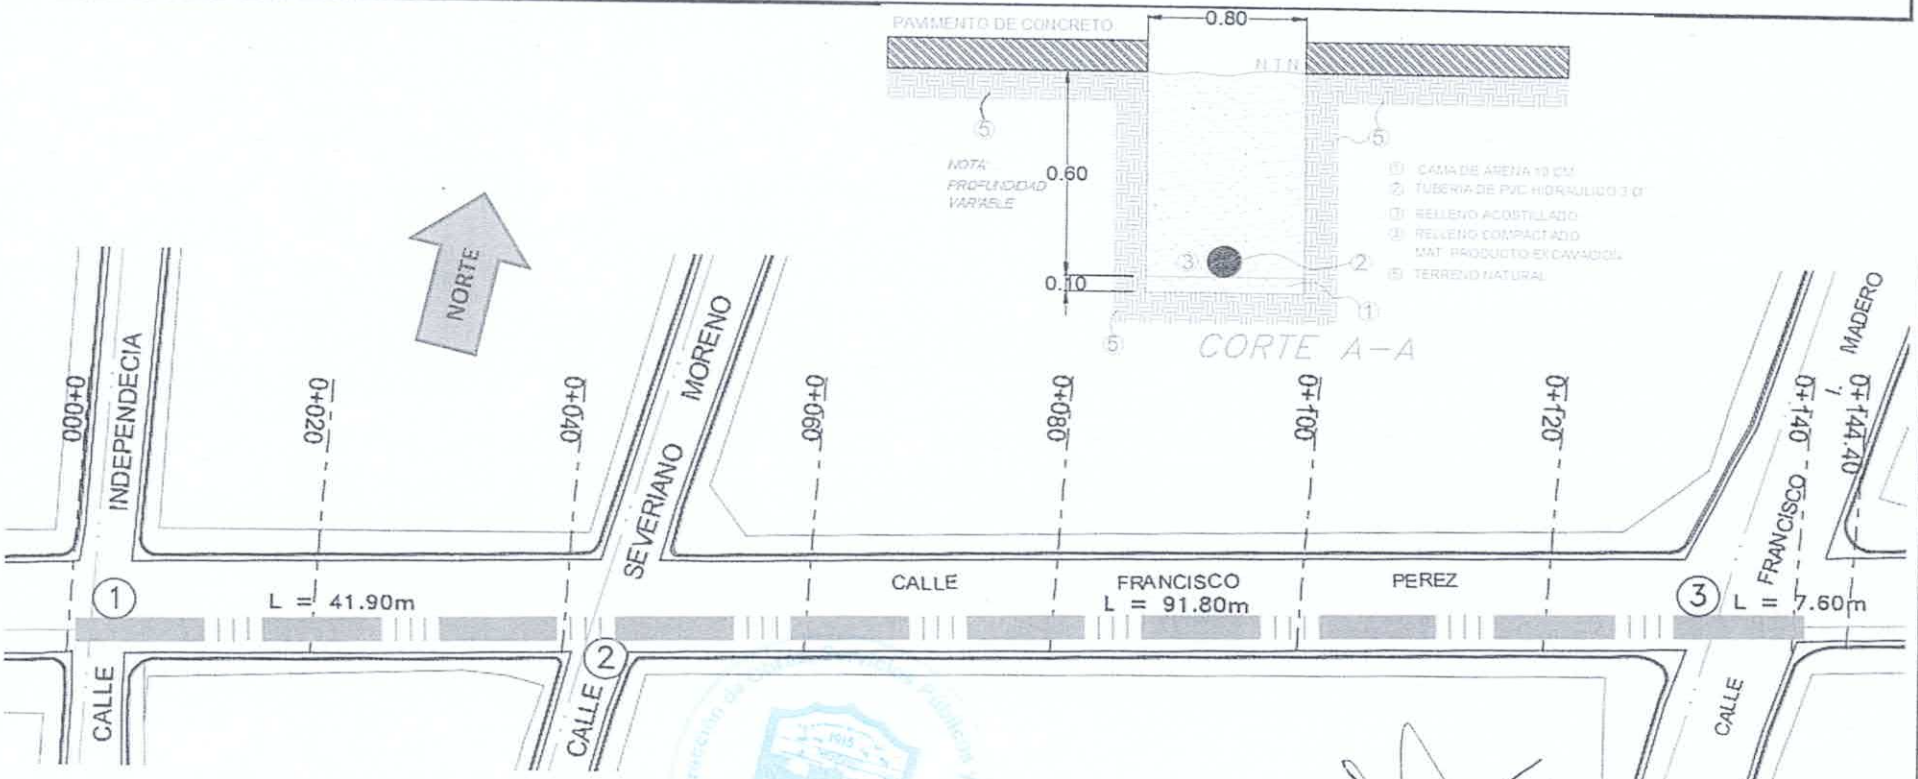

AUTORIZO

M. en Arq. Graciela Elizalde Santos
Directora de Obras, Servicios Publicos Y Ecologia

CONTRATISTA

Ing. Marco Polo Arroyo Prado
COLEON S.A. DE C.V.
Representante Legal

COLEC A. DE C.V.

DOMICILIO. CALLE HIDALGO N°. 46 PONIENTE COLONIA CENTRO, ESCUINAPA, SINALOA.

R.F.C. COL11012631A

I.M.S.S.

DEPENDENCIA:

H. AYUNTAMIENTO DE ESCUINAPA, SINALOA

DIRECCION DE OBRAS, SERVICIOS PUBLICOS Y ECOLOGIA.

UBICACIÓN DE LA OBRA

CONTRATO ESC-FAISMUN-2025-035

ESCUINAPA, SINALOA

ESCUINAPA, SINALOA.

ESTIMACION: 1 EXTRAORDINARIOS

ESCUINAPA, SINALOA

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN CALLE FRANCISCO PEREZ ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y FRANCISCO I. MADERO, COL. CENTRO, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ESCUINAPA

CLAVE	DESCRIPCION
1.3.1.2	Suministro e Instalación de CRUZ PVC Hidráulico ANG SI 3" Ø. Incluye: Materiales, mano de obra especializada y herramientas.



AUTORIZO

M. en Arq. Graciela Elizalde Santos
Directora de Obras, Servicios Publicos Y Ecologia

CONTRATISTA:

Ing. Marco Polo Arroyo Prado
COLEON S.A. DE C.V.
Representante Legal


COLE A. DE C.V.		DEPENDENCIA: H. AYUNTAMIENTO DE ESCUINAPA, SINALOA DIRECCION DE OBRAS, SERVICIOS PUBLICOS Y ECOLOGIA.
DOMICILIO. CALLE HIDALGO N°. 46 PONIENTE COLONIA CENTRO, ESCUINAPA, SINALOA.		
R.F.C. COL11012631A	I.M.S.S.	

UBICACIÓN DE LA OBRA

CONTRATO	ESC-FAISMUN-2025-035	ESTIMACION:	1 EXTRAORDINARIOS
ESCUINAPA, SINALOA	ESCUINAPA, SINALOA.		ESCUINAPA, SINALOA

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN CALLE FRANCISCO PEREZ ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y FRANCISCO I. MADERO, COL. CENTRO, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ESCUINAPA

CLAVE	DESCRIPCION
1.3.1.3	Suministro e Instalación de Reduccion campana PVC Hidráulico ANG SI 3" x 2" Ø. Incluye: Materiales, Anillos de hule, Limpieza, acarreos, prueba hidroestatica junto con la tubería, mano de obra especializada y herramientas.

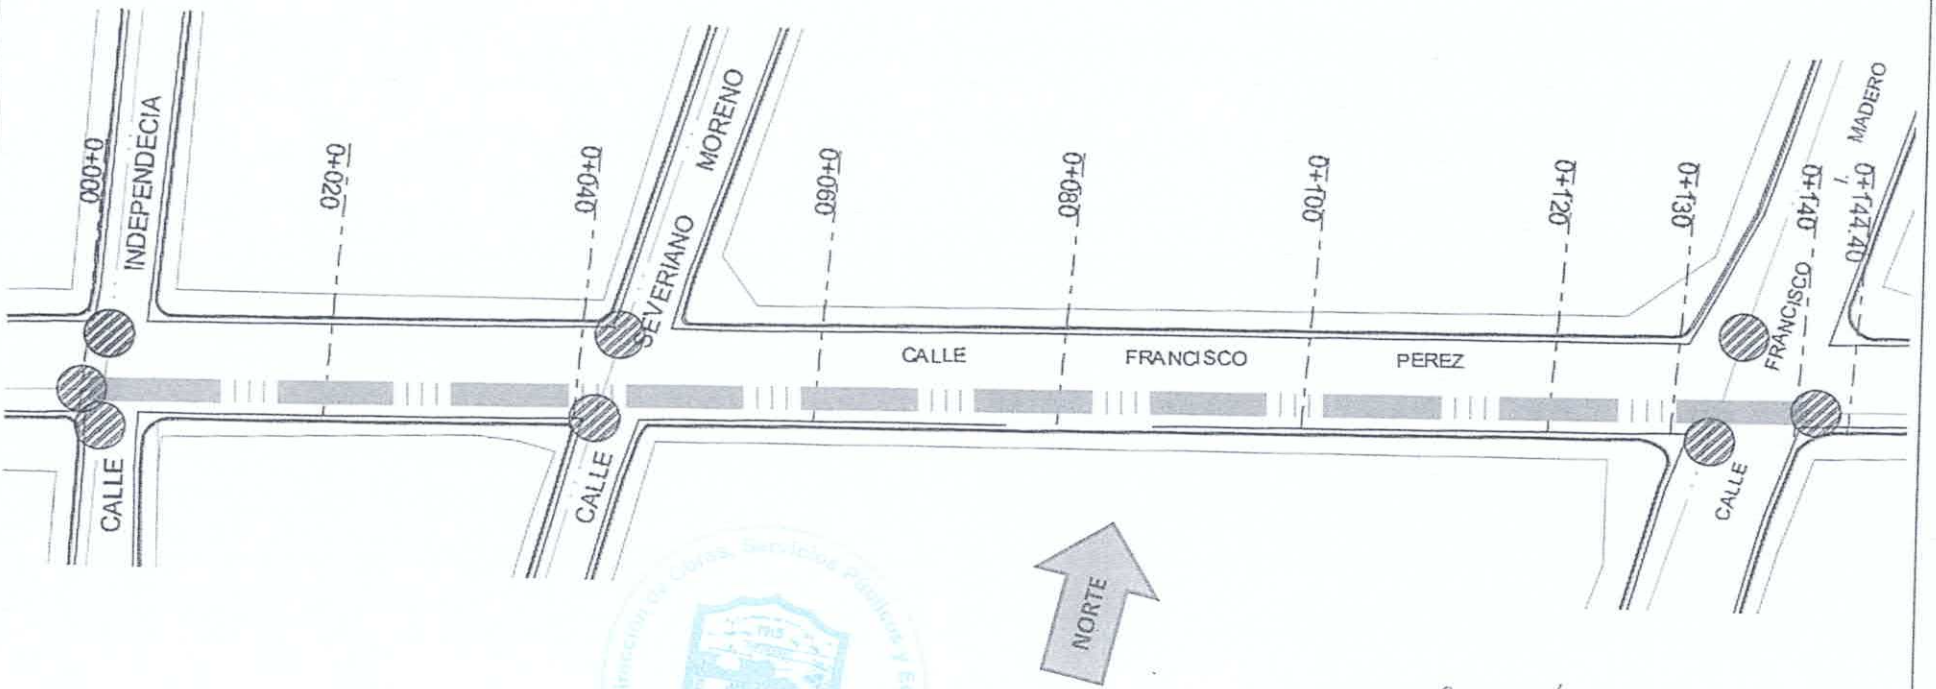

AUTORIZO

M. en Arq. Graciela Elizalde Santos
Directora de Obras, Servicios Publicos Y Ecologia

CONTRATISTA

Ing. Marco Polo Arroyo Prado
COLEON S.A. DE C.V.
Representante Legal

COLEC[illegible]L. DE C.V.	
DOMICILIO. CALLE HIDALGO N°. 46 PONIENTE COLONIA CENTRO, ESCUINAPA, SINALOA.	
R.F.C. COL11012631A	I.M.S.S.

DEPENDENCIA:

H. AYUNTAMIENTO DE ESCUINAPA, SINALOA

DIRECCION DE OBRAS, SERVICIOS PUBLICOS Y ECOLOGIA.

UBICACIÓN DE LA OBRA

CONTRATO ESC-FAISMUN-2025-035

ESCUINAPA, SINALOA


ESCUINAPA, SINALOA.

ESTIMACION: 1 EXTRAORDINARIOS

ESCUINAPA, SINALOA

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN CALLE FRANCISCO PEREZ ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y FRANCISCO I. MADERO, COL. CENTRO, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ESCUINAPA

CLAVE	DESCRIPCION
1.3.1.2	Toma domiciliaria Tipo AP-19-A de 3.00 a 9.00 m. de Longitud, con Tubería Extrupack o similar de polietileno de alta densidad y alto peso molecular tipo II de 13 mm de Ø interior RD-9 Termofusionable (Norma NMX-E-018-SCFI-2002 o vigente), incluye: material, camisa de tubo pvc 2" RD-41, suministro de tuberia, abrazadera de insercion de pvc 3x1/2", llave de insercion, excavación a mano, equipo y herramientas.

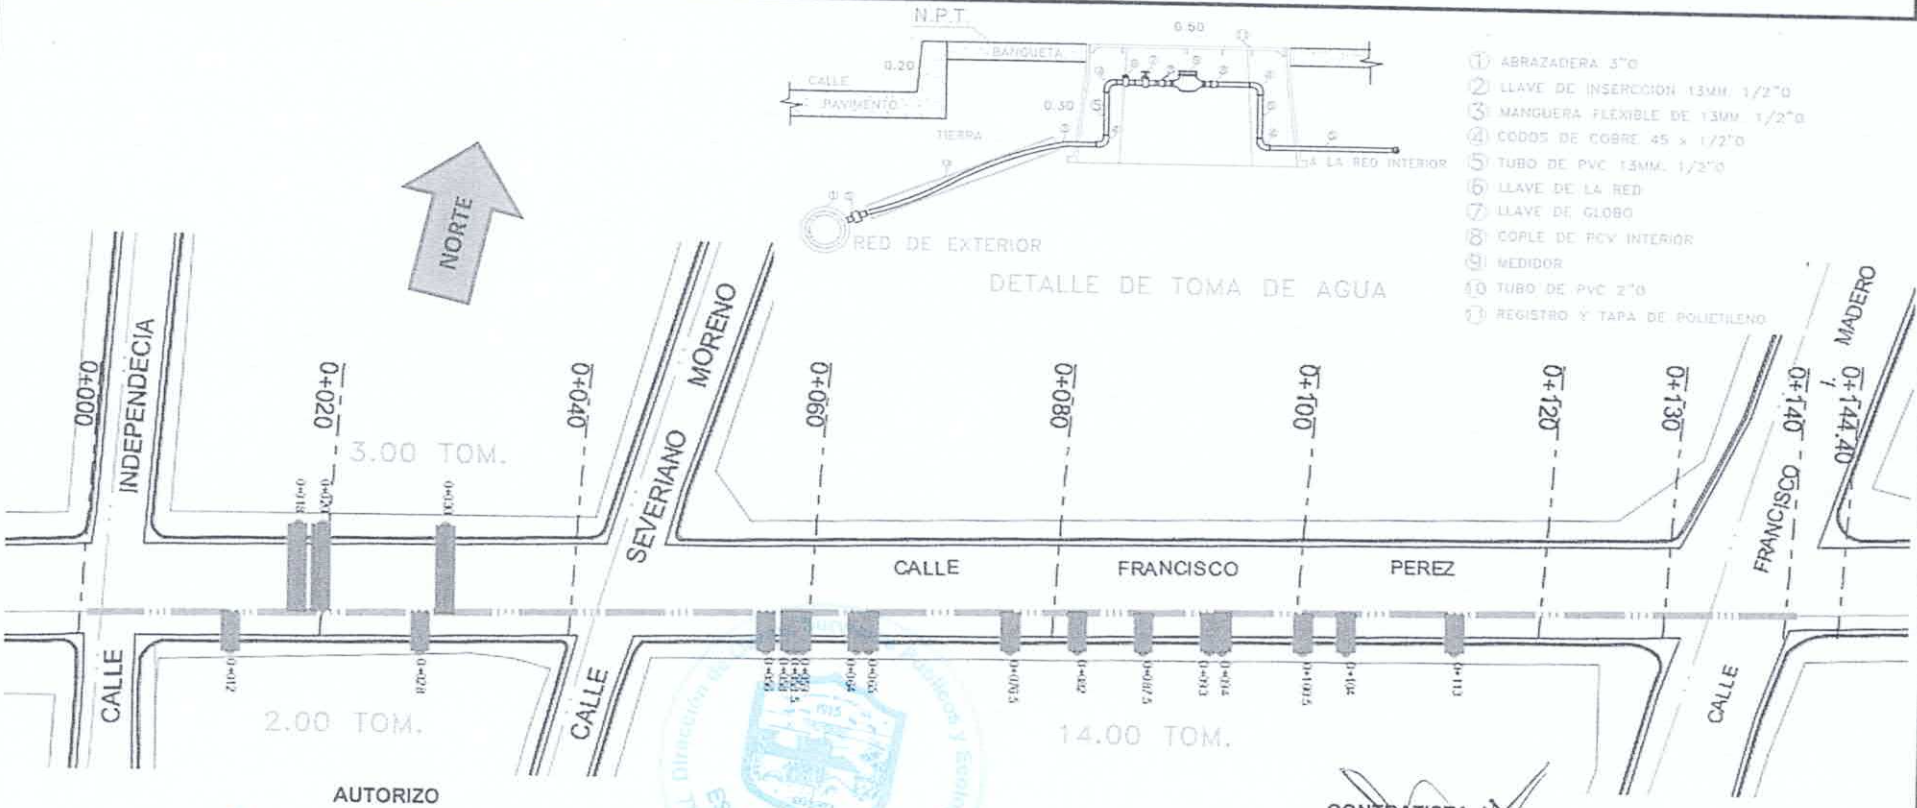

AUTORIZO

M. en Arq. Graciela Elizalde Santos
Directora de Obras, Servicios Publicos Y Ecologia

CONTRATISTA

Ing. Marco Polo Arroyo Prado
COLEON S.A. DE C.V.
Representante Legal

COLEC . DE C.V.	
DOMICILIO. CALLE HIDALGO N°. 46 PONIENTE COLONIA CENTRO, ESCUINAPA, SINALOA.	
R.F.C. COL11012631A	I.M.S.S.

DEPENDENCIA:

H. AYUNTAMIENTO DE ESCUINAPA, SINALOA

DIRECCION DE OBRAS, SERVICIOS PUBLICOS Y ECOLOGIA.

UBICACIÓN DE LA OBRA

CONTRATO: ESC-FAISMUN-2025-035

ESCUINAPA, SINALOA


ESCUINAPA, SINALOA.

ESTIMACION: 1 EXTRAORDINARIOS

ESCUINAPA, SINALOA

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN CALLE FRANCISCO PEREZ ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y FRANCISCO I. MADERO, COL. CENTRO, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ESCUINAPA

CLAVE	DESCRIPCION
1.5.2	Limpieza final de la obra. Incluye: recolección de basura generada por la obra, retiro de escombro y del material sobrante, acarreo fuera del lugar de la obra, mano de obra y herramientas.

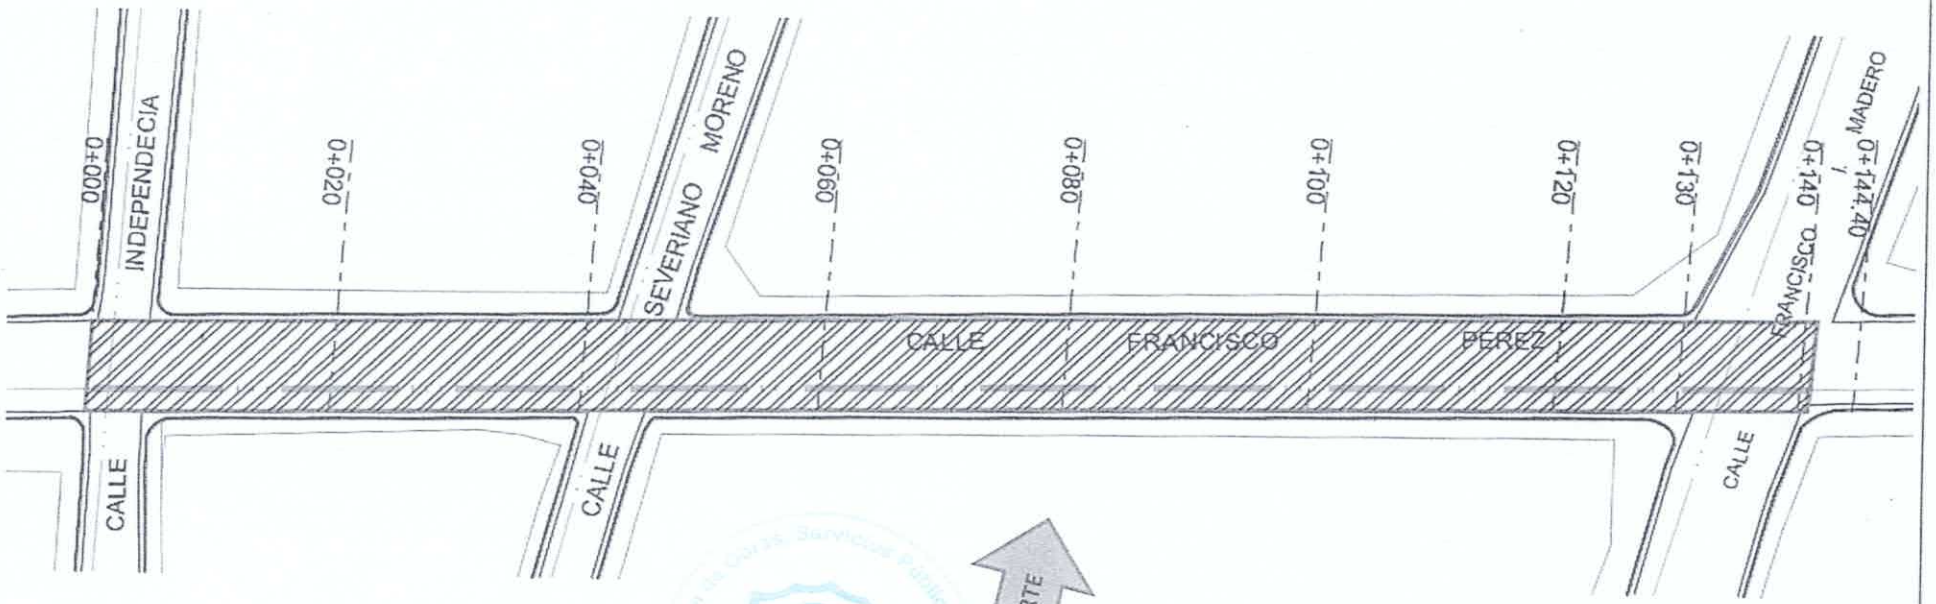

AUTORIZO

M. en Arq. Graciela Elizalde Santos
Directora de Obras, Servicios Publicos Y Ecologia

CONTRATISTA

Ing. Marco Polo Arroyo Prado
COLEON S.A. DE C.V.
Representante Legal

COLEC A. DE C.V.		DEPENDENCIA: H. AYUNTAMIENTO DE ESCUINAPA, SINALOA DIRECCION DE OBRAS, SERVICIOS PUBLICOS Y ECOLOGIA.
DOMICILIO. CALLE HIDALGO N°. 46 PONIENTE COLONIA CENTRO, ESCUINAPA, SINALOA.		
R.F.C. COL11012631A	I.M.S.S.	

UBICACIÓN DE LA OBRA

CONTRATO ESC-FAISMUN-2025-035

ESCUINAPA, SINALOA


ESCUINAPA, SINALOA.

ESTIMACION: 1 EXTRAORDINARIOS

ESCUINAPA, SINALOA

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN CALLE FRANCISCO PEREZ ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y FRANCISCO I. MADERO, COL. CENTRO, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ESCUINAPA

CLAVE	DESCRIPCION
1.4.1	Reparacion de guarnicion y banqueta de 5cm esp en area de caja de medidore, con concreto hecho en obra F'c=150 kg/cm2, acabado escabillado fino. Incluye: demolicion de banqueta existente, compactacion, colado y curado de concreto, mano de obra y herramienta.

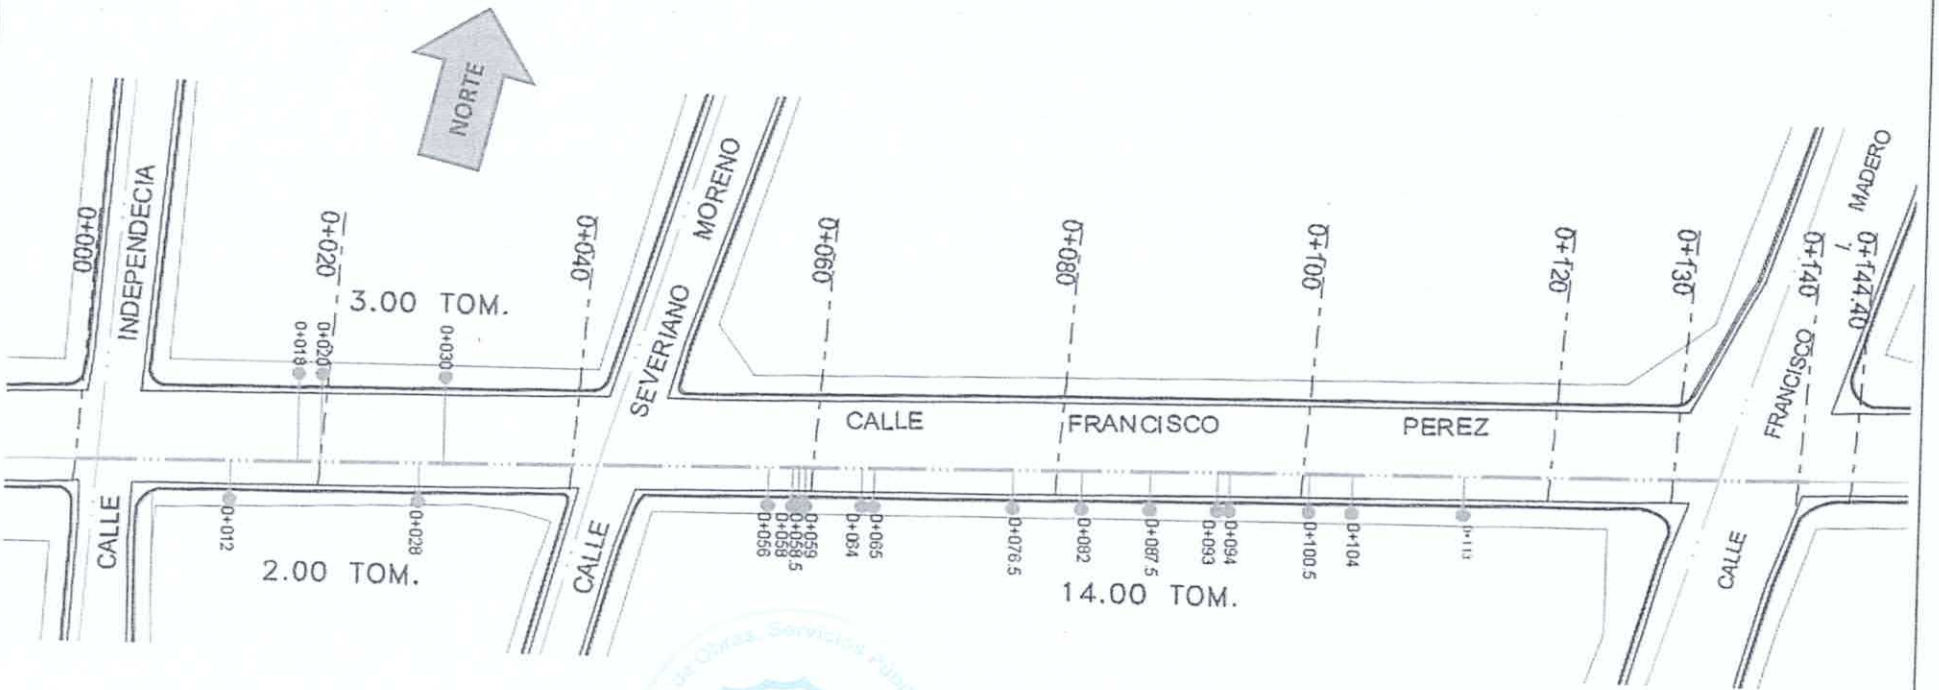

AUTORIZO

M. en Arq. Graciela Elizalde Santos
Directora de Obras, Servicios Publicos Y Ecologia

CONTRATISTA

Ing. Marco Polo Arroyo Prado
COLEON S.A. DE C.V.
Representante Legal

COLEON S.A DE C.V. DOMICILIO - CALLE HIDALGO N°. 46 PONIENTE COLONIA CENTRO, ESCUINAPA, SINALOA. R.F.C. I.M.S.S. COL11012631A	DEPENDENCIA H. AYUNTAMIENTO DE ESCUINAPA, SINALOA DIRECCION DE OBRAS, SERVICIOS PUBLICOS Y ECOLOGIA


REPORTE FOTOGRAFICO

DESCRIPCION:	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN CALLE FRANCISCO PEREZ ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y FRANCISCO I. MADERO, COL. CENTRO, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ESCUINAPA			FECHA:	05/12/2025
CONTRATO:	ESC-FAISMUN-2025-035	LOCALIDAD:	ESCUINAPA, SINALOA	ESTIMACION:	1 EXTRAS

CLAVE:	CONCEPTO
1.1.1	Trazo y nivelación con equipo topografico para tendido de tuberia para red hidraulica. Incluye: personal de topografía, materiales (pinturas, cal, cintas, clavos, estacas, etc.) transporte y acarreos. Así mismo la revisión de las cotas del proyecto; verificando del perfil del terreno natural durante el proceso necesario de la obra.





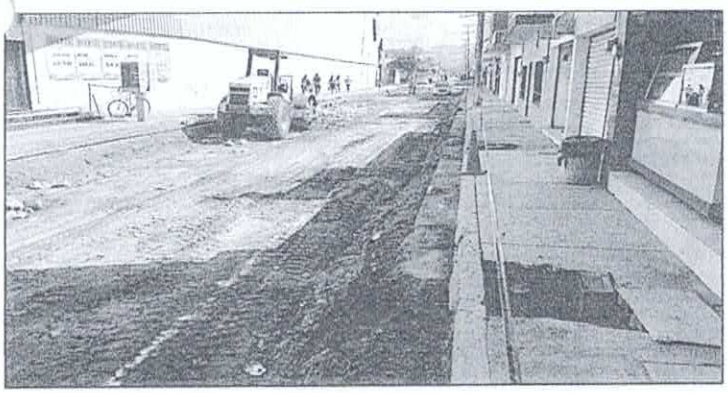



AUTORIZO

M. de Arq. Graciela Elizalde Santos
Directora de Obras, Servicios Publicos Y Ecologia

Arq. Cesar Guadalupe Medina Contreras
Supervisor de Obras Publicas
Obras, Servicios Publicos Y Ecologia

CONTRATISTA

Ing. Marco Polo Arroyo Prado
COLEON S.A. DE C.V.
Representante Legal

COLEON S.A DE C.V. DOMICILIO - CALLE HIDALGO N°. 46 PONIENTE COLONIA CENTRO, ESCUINAPA, SINALOA. R.F.C. I.M.S.S. COL11012631A	DEPENDENCIA H. AYUNTAMIENTO DE ESCUINAPA, SINALOA DIRECCION DE OBRAS, SERVICIOS PUBLICOS Y ECOLOGIA

REPORTE FOTOGRAFICO

DESCRIPCION:	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN CALLE FRANCISCO PEREZ ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y FRANCISCO I. MADERO, COL. CENTRO, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ESCUINAPA			FECHA:	05/12/2025
CONTRATO:	ESC-FAISMUN-2025-035	LOCALIDAD:	ESCUINAPA, SINALOA	ESTIMACION:	1 EXTRAS

CLAVE:	CONCEPTO
1.1.2	Sondeo para localizar tuberia existente en campo. Incluye: mano de obra, maquinaria, equipo menor y herramientas, pago de permisos y todo lo necesario para correcta ejecución.









AUTORIZO

M. de Arq. Graciela Elizalde Santos
Directora de Obras, Servicios Publicos Y Ecologia

CONTRATISTA

Ing. Marco Polo Arroyo Prado
COLEON S.A. DE C.V.
Representante Legal

Arq. Cesar Guadalupe Medina Contreras
Supervisor de Obras Publicas
Obras, Servicios Publicos Y Ecologia

COLEON S.A DE C.V. DOMICILIO - CALLE HIDALGO N°. 46 PONIENTE COLONIA CENTRO, ESCUINAPA, SINALOA. R.F.C. I.M.S.S. COL11012631A	DEPENDENCIA H. AYUNTAMIENTO DE ESCUINAPA, SINALOA DIRECCION DE OBRAS, SERVICIOS PUBLICOS Y ECOLOGIA

REPORTE FOTOGRAFICO

DESCRIPCION:	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN CALLE FRANCISCO PEREZ ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y FRANCISCO I. MADERO, COL. CENTRO, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ESCUINAPA			FECHA:	05/12/2025
CONTRATO:	ESC-FAISMUN-2025-035	LOCALIDAD:	ESCUINAPA, SINALOA	ESTIMACION:	1 EXTRAS

CLAVE:	CONCEPTO
EXT-01	Remoción de carpeta asfáltica existente de 10cm espesor sobre el área de rodamiento del pavimento hidráulico existente. Incluye: corte, raspado con máquina y manual, equipo, mano de obra y herramienta.









AUTORIZO

M. de Arq. Graciela Elizalde Santos
Directora de Obras, Servicios Publicos Y Ecologia

CONTRATISTA

Ing. Marco Polo Arroyo Prado
COLEON S.A. DE C.V.
Representante Legal

Arq. Cesar Guadalupe Medina Contreras
Supervisor de Obras Publicas
Obras, Servicios Publicos Y Ecologia

COLEON S.A DE C.V. DOMICILIO - CALLE HIDALGO N°. 46 PONIENTE COLONIA CENTRO, ESCUINAPA, SINALOA. R.F.C. COL11012631A I.M.S.S.	DEPENDENCIA H. AYUNTAMIENTO DE ESCUINAPA, SINALOA DIRECCION DE OBRAS, SERVICIOS PUBLICOS Y ECOLOGIA


REPORTE FOTOGRAFICO

DESCRIPCION:	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN CALLE FRANCISCO PEREZ ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y FRANCISCO I. MADERO, COL. CENTRO, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ESCUINAPA			FECHA:	05/12/2025
CONTRATO:	ESC-FAISMUN-2025-035	LOCALIDAD:	ESCUINAPA, SINALOA	ESTIMACION:	1 EXTRAS

CLAVE:	CONCEPTO
1.2.2	Excavacion de zanja a mano en material tipo I - II, excepto roca, de 0.00 hasta 2.00 mts de profundidad en seco. Incluye: afloje y extracción del material, amacize y limpieza de plantilla y taludes, remoción traspaleos y conservación de la zanja hasta la instalación satisfactoria de la tubería. En seco.





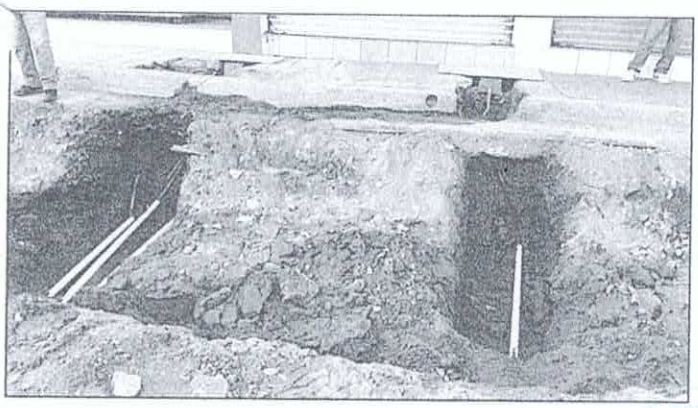

AUTORIZO

M. de Arq. Graciela Elizalde Santos
Directora de Obras, Servicios Publicos Y Ecologia

CONTRATISTA

Ing. Marco Polo Arroyo Prado
COLEON S.A. DE C.V.
Representante Legal

Arq. Cesar Guadalupe Medina Contreras
Supervisor de Obras Publicas
Obras, Servicios Publicos Y Ecologia

COLEON S.A DE C.V. DOMICILIO - CALLE HIDALGO N°. 46 PONIENTE COLONIA CENTRO, ESCUINAPA, SINALOA. R.F.C. COL11012631A I.M.S.S.	DEPENDENCIA H. AYUNTAMIENTO DE ESCUINAPA, SINALOA DIRECCION DE OBRAS, SERVICIOS PUBLICOS Y ECOLOGIA

REPORTE FOTOGRAFICO

DESCRIPCION:	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN CALLE FRANCISCO PEREZ ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y FRANCISCO I. MADERO, COL. CENTRO, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ESCUINAPA			FECHA:	05/12/2025
CONTRATO:	ESC-FAISMUN-2025-035	LOCALIDAD:	ESCUINAPA, SINALOA	ESTIMACION:	1 EXTRAS

CLAVE:	CONCEPTO
1.2.1	Excavacion de zanja por medios mecanico en material tipo I - II, excepto roca, de 0.00 hasta 2.00 mts de profundidad en seco. Incluye: afloje y extracción del material, amacize y limpieza de plantilla y taludes, remoción traspaleos y conservación de la zanja hasta la instalación satisfactoria de la tubería. En seco.









AUTORIZO

M. de Arq. Graciela Elizalde Santos
Directora de Obras, Servicios Publicos Y Ecologia

CONTRATISTA

Ing. Marco Polo Arroyo Prado
COLEON S.A. DE C.V.
Representante Legal

Arq. Cesar Guadalupe Medina Contreras
Supervisor de Obras Publicas
Obras, Servicios Publicos Y Ecologia

COLEON S.A DE C.V. DOMICILIO - CALLE HIDALGO N°. 46 PONIENTE COLONIA CENTRO, ESCUINAPA, SINALOA. R.F.C. COL11012631A I.M.S.S.	DEPENDENCIA H. AYUNTAMIENTO DE ESCUINAPA, SINALOA DIRECCION DE OBRAS, SERVICIOS PUBLICOS Y ECOLOGIA


REPORTE FOTOGRAFICO

DESCRIPCION:	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN CALLE FRANCISCO PEREZ ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y FRANCISCO I. MADERO, COL. CENTRO, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ESCUINAPA			FECHA:	05/12/2025
CONTRATO:	ESC-FAISMUN-2025-035	LOCALIDAD:	ESCUINAPA, SINALOA	ESTIMACION:	1 EXTRAS

CLAVE:	CONCEPTO
1.2.3	Excavacion de zanja por medios mecanico en material tipo I - II, excepto roca, de 0.00 hasta 2.00 mts de profundidad en presencia de Agua. Incluye: afloje y extracción del material, amacize y limpieza de plantilla y taludes, remoción traspaleos y conservación de la zanja hasta la instalación satisfactoria de la tubería. En presencia de agua.





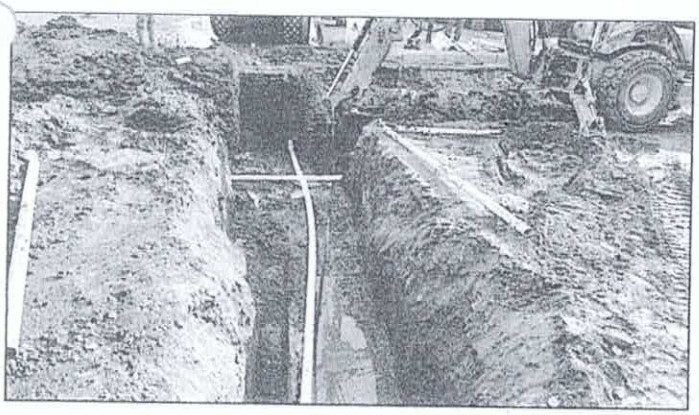



AUTORIZO

M. de Arq. Graciela Elizalde Santos
Directora de Obras, Servicios Publicos Y Ecologia

CONTRATISTA

Ing. Marco Polo Arroyo Prado
COLEON S.A. DE C.V.
Representante Legal

Arq. Cesar Guadalupe Medina Contreras
Supervisor de Obras Publicas
Obras, Servicios Publicos Y Ecologia

COLEON S.A DE C.V. DOMICILIO - CALLE HIDALGO N°. 46 PONIENTE COLONIA CENTRO, ESCUINAPA, SINALOA. R.F.C. I.M.S.S. COL11012631A	DEPENDENCIA H. AYUNTAMIENTO DE ESCUINAPA, SINALOA DIRECCION DE OBRAS, SERVICIOS PUBLICOS Y ECOLOGIA


REPORTE FOTOGRAFICO

DESCRIPCION:	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN CALLE FRANCISCO PEREZ ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y FRANCISCO I. MADERO, COL. CENTRO, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ESCUINAPA			FECHA:	05/12/2025
CONTRATO:	ESC-FAISMUN-2025-035	LOCALIDAD:	ESCUINAPA, SINALOA	ESTIMACION:	1 EXTRAS

CLAVE:	CONCEPTO
1.2.5	Encofrado con arena de rio aplicando agua, hasta 15cm arriba del lomo del tubo, medido colocado. Incluye: mano de obra, equipo y herraminetas.





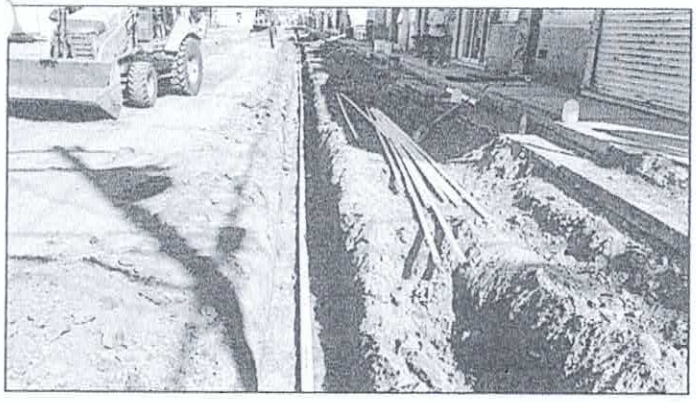



AUTORIZO

M. de Arq. Graciela Elizalde Santos
Directora de Obras, Servicios Publicos Y Ecologia

Arq. Cesar Guadalupe Medina Contreras
Supervisor de Obras Publicas
Obras, Servicios Publicos Y Ecologia

CONTRATISTA

Ing. Marco Polo Arroyo Prado
COLEON S.A. DE C.V.
Representante Legal


COLEON S.A DE C.V. DOMICILIO - CALLE HIDALGO N°. 46 PONIENTE COLONIA CENTRO, ESCUINAPA, SINALOA. R.F.C. I.M.S.S. COL11012631A	DEPENDENCIA H. AYUNTAMIENTO DE ESCUINAPA, SINALOA DIRECCION DE OBRAS, SERVICIOS PUBLICOS Y ECOLOGIA


REPORTE FOTOGRAFICO


DESCRIPCION:	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN CALLE FRANCISCO PEREZ ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y FRANCISCO I. MADERO, COL. CENTRO, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ESCUINAPA			FECHA:	05/12/2025
CONTRATO:	ESC-FAISMUN-2025-035	LOCALIDAD:	ESCUINAPA, SINALOA	ESTIMACION:	1 EXTRAS

CLAVE:	CONCEPTO
1.2.6	Relleno con material balastre compactado con equipo menor al 90% de la prueba PROCTOR y aplicando agua, medido colocado. Incluye: mano de obra, equipo y herraminetas.



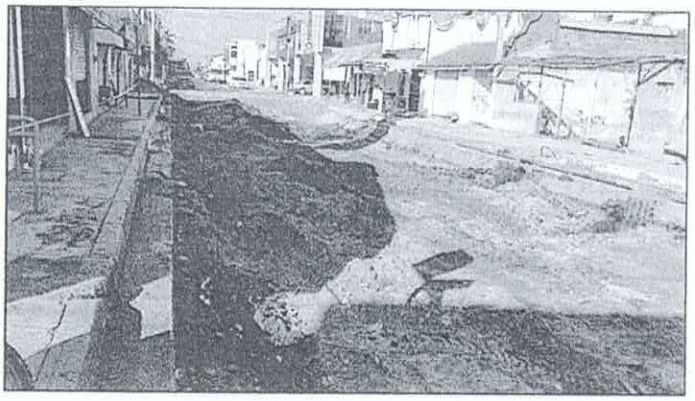

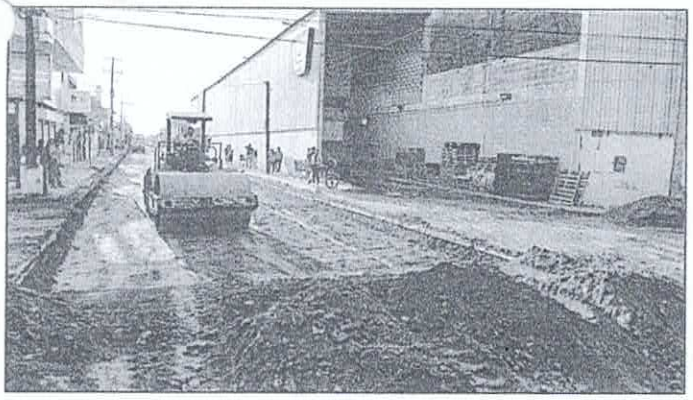

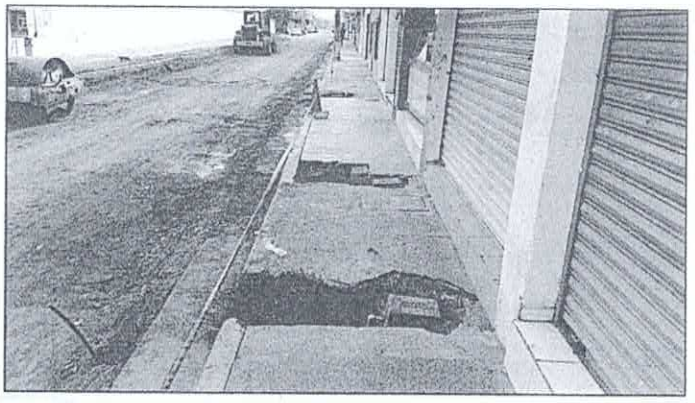

AUTORIZO

M. de Arq. Graciela Elizalde Santos
Directora de Obras, Servicios Publicos Y Ecologia

Arq. Cesar Guadalupe Medina Contreras
Supervisor de Obras Publicas
Obras, Servicios Publicos Y Ecologia

CONTRATISTA


Ing. Marco Polo Arroyo Prado
COLEON S.A. DE C.V.
Representante Legal

COLEON S.A DE C.V. DOMICILIO - CALLE HIDALGO N°. 46 PONIENTE COLONIA CENTRO, ESCUINAPA, SINALOA. R.F.C. COL11012631A I.M.S.S.	DEPENDENCIA H. AYUNTAMIENTO DE ESCUINAPA, SINALOA DIRECCION DE OBRAS, SERVICIOS PUBLICOS Y ECOLOGIA

REPORTE FOTOGRAFICO

DESCRIPCION:	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN CALLE FRANCISCO PEREZ ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y FRANCISCO I. MADERO, COL. CENTRO, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ESCUINAPA			FECHA:	05/12/2025
CONTRATO:	ESC-FAISMUN-2025-035	LOCALIDAD:	ESCUINAPA, SINALOA	ESTIMACION:	1 EXTRAS

CLAVE:	CONCEPTO
EXT-02	Estabilización de terreno natural saturado con Pedraplen de piedra incada y material de banco balastre para relleno compactado al 95% Proctor, incluye: acarreo del material, conformación, afine, maquinaria, material, mano de obra y herramienta.

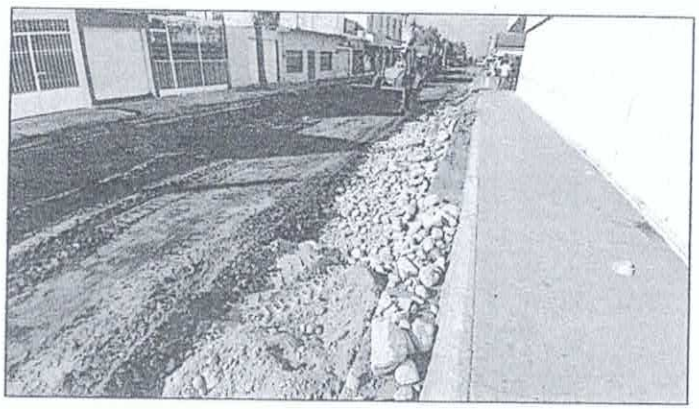







AUTORIZO

M. de Arq. Graciela Elizalde Santos
Directora de Obras, Servicios Publicos Y Ecologia

Arq. Cesar Guadalupe Medina Contreras
Supervisor de Obras Publicas
Obras, Servicios Publicos Y Ecologia

CONTRATISTA


Ing. Marco Polo Arroyo Prado
COLEON S.A. DE C.V.
Representante Legal

COLEON S.A DE C.V. DOMICILIO - CALLE HIDALGO N°. 46 PONIENTE COLONIA CENTRO, ESCUINAPA, SINALOA. R.F.C. COL11012631A I.M.S.S.	DEPENDENCIA H. AYUNTAMIENTO DE ESCUINAPA, SINALOA DIRECCION DE OBRAS, SERVICIOS PUBLICOS Y ECOLOGIA


REPORTE FOTOGRAFICO


DESCRIPCION:	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN CALLE FRANCISCO PEREZ ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y FRANCISCO I. MADERO, COL. CENTRO, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ESCUINAPA			FECHA:	05/12/2025
CONTRATO:	ESC-FAISMUN-2025-035	LOCALIDAD:	ESCUINAPA, SINALOA	ESTIMACION:	1 EXTRAS

CLAVE:	CONCEPTO
1.3.1.1	Suministro e Instalación de Tuberia PVC Hidraulico ANG SI 3" Ø RD-32.5. Incluye: Suministro de material, Junteo, mano de obra especializada, Prueba Hidrostatica sugún Norma Oficial Mexicana NOM-013-CNA-2000 ó vigente, acarreos, suministro de agua para prueba de Campo, carga, maniobras para tendido a lo largo de la zanja, bajado, acoplamiento de atraques, equipo, herramientas y tapones en los extremos de 3" (75mm) de Ø RD-26

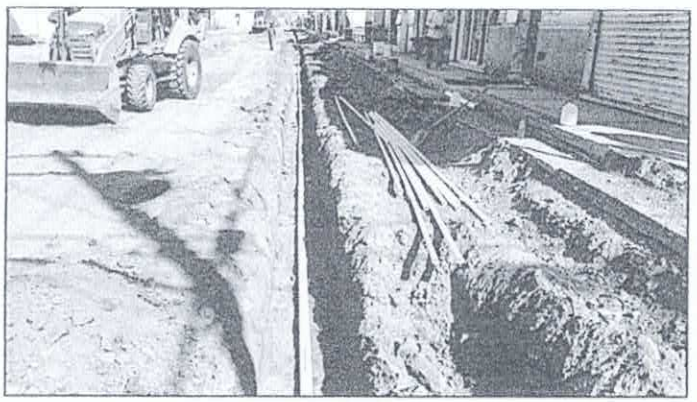



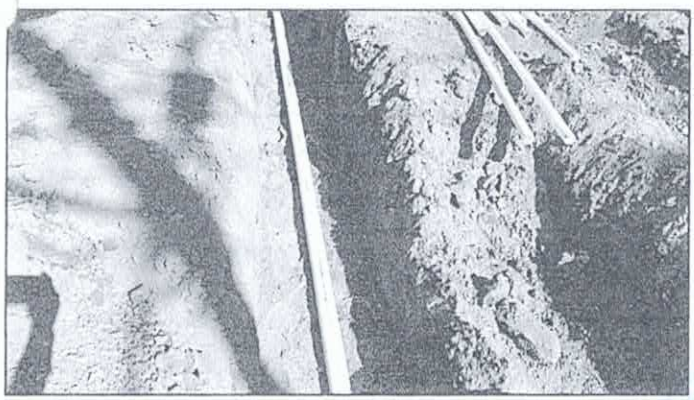

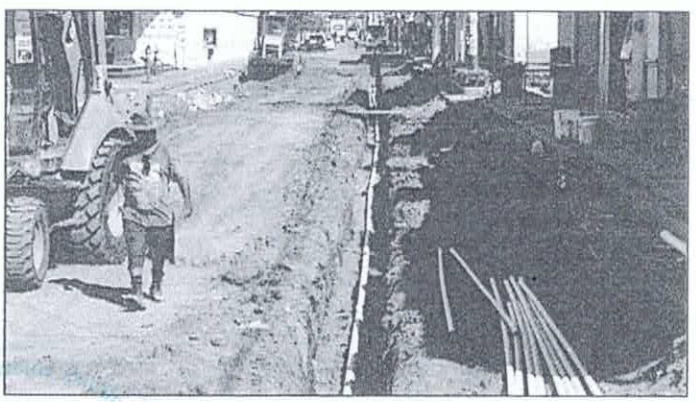

AUTORIZO

M. de Arq. Graciela Elizalde Santos
Directora de Obras, Servicios Publicos Y Ecologia

CONTRATISTA

Ing. Marco Polo Arroyo Prado
COLEON S.A. DE C.V.
Representante Legal


Arq. Cesar Guadalupe Medina Contreras
Supervisor de Obras Publicas
Obras, Servicios Publicos Y Ecologia


COLEON S.A DE C.V. DOMICILIO - CALLE HIDALGO N°. 46 PONIENTE COLONIA CENTRO, ESCUINAPA, SINALOA. R.F.C. COL11012631A I.M.S.S.	DEPENDENCIA H. AYUNTAMIENTO DE ESCUINAPA, SINALOA DIRECCION DE OBRAS, SERVICIOS PUBLICOS Y ECOLOGIA


REPORTE FOTOGRAFICO

DESCRIPCION:	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN CALLE FRANCISCO PEREZ ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y FRANCISCO I. MADERO, COL. CENTRO, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ESCUINAPA			FECHA:	05/12/2025
CONTRATO:	ESC-FAISMUN-2025-035	LOCALIDAD:	ESCUINAPA, SINALOA	ESTIMACION:	1 EXTRAS

CLAVE:	CONCEPTO
1.3.1.2	Suministro e Instalación de CRUZ PVC Hidráulico ANG SI 3" Ø. Incluye: Materiales, mano de obra especializada y herramientas.

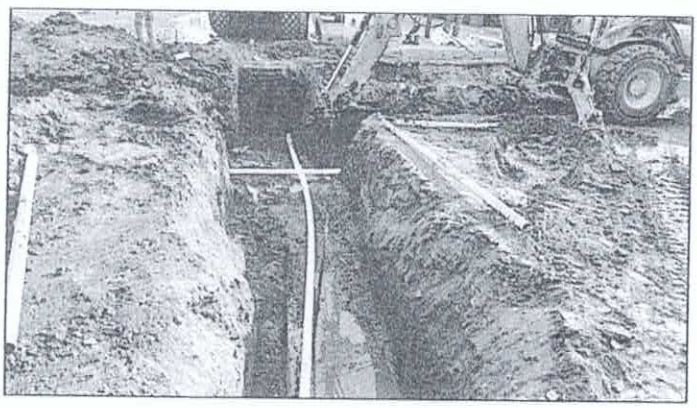

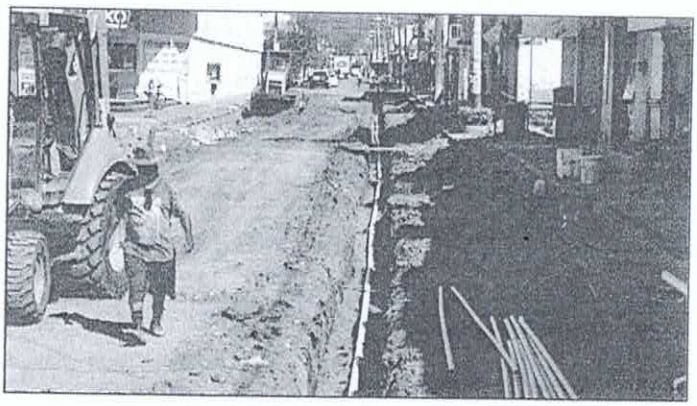

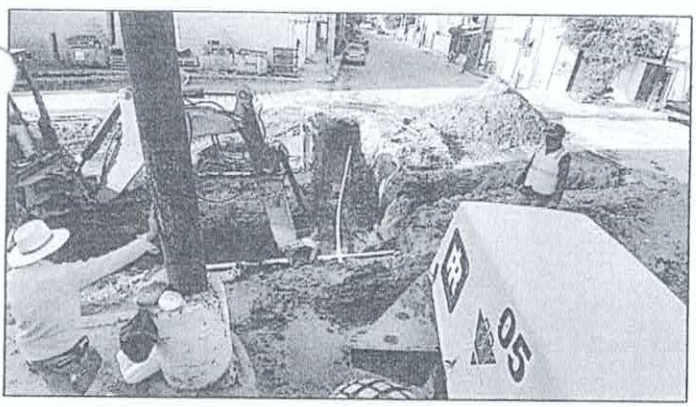



AUTORIZO

M. de Arq. Graciela Elizalde Santos
Directora de Obras, Servicios Publicos Y Ecologia

CONTRATISTA

Ing. Marco Polo Arroyo Prado
COLEON S.A. DE C.V.
Representante Legal


Arq. Cesar Guadalupe Medina Contreras
Supervisor de Obras Publicas
Obras, Servicios Publicos Y Ecologia


COLEON S.A DE C.V. DOMICILIO - CALLE HIDALGO N°. 46 PONIENTE COLONIA CENTRO, ESCUINAPA, SINALOA. R.F.C. I.M.S.S. COL11012631A	DEPENDENCIA H. AYUNTAMIENTO DE ESCUINAPA, SINALOA DIRECCION DE OBRAS, SERVICIOS PUBLICOS Y ECOLOGIA


REPORTE FOTOGRAFICO


DESCRIPCION:	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN CALLE FRANCISCO PEREZ ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y FRANCISCO I. MADERO, COL. CENTRO, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ESCUINAPA			FECHA:	05/12/2025
CONTRATO:	ESC-FAISMUN-2025-035	LOCALIDAD:	ESCUINAPA, SINALOA	ESTIMACION:	1 EXTRAS

CLAVE:	CONCEPTO
1.3.1.3	Suministro e Instalación de Reduccion campana PVC Hidráulico ANG SI 3" x 2" Ø. Incluye: Materiales, Anillos de hule, Limpieza, acarreos, prueba hidroestatica junto con la tubería, mano de obra especializada y herramientas.

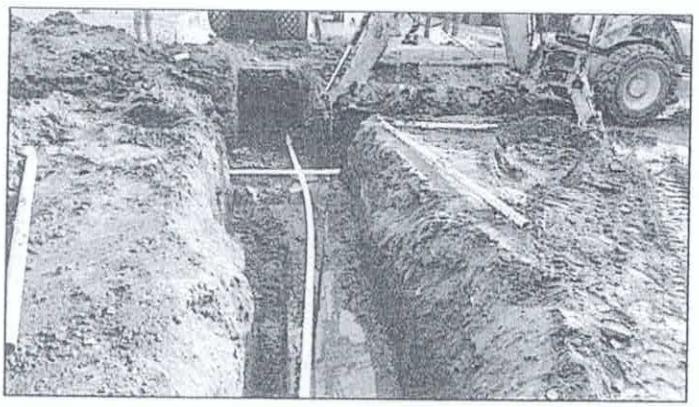

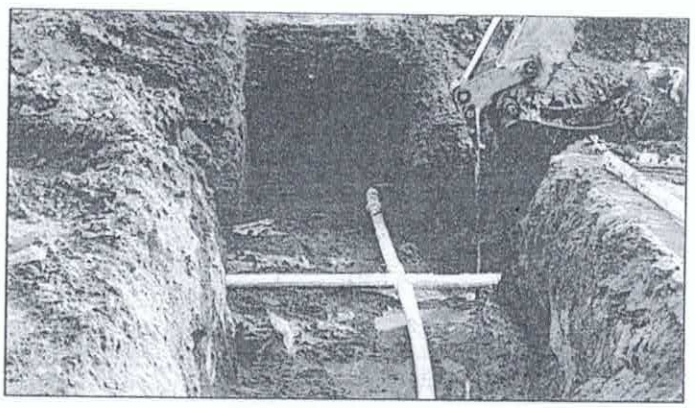

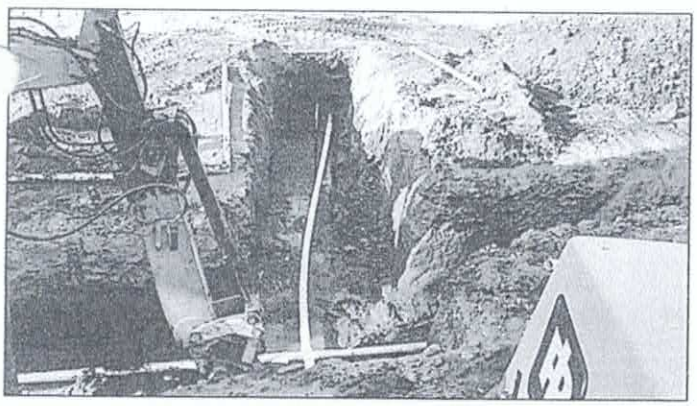

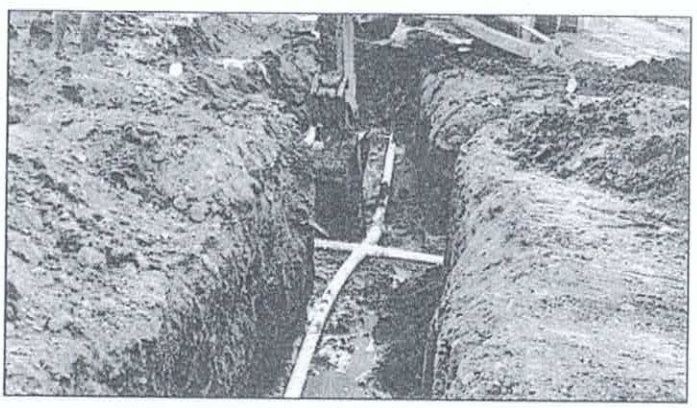

AUTORIZO

M. de Arq. Graciela Elizalde Santos
Directora de Obras, Servicios Publicos Y Ecologia

Arq. Cesar Guadalupe Medina Contreras
Supervisor de Obras Publicas
Obras, Servicios Publicos Y Ecologia

CONTRATISTA


Ing. Marco Polo Arroyo Prado
COLEON S.A. DE C.V.
Representante Legal


COLEON S.A DE C.V. DOMICILIO - CALLE HIDALGO N°. 46 PONIENTE COLONIA CENTRO, ESCUINAPA, SINALOA. R.F.C. I.M.S.S. COL11012631A	DEPENDENCIA H. AYUNTAMIENTO DE ESCUINAPA, SINALOA DIRECCION DE OBRAS, SERVICIOS PUBLICOS Y ECOLOGIA

REPORTE FOTOGRAFICO

DESCRIPCION:	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN CALLE FRANCISCO PEREZ ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y FRANCISCO I. MADERO, COL. CENTRO, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ESCUINAPA			FECHA:	05/12/2025
CONTRATO:	ESC-FAISMUN-2025-035	LOCALIDAD:	ESCUINAPA, SINALOA	ESTIMACION:	1 EXTRAS

CLAVE:	CONCEPTO
1.5.1	Toma domiciliaria Tipo AP-19-A de 3.00 a 9.00 m. de Longitud, con Tubería Extrupack o similar de polietileno de alta densidad y alto peso molecular tipo II de 13 mm de Ø interior RD-9 Termofusionable (Norma NMX-E-018-SCFI-2002 o vigente), incluye: material, camisa de tubo pvc 2" RD-41, suministro de tubería, abrazadera de inserción de pvc 3x1/2", llave de inserción, excavación a mano, equipo y herramientas.

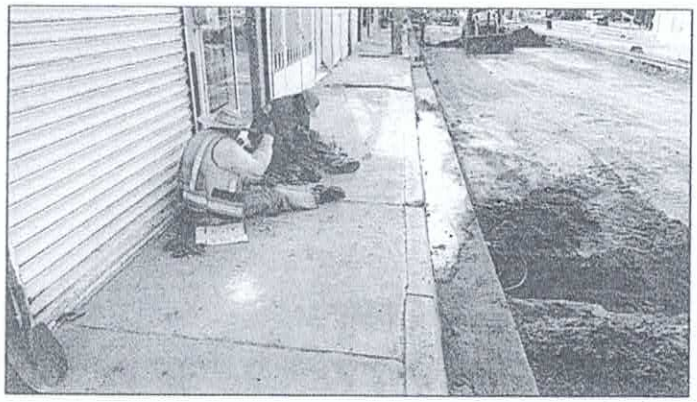

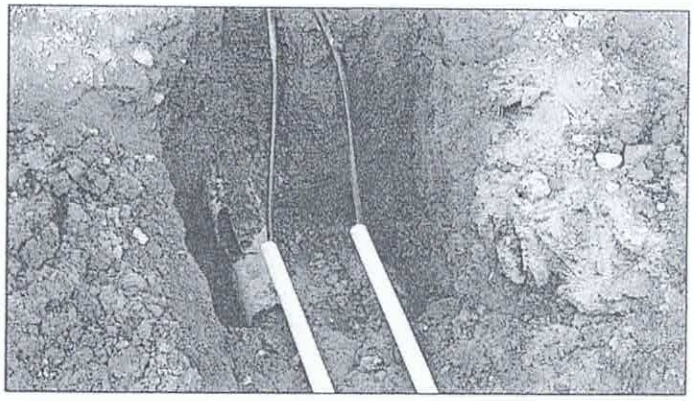





AUTORIZO

M. de Arq. Graciela Elizalde Santos
Directora de Obras, Servicios Publicos Y Ecologia

CONTRATISTA

Ing. Marco Polo Arroyo Prado
COLEON S.A. DE C.V.
Representante Legal


Arq. Cesar Guadalupe Medina Contreras
Supervisor de Obras Publicas
Obras, Servicios Publicos Y Ecologia

COLEON S.A DE C.V. DOMICILIO - CALLE HIDALGO N°. 46 PONIENTE COLONIA CENTRO, ESCUINAPA, SINALOA. R.F.C. COL11012631A I.M.S.S.	DEPENDENCIA H. AYUNTAMIENTO DE ESCUINAPA, SINALOA DIRECCION DE OBRAS, SERVICIOS PUBLICOS Y ECOLOGIA

REPORTE FOTOGRAFICO

DESCRIPCION:	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN CALLE FRANCISCO PEREZ ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y FRANCISCO I. MADERO, COL. CENTRO, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ESCUINAPA			FECHA:	05/12/2025
CONTRATO:	ESC-FAISMUN-2025-035	LOCALIDAD:	ESCUINAPA, SINALOA	ESTIMACION:	1 EXTRAS

CLAVE:	CONCEPTO
1.4.1	Reparacion de guarnicion y banqueta de 5cm esp en area de caja de medidore, con concreto hecho en obra F'c=150 kg/cm2, acabado escabillado fino. Incluye: demolicion de banqueta existente, compactacion, colado y curado de concreto, mano de obra y herramienta.

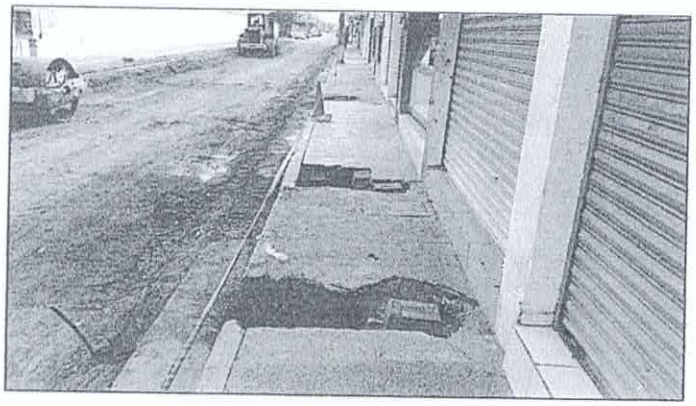







AUTORIZO

M. de Arq. Graciela Elizalde Santos
Directora de Obras, Servicios Publicos Y Ecologia

CONTRATISTA

Ing. Marco Polo Arroyo Prado
COLEON S.A. DE C.V.
Representante Legal

Arq. Cesar Guadalupe Medina Contreras
Supervisor de Obras Publicas
Obras, Servicios Publicos Y Ecologia

COLEON S.A DE C.V.
NOMBRE
DOMICILIO - CALLE HIDALGO N°. 46 PONIENTE COLONIA CENTRO, ESCUINAPA, SINALOA.
R.F.C. COL11012631A I.M.S.S.

DEPENDENCIA:
H. AYUNTAMIENTO DE ESCUINAPA, SINALOA.

DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS

COMPARATIVO DE OBRA

CONTRATO: ESC-FAISMUN-2025-035

LOCALIDAD: MUNICIPIO DE ESCUINAPA

MUNICIPIO: ESCUINAPA, SINALOA

DESCRIPCION: CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN CALLE FRANCISCO PEREZ ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y FRANCISCO I. MADERO, COL. CENTRO, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ESCUINAPA

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	P.U.	CANTIDAD	TOTAL	VOL. REAL		DIFERENCIA	
						CANTIDA	IMPORTE	CANTIDA	IMPORTE
	REPOSICION DE RED DE AGUA POTABLE CON TUBERIA PVC 3" CALLE FCO. PEREZ								
	PRELIMINARES								
1.1.1	Trazo y nivelación con equipo topografico para tendido de tuberia para red hidraulica. Incluye: personal de topografía, materiales (pinturas, cal, cintas, clavos, estacas, etc.) transporte y acarreos. Asl mismo la revisión de las cotas del proyecto; verificando del perfil del terreno natural durante el proceso necesario de la obra.	ML	$16.46	149.00	**$2,452.54**	141.30	$2,325.80	7.70	$126.74
1.1.2	Sondeo para localizar tuberia existente en campo. Incluye: mano de obra, maquinaria, equipo menor y herramientas, pago de permisos y todo lo necesario para correcta ejecución.	PZA	$2,652.14	1.00	**$2,652.14**	2.00	$5,304.28	- 1.00	-$2,652.14
1.1.4	Bombeo de achique con bomba autocebante, propiedad del contratista. Incluye: mano de obra, equipo menor y herramientas.	HR	$90.12	40.00	**$3,604.80**	24.00	$2,162.88	16.00	$1,441.92
EXT-01	Remoción de carpeta asfáltica existente de 10cm espesor sobre el área de rodamiento del pavimento hidráulico existente. Incluye: corte, raspado con máquina y manual, equipo, mano de obra y herramienta.	M2	$50.69	1208.04	**$61,235.61**	1,208.04	$61,235.61	-	$0.00
1.2	**EXCAVACIONES Y RELLENOS**								
1.2.2	Excavacion de zanja a mano en material tipo I - II, excepto roca, de 0.00 hasta 2.00 mts de profundidad en seco. Incluye: afloje y extracción del material, amacize y limpieza de plantilla y taludes, remoción traspaleos y conservación de la zanja hasta la instalación satisfactoria de la tubería. En seco.	M3	$301.46	23.54	**$7,096.37**	3.30	$993.61	20.24	$6,102.76
1.2.1	Excavacion de zanja por medios mecanico en material tipo I - II, excepto roca, de 0.00 hasta 2.00 mts de profundidad en seco. Incluye: afloje y extracción del material, amacize y limpieza de plantilla y taludes, remoción traspaleos y conservación de la zanja hasta la instalación satisfactoria de la tubería. En seco.	M3	$90.30	164.76	**$14,877.83**	149.52	$13,501.66	15.24	$1,376.17
1.2.3	Excavacion de zanja por medios mecanico en material tipo I - II, excepto roca, de 0.00 hasta 2.00 mts de profundidad en presencia de Agua. Incluye: afloje y extracción del material, amacize y limpieza de plantilla y taludes, remoción traspaleos y conservación de la zanja hasta la instalación satisfactoria de la tubería. En presencia de agua.	M3	$120.46	47.07	**$5,670.05**	19.00	$2,288.74	28.07	$3,381.31
1.2.5	Encofrado con arena de rio aplicando agua, hasta 15cm arriba del lomo del tubo, medido colocado. Incluye: mano de obra, equipo y herraminetas.	M3	$499.09	44.80	**$22,359.23**	59.81	$29,849.57	- 15.01	-$7,490.34

Dirección de Obras, Servicios Públicos y Ecología
ESCUINAPA 2024-2027
TIERRA DE OPORTUNIDADES

COLEON S.A DE C.V.
NOMBRE
DOMICILIO - CALLE HIDALGO N°. 46 PONIENTE COLONIA CENTRO, ESCUINAPA, SINALOA.
R.F.C. COL11012631A I.M.S.S.

DEPENDENCIA:
H. AYUNTAMIENTO DE ESCUINAPA, SINALOA.

DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS

COMPARATIVO DE OBRA

CONTRATO: ESC-FAISMUN-2025-035

LOCALIDAD: MUNICIPIO DE ESCUINAPA

MUNICIPIO: ESCUINAPA, SINALOA

DESCRIPCION: CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN CALLE FRANCISCO PEREZ ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y FRANCISCO I. MADERO, COL. CENTRO, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ESCUINAPA

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	P.U.	CANTIDAD	TOTAL	VOL. REAL		DIFERENCIA	
						CANTIDA	IMPORTE	CANTIDA	IMPORTE
1.2.6	Relleno con material balastre compactado con equipo menor al 90% de la prueba PROCTOR y aplicando agua, medido colocado. Incluye: mano de obra, equipo y herraminetas.	M3	$203.50	99.42	**$20,231.97**	89.71	$18,256.39	9.71	$1,975.58
EXT-02	Estabilización de terreno natural saturado con Pedraplen de piedra incada y material de banco balastre para relleno compactado al 95% Proctor, incluye: acarreo del material, conformación, afine, maquinaria, material, mano de obra y herramienta.	M3	$367.54	509.45	**$187,243.25**	509.45	$187,243.25	-	$0.00
	TENDIDO DE TUBERIA								
1.3.1	**TUBERIA Y PIEZAS ESPECIALES**								
1.3.1.1	Suministro e Instalación de Tuberia PVC Hidraulico ANG SI 3" Ø RD-32.5. Incluye: Suministro de material, Junteo, mano de obra especializada, Prueba Hidrostatica sugún Norma Oficial Mexicana NOM-013-CNA-2000 ó vigente, acarreos, suministro de agua para prueba de Campo, carga, maniobras para tendido a lo largo de la zanja, bajado, acoplamiento de atraques, equipo, herramientas y tapones en los extremos de 3" (75mm) de Ø RD-26	M	$195.98	149.00	**$29,201.02**	141.30	$27,691.97	7.70	$1,509.05
1.3.1.2	Suministro e Instalación de CRUZ PVC Hidráulico ANG SI 3" Ø. Incluye: Materiales, mano de obra especializada y herramientas.	PZA	$1,299.89	3.00	**$3,899.67**	3.00	$3,899.67	-	$0.00
1.3.1.3	Suministro e Instalación de Reduccion campana PVC Hidráulico ANG SI 3" x 2" Ø. Incluye: Materiales, Anillos de hule, Limpieza, acarreos, prueba hidroestatica junto con la tubería, mano de obra especializada y herramientas.	PZA	$475.70	4.00	**$1,902.80**	8.00	$3,805.60	- 4.00	-$1,902.80
	TOMAS DOMICILIARIAS								
1.5.1	Toma domiciliaria Tipo AP-19-A de 3.00 a 9.00 m. de Longitud, con Tubería Extrupack o similar de polietileno de alta densidad y alto peso molecular tipo II de 13 mm de Ø interior RD-9 Termofusionable (Norma NMX-E-018-SCFI-2002 o vigente), incluye: material, camisa de tubo pvc 2" RD-41, suministro de tuberia, abrazadera de insercion de pvc 3x1/2", llave de insercion, excavación a mano, equipo y herramientas.	PZA	$2,715.82	20.00	**$54,316.40**	19.00	$51,600.58	1.00	$2,715.82
1.5.2	Limpieza final de la obra. Incluye: recolección de basura generada por la obra, retiro de escombro y del material sobrante, acarreo fuera del lugar de la obra, mano de obra y herramientas.	LOTE	$6,709.33	1.00	**$6,709.33**	1.00	$6,709.33	-	$0.00

COLEON S.A DE C.V.
NOMBRE
DOMICILIO - CALLE HIDALGO N°. 46 PONIENTE COLONIA CENTRO, ESCUINAPA, SINALOA.
R.F.C. COL11012631A
I.M.S.S.

DEPENDENCIA:
H. AYUNTAMIENTO DE ESCUINAPA, SINALOA.

DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS

COMPARATIVO DE OBRA

CONTRATO: ESC-FAISMUN-2025-035

LOCALIDAD: MUNICIPIO DE ESCUINAPA

MUNICIPIO: ESCUINAPA, SINALOA

DESCRIPCION: CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN CALLE FRANCISCO PEREZ ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y FRANCISCO I. MADERO, COL. CENTRO, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ESCUINAPA

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	P.U.	CANTIDAD	TOTAL	VOL. REAL		DIFERENCIA	
						CANTIDA	IMPORTE	CANTIDA	IMPORTE
	ALBAÑILERIAS								
1.4.1	Reparacion de guarnicion y banqueta de 5cm esp en area de caja de medidore, con concreto hecho en obra F'c=150 kg/cm2, acabado escabillado fino. Incluye: demolicion de banqueta existente, compactacion, colado y curado de concreto, mano de obra y herramienta.	M2	$775.55	50.00	$38,777.50	39.75	$30,828.11	10.25	$7,949.39
					$462,230.52		$ 447,697.06		14,533.45

REVISO

Arq. Cesar Guadalupe Medina Contreras
Supervisor de Obras Publicas

AUTORIZO

M. de Arq. Graciela Elizalde Santos
Directora de Obras, Servicios Publicos Y Ecologia

CONTRATISTA

Ing. Marco Polo Arroyo Prado
COLEON S.A. DE C.V.
Representante Legal

COLEON [illegible] C.V.

DOMICILIO - CALLE HIDALGO N°. 46 PONIENTE COLONIA CENTRO, ESCUINAPA, SINALOA.

R.F.C. I.M.S.S.

COL11012631A

DEPENDENCIA:
H. AYUNTAMIENTO DE ESCUINAPA, SINALOA.

DIRECCION DE OBRAS, SERVICIOS PUBLICOS Y ECOLOGIA

ESTIMACION

CONTRATO	ESC-FAISMUN-2025-035
LOCALIDAD	ESCUINAPA, SINALOA
DESCRIPCION:	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN CALLE FRANCISCO PEREZ ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y FRANCISCO I. MADERO, COL. CENTRO, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ESCUINAPA

ESTIMACION:	02 (Finiquito)
MUNICIPIO:	ESCUINAPA

IMPORTE DE OBRA:	$2,114,658.06
IMPORTE DE ANTICIPO DE OBRA (35%):	$740,130.32
IMPORTE TOTAL DE CONTRATO:	$2,453,003.35

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	SEGUN PROYECTO			HASTA ESTA ESTIM.	HASTA ESTIM ANT.	EXCEDENTE	DE ESTA ESTIMACION	IMPORTE
			VOL	PU	$					
	PAVIMENTO HIDRAULICO									
	PRELIMINARES									
PU-01	LIMPIEZA, TRAZO Y NIVELACION DE TERRENO NATURAL	M2	1582.90	$13.04	$20,641.02	1208.04	1208.04	-374.86	0.00	$0.00
PU-01.1	DEMOLICIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO CON EQUIPO, INCLUYE; MAQUINARIA CON DEMOLEDOR HIDRÁULICO, HERRAMIENTAS.	M2	1582.90	$111.74	$176,873.25	1208.04	1208.04	-374.86	0.00	$0.00
	DESPALME Y CORTE									
PU-02	EXCAVACION EN MATERIAL TIPO II PARA ALOJAR BASE, SUB-BASE Y PAVIMENTO. NOTA: (EN ESTE CONCEPTO SE REALIZA LA EXCAVACION A BASE DEL PROYECTO EJECUTIVO PARA REALIZAR LOS TRABAJOS CORRESPONDIENTE DEL PROYECTO, ESTO PARA DAR LOS NIVELES ADECUADOS A LA EJECUCION).	M3	949.74	$22.48	$21,350.16	1234.28	1234.28	284.54	0.00	$0.00
	ACARREOS PARA TERRACERIAS									
PU-03	CARGA Y ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION A 1ER. KM.	M3	949.74	$32.71	$31,066.00	1234.28	1234.28	284.54	0.00	$0.00
PU-04	ACARREO DE MATERIAL A KM. SUB A 3 KM.	M3/KM	2849.22	$8.74	$24,902.18	3702.84	3702.84	853.62	0.00	$0.00
	TERRAPLENES									
PU-05	AFINE Y COMPACTADO PROCTOR AL 85% PROCTOR, DE TERRRENO NATURAL PARA RECIBIR TERRACERIAS.	M2	1582.90	$23.55	$37,277.30	1208.04	1208.04	-374.86	0.00	$0.00
PU-06	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MATERIAL DE BANCO PARA BASE, DE 20 CM DE ESPESOR.	M3	316.58	$586.89	$185,797.64	241.61	241.61	-74.97	0.00	$0.00
PU-07	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MATERIAL DE BANCO PARA SUB-BASE DE 20 CM DE ESPESOR	M3	316.58	$522.17	$165,308.58	241.61	241.61	-74.97	0.00	$0.00
PU-08	SUMINISTRO Y COLOCACION DE RIEGO DE IMPREGNACION A RAZON DE 1.5 LTS/M2 PARA PROTEGER TERRACERIA, INCLUYE ARENA PARA SU PROTECCION.	M2	1582.90	$47.17	$74,665.39	1208.04	1208.04	-374.86	0.00	$0.00

Servicios Públicos y Ecología
ESCUINAPA 2024-2027
TIERRA DE OPORTUNIDADES

COLEON S.A. DE C.V.

DOMICILIO - CALLE HIDALGO N°. 46 PONIENTE COLONIA CENTRO, ESCUINAPA, SINALOA.

R.F.C. COL11012631A I.M.S.S.

DEPENDENCIA:
H. AYUNTAMIENTO DE ESCUINAPA, SINALOA.

DIRECCION DE OBRAS, SERVICIOS PUBLICOS Y ECOLOGIA

ESTIMACION

CONTRATO	ESC-FAISMUN-2025-035
LOCALIDAD	ESCUINAPA, SINALOA
DESCRIPCION:	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN CALLE FRANCISCO PEREZ ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y FRANCISCO I. MADERO, COL. CENTRO, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ESCUINAPA

ESTIMACION:	02 (Finiquito)
MUNICIPIO:	ESCUINAPA

IMPORTE DE OBRA:	$2,114,658.06
IMPORTE DE ANTICIPO DE OBRA (35%):	$740,130.32
IMPORTE TOTAL DE CONTRATO:	$2,453,003.35

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	SEGUN PROYECTO VOL	PU	$	HASTA ESTA ESTIM.	HASTA ESTIM ANT.	EXCEDENTE	DE ESTA ESTIMACION	IMPORTE
	CONCRETO HIDRAULICO									
PU-10	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LOSA DE CONCRETO F'C=250 KG/CM2 DE 20 CM DE ESPESOR INCLUYE CIMBRA, DESCIMBRA Y MANO DE OBRA. NOTA: (LOS PRECIOS DE ESTE CONCEPTOS ESTAN SUJETOS AL MERCADO DEL COSTO DE LOS INSUMOS EN ESTA ZONA, COMO TAMBIEN LA MANO DE OBRA)	M2	1582.90	$806.25	$1,276,213.13	1208.04	1208.04	-374.86	0.00	$0.00
PU-11	CALAFATEO CON EMULSION ASFALTICA EN CALIENTE ENJUNTAS DE CONTRACCION , INCLUYE MATERIAL Y MANO DE OBRA.	ML	515.82	$40.02	$20,643.12	794.68	794.68	278.86	0.00	$0.00
	OBRAS COMPLEMENTARIAS									
PU-11.1	RENIVELACION DE POZO DE VISITA EXISTENTE; INCLUYE; TAPA Y BROCAL DE FIERRO FUNDIDO DE ALTA DENSIDAD NUEVOS.	PZA	6.00	$8,491.89	$50,951.34	4.00	4.00	-2.00	0.00	$0.00
PU-14	PINTURA DE ESMALTE EN GUARNICIONES HASTA 40 CM DE DESARROLLO, TRABAJO TERMINADO, INCLUYE: LIMPIEZA Y PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, SUMINISTRO Y APLICACIÓN.	ML	343.88	$33.93	$11,667.85	276.65	0.00	-67.23	276.65	$9,386.73
PU-13	LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA, INCLUYE ACARREO DEL SOBRANTE DENTRO Y FUERA DE LA OBRA, A TIRO LIBRE.	M2	1582.9	10.93	$17,301.10	1208.04	0.00	-374.86	1208.04	$13,203.89
								TOTAL DE PAVIMENTO HIDRAULICO :		$22,590.63

TOTAL DE PAVIMENTO HIDRAULICO :	$22,590.63
AMORTIZACION ANTICIPO (35%) :	$0.00
TOTAL DE PAVIMENTO HIDRAULICO AMORTIZADO:	$22,590.63
TOTAL I.V.A. (16%) :	$3,614.50
TOTAL DE ESTIMACION CON IVA.	$26,205.13

REVISO

Arq. Cesar Guadalupe Medina Contreras
Supervisor de Obras Publicas

AUTORIZO

M. de Arq. Graciela Elizalde Santos
Directora de Obras, Servicios Publicos Y Ecologia

CONTRATISTA

Ing. Marco Polo Arroyo Prado
COLEON S.A. DE C.V.
Representante Legal

HOJA: DE: 1

CONTRATISTA: COLEON S.A DE C.V.

DOMICILIO - CALLE HIDALGO N°. 46 PONIENTE COLONIA CENTRO, ESCUINAPA, SINALOA.

R.F.C. I.M.S.S.

COL11012631A

DEPENDENCIA

H. AYUNTAMIENTO DE ESCUINAPA, SINALOA.

DIRECCION DE OBRAS, SERVICIOS PUBLICOS Y ECOLOGIA

ESTADO DE CUENTA

CONTRATO: ESC-FAISMUN-2025-035

ESTIMACION: 02 (Finiquito)

LOCALIDAD: MUNICIPIO DE ESCUINAPA

MUNICIPIO: ESCUINAPA

DESCRIPCION: CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN CALLE FRANCISCO PEREZ ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y FRANCISCO I. MADERO, COL. CENTRO, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ESCUINAPA

OF. APROB.

FECHA APROB.

PERIODO DE CONTRATO DEL: 22-oct-25 AL 31-dic-25

IMPORTE DE OBRA: $2,114,658.06

IMPORTE DE ANTICIPO DE OBRA: $740,130.32

IMPORTE TOTAL DE CONTRATO: $2,453,003.35

CONVENIO ADICIONAL:

PERIODO CONVENIO ADICIONAL: DEL AL

No. DE ESTIMACION	PERIODO		IMPORTE ESTIMACION $	IMPORTE $ SIN IVA	3% A INSP DE OBRAS $	AMORTIZACION ANTICIPO	TOTAL DEDUCCIONES SIN IVA	TOTAL DE MONTO CON IVA:	LIQUIDO A PAGAR
01	22-oct-25	21-nov-25	$1,907,465.13	$ 1,644,366.49	$ 49,330.99	$575,528.27	1,068,838.22	$1,239,852.33	$1,190,521.34
01 EXT.	22-oct-25	21-nov-25	$ 519,330.47	$ 447,698.68	$ 13,430.96	$164,602.05	283,096.63	$328,392.09	$314,961.13
02	22-nov-25	13-dic-25	$ 26,205.13	$ 22,590.63	$ 677.72	$0.00	22,590.63	$26,205.13	$25,527.41
TOTALES:			$ 2,453,000.73	$ 2,114,655.80	$ 63,439.67	$ 740,130.32	$ 1,374,525.48	$1,594,449.55	$1,531,009.87

SALDO DEL CONTRATO: $2.62

SALDO DE ANTICIPO POR AMORTIZAR: $0.00

AUTORIZO

M. de Arq. Graciela Elizalde Santos
Directora de Obras, Servicios Publicos Y Ecologia

CONTRATISTA

Ing. Marco Polo Arroyo Prado
COLEON S.A. DE C.V.
Representante Legal

SUPERVISOR DE OBRA

Arq. Cesar Guadalupe Medina Contreras

RECIBO No: 01

CONTRATISTA:	COLEON S.A DE C.V.	FECHA :	13-dic-25
DOMICILIO:		ESTIMACION No:	02 (Finiquito)
DOMICILIO - CALLE HIDALGO N°. 46 PONIENTE COLONIA CENTRO, ESCUINAPA, SINALOA.			
	UBICACION: ESCUINAPA, SINALOA.	PERIODO:	
R.F.C. COL11012631A	I.M.S.S.	DEL	22-nov-25
		AL	13-dic-25

CONTRATO: ESC-FAISMUN-2025-035	FECHA DE CONTRATO: 22-oct-25
	PERIODO DE EJECUCION DEL CONTRATO:
	INICIO: 22-oct-25
	TERMINACION: 31-dic-25

DESCRIPCION:
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN CALLE FRANCISCO PEREZ ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y FRANCISCO I. MADERO, COL. CENTRO, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ESCUINAPA

CONTRATO N0:
ESC-FAISMUN-2025-035

IMPORTE SIN IVA	IMPORTE CON IVA	35% ANTICIPO	TOTAL DE CONTRATO:
$2,114,658.06	$2,453,003.35	$740,130.32	$2,453,003.35

BUENO POR:	$ 1,239,174.62

RECIBI DEL H. AYUNTAMIENTO DE ESCUINAPA LA CANTIDAD DE:

$ 1,239,174.62 (SON: UN MILLON CIENTO NOVENTA MIL QUINIENTOS VEINTIUN PESOS 34/100 M. N.)

EN PAGO DE ESTIMACION 01

DEDUCCIONES:		CALCULO DE ESTIMACION	
AMORTIZACION ANTICIPO 35% (*)	$ 740,130.32	TOTAL DE LA OBRA EJECUTADA SIN IVA	1,068,838.22
MAS I.V.A.	$ 118,420.85	MAS I.V.A 16 %	$ 171,014.12
TOTAL AMORTIZACION DE ANTICIPO	$0.00	TOTAL DE LA OBRA EJECUTADA CON IVA	$ 1,239,852.34
3 % SFP INSP. OBRAS: (*)	$ 677.72	MENOS DEDUCCIONES 3% DE INSPECCION Y VIGILANCIA:	$ 677.72
2 AL MILLAR C.M.I.C.	$ -		
TOTAL DEDUCCIONES	677.72		
(*) DEL IMPORTE EJECUTADO CON IVA		SALDO A PAGAR:	1,239,174.62

AUTORIZO

M. de Arq. Graciela Elizalde Santos
Directora de Obras, Servicios Publicos Y Ecologia

CONTRATISTA

Ing. Marco Polo Arroyo Prado
COLEON S.A. DE C.V.
Representante Legal

SUPERVISOR DE OBRA

Arq. Cesar Guadalupe Medina Contreras

COLEON S.A DE C.V.
NOMBRE

DOMICILIO - CALLE HIDALGO N°. 46 PONIENTE COLONIA CENTRO, ESCUINAPA, SINALOA.

R.F.C. COL11012631A

I.M.S.S.

DEPENDENCIA:
H. AYUNTAMIENTO DE ESCUINAPA, SINALOA.

DIRECCION DE OBRAS, SERVICIOS PUBLICOS Y ECOLOGIA

NUMEROS GENERADORES

CONTRATO: ESC-FAISMUN-2025-035

ESTIMACION: 02 (Finiquito)

LOCALIDAD: MUNICIPIO DE ESCUINAPA

MUNICIPIO: ESCUINAPA

DESCRIPCION: CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN CALLE FRANCISCO PEREZ ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y FRANCISCO I. MADERO, COL. CENTRO, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ESCUINAPA

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	LOCALIZACION TRAMO	LOCALIZACION PZAS	LARGO	ANCHO	ALTO	RESULTADO	OBSERVACION
	PAVIMENTO HIDRAULICO								
	OBRAS COMPLEMENTARIAS		**C. INDEPENDENCIA - C. FCO. I. MADERO**						
PU-14	PINTURA DE ESMALTE EN GUARNICIONES HASTA 40 CM DE DESARROLLO, TRABAJO TERMINADO, INCLUYE: LIMPIEZA Y PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, SUMINISTRO Y APLICACIÓN.	ML	**Lado Derecho**						
			0+000 al 0+000.8		2.00			2.00	
			0+005.6 al 0+041		36.60			36.60	
			0+046.2 al 0+130		86.30			86.30	
			0+140 al 0+144.40		4.90			4.90	
			Lado Izquierdo						
			0+000 al 0+000.8		2.50			2.50	
			0+005.6 al 0+043		38.90			38.90	
			0+048.8 al 0+128		81.00			81.00	
			0+143 al 0+144.40		3.85			3.85	
			BOCACALLE SEVERIANO MORENO						
			Lado Derecho		10.00			10.00	
			Lado Izquierdo		10.60			10.60	
							TOTAL DE PU-14 :	276.65	M2

REVISO

Arq. Cesar Guadalupe Medina Contreras
Supervisor de Obras Publicas

AUTORIZO

M. de Arq. Graciela Elizalde Santos
Directora de Obras, Servicios Publicos Y Ecologia

CONTRATISTA

Ing. Marco Polo Arroyo Prado
COLEON S.A. DE C.V.
Representante Legal

COLEON S.A DE C.V.
NOMBRE

DOMICILIO - CALLE HIDALGO N°. 46 PONIENTE COLONIA CENTRO, ESCUINAPA, SINALOA.

R.F.C. COL11012631A

I.M.S.S.

DEPENDENCIA:
H. AYUNTAMIENTO DE ESCUINAPA, SINALOA.

DIRECCION DE OBRAS, SERVICIOS PUBLICOS Y ECOLOGIA

NUMEROS GENERADORES

CONTRATO: ESC-FAISMUN-2025-035

ESTIMACION: 02 (Finiquito)

LOCALIDAD: MUNICIPIO DE ESCUINAPA

MUNICIPIO: ESCUINAPA

DESCRIPCION: CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN CALLE FRANCISCO PEREZ ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y FRANCISCO I. MADERO, COL. CENTRO, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ESCUINAPA

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	LOCALIZACION		LARGO	ANCHO	ALTO	RESULTADO	OBSERVACION
			TRAMO	PZAS					
	PAVIMENTO HIDRAULICO								
	OBRAS COMPLEMENTARIAS		**C. INDEPENDENCIA - C. FCO. I. MADERO**						
PU-13	LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA, INCLUYE ACARREO DEL SOBRANTE DENTRO Y FUERA DE LA OBRA, A TIRO LIBRE.	M2	0+000 al 0+010		10.00	8.00		80.00	
			0+010 al 0+020		10.00	8.00		80.00	
			0+020 al 0+030		10.00	8.00		80.00	
			0+030 al 0+040		10.00	8.00		80.00	
			0+040 al 0+050		10.00	8.00		80.00	
			0+050 al 0+060		10.00	8.00		80.00	
			0+060 al 0+070		10.00	8.00		80.00	
			0+070 al 0+080		10.00	8.00		80.00	
			0+080 al 0+090		10.00	8.00		80.00	
			0+090 al 0+100		10.00	8.00		80.00	
			0+100 al 0+110		10.00	8.00		80.00	
			0+110 al 0+120		10.00	8.00		80.00	
			0+120 al 0+130		10.00	8.00		80.00	
			0+130 al 0+140		10.00	8.00		80.00	
			0+140 al 0+144.40		4.40	8.00		35.20	
			BOCACALLE SEVERIANO MORENO		11.55	4.58		52.84	
							TOTAL DE PU-13 :	1208.04	M2

REVISO

Arq. Cesar Guadalupe Medina Contreras
Supervisor de Obras Publicas

AUTORIZO

M. de Arq. Graciela Elizalde Santos
Directora de Obras, Servicios Publicos Y Ecologia

CONTRATISTA

Ing. Marco Polo Arroyo Prado
COLEON S.A. DE C.V.
Representante Legal


COLEON S.A. DE C.V.	DEPENDENCIA: **H. AYUNTAMIENTO DE ESCUINAPA, SINALOA** **DIRECCION DE OBRAS, SERVICIOS PUBLICOS Y ECOLOGIA.**
DOMICILIO. CALLE HIDALGO N°. 46 PONIENTE COLONIA CENTRO, ESCUINAPA, SINALOA.	
R.F.C. **COL11012631A**	I.M.S.S.

UBICACIÓN DE LA OBRA

CONTRATO	**ESC-FAISMUN-2025-035**	ESTIMACION:	**02 (Finiquito)**
ESCUINAPA, SINALOA	**ESCUINAPA, SINALOA.**		**ESCUINAPA, SINALOA**

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN CALLE FRANCISCO PEREZ ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y FRANCISCO I. MADERO, COL. CENTRO, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ESCUINAPA

CLAVE	DESCRIPCION
PU-14	PINTURA DE ESMALTE EN GUARNICIONES HASTA 40 CM DE DESARROLLO, TRABAJO TERMINADO, INCLUYE: LIMPIEZA Y PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, SUMINISTRO Y APL

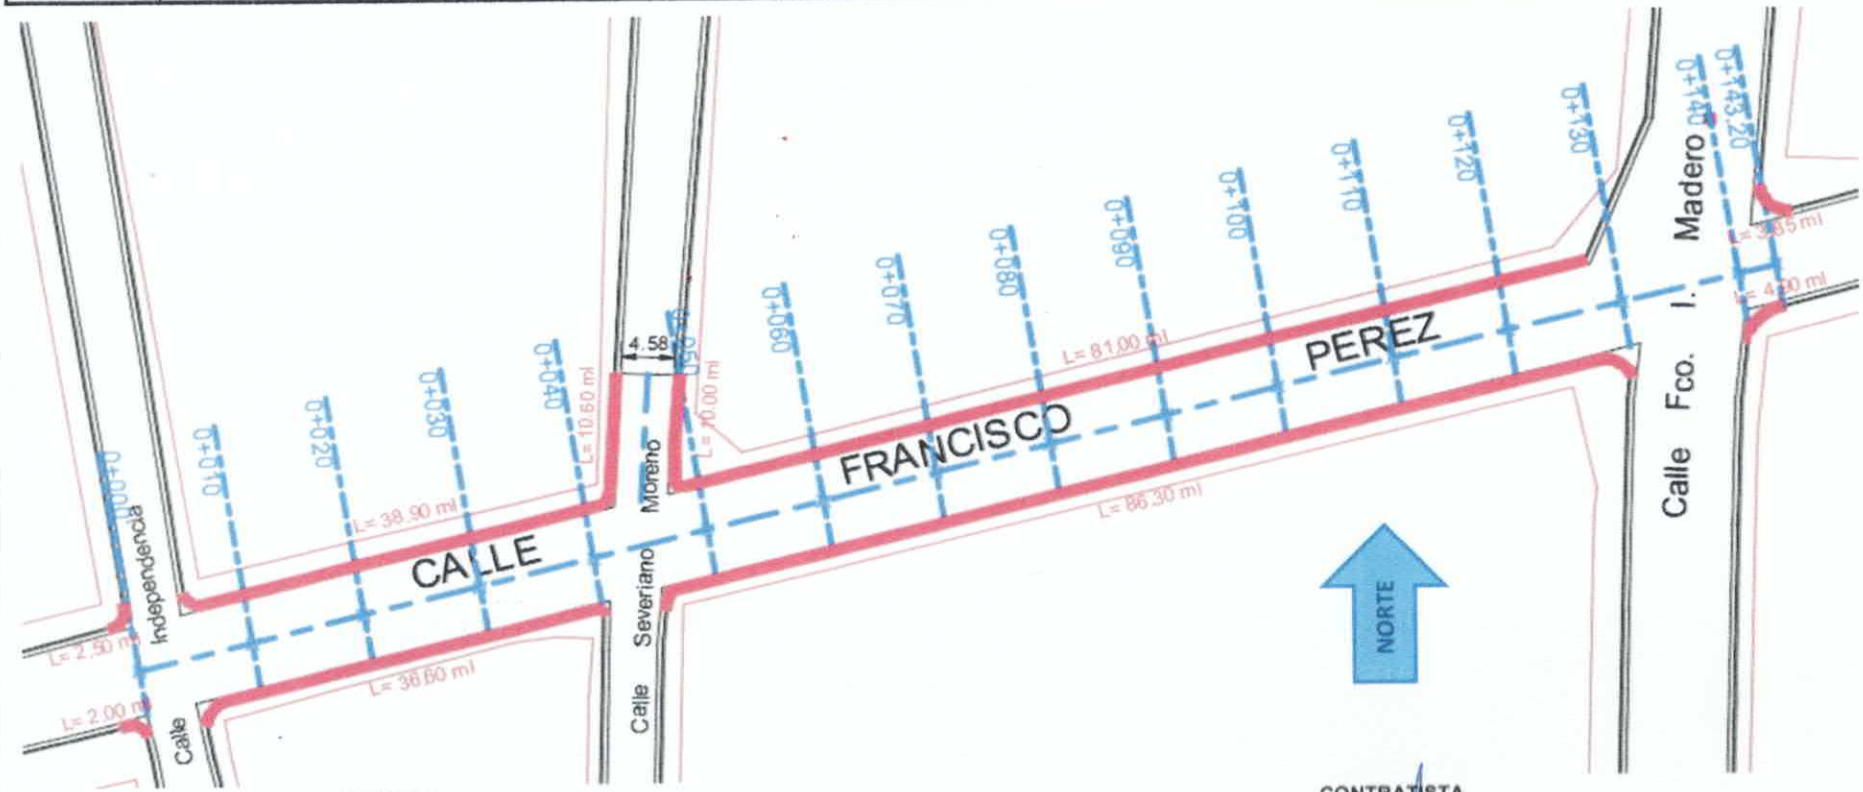

AUTORIZO

M. en Arq. Graciela Elizalde Santos
Directora de Obras, Servicios Publicos Y Ecologia

CONTRATISTA

Ing. Marco Polo Arroyo Prado
COLEON S.A. DE C.V.
Representante Legal


COLEON S.. DE C.V.	DEPENDENCIA: H. AYUNTAMIENTO DE ESCUINAPA, SINALOA DIRECCION DE OBRAS, SERVICIOS PUBLICOS Y ECOLOGIA.
DOMICILIO. CALLE HIDALGO N°. 46 PONIENTE COLONIA CENTRO, ESCUINAPA, SINALOA.	
R.F.C. COL11012631A	I.M.S.S.

UBICACIÓN DE LA OBRA

CONTRATO	ESC-FAISMUN-2025-035	ESTIMACION:	02 (Finiquito)
ESCUINAPA, SINALOA	ESCUINAPA, SINALOA.		ESCUINAPA, SINALOA

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN CALLE FRANCISCO PEREZ ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y FRANCISCO I. MADERO, COL. CENTRO, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ESCUINAPA

CLAVE	CONCEPTO
PU-13	LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA, INCLUYE ACARREO DEL SOBRANTE DENTRO Y FUERA DE LA OBRA, A TIRO LIBRE.

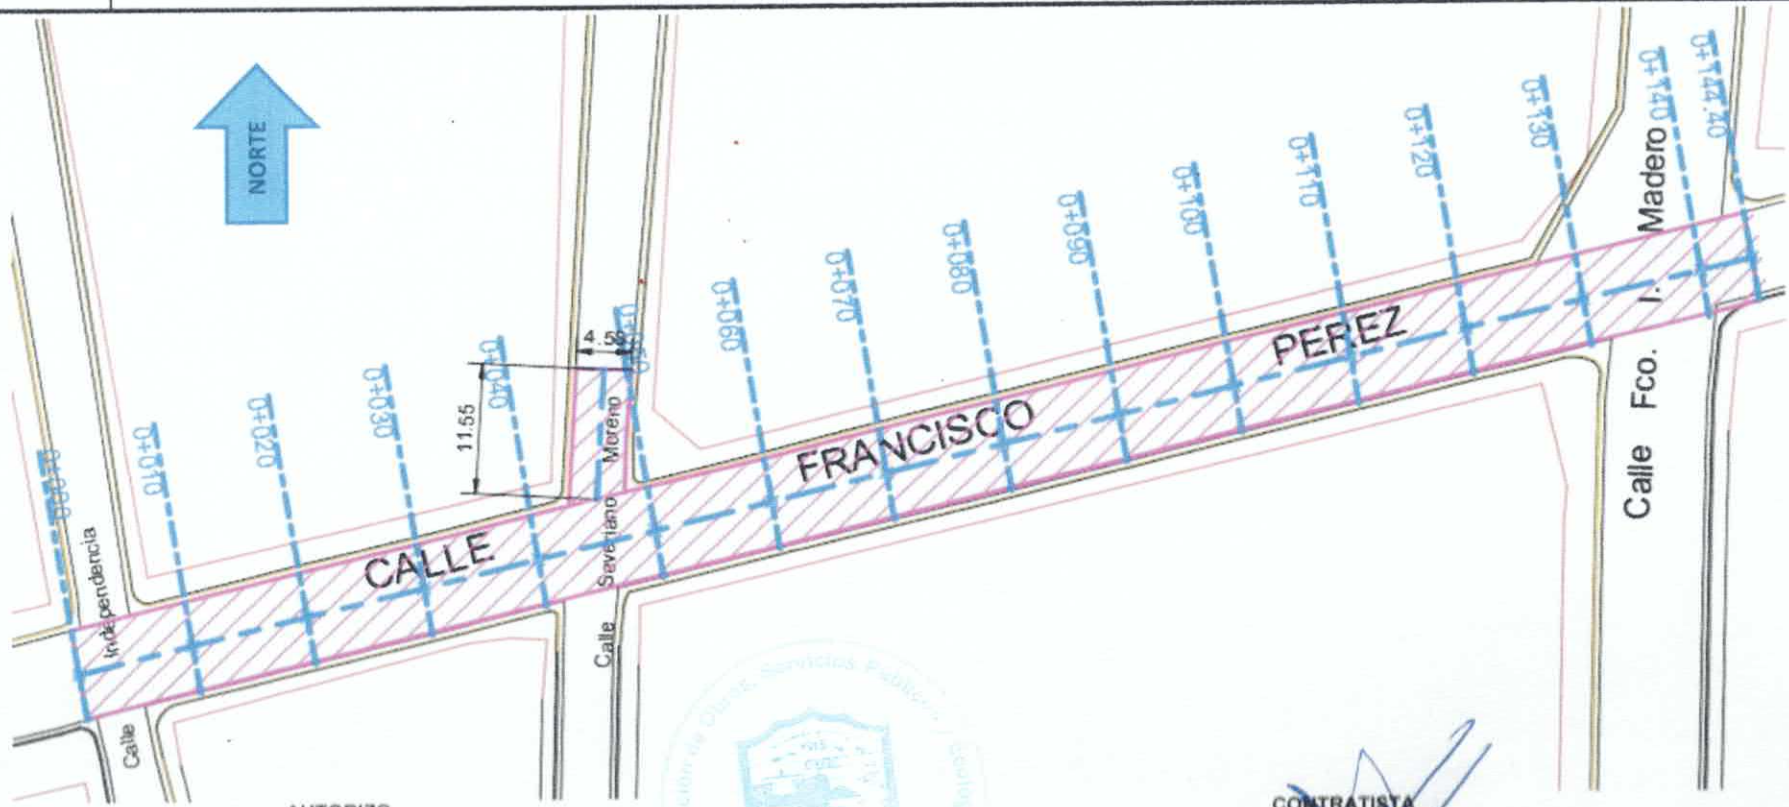

AUTORIZO

M. en Arq. Graciela Elizalde Santos
Directora de Obras, Servicios Publicos Y Ecologia

CONTRATISTA

Ing. Marco Polo Arroyo Prado
COLEON S.A. DE C.V.
Representante Legal

COLEON S.A DE C.V. DOMICILIO - CALLE HIDALGO N°. 46 PONIENTE COLONIA CENTRO, ESCUINAPA, SINALOA. R.F.C. I.M.S.S. COL11012631A	DEPENDENCIA H. AYUNTAMIENTO DE ESCUINAPA, SINALOA DIRECCION DE OBRAS, SERVICIOS PUBLICOS Y ECOLOGIA

REPORTE FOTOGRAFICO

DESCRIPCION:	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN CALLE FRANCISCO PEREZ ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y FRANCISCO I. MADERO, COL. CENTRO, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ESCUINAPA			FECHA:	06/12/2025
CONTRATO:	ESC-FAISMUN-2025-035	LOCALIDAD:	ESCUINAPA, SINALOA	ESTIMACION:	02 (Finiquito)

CLAVE:	CONCEPTO
PU-14	PINTURA DE ESMALTE EN GUARNICIONES HASTA 40 CM DE DESARROLLO, TRABAJO TERMINADO, INCLUYE: LIMPIEZA Y PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, SUMINISTRO Y APLICACIÓN.









AUTORIZO

M. de Arq. Graciela Elizalde Santos
Directora de Obras, Servicios Publicos Y Ecologia

CONTRATISTA

Ing. Marco Polo Arroyo Prado
COLEON S.A. DE C.V.
Representante Legal

Arq. Cesar Guadalupe Medina Contreras
Supervisor de Obras Publicas
Obras, Servicios Publicos Y Ecologia

COLEON S.A DE C.V. **DOMICILIO - CALLE HIDALGO N°. 46 PONIENTE COLONIA CENTRO, ESCUINAPA, SINALOA.** R.F.C. **COL11012631A** I.M.S.S.	DEPENDENCIA **H. AYUNTAMIENTO DE ESCUINAPA, SINALOA** **DIRECCION DE OBRAS, SERVICIOS PUBLICOS Y ECOLOGIA**

REPORTE FOTOGRAFICO

DESCRIPCION:	**CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN CALLE FRANCISCO PEREZ ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y FRANCISCO I. MADERO, COL. CENTRO, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ESCUINAPA**			FECHA:	06/12/2025
CONTRATO:	ESC-FAISMUN-2025-035	LOCALIDAD:	**ESCUINAPA, SINALOA**	ESTIMACION:	02 (Finiquito)

CLAVE:	CONCEPTO
PU-13	LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA, INCLUYE ACARREO DEL SOBRANTE DENTRO Y FUERA DE LA OBRA, A TIRO LIBRE.









AUTORIZO

M. de Arq. Graciela Elizalde Santos
Directora de Obras, Servicios Publicos Y Ecologia

CONTRATISTA

Ing. Marco Polo Arroyo Prado
COLEON S.A. DE C.V.
Representante Legal

Arq. Cesar Guadalupe Medina Contreras
Supervisor de Obras Publicas
Obras, Servicios Publicos Y Ecologia
