MUNICIPIO DE SINALOA
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
ESTIMACION DE OBRA

OBRA: CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO ASFALTICO EN AVENIDA NUMERO NUEVE ENTRE PROLONGACION CALLE PEDRO FONSECA Y LIRAMIENTO EN LA LOCALIDAD DE SINALOA DE LEYVA, MUNICIPIO DE SINALOA, ESTADO DE SINALOA.

DAGBA CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.
CALLE IGNACIO ZARAGOZA # 000-1, COL. CENTRO, GUASAVE, SIN. MEXICO C.P. 81000
(687) 164-43-61

CONTRATO: FAIS-DOP-SIN-2025-012	**PERIODO CONTRATO:** 17 DE JUNIO AL 11 DE DICIEMBRE DEL 2025.		
IMPORTE CONTRATO: $6,212,742.67	CON I.V.A.	**IMPORTE ANTICIPO:** $2,174,459.93	
ESTIMACIÓN No.: 3 (FINIQUITO)	**PERIODO:** 11 DE OCTUBRE AL 11 DE DICIEMBRE DEL 2025.	**FECHA:** 12 DE DICIEMBRE DEL 2025.	**HOJA:** 1 DE 1

ESTADO DE CUENTA

ESTIMACION	PERIODO	IMPORTE DE ESTIMACION	DEDUCCION DEL 3.0%				AMORTIZACION DEL ANTICIPO 35%	TOTAL DE DEDUCCIONES	LIQUIDO A PAGAR
ESTIMACION 1 (UNO)	17 DE JUNIO AL 11 DE AGOSTO DEL 2025.	$ 1,023,833.46	$ 26,478.45				$ 358,341.71	$ 384,820.16	$ 639,013.30
ESTIMACION 2 (DOS)	12 DE AGOSTO AL 10 DE OCTUBRE DEL 2025.	$ 1,538,817.67	$ 39,797.01				$ 538,586.18	$ 578,383.19	$ 960,434.48
ESTIMACION 3 (FINIQUITO)	11 DE OCTUBRE AL 11 DE DICIEMBRE DEL 2025.	$ 3,491,977.94	$ 90,309.77				$ 1,222,192.28	$ 1,312,502.05	$ 2,179,475.89
TOTALES		$ 6,054,629.07	$ 156,585.23				$ 2,119,120.17	$ 2,275,705.40	$ 3,778,923.67
SALDO DEL CONTRATO:		$ 158,113.60	SALDO POR AMORTIZAR DEL ANTICIPO				$ 55,339.76		

CONFORME:

ARQ. OMAR ISIDRO DAGNINO MEZA
SUPERINTENDENTE DE OBRA

CONFORME:

ING. JOEL ERNESTO RUBIO ACOSTA
SUPERVISOR DE OBRAS PÚBLICAS

CONFORME:

JUAN MANUEL LOPEZ MENCHACA
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

MUNICIPIO DE SINALOA
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
ESTIMACION DE OBRA

OBRA:	**CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO ASFALTICO EN AVENIDA NUMERO NUEVE ENTRE PROLONGACION CALLE PEDRO FONSECA Y LIRAMIENTO EN LA LOCALIDAD DE SINALOA DE LEYVA, MUNICIPIO DE SINALOA, ESTADO DE SINALOA.**			**DAGBA** CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V. CALLE IGNACIO ZARAGOZA # 200-1, COL. CENTRO, GUASAVE, SIN. MEXICO C.P. 81000 (668) 154-43-51
CONTRATO: FAIS-DOP-SIN-2025-012	**IMPORTE:** $5,355,812.65 MAS I.V.A.	**PERIODO CONTRATO:**	17 DE JUNIO AL 11 DE DICIEMBRE DEL 2025.	DAGBA CONSTRUCTORA
ESTIMACIÓN No.: 3 (FINIQUITO)	**PERIODO:** 11 DE OCTUBRE AL 11 DE DICIEMBRE DEL 2025.	**FECHA:**	12 DE DICIEMBRE DEL 2025.	**HOJA:** 1 DE 1

RESUMEN GENERAL DE ESTIMACIÓN

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO ASFALTICO EN AVENIDA NUMERO NUEVE ENTRE PROLONGACION CALLE PEDRO FONSECA Y LIRAMIENTO EN LA LOCALIDAD DE SINALOA DE LEYVA, MUNICIPIO DE SINALOA, ESTADO DE SINALOA.	**$**	**3,010,325.81**
SUB-TOTAL DE OBRA:	$	3,010,325.81
I.V.A. (16%):	$	481,652.13
TOTAL DE ESTIMACION:	**$**	**3,491,977.94**
DEDUCCIONES:		
AMORTIZACION DEL ANTICIPO 35%	$	1,222,192.28
DEDUCCION DEL 3.0%	$	90,309.77
Suma de deducciones	**$**	**1,312,502.05**
Neto a pagar de esta estimacion:	**$**	**2,179,475.89**

n: DOS MILLONES CIENTO SETENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS 89/100 M.N.

CONFORME:

ARQ. OMAR ISIDRO DAGNINO MEZA
SUPERINTENDENTE DE OBRA

CONFORME:

ING. JOEL ERNESTO RUBIO ACOSTA
SUPERVISOR DE OBRAS PÚBLICAS

CONFORME:

JUAN MANUEL LOPEZ MENCHACA
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

MUNICIPIO DE SINALOA
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
ESTIMACION DE OBRA

OBRA:	**CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO ASFALTICO EN AVENIDA NUMERO NUEVE ENTRE PROLONGACION CALLE PEDRO FONSECA Y LIRAMIENTO EN LA LOCALIDAD DE SINALOA DE LEYVA, MUNICIPIO DE SINALOA, ESTADO DE SINALOA.**				**DAGBA** CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V. CALLE IGNACIO ZARAGOZA # 200 1, COL. CENTRO, GUASAVE, SIN. MEXICO C.P. 81 200 (668) 154-43-51
CONTRATO: FAIS-DOP-SIN-2025-012	**IMPORTE:**	$5,355,812.65 MAS I.V.A.	**PERIODO CONTRATO:**	17 DE JUNIO AL 11 DE DICIEMBRE DEL 2025.	DAGBA CONSTRUCTORA
ESTIMACIÓN No.: 3 (FINIQUITO)	**PERIODO EST:**	11 DE OCTUBRE AL 11 DE DICIEMBRE DEL 2025.	**FECHA:**	12 DE DICIEMBRE DEL 2025.	**HOJA:** 1 DE 1

RESUMEN DE ESTIMACIÓN

TERRACERIAS	
GUARNICION,BANQUETAS Y PAVIMENTOS	**$ 2,481,242.12**
SEÑALIZACION	**$ 63,739.74**
VARIOS	**$ 36,987.78**
ALUMBRADO PUBLICO	**$ 428,356.17**

SUB-TOTAL DE OBRA:	$ 3,010,325.81
I.V.A. (16%):	$ 481,652.13
TOTAL DE ESTIMACION:	**$ 3,491,977.94**

DEDUCCIONES:

AMORTIZACION DEL ANTICIPO 35%	$ 1,222,192.28
DEDUCCION DEL 3.0%	$ 90,309.77
Suma de deducciones	**$ 1,312,502.05**

Neto a pagar de esta estimacion: $ 2,179,475.89

(Son: DOS MILLONES CIENTO SETENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS 89/100 M.N.)

CONFORME:

ARQ. OMAR ISIDRO DAGNINO MEZA
SUPERINTENDENTE DE OBRA

CONFORME:

ING. JOEL ERNESTO RUBIO ACOSTA
SUPERVISOR DE OBRAS PÚBLICAS

CONFORME:

JUAN MANUEL LOPEZ MENCHACA
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

MUNICIPIO DE SINALOA
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
ESTIMACION DE OBRA

OBRA:	**CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO ASFALTICO EN AVENIDA NUMERO NUEVE ENTRE PROLONGACION CALLE PEDRO FONSECA Y LIRAMIENTO EN LA LOCALIDAD DE SINALOA DE LEYVA, MUNICIPIO DE SINALOA, ESTADO DE SINALOA.**			DAGBA CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.
CONTRATO: FAIS-DOP-SIN-2025-012	**IMPORTE:**	**$ 5,355,812.65** MAS I.V.A.	**PERIODO CONTRATO:**	17 DE JUNIO AL 11 DE DICIEMBRE DEL 2025.
ESTIMACIÓN No.: 3 (FINIQUITO)	**PERIODO EST:**	11 DE OCTUBRE AL 11 DE DICIEMBRE DEL 2025.	**FECHA:**	12 DE DICIEMBRE DEL 2025.

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	SEGUN PROYECTO	HASTA ESTA ESTIMACIÓN	HASTA LA ESTIMACIÓN ANTERIOR	EXCEDENTE	DE ESTA ESTIMACIÓN	P. U.	IMPORTE
2.-	**GUARNICION , BANQUETAS Y PAVIMENTOS**								
2.1	CONSTRUCCION DE GUARNICION TIPO "L" DE CONCRETO F'C=250 KG/CM2 EN TRAMO RECTO CON PATIN DE 62 CM, ANCHO DE 15 CMS, RODAMIENTO DE 42 CMS Y BORDILLO DE 15 CMS, INCLUYE:CIMBRADO Y DESCIMBRADO EN RESPALDO (POLIN DE 12" X 12 MTS CAL. 12), CONTRA RESPALDO (POLIN DE 6" X 6 MTS CAL. 12) Y ALTURA DE GUARNICION (POLIN DE 6" X 6 MTS CAL. 12), TENDIDO Y COMPACTACIÓN CON REGLA VIBRATORIA Y VIBRADO DE INMERSION, CONCRETO PREMEZCLADO HECHO EN PLANTA CON ACARREO HASTA DE 45 KMS,AVIONADO CON CHECK ROD Y BULL FLOAT ,ACABADO RAYADO CON PEINE METALICO DE ¾" DE SEPARACION, INDUCCIÓN DE AGRIETAMIENTO MEDIANTE CORTE CON MACHETE, EXCAVACION Y RETIRO DE MATERIAL DE 10 CMS DE PROFUNDIDAD POR 62 CMS DE ANCHO POR MEDIOS MANUALES,HERRAMIENTA, PRUEBAS DE LABORATORIO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	**ML**	445.80	427.45		-18.35	427.45	$ 916.50	$ 391,757.93
2.1.1	CONSTRUCCION DE GUARNICION TIPO "L" DE CONCRETO F'C=250 KG/CM2 EN TRAMO RECTO CON PATIN DE 62 CM, ANCHO DE 15 CMS, RODAMIENTO DE 42 CMS Y BORDILLO DE 15 CMS, INCLUYE:CIMBRADO Y DESCIMBRADO EN RESPALDO (POLIN DE 12" X 12 MTS CAL. 12), CONTRA RESPALDO (POLIN DE 6" X 6 MTS CAL. 12) Y ALTURA DE GUARNICION (POLIN DE 6" X 6 MTS CAL. 12), TENDIDO Y COMPACTACIÓN CON REGLA VIBRATORIA Y VIBRADO DE INMERSION, CONCRETO PREMEZCLADO HECHO EN PLANTA CON ACARREO HASTA DE 45 KMS,AVIONADO CON CHECK ROD Y BULL FLOAT ,ACABADO RAYADO CON PEINE METALICO DE ¾" DE SEPARACION, INDUCCIÓN DE AGRIETAMIENTO MEDIANTE CORTE CON MACHETE,SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BARRAS DE AMARRE A BASE DE VARILLA CORRUGADA DE 1/2" F'Y=4200 KG/CM2 DE 75CMS DE LONGITUD @ 75 CMS. EN CIMBRA PERFORADA, HERRAMIENTA, PRUEBAS DE LABORATORIO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	**ML**	202.60	194.50		-8.10	194.50	$ 953.23	$ 185,403.24
2.2	CONSTRUCCIÓN DE BANQUETA DE CONCRETO F'C=200 KG/CM2 DE 10CM DE ESPESOR REFORZADO CON MALLA ELECTROSOLDADA 66-1010 CON ACABADO ESCOBILLADO, INCLUYE: RELLENO COMPACTADO EN CAPAS NO MAYORES DE 20 CM CON MATERIAL INERTE (LIMO) DE BANCO,SUMINISTRO Y HABILITADO DE MALLA ELECTROSOLDADA 66-1010, CONCRETO PREMEZCLADO HECHO EN PLANTA CON ACARREO HASTA DE 45 KMS,VIBRADO DE INMERSION, HERRAMIENTA, PRUEBAS DE LABORATORIO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	**M2**	608.25	674.15		65.90	625.26	$ 743.84	$ 465,093.40
2.2.1	CONSTRUCCIÓN DE BANQUETA DE CONCRETO F'C=200 KG/CM2 DE 10CM DE ESPESOR CON ACABADO ESCOBILLADO, INCLUYE: RELLENO COMPACTADO EN CAPAS NO MAYORES DE 20 CM CON MATERIAL INERTE (LIMO) DE BANCO, CONCRETO PREMEZCLADO HECHO EN PLANTA CON ACARREO HASTA DE 45 KMS,VIBRADO DE INMERSION, HERRAMIENTA, PRUEBAS DE LABORATORIO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	**M2**	89.16	79.66		-9.50	79.66	$ 733.61	$ 58,439.37

CONFORME:

ARQ. OMAR ISIDRO DAGNINO MEZA
SUPERINTENDENTE DE OBRA

CONFORME:

ING. JOEL ERNESTO RUBIO ACOSTA
SUPERVISOR DE OBRAS PÚBLICAS

CONFORME:

JUAN MANUEL LOPEZ MENCHACA
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

MUNICIPIO DE SINALOA
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
ESTIMACION DE OBRA

OBRA:	**CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO ASFALTICO EN AVENIDA NUMERO NUEVE ENTRE PROLONGACION CALLE PEDRO FONSECA Y LIRAMIENTO EN LA LOCALIDAD DE SINALOA DE LEYVA, MUNICIPIO DE SINALOA, ESTADO DE SINALOA.**			DAGBA CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.
CONTRATO: FAIS-DOP-SIN-2025-012	**IMPORTE:**	**$ 5,355,812.65** MAS I.V.A.	**PERIODO CONTRATO:** 17 DE JUNIO AL 11 DE DICIEMBRE DEL 2025.	
ESTIMACIÓN No.: 3 (FINIQUITO)	**PERIODO EST:**	11 DE OCTUBRE AL 11 DE DICIEMBRE DEL 2025.	**FECHA:** 12 DE DICIEMBRE DEL 2025.	

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	SEGUN PROYECTO	HASTA ESTA ESTIMACIÓN	HASTA LA ESTIMACIÓN ANTERIOR	EXCEDENTE	DE ESTA ESTIMACIÓN	P. U.	IMPORTE
2.3	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO DE 15 CM DE ESPESOR CONCRETO F'C=300 KG/CM2,INCLUYE: CIMBRADO Y DESCIMBRADO EN ESPESOR DE LOSA DE CONCRETO HIDRAULICO (POLIN DE 6" X 6 MTS CAL. 12), TENDIDO Y COMPACTACIÓN CON REGLA VIBRATORIA Y VIBRADO DE INMERSION, CONCRETO PREMEZCLADO HECHO EN PLANTA CON ACARREO HASTA DE 45 KMS,AVIONADO CON CHECK ROD Y BULL FLOAT ,ACABADO RAYADO CON PEINE METALICO DE ¾" DE SEPARACION, INDUCCIÓN DE AGRIETAMIENTO MEDIANTE CORTE CON CORTADORA Y DISCO PUNTA DIAMANTE, HERRAMIENTA, PRUEBAS DE LABORATORIO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	619.14	659.57		40.43	619.14	$ 1,089.72	$ 674,689.24
2.4	JUNTA CONSTRUCTIVA A BASE DE CELOTEX DE 1/2" EN 20 CM DE ESPESOR, INCLUYE: VARILLA CORRUGADA DE 5/8" COLOCADA DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	ML	29.80	19.56		-10.24	19.56	$ 190.88	$ 3,733.61
2.5	CALAFATEO EN JUNTAS DE PAVIMENTOS A BASE DE ASFALTEX 505, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA..	ML	462.30	468.18		5.88	468.18	$ 44.71	$ 20,932.33
2.6	CONSTRUCCION DE CARPETA ASFALTICA DE 5 CMS DE ESPESOR.INCLUYE: ADQUISION Y PRODUCCION DE MEZCLA ASFALTICA EN PLANTA, CARGA Y ACARREO A 28 KMS,TENDIDO, COMPACTADO, INCORPORACION DE HUMEDAD,MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y PRUEBAS DE LABORATORIO.	M3	92.81	85.99		-6.82	85.99	$ 7,921.77	$ 681,193.00
	TOTAL DE GUARNICION , BANQUETAS Y PAVIMENTOS:								**$ 2,481,242.12**
3.-	**SEÑALIZACION**								
3.1	PINTURA TIPO TRANSITO EN GUARNICION CON USO DE MAQUINA PINTARRAYAS.	ML	628.40	609.00		-19.40	609.00	$ 50.08	$ 30,498.72
3.2	SUMINISTRO Y COLOCACIÒN DE BOYA METALICA DE 20X20 CMS PARA TOPE VEHICULAR DE 40 CMS DE SECCION; INCLUYE: BOYA METALICA DE 20x20 CMS, JUEGO DE CUATRO CLAVOS DE SUJECIÒN, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	64.00	85.00		21.00	64.00	$ 256.54	$ 16,418.56
3.3	CONSTRUCCION DE TOPE VEHICULAR DE 3.00 MTS DE ANCHO, 10 CMS DE ALTURA Y 1.00 MTS DE CORONA DE CONCRETO HIDRAULICO F'C=300 KG/CM2 REFORZADO CON MALLALAC 6x6/10x10,INCLUYE: MALLA LAC 66-1010,MATERIALES,MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	ML	7.00	7.00		0.00	7.00	$ 1,851.04	$ 12,957.28
3.4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALAMIENTO VERTICAL DE HASTA 24" ø CON POSTE DE HASTA 3 MTS. Y REFLEJANTE GRADO INGENIERIA. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	1.00	1.00		0.00	1.00	$ 3,865.18	$ 3,865.18
	TOTAL DE SEÑALIZACION:								**$ 63,739.74**

CONFORME:

ARQ. OMAR ISIDRO DAGNINO MEZA
SUPERINTENDENTE DE OBRA

CONFORME:

ING. JOEL ERNESTO RUBIO ACOSTA
SUPERVISOR DE OBRAS PÚBLICAS

CONFORME:

JUAN MANUEL LOPEZ MENCHACA
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

MUNICIPIO DE SINALOA
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
ESTIMACION DE OBRA

OBRA:	**CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO ASFALTICO EN AVENIDA NUMERO NUEVE ENTRE PROLONGACION CALLE PEDRO FONSECA Y LIRAMIENTO EN LA LOCALIDAD DE SINALOA DE LEYVA, MUNICIPIO DE SINALOA, ESTADO DE SINALOA.**			
CONTRATO: FAIS-DOP-SIN-2025-012	**IMPORTE:**	**$ 5,355,812.65** MAS I.V.A.	**PERIODO CONTRATO:**	17 DE JUNIO AL 11 DE DICIEMBRE DEL 2025.
ESTIMACIÓN No.: 3 (FINIQUITO)	**PERIODO EST:**	11 DE OCTUBRE AL 11 DE DICIEMBRE DEL 2025.	**FECHA:**	12 DE DICIEMBRE DEL 2025.

DAGBA CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	SEGUN PROYECTO	HASTA ESTA ESTIMACIÓN	HASTA LA ESTIMACIÓN ANTERIOR	EXCEDENTE	DE ESTA ESTIMACIÓN	P. U.	IMPORTE
4.-	**VARIOS**								
4.1	RETIRO DE TAPONES EN LOS EXTREMOS Y BARRIDO TOTAL DE LOS MISMOS	M3	38.40	38.40		0.00	38.40	$ 53.28	$ 2,045.95
4.2	LIMPIEZA TOTAL DE LA OBRA, INCLUYE: LA MANO DE OBRA NECESARIA.	M2	2,991.45	2,991.45		-3.08	2,988.37	$ 4.75	$ 14,194.73
4.3	ROTULO DE INICIO DE OBRA A BASE DE UNA LAMINA CON VINIL CON INFORMACION BASICA DE LA OBRA COMO SE ANEXA EN EL CROQUIS DE 1.20 MTS DE LARGO POR 0.90 MTS DE ANCHO EN UNA BASE DE PTR DE 1" X 1" CAL. 14 DE 1.50 MTS DE LARGO Y SE AHOGARA EN CONCRETO 30 CMS.	PZA	1.00	1.00		0.00	1.00	$ 5,536.24	$ 5,536.24
4.4	SUMINISTRO E INSTALACION DE PLACA ALUSIVA A LA OBRA; INCLUYE: MATERIALES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	PZA	1.00	1.00		0.00	1.00	$ 5,993.52	$ 5,993.52
4.5	DEMOLICION DE FIRME DE CONCRETO HIDRAULICO; INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, CARGA Y ACARREO AL 1ER KILOMETRO.	M2	67.27	67.27		0.00	67.27	$ 137.02	$ 9,217.34
	TOTAL DE VARIOS:								**$ 36,987.78**
11.-	**ALUMBRADO PUBLICO**								
11.1	SUMINISTRO E INST. DE POLIDUCTO NARANJA REFORZADO DE 41 MM (1 1/2) INCLUYE EXCAVACION EN TERRENO TIPO II, CONCRETO FC=100 KG/CM2, RELLENO CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO	ML	297.00	215.00		-82.00	215.00	$ 50.22	$ 10,797.30
11.2	SUMINISTRO E INST. DE CABLE AL XLP 2+1 CAL. 4 SUBTERRANEO INCLUYE MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO	ML	297.00	215.00		-82.00	215.00	$ 117.49	$ 25,260.35
11.3	SUMINISTRO E INSTALACION DE ALIMENTADOR PARA MURETE INCLUYE: CABLE THW CAL. 4, VATHW. CAL 6, CABLE COBRE DESNUDO CAL. 8, TUBO PVC PESADO DE 1-1/2 EXCAVACION ENTERRENO TIPO II, CONCRETO FC=100 KG/CM2, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	MTS	10.00	10.00		0.00	10.00	$ 921.76	$ 9,217.60
11.4	SUMINISTRO E INST. DE SISTEMA DE TIERRA PARA FINAL DE CIRCUITO, INCLUYE: VARILLA PARA TIERRA 5/8" X 1.5 MTS. NORMAL, CONECTOR PARA VARILLA DE TIERRA MECANICO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	1.00	1.00		0.00	1.00	$ 1,815.71	$ 1,815.71
11.5	SUMINISTRO E INST. DE REGISTRO DE CONCRETO DE 40X40X40 CMS MEDIDAS EXTERIORES CON MARCO Y CONTRA MARCO DE FE, ANGULO 1 1/2 X 1/8" Y 1 1/4"X 1/8" INCLUYE MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO	PZA	8.00	8.00		0.00	8.00	$ 2,240.38	$ 17,923.04
11.6	SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPO DE MEDICION CON CONTACTOR AUTOMATIZADO, RELEVADOR 5-0 HRS, INCLUYE: MURETE PREFABRICADO, MEDICION, TUBERIA, INTERRUPTORES, GABINETES, PUERTA DE PROTECCIÓN, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	1.00	1.00		0.00	1.00	$ 28,456.78	$ 28,456.78
11.8	PAGOS DE VERIFICACION, SUPERVISION, ENERGIZACION Y TODOS LOS CORRESPONDIENTES PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.	LOTE	1.00	1.00		0.00	1.00	$ 25,932.91	$ 25,932.91

CONFORME:

ARQ. OMAR ISIDRO DAGNINO MEZA
SUPERINTENDENTE DE OBRA

CONFORME:

ING. JOEL ERNESTO RUBIO ACOSTA
SUPERVISOR DE OBRAS PÚBLICAS

CONFORME:

JUAN MANUEL LOPEZ MENCHACA
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

MUNICIPIO DE SINALOA
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
ESTIMACION DE OBRA

OBRA:	**CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO ASFALTICO EN AVENIDA NUMERO NUEVE ENTRE PROLONGACION CALLE PEDRO FONSECA Y LIRAMIENTO EN LA LOCALIDAD DE SINALOA DE LEYVA, MUNICIPIO DE SINALOA, ESTADO DE SINALOA.**			**DAGBA** CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.
CONTRATO: FAIS-DOP-SIN-2025-012	**IMPORTE:**	**$ 5,355,812.65** MAS I.V.A.	**PERIODO CONTRATO:** 17 DE JUNIO AL 11 DE DICIEMBRE DEL 2025.	
ESTIMACIÓN No.: 3 (FINIQUITO)	**PERIODO EST:**	11 DE OCTUBRE AL 11 DE DICIEMBRE DEL 2025.	**FECHA:** 12 DE DICIEMBRE DEL 2025.	

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	SEGUN PROYECTO	HASTA ESTA ESTIMACIÓN	HASTA LA ESTIMACIÓN ANTERIOR	EXCEDENTE	DE ESTA ESTIMACIÓN	P. U.	IMPORTE
11.9	SUMINISTRO E INSTALACIÓN UN LUMINARIO CREE DE LED 80WATTS EN POSTE CFE CÓNICO OCTAGONAL 8 MTS, INCLUYE: LAMPARA, POSTE, BRAZO METALICO, BASE PIRAMIDAL 40X90X90, CABLEADO, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.	PZA	8.00	8.00		0.00	8.00	$ 38,619.06	$ 308,952.48
	TOTAL DE LUMINARIA:								**$ 428,356.17**
								SUB TOTAL	$ 3,010,325.81
								IVA (16%)	$ 481,652.13
								Total:	**$ 3,491,977.94**

CONFORME:

ARQ. OMAR ISIDRO DAGNINO MEZA
SUPERINTENDENTE DE OBRA

CONFORME:

ING. JOEL ERNESTO RUBIO ACOSTA
SUPERVISOR DE OBRAS PÚBLICAS

CONFORME:

JUAN MANUEL LOPEZ MENCHACA
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

MUNICIPIO DE SINALOA
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
ESTIMACION DE OBRA

OBRA: CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO ASFALTICO EN AVENIDA NUMERO NUEVE ENTRE PROLONGACION CALLE PEDRO FONSECA Y LIRAMIENTO EN LA LOCALIDAD DE SINALOA DE LEYVA, MUNICIPIO DE SINALOA, ESTADO DE SINALOA.

CONTRATO: FAIS-DOP-SIN-2025-012 | **IMPORTE:** $ 5,355,812.65 MAS I.V.A.

ESTIMACIÓN No.: 3 (FINIQUITO) | **PERIODO CONTRATO:** 17 DE JUNIO AL 11 DE DICIEMBRE DEL 2025.

FECHA 12 DE DICIEMBRE DEL 2025. | **CALCULÓ:** ARQ. OMAR ISIDRO DAGNINO MEZA

DAGBA CONSTRUCTORA

DAGBA CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.
CALLE IGNACIO ZARAGOZA # 200-1, COL. CENTRO, GUASAVE, SIN. MEXICO C.P. 81000
(646) 164-43-51

HOJA: 1 DE 8

GENERADORES DE OBRA

CLAVE	DESCRIPCION	UNIDAD	TRAMO	EJE	LARGO	ANCHO	ALTO	PIEZA	AREA	RESULTADO PARCIAL	RESULTADO TOTAL	OBSERVACIONES
2.-	**GUARNICION , BANQUETAS Y PAVIMENTOS**											
2.1	CONSTRUCCION DE GUARNICION TIPO "L" DE CONCRETO F'C=250 KG/CM2 EN TRAMO RECTO CON PATIN DE 62 CM, ANCHO DE 15 CMS, RODAMIENTO DE 42 CMS Y BORDILLO DE 15 CMS, INCLUYE:CIMBRADO Y DESCIMBRADO EN RESPALDO (POLIN DE 12" X 12 MTS CAL. 12), CONTRA RESPALDO (POLIN DE 6" X 6 MTS CAL. 12) Y ALTURA DE GUARNICION (POLIN DE 6" X 6 MTS CAL. 12), TENDIDO Y COMPACTACIÓN CON REGLA VIBRATORIA Y VIBRADO DE INMERSION, CONCRETO PREMEZCLADO HECHO EN PLANTA CON ACARREO HASTA DE 45 KMS,AVIONADO CON CHECK ROD Y BULL FLOAT ,ACABADO RAYADO CON PEINE METALICO DE ¾" DE SEPARACION, INDUCCIÓN DE AGRIETAMIENTO MEDIANTE CORTE CON MACHETE, EXCAVACION Y RETIRO DE MATERIAL DE 10 CMS DE PROFUNDIDAD POR 62 CMS DE ANCHO POR MEDIOS MANUALES,HERRAMIENTA, PRUEBAS DE LABORATORIO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	ML	**AVENIDA NO. 9**									
			AREA DE ASFALTO									
			LADO DER		222.50				1.00	222.50		
			LADO IZQ		63.75				1.00	63.75		
					135.20				1.00	135.20		
			PAV EXISTENTE		6.00				1.00	6.00		
										TOTAL	**427.45**	
2.1.1	CONSTRUCCION DE GUARNICION TIPO "L" DE CONCRETO F'C=250 KG/CM2 EN TRAMO RECTO CON PATIN DE 62 CM, ANCHO DE 15 CMS, RODAMIENTO DE 42 CMS Y BORDILLO DE 15 CMS, INCLUYE:CIMBRADO Y DESCIMBRADO EN RESPALDO (POLIN DE 12" X 12 MTS CAL. 12), CONTRA RESPALDO (POLIN DE 6" X 6 MTS CAL. 12) Y ALTURA DE GUARNICION (POLIN DE 6" X 6 MTS CAL. 12), TENDIDO Y COMPACTACIÓN CON REGLA VIBRATORIA Y VIBRADO DE INMERSION, CONCRETO PREMEZCLADO HECHO EN PLANTA CON ACARREO HASTA DE 45 KMS,AVIONADO CON CHECK ROD Y BULL FLOAT ,ACABADO RAYADO CON PEINE METALICO DE ¾" DE SEPARACION, INDUCCIÓN DE AGRIETAMIENTO MEDIANTE CORTE CON MACHETE,SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BARRAS DE AMARRE A BASE DE VARILLA CORRUGADA DE 1/2" F'Y=4200 KG/CM2 DE 75CMS DE LONGITUD @ 75 CMS. EN CIMBRA PERFORADA, HERRAMIENTA, PRUEBAS DE LABORATORIO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	ML	AVENIDA NO. 9									
			AREA DE CONCRETO									
			LADO DER		55.20					55.20		
			LADO IZQ		72.30					72.30		
			ACERA SUPERIOR		47.20					47.20		
			ENTRONQUE 2									
			LADO IZQ		12.70					12.70		
			LADO DER		7.10					7.10		
										TOTAL	**194.50**	

CONFORME:

ARQ. OMAR ISIDRO DAGNINO MEZA
SUPERINTENDENTE DE OBRA

CONFORME:

ING. JOEL ERNESTO RUBIO ACOSTA
SUPERVISOR DE OBRAS PÚBLICAS

CONFORME:

JUAN MANUEL LOPEZ MENCHACA
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

MUNICIPIO DE SINALOA
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
ESTIMACION DE OBRA

OBRA: CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO ASFALTICO EN AVENIDA NUMERO NUEVE ENTRE PROLONGACION CALLE PEDRO FONSECA Y LIRAMIENTO EN LA LOCALIDAD DE SINALOA DE LEYVA, MUNICIPIO DE SINALOA, ESTADO DE SINALOA.

CONTRATO: FAIS-DOP-SIN-2025-012 | **IMPORTE:** $ 5,355,812.65 MAS I.V.A.

ESTIMACIÓN No.: 3 (FINIQUITO) | **PERIODO CONTRATO:** 17 DE JUNIO AL 11 DE DICIEMBRE DEL 2025.

FECHA 12 DE DICIEMBRE DEL 2025. | **CALCULÓ:** ARQ. OMAR ISIDRO DAGNINO MEZA

DAGBA CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.
CALLE IGNACIO ZARAGOZA # 200-1, COL. CENTRO, GUASAVE, SIN. MEXICO C.P. 81000
(646) 164-43-51

GENERADORES DE OBRA

CLAVE	DESCRIPCION	UNIDAD	TRAMO	EJE	LARGO	ANCHO	ALTO	PIEZA	AREA	RESULTADO PARCIAL	RESULTADO TOTAL	OBSERVACIONES
2.2	CONSTRUCCIÓN DE BANQUETA DE CONCRETO F'C=200 KG/CM2 DE 10CM DE ESPESOR REFORZADO CON MALLA ELECTROSOLDADA 66-1010 CON ACABADO ESCOBILLADO, INCLUYE: RELLENO COMPACTADO EN CAPAS NO MAYORES DE 20 CM CON MATERIAL INERTE (LIMO) DE BANCO,SUMINISTRO Y HABILITADO DE MALLA ELECTROSOLDADA 66-1010, CONCRETO PREMEZCLADO HECHO EN PLANTA CON ACARREO HASTA DE 45 KMS,VIBRADO DE INMERSION, HERRAMIENTA, PRUEBAS DE LABORATORIO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	AVENIDA NO. 9									
		AREA DE CONCRETO	AREA DE CONCRETO									
			KM 0+000.00 AL 0+074.50									
			LADO IZQ		14.72	1.50				22.08		
					44.95	1.00				44.95		
			LADO DER									
					4.62	2.67	PROM.			12.34		
					25.85	1.55	PROM.			40.07		
					5.15	1.53	PROM.			7.88		
					5.25	0.95	PROM.			4.99		
					8.95	0.40				3.58		
			MENOS MACETEROS									
					1.84	0.24				-0.44		
					1.17	0.33				-0.39		
			ACERA SUPERIOR									
					17.00	1.61	PROM.			27.37		
			MENOS MACETEROS		1.45	1.05				-1.52		
					8.91	1.50				13.37		
			MENOS MACETEROS		1.00	0.50				-0.50		
					3.18	3.49	PROM.			11.10		
					3.90	1.50				5.85		
			MENOS MACETEROS		1.55	0.80				-1.24		
					8.72	3.38	PROM.			29.47		
			MENOS MACETEROS		2.00	1.54				-3.08		
					5.31	1.50				7.97		
		AREA DE ASFALTO	LADO DER									
			KM 0+000.00 AL 0+020.00		24.25	1.50				36.38		
			MAS ACCESO A COCHERA		1.86	0.83				1.54		
					3.04	1.18				3.59		
					b	h						
					1.50	4.60	PROM.			3.45		
			KM 0+020.00 AL 0+199.80		12.43	1.50				18.65		

CONFORME:

ARQ. OMAR ISIDRO DAGNINO MEZA
SUPERINTENDENTE DE OBRA

CONFORME:

ING. JOEL ERNESTO RUBIO ACOSTA
SUPERVISOR DE OBRAS PÚBLICAS

CONFORME:

JUAN MANUEL LOPEZ MENCHACA
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

MUNICIPIO DE SINALOA
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
ESTIMACION DE OBRA

OBRA: CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO ASFALTICO EN AVENIDA NUMERO NUEVE ENTRE PROLONGACION CALLE PEDRO FONSECA Y LIRAMIENTO EN LA LOCALIDAD DE SINALOA DE LEYVA, MUNICIPIO DE SINALOA, ESTADO DE SINALOA.

CONTRATO: FAIS-DOP-SIN-2025-012 | **IMPORTE:** $ 5,355,812.65 MAS I.V.A.

ESTIMACIÓN No.: 3 (FINIQUITO) | **PERIODO CONTRATO:** 17 DE JUNIO AL 11 DE DICIEMBRE DEL 2025.

FECHA 12 DE DICIEMBRE DEL 2025. | **CALCULÓ:** ARQ. OMAR ISIDRO DAGNINO MEZA

DAGBA CONSTRUCTORA

DAGBA CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.
CALLE IGNACIO ZARAGOZA # 200-1, COL. CENTRO, GUASAVE, SIN. MEXICO C.P. 81000
(646) 164-43-81

HOJA: 3 **DE** 8

GENERADORES DE OBRA

CLAVE	DESCRIPCION	UNIDAD	TRAMO	EJE	LARGO	ANCHO	ALTO	PIEZA	AREA	RESULTADO PARCIAL	RESULTADO TOTAL	OBSERVACIONES
2.2	CONSTRUCCIÓN DE BANQUETA DE CONCRETO F'C=200 KG/CM2 DE 10CM DE ESPESOR REFORZADO CON MALLA ELECTROSOLDADA 66-1010 CON ACABADO ESCOBILLADO, INCLUYE: RELLENO COMPACTADO EN CAPAS NO MAYORES DE 20 CM CON MATERIAL INERTE (LIMO) DE BANCO,SUMINISTRO Y HABILITADO DE MALLA ELECTROSOLDADA 66-1010, CONCRETO PREMEZCLADO HECHO EN PLANTA CON ACARREO HASTA DE 45 KMS,VIBRADO DE INMERSION, HERRAMIENTA, PRUEBAS DE LABORATORIO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	AREA DE ASFALTO	KM 0+020.00 AL 0+199.80		23.33	1.50				35.00		
					8.80	1.97	PROM.			17.34		
					6.00	2.32	PROM.			13.92		
					1.85	0.38	PROM.			0.70		
					6.70	2.23	PROM.			14.94		
					1.10	1.78	PROM.			1.96		
			MENOS MACETEROS		1.10	0.62				-0.68		
					7.90	1.50				11.85		
					5.10	2.08	PROM.			10.61		
					24.00	1.50				36.00		
					8.25	1.50				12.38		
					7.30	2.63	PROM.			19.20		
			MENOS MACETEROS		1.10	0.70				-0.77		
					10.20	1.50				15.30		
					6.45	2.88	PROM.			18.58		
					8.00	1.50				12.00		
					7.90	2.87	PROM.			22.67		
					7.15	0.96	PROM.			6.86		
					1.30	0.45				0.59		
					8.00	1.45				11.60		
					33.45	0.50				16.73		
			LADO IZQ									
			KM 0+070.35 AL 0+155.00		3.10	2.17	PROM.			6.73		
					3.20	2.50	PROM.			8.00		
			MENOS MACETEROS		D		π					
					0.75		3.1416			-0.88		
					23.80	1.44	PROM.			34.27		
					3.68	0.93	PROM.			3.42		
					15.85	0.50				7.93		
					21.00	1.51				31.71		
					12.45	0.45				5.60		
					24.71	0.50				12.36		
					D		π					
					0.70		3.1416			0.77		
										TOTAL	674.15	

CONFORME:

ARQ. OMAR ISIDRO DAGNINO MEZA
SUPERINTENDENTE DE OBRA

CONFORME:

ING. JOEL ERNESTO RUBIO ACOSTA
SUPERVISOR DE OBRAS PÚBLICAS

CONFORME:

JUAN MANUEL LOPEZ MENCHACA
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

MUNICIPIO DE SINALOA
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
ESTIMACION DE OBRA

OBRA: CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO ASFALTICO EN AVENIDA NUMERO NUEVE ENTRE PROLONGACION CALLE PEDRO FONSECA Y LIRAMIENTO EN LA LOCALIDAD DE SINALOA DE LEYVA, MUNICIPIO DE SINALOA, ESTADO DE SINALOA.

CONTRATO: FAIS-DOP-SIN-2025-012 | **IMPORTE:** $ 5,355,812.65 MAS I.V.A.

ESTIMACIÓN No.: 3 (FINIQUITO) | **PERIODO CONTRATO:** 17 DE JUNIO AL 11 DE DICIEMBRE DEL 2025.

FECHA 12 DE DICIEMBRE DEL 2025. | **CALCULÓ:** ARQ. OMAR ISIDRO DAGNINO MEZA

DAGBA CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.
CALLE IGNACIO ZARAGOZA # 200-1, COL. CENTRO, GUASAVE, SIN. MEXICO C.P. 81200
(668) 164-43-51

GENERADORES DE OBRA

CLAVE	DESCRIPCION	UNIDAD	TRAMO	EJE	LARGO	ANCHO	ALTO	PIEZA	AREA	RESULTADO PARCIAL	RESULTADO TOTAL	OBSERVACIONES
2.2.1	CONSTRUCCIÓN DE BANQUETA DE CONCRETO F'C=200 KG/CM2 DE 10CM DE ESPESOR CON ACABADO ESCOBILLADO, INCLUYE: RELLENO COMPACTADO EN CAPAS NO MAYORES DE 20 CM CON MATERIAL INERTE (LIMO) DE BANCO, CONCRETO PREMEZCLADO HECHO EN PLANTA CON ACARREO HASTA DE 45 KMS,VIBRADO DE INMERSION, HERRAMIENTA, PRUEBAS DE LABORATORIO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	AVENIDA NO. 9									
		AREA DE ASFALTO										
			KM 0+000.00 AL 0+070.35									
			LADO IZQ.		12.15	1.00				12.15		
					39.20	0.50				19.60		
					1.90	0.90				1.71		
					13.60	0.50				6.80		
					9.30	0.90	PROM.			8.37		
		AREA DE ASFALTO	KM 0+099.10 AL 0+121.30									
					2.40	0.48	PROM.			1.15		
					3.65	0.91	PROM.			3.32		
					15.85	0.50				7.93		
			KM 0+142.30 AL 0+154.75									
					12.45	0.50				6.23		
			KM 0+174.85 AL 0+199.80									
					24.80	0.50				12.40		
										TOTAL	79.66	
2.3	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO DE 15 CM DE ESPESOR CONCRETO F'C=300 KG/CM2,INCLUYE: CIMBRADO Y DESCIMBRADO EN ESPESOR DE LOSA DE CONCRETO HIDRAULICO (POLIN DE 6" X 6 MTS CAL. 12), TENDIDO Y COMPACTACIÓN CON REGLA VIBRATORIA Y VIBRADO DE INMERSION, CONCRETO PREMEZCLADO HECHO EN PLANTA CON ACARREO HASTA DE 45 KMS,AVIONADO CON CHECK ROD Y BULL FLOAT ,ACABADO RAYADO CON PEINE METALICO DE ¾" DE SEPARACION, INDUCCIÓN DE AGRIETAMIENTO MEDIANTE CORTE CON CORTADORA Y DISCO PUNTA DIAMANTE, HERRAMIENTA, PRUEBAS DE LABORATORIO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	AVENIDA NO. 9									
			KM 0+000.00 AL 0+012.05		12.05	6.76				81.46		(7.11+6.41)/2
			KM 0+012.05 AL 0+034.60		22.55	6.36				143.42		(6.41+6.30)/2
			KM 0+034.60 AL 0+074.65		40.05	6.26				250.71		
			ENTRONQUE 1									
			KM 0+000.00 AL 0+018.75		8.75	5.81				50.84		(5.56+6.06)/2
					3.55	6.49				23.04		(6.06+6.91)/2
					1.22	7.76				4.73		(6.61+8.90)/2
					7.19	14.24				51.19		TRIANG
					2.73	4.34				5.92		TRIANG
			ENTRONQUE 2									s-a
			KM 0+000.00 AL 0+009.10		a	b	c	s				5.45
					9.00	6.05	4.15	9.60		10.56		s-b
					2.09	5.39	PROM.			11.27		3.55
					5.66	4.67	PROM.			26.43		s-c
										TOTAL	659.57	

CONFORME:

ARQ. OMAR ISIDRO DAGNINO MEZA
SUPERINTENDENTE DE OBRA

CONFORME:

ING. JOEL ERNESTO RUBIO ACOSTA
SUPERVISOR DE OBRAS PÚBLICAS

CONFORME:

JUAN MANUEL LOPEZ MENCHACA
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

MUNICIPIO DE SINALOA
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
ESTIMACION DE OBRA

OBRA: CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO ASFALTICO EN AVENIDA NUMERO NUEVE ENTRE PROLONGACION CALLE PEDRO FONSECA Y LIRAMIENTO EN LA LOCALIDAD DE SINALOA DE LEYVA, MUNICIPIO DE SINALOA, ESTADO DE SINALOA.

CONTRATO: FAIS-DOP-SIN-2025-012 | **IMPORTE:** $ 5,355,812.65 MAS I.V.A.

ESTIMACIÓN No.: 3 (FINIQUITO) | **PERIODO CONTRATO:** 17 DE JUNIO AL 11 DE DICIEMBRE DEL 2025.

FECHA 12 DE DICIEMBRE DEL 2025. | **CALCULÓ:** ARQ. OMAR ISIDRO DAGNINO MEZA

DAGBA CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.
CALLE IGNACIO ZARAGOZA # 200-1, COL. CENTRO, GUASAVE, SIN. MEXICO C.P. 81000
(646) 164-43-51

HOJA: 5 DE 8

GENERADORES DE OBRA

CLAVE	DESCRIPCION	UNIDAD	TRAMO	EJE	LARGO	ANCHO	ALTO	PIEZA	AREA	RESULTADO PARCIAL	RESULTADO TOTAL	OBSERVACIONES
2.4	JUNTA CONSTRUCTIVA A BASE DE CELOTEX DE 1/2" EN 20 CM DE ESPESOR, INCLUYE: VARILLA CORRUGADA DE 5/8" COLOCADA DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	ML	AVENIDA NO. 9									
			KM 0+000.00		7.11					7.11		
			KM 0+045.60		12.45					12.45		
										TOTAL	19.56	
2.5	CALAFATEO EN JUNTAS DE PAVIMENTOS A BASE DE ASFALTEX 505, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA..	ML	**AVENIDA NO. 9**									
		AREA DE ASFALTO	GUARNICION LADO IZQUIERDO 197.60/3.00=									
			(0.42+0.15+0.15)=			0.72		66.00		47.52		
			GUARNICION LADO DERECHO 246.35/3.00=									
			(0.42+0.15+0.15)=			0.72		82.00		59.04		
			AV. No. 9 (KM 0+000.00 AL 074.50)									
		AREA DE CONCRETO	EJES LONGITUDINALES			74.50		3.00		223.50		
			GUARNICION LADO IZQUIERDO 72.00/3.00=									
			(0.42+0.15+0.15)=			0.72		24.00		17.28		
			GUARNICION LADO DERECHO 55.90/3.00=									
			(0.42+0.15+0.15)=			0.72		29.00		20.88		
			ENTRONQUE 1 (KM 0+000.00 AL 0+018.70)									
			EJES LONGITUDINALES			18.70		3.00		56.10		
			GUARNICION ACERA SUPERIOR 47.10/3.00=									
			(0.42+0.15+0.15)=			0.72		16.00		11.52		
			ENTRONQUE 2 (KM 0+000.00 AL 0+009.10)									
			EJES LONGITUDINALES			9.10		3.00		27.30		
			GUARNICION LADO IZQUIERDO 12.60/3.00=									
			(0.42+0.15+0.15)=			0.72		4.00		2.88		
			GUARNICION LADO DERECHO 7.00/3.00=									
			(0.42+0.15+0.15)=			0.72		3.00		2.16		
										TOTAL	468.16	

CONFORME:

ARQ. OMAR ISIDRO DAGNINO MEZA
SUPERINTENDENTE DE OBRA

CONFORME:

ING. JOEL ERNESTO RUBIO ACOSTA
SUPERVISOR DE OBRAS PÚBLICAS

CONFORME:

JUAN MANUEL LOPEZ MENCHACA
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

MUNICIPIO DE SINALOA
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
ESTIMACION DE OBRA

OBRA: CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO ASFALTICO EN AVENIDA NUMERO NUEVE ENTRE PROLONGACION CALLE PEDRO FONSECA Y LIRAMIENTO EN LA LOCALIDAD DE SINALOA DE LEYVA, MUNICIPIO DE SINALOA, ESTADO DE SINALOA.

CONTRATO: FAIS-DOP-SIN-2025-012 | **IMPORTE:** $ 5,355,812.65 MAS I.V.A.

ESTIMACIÓN No.: 3 (FINIQUITO) | **PERIODO CONTRATO:** 17 DE JUNIO AL 11 DE DICIEMBRE DEL 2025.

FECHA 12 DE DICIEMBRE DEL 2025. | **CALCULÓ:** ARQ. OMAR ISIDRO DAGNINO MEZA

DAGBA CONSTRUCTORA

DAGBA CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.
CALLE IGNACIO ZARAGOZA # 200-1, COL. CENTRO, GUASAVE, SIN. MEXICO C.P. 81000
(646) 164-43-81

HOJA: 6 **DE** 8

GENERADORES DE OBRA

CLAVE	DESCRIPCION	UNIDAD	TRAMO	EJE	LARGO	ANCHO	ALTO	PIEZA	AREA	RESULTADO PARCIAL	RESULTADO TOTAL	OBSERVACIONES
2.6	CONSTRUCCION DE CARPETA ASFALTICA DE 5 CMS DE ESPESOR.INCLUYE: ADQUISION Y PRODUCCION DE MEZCLA ASFALTICA EN PLANTA, CARGA Y ACARREO A 28 KMS,TENDIDO, COMPACTADO, INCORPORACION DE HUMEDAD,MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y PRUEBAS DE LABORATORIO.	M3	AVENIDA NO. 9									
			KM 0+000.00 AL 0+015.60		15.60	6.32	0.05	1.30		6.41		(6.26+6.37)/2
			KM 0+015.60 AL 0+048.95		33.35	6.32	0.05	1.30		13.70		(6.26+6.37)/2
			KM 0+048.95 AL 0+061.55		12.60	6.39	0.05	1.30		5.23		(6.51+6.26)/2
			KM 0+061.55 AL 0+070.35		8.80	6.96	0.05	1.30		3.98		(7.41+6.51)/2
			KM 0+070.35 AL 0+101.60		31.25	6.09	0.05	1.30		12.37		(4.76+7.41)/2
			KM 0+101.60 AL 0+174.95		73.35	5.54	0.05	1.30		26.41		(6.31+4.76)/2
			KM 0+174.95 AL 0+181.75		6.80	6.29	0.05	1.30		2.78		(6.26+6.31)/2
			KM 0+181.75 AL 0+201.00		19.25	6.36	0.05	1.30		7.96		(6.46+6.26)/2
												s-a
		M3	TRIANGULO ENTRONQUE A LIBRAMIENTO		**a**	**b**	**c**	**s**				4.93
					25.00	26.05	8.80	29.93	109.99	7.15		**s-b**
							0.05	1.30				3.88
												s-c
												21.13
										TOTAL	**85.99**	
3.-	**SEÑALIZACION**											
3.1	PINTURA TIPO TRANSITO EN GUARNICION CON USO DE MAQUINA PINTARRAYAS.	ML	AVENIDA NO. 9									
			LADO IZQ		148.00					148.00		
					136.00					136.00		
			ACERA SUPERIOR		271.00					271.00		
			LADO DER		54.00					54.00		
										TOTAL	**609.00**	
3.2	SUMINISTRO Y COLOCACIÒN DE BOYA METALICA DE 20X20 CMS PARA TOPE VEHICULAR DE 40 CMS DE SECCION; INCLUYE: BOYA METALICA DE 20x20 CMS, JUEGO DE CUATRO CLAVOS DE SUJECIÒN, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	AVENIDA NO. 9						85.00	85.00		
										TOTAL	**85.00**	
3.3	CONSTRUCCION DE TOPE VEHICULAR DE 3.00 MTS DE ANCHO, 10 CMS DE ALTURA Y 1.00 MTS DE CORONA DE CONCRETO HIDRAULICO F'C=300 KG/CM2 REFORZADO CON MALLALAC 6x6/10x10,INCLUYE: MALLA LAC 66-1010,MATERIALES,MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	ML	AVENIDA NO. 9		7.00					7.00		
										TOTAL	**7.00**	

CONFORME:

ARQ. OMAR ISIDRO DAGNINO MEZA
SUPERINTENDENTE DE OBRA

CONFORME:

ING. JOEL ERNESTO RUBIO ACOSTA
SUPERVISOR DE OBRAS PÚBLICAS

CONFORME:

JUAN MANUEL LOPEZ MENCHACA
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

MUNICIPIO DE SINALOA
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
ESTIMACION DE OBRA

OBRA: CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO ASFALTICO EN AVENIDA NUMERO NUEVE ENTRE PROLONGACION CALLE PEDRO FONSECA Y LIRAMIENTO EN LA LOCALIDAD DE SINALOA DE LEYVA, MUNICIPIO DE SINALOA, ESTADO DE SINALOA.

CONTRATO: FAIS-DOP-SIN-2025-012 | **IMPORTE:** $ 5,355,812.65 MAS I.V.A.

ESTIMACIÓN No.: 3 (FINIQUITO) | **PERIODO CONTRATO:** 17 DE JUNIO AL 11 DE DICIEMBRE DEL 2025.

FECHA 12 DE DICIEMBRE DEL 2025. | **CALCULÓ:** ARQ. OMAR ISIDRO DAGNINO MEZA

DAGBA CONSTRUCTORA

DAGBA CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.
CALLE IGNACIO ZARAGOZA # 200-1, COL. CENTRO, GUASAVE, SIN. MEXICO C.P. 81200
(646) 164-43-51

GENERADORES DE OBRA

CLAVE	DESCRIPCION	UNIDAD	TRAMO	EJE	LARGO	ANCHO	ALTO	PIEZA	AREA	RESULTADO PARCIAL	RESULTADO TOTAL	OBSERVACIONES
3.4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALAMIENTO VERTICAL DE HASTA 24" ø CON POSTE DE HASTA 3 MTS. Y REFLEJANTE GRADO INGENIERIA. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	AVENIDA NO. 9						1.00	1.00		
										TOTAL	**1.00**	
4.-	**VARIOS**											
4.1	RETIRO DE TAPONES EN LOS EXTREMOS Y BARRIDO TOTAL DE LOS MISMOS	M3	AVENIDA NO. 9		8.00	0.80			6.00	38.40		
										TOTAL	**38.40**	
4.2	LIMPIEZA TOTAL DE LA OBRA, INCLUYE: LA MANO DE OBRA NECESARIA.	M2	AVENIDA NO. 9		IDEA AL CONCEPTO 1.1			1.00	1.00	2,991.45		
										TOTAL	**2,991.45**	
4.3	ROTULO DE INICIO DE OBRA A BASE DE UNA LAMINA CON VINIL CON INFORMACION BASICA DE LA OBRA COMO SE ANEXA EN EL CROQUIS DE 1.20 MTS DE LARGO POR 0.90 MTS DE ANCHO EN UNA BASE DE PTR DE 1" X 1" CAL. 14 DE 1.50 MTS DE LARGO Y SE AHOGARA EN CONCRETO 30 CMS.	PZA	AVENIDA NO. 9							1.00		
										TOTAL	**1.00**	
4.4	SUMINISTRO E INSTALACION DE PLACA ALUSIVA A LA OBRA; INCLUYE: MATERIALES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	PZA	AVENIDA NO. 9							1.00		
										TOTAL	**1.00**	
4.5	DEMOLICION DE FIRME DE CONCRETO HIDRAULICO; INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, CARGA Y ACARREO AL 1ER KILOMETRO.	M2	AVENIDA NO. 9		4.30	7.00				30.10		
			LOSA		3.40	1.80				6.12		
			RAMPA		8.40	3.40				28.56		
					8.30	0.30				2.49		
			DENTELLON									
										TOTAL	**67.27**	
11.-	**ALUMBRADO PUBLICO**											
11.1	SUMINISTRO E INST. DE POLIDUCTO NARANJA REFORZADO DE 41 MM (1 1/2) INCLUYE EXCAVACION EN TERRENO TIPO II, CONCRETO FC=100 KG/CM2, RELLENO CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO	ML	AVENIDA NO. 9		215.00					215.00		
										TOTAL	**215.00**	

CONFORME:

ARQ. OMAR ISIDRO DAGNINO MEZA
SUPERINTENDENTE DE OBRA

CONFORME:

ING. JOEL ERNESTO RUBIO ACOSTA
SUPERVISOR DE OBRAS PÚBLICAS

CONFORME:

JUAN MANUEL LOPEZ MENCHACA
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

MUNICIPIO DE SINALOA
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
ESTIMACION DE OBRA

OBRA: CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO ASFALTICO EN AVENIDA NUMERO NUEVE ENTRE PROLONGACION CALLE PEDRO FONSECA Y LIRAMIENTO EN LA LOCALIDAD DE SINALOA DE LEYVA, MUNICIPIO DE SINALOA, ESTADO DE SINALOA.

CONTRATO: FAIS-DOP-SIN-2025-012 | **IMPORTE:** $ 5,355,812.65 MAS I.V.A.

ESTIMACIÓN No.: 3 (FINIQUITO) | **PERIODO CONTRATO:** 17 DE JUNIO AL 11 DE DICIEMBRE DEL 2025.

FECHA 12 DE DICIEMBRE DEL 2025. | **CALCULÓ:** ARQ. OMAR ISIDRO DAGNINO MEZA

DAGBA CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.
CALLE IGNACIO ZARAGOZA # 200-1, COL. CENTRO, GUASAVE, SIN. MÉXICO C.P. 81000
(646) 164-43-61

HOJA: 8 DE 8

GENERADORES DE OBRA

CLAVE	DESCRIPCION	UNIDAD	TRAMO	EJE	LARGO	ANCHO	ALTO	PIEZA	AREA	RESULTADO PARCIAL	RESULTADO TOTAL	OBSERVACIONES
11.2	SUMINISTRO E INST. DE CABLE AL XLP 2+1 CAL. 4 SUBTERRANEO INCLUYE MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO	ML	AVENIDA NO. 9		215.00					215.00		
										TOTAL	215.00	
11.3	SUMINISTRO E INSTALACION DE ALIMENTADOR PARA MURETE INCLUYE: CABLE THW CAL. 4, VATHW. CAL 6, CABLE COBRE DESNUDO CAL. 8, TUBO PVC PESADO DE 1-1/2 EXCAVACION ENTERRENO TIPO II, CONCRETO FC=100 KG/CM2, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	MTS	AVENIDA NO. 9		10.00					10.00		
										TOTAL	10.00	
11.4	SUMINISTRO E INST. DE SISTEMA DE TIERRA PARA FINAL DE CIRCUITO, INCLUYE: VARILLA PARA TIERRA 5/8" X 1.5 MTS. NORMAL, CONECTOR PARA VARILLA DE TIERRA MECANICO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA.	AVENIDA NO. 9					1.00		1.00		
										TOTAL	1.00	
11.5	SUMINISTRO E INST. DE REGISTRO DE CONCRETO DE 40X40X40 CMS MEDIDAS EXTERIORES CON MARCO Y CONTRA MARCO DE FE, ANGULO 1 1/2 X 1/8" Y 1 1/4"X 1/8" INCLUYE MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO	PZA.	AVENIDA NO. 9					8.00		8.00		
										TOTAL	8.00	
11.6	SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPO DE MEDICION CON CONTACTOR AUTOMATIZADO, RELEVADOR 5-0 HRS, INCLUYE: MURETE PREFABRICADO, MEDICION, TUBERIA, INTERRUPTORES, GABINETES, PUERTA DE PROTECCIÓN, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA.	AVENIDA NO. 9					1.00		1.00		
										TOTAL	1.00	
11.8	PAGOS DE VERIFICACION, SUPERVISION, ENERGIZACION Y TODOS LOS CORRESPONDIENTES PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.	LOTE	AVENIDA NO. 9					1.00		1.00		
										TOTAL	1.00	
11.9	SUMINISTRO E INSTALACIÓN UN LUMINARIO CREE DE LED 80WATTS EN POSTE CFE CÓNICO OCTAGONAL 8 MTS, INCLUYE: LAMPARA, POSTE, BRAZO METALICO, BASE PIRAMIDAL 40X90X90, CABLEADO, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.	PZA	AVENIDA NO. 9					8.00		8.00		
										TOTAL	8.00	

CONFORME:

ARQ. OMAR ISIDRO DAGNINO MEZA
SUPERINTENDENTE DE OBRA

CONFORME:

ING. JOEL ERNESTO RUBIO ACOSTA
SUPERVISOR DE OBRAS PÚBLICAS

CONFORME:


JUAN MANUEL LOPEZ MENCHACA
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

MUNICIPIO DE SINALOA
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
ESTIMACION DE OBRA

OBRA:	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO ASFALTICO EN AVENIDA NUMERO NUEVE ENTRE PROLONGACION CALLE PEDRO FONSECA Y LIRAMIENTO EN LA LOCALIDAD DE SINALOA DE LEYVA, MUNICIPIO DE SINALOA, ESTADO DE SINALOA.	**DAGBA** CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.
CONTRATO: FAIS-DOP-SIN-2025-012	**IMPORTE:** $ 5,355,812.65 MAS IVA	
ESTIMACIÓN No.: 3 (FINIQUITO)		
FECHA: 12 DE DICIEMBRE DEL 2025.	**PERIODO:** 11 DE OCTUBRE AL 11 DE DICIEMBRE DEL 2025.	

REPORTE FOTOGRAFICO



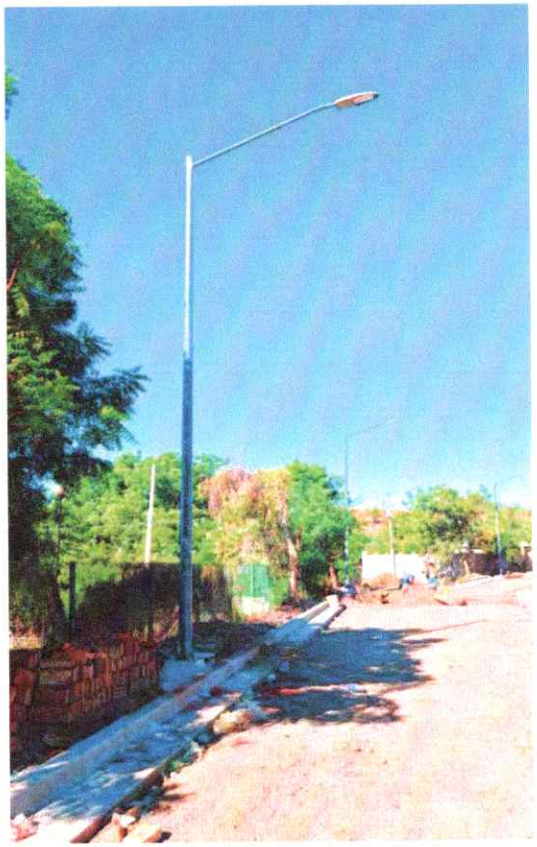



CONFORME:

ARQ. OMAR ISIDRO DAGNINO MEZA
SUPERINTENDENTE DE OBRA

CONFORME:

ING. JOEL ERNESTO RUBIO ACOSTA
SUPERVISOR DE OBRAS PÚBLICAS


CONFORME:


JUAN MANUEL LOPEZ MENCHACA
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS


MUNICIPIO DE SINALOA
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
ESTIMACION DE OBRA

OBRA:	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO ASFALTICO EN AVENIDA NUMERO NUEVE ENTRE PROLONGACION CALLE PEDRO FONSECA Y LIRAMIENTO EN LA LOCALIDAD DE SINALOA DE LEYVA, MUNICIPIO DE SINALOA, ESTADO DE SINALOA.	DAGBA CONSTRUCTORA **DAGBA** CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V. CALLE IGNACIO ZARAGOZA # 200-1, COL. CENTRO, GUASAVE, SIN. MEXICO C.P. 81000 (CEL) 184-43-51
CONTRATO: FAIS-DOP-SIN-2025-012	**IMPORTE:** $ 5,355,812.65 MAS IVA	
ESTIMACIÓN No.: 3 (FINIQUITO)		
FECHA: 12 DE DICIEMBRE DEL 2025.	**PERIODO:** 11 DE OCTUBRE AL 11 DE DICIEMBRE DEL 2025.	

REPORTE FOTOGRAFICO

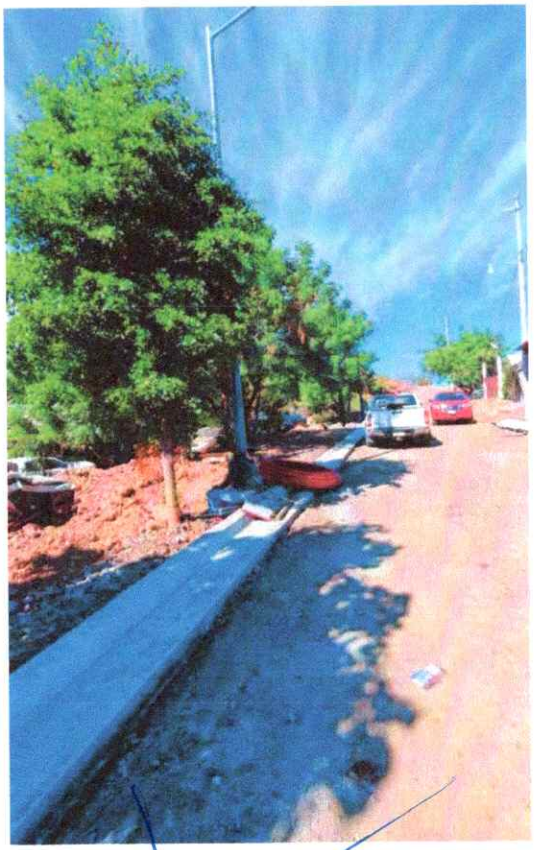

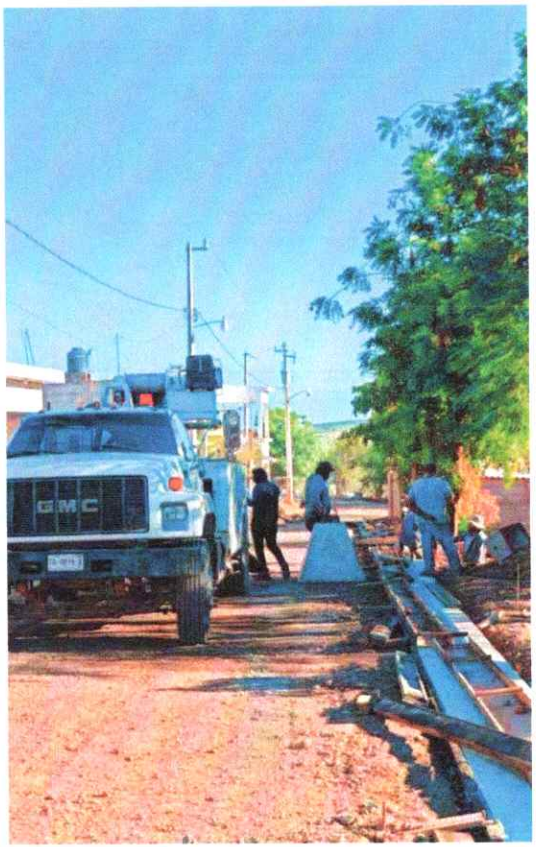

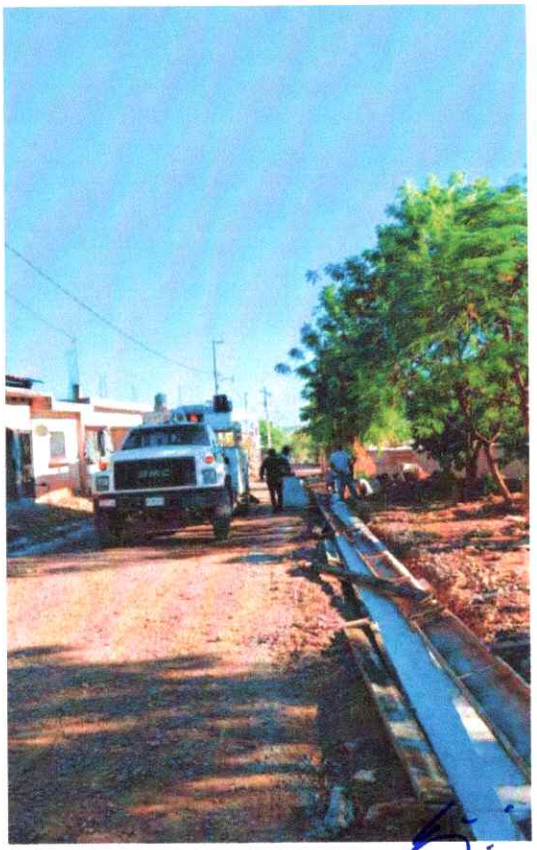

CONFORME:

ARQ. OMAR ISIDRO DAGNINO MEZA
SUPERINTENDENTE DE OBRA

CONFORME:

ING. JOEL ERNESTO RUBIO ACOSTA
SUPERVISOR DE OBRAS PÚBLICAS

CONFORME:


JUAN MANUEL LOPEZ MENCHACA
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS


MUNICIPIO DE SINALOA
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
ESTIMACION DE OBRA

OBRA:	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO ASFALTICO EN AVENIDA NUMERO NUEVE ENTRE PROLONGACION CALLE PEDRO FONSECA Y LIRAMIENTO EN LA LOCALIDAD DE SINALOA DE LEYVA, MUNICIPIO DE SINALOA, ESTADO DE SINALOA.	DAGBA CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.
CONTRATO: FAIS-DOP-SIN-2025-012	**IMPORTE:** $ 5,355,812.65 MAS IVA	
ESTIMACIÓN No.: 3 (FINIQUITO)		
FECHA: 12 DE DICIEMBRE DEL 2025.	**PERIODO:** 11 DE OCTUBRE AL 11 DE DICIEMBRE DEL 2025.	

REPORTE FOTOGRAFICO



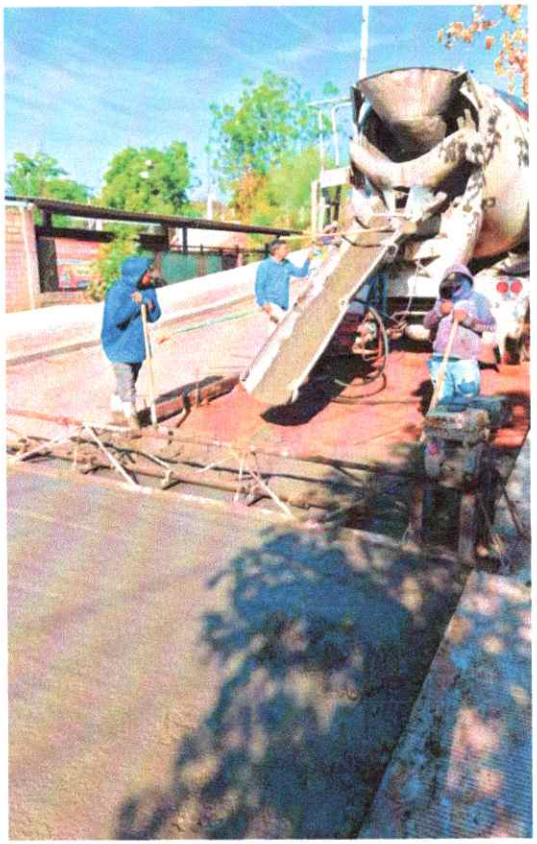

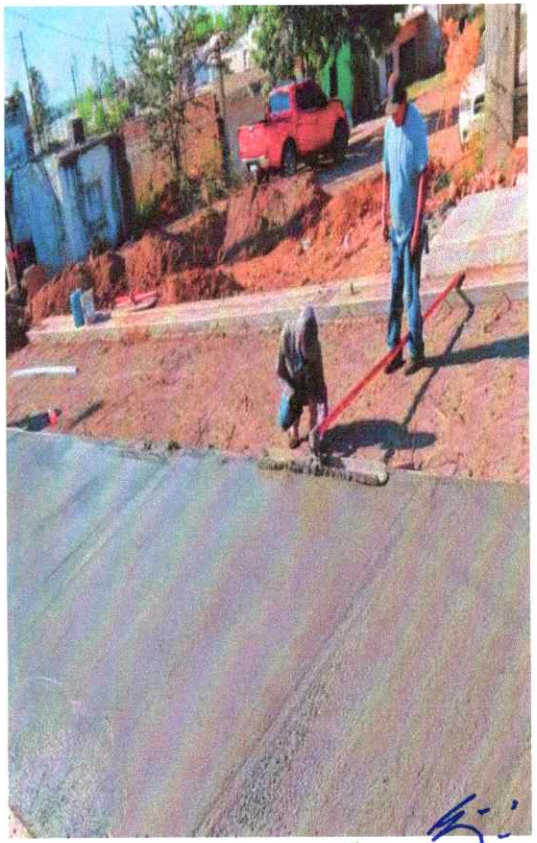

CONFORME:

ARQ. OMAR ISIDRO DAGNINO MEZA
SUPERINTENDENTE DE OBRA

CONFORME:

ING. JOEL ERNESTO RUBIO ACOSTA
SUPERVISOR DE OBRAS PÚBLICAS

CONFORME:

JUAN MANUEL LOPEZ MENCHACA
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

MUNICIPIO DE SINALOA
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
ESTIMACION DE OBRA


OBRA:	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO ASFALTICO EN AVENIDA NUMERO NUEVE ENTRE PROLONGACION CALLE PEDRO FONSECA Y LIRAMIENTO EN LA LOCALIDAD DE SINALOA DE LEYVA, MUNICIPIO DE SINALOA, ESTADO DE SINALOA.	DAGBA CONSTRUCTORA **DAGBA** CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V. CALLE IGNACIO ZARAGOZA # 200-1, COL. CENTRO, GUASAVE, SIN. MEXICO C.P. 81000 (646) 154-43-51
CONTRATO: FAIS-DOP-SIN-2025-012	**IMPORTE:** $ 5,355,812.65 MAS IVA	
ESTIMACIÓN No.: 3 (FINIQUITO)		
FECHA: 12 DE DICIEMBRE DEL 2025.	**PERIODO:** 11 DE OCTUBRE AL 11 DE DICIEMBRE DEL 2025.	

REPORTE FOTOGRAFICO







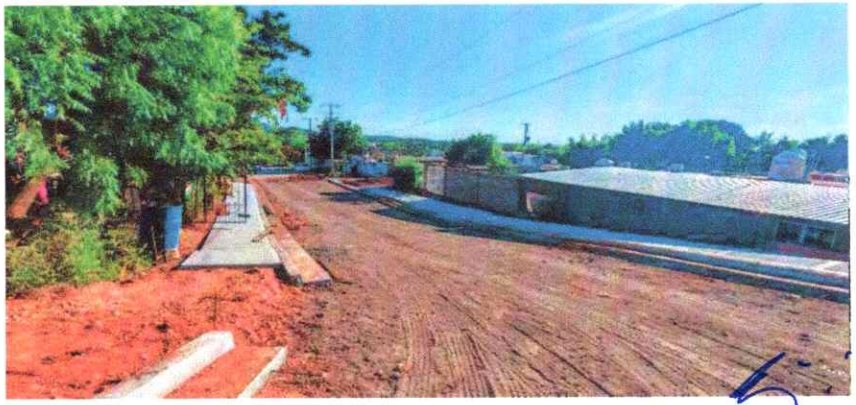

CONFORME:

ARQ. OMAR ISIDRO DAGNINO MEZA
SUPERINTENDENTE DE OBRA

CONFORME:

ING. JOEL ERNESTO RUBIO ACOSTA
SUPERVISOR DE OBRAS PÚBLICAS


CONFORME:


JUAN MANUEL LOPEZ MENCHACA
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

MUNICIPIO DE SINALOA
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
ESTIMACION DE OBRA

OBRA:	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO ASFALTICO EN AVENIDA NUMERO NUEVE ENTRE PROLONGACION CALLE PEDRO FONSECA Y LIRAMIENTO EN LA LOCALIDAD DE SINALOA DE LEYVA, MUNICIPIO DE SINALOA, ESTADO DE SINALOA.	DAGBA CONSTRUCTORA **DAGBA** CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V. CALLE IGNACIO ZARAGOZA # 200-1, COL. CENTRO, GUASAVE, SIN. MEXICO C.P. 81000 (687) 154-43-51
CONTRATO: FAIS-DOP-SIN-2025-012	**IMPORTE:** $ 5,355,812.65 MAS IVA	
ESTIMACIÓN No.: 3 (FINIQUITO)		
FECHA: 12 DE DICIEMBRE DEL 2025.	**PERIODO:** 11 DE OCTUBRE AL 11 DE DICIEMBRE DEL 2025.	

REPORTE FOTOGRAFICO

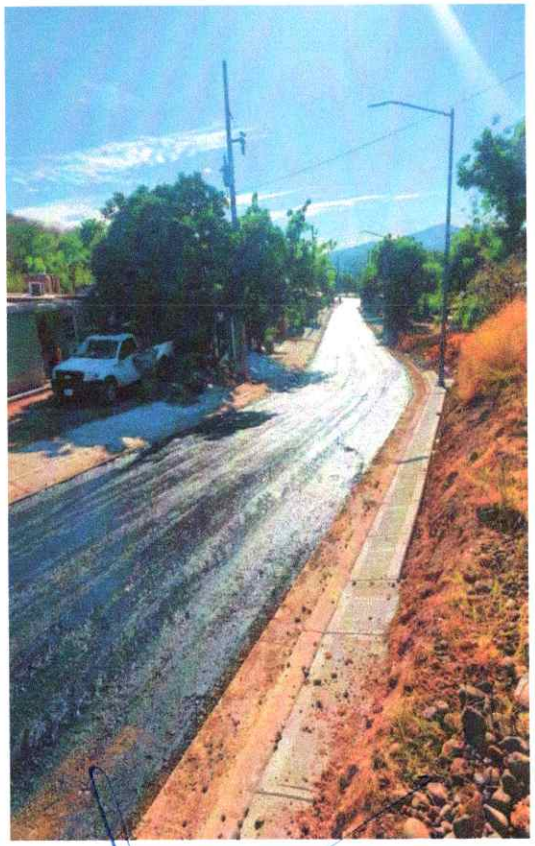

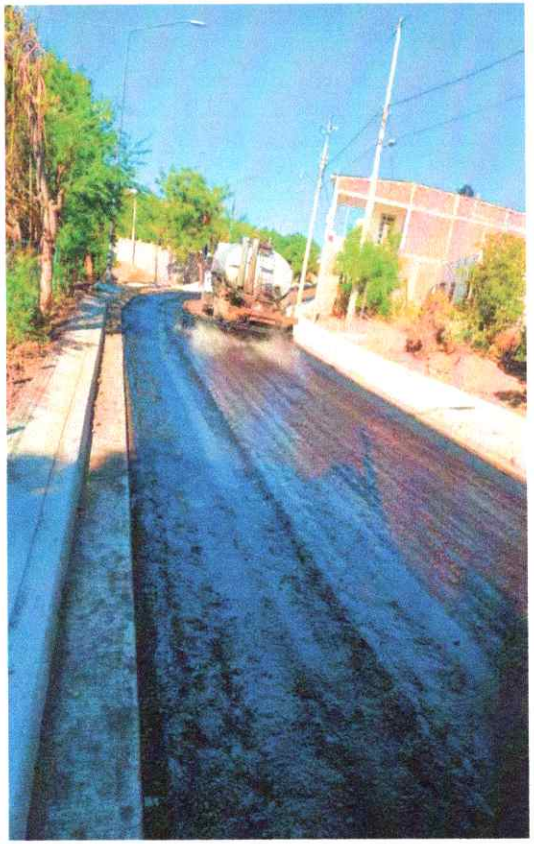



CONFORME:


ARQ. OMAR ISIDRO DAGNINO MEZA
SUPERINTENDENTE DE OBRA

CONFORME:

ING. JOEL ERNESTO RUBIO ACOSTA
SUPERVISOR DE OBRAS PÚBLICAS

CONFORME:

JUAN MANUEL LOPEZ MENCHACA
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

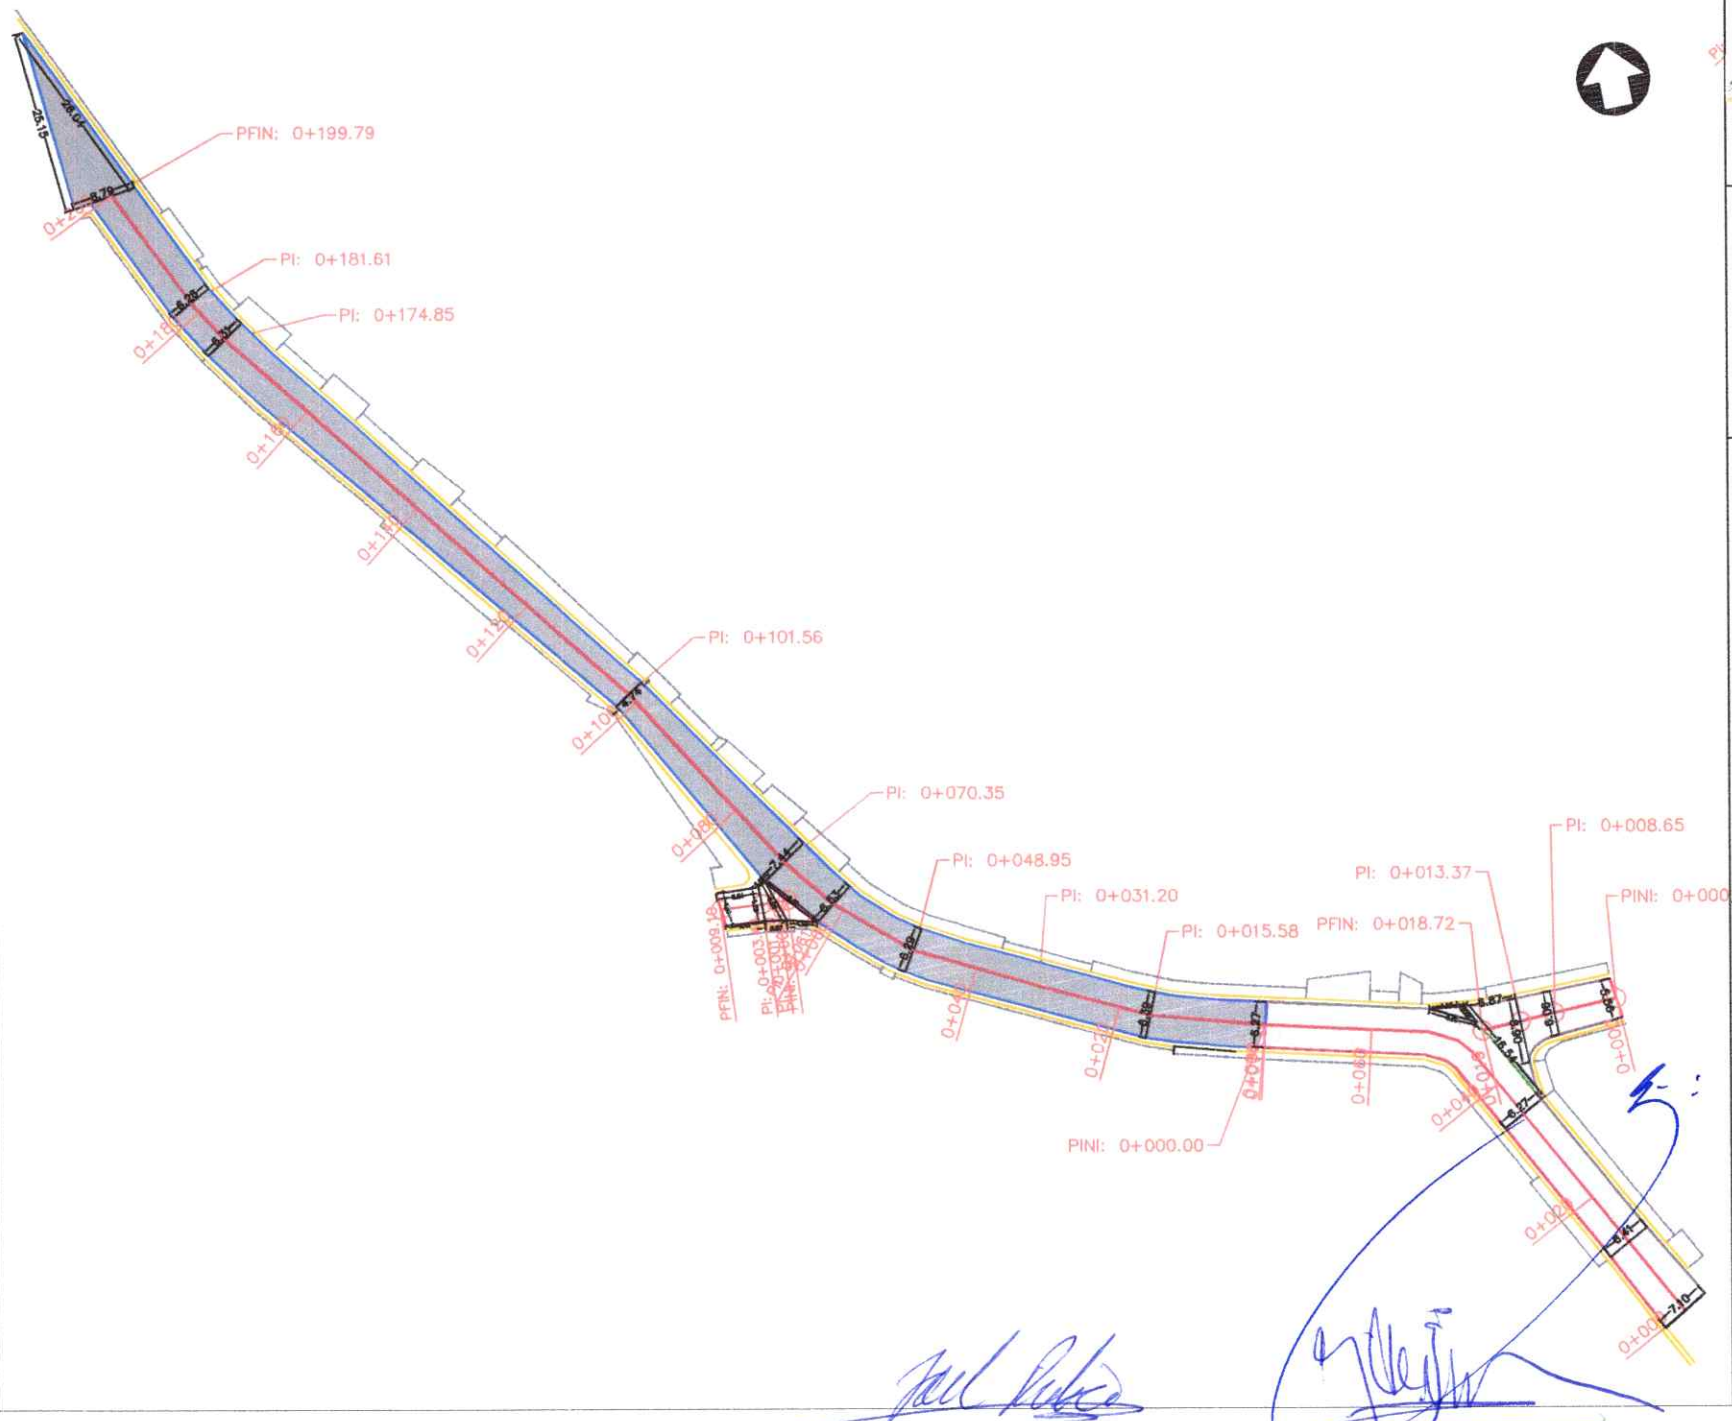

DAGBA CONSTRUCTORA S.A. DE C.V.

LOCALIZACION


SIMBOLOGIA

- EJE DE PROYECTO
- CERCO
- AREA DE ASFALTO
- CONCRETO F'C 300KG/CM2
- CONCRETO F'C 200KG/CM2

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO ASFALTICO EN AVENIDA NUMERO NUEVE ENTRE PROLONGACION CALLE PEDRO FONSECA Y LIBRAMIENTO EN LA LOCALIDAD DE SINALOA DE LEYVA, MUNICIPIO DE SINALOA, ESTADO DE SINALOA.

CROQUIS DE ESTIMACION 3

PAVIMENTO

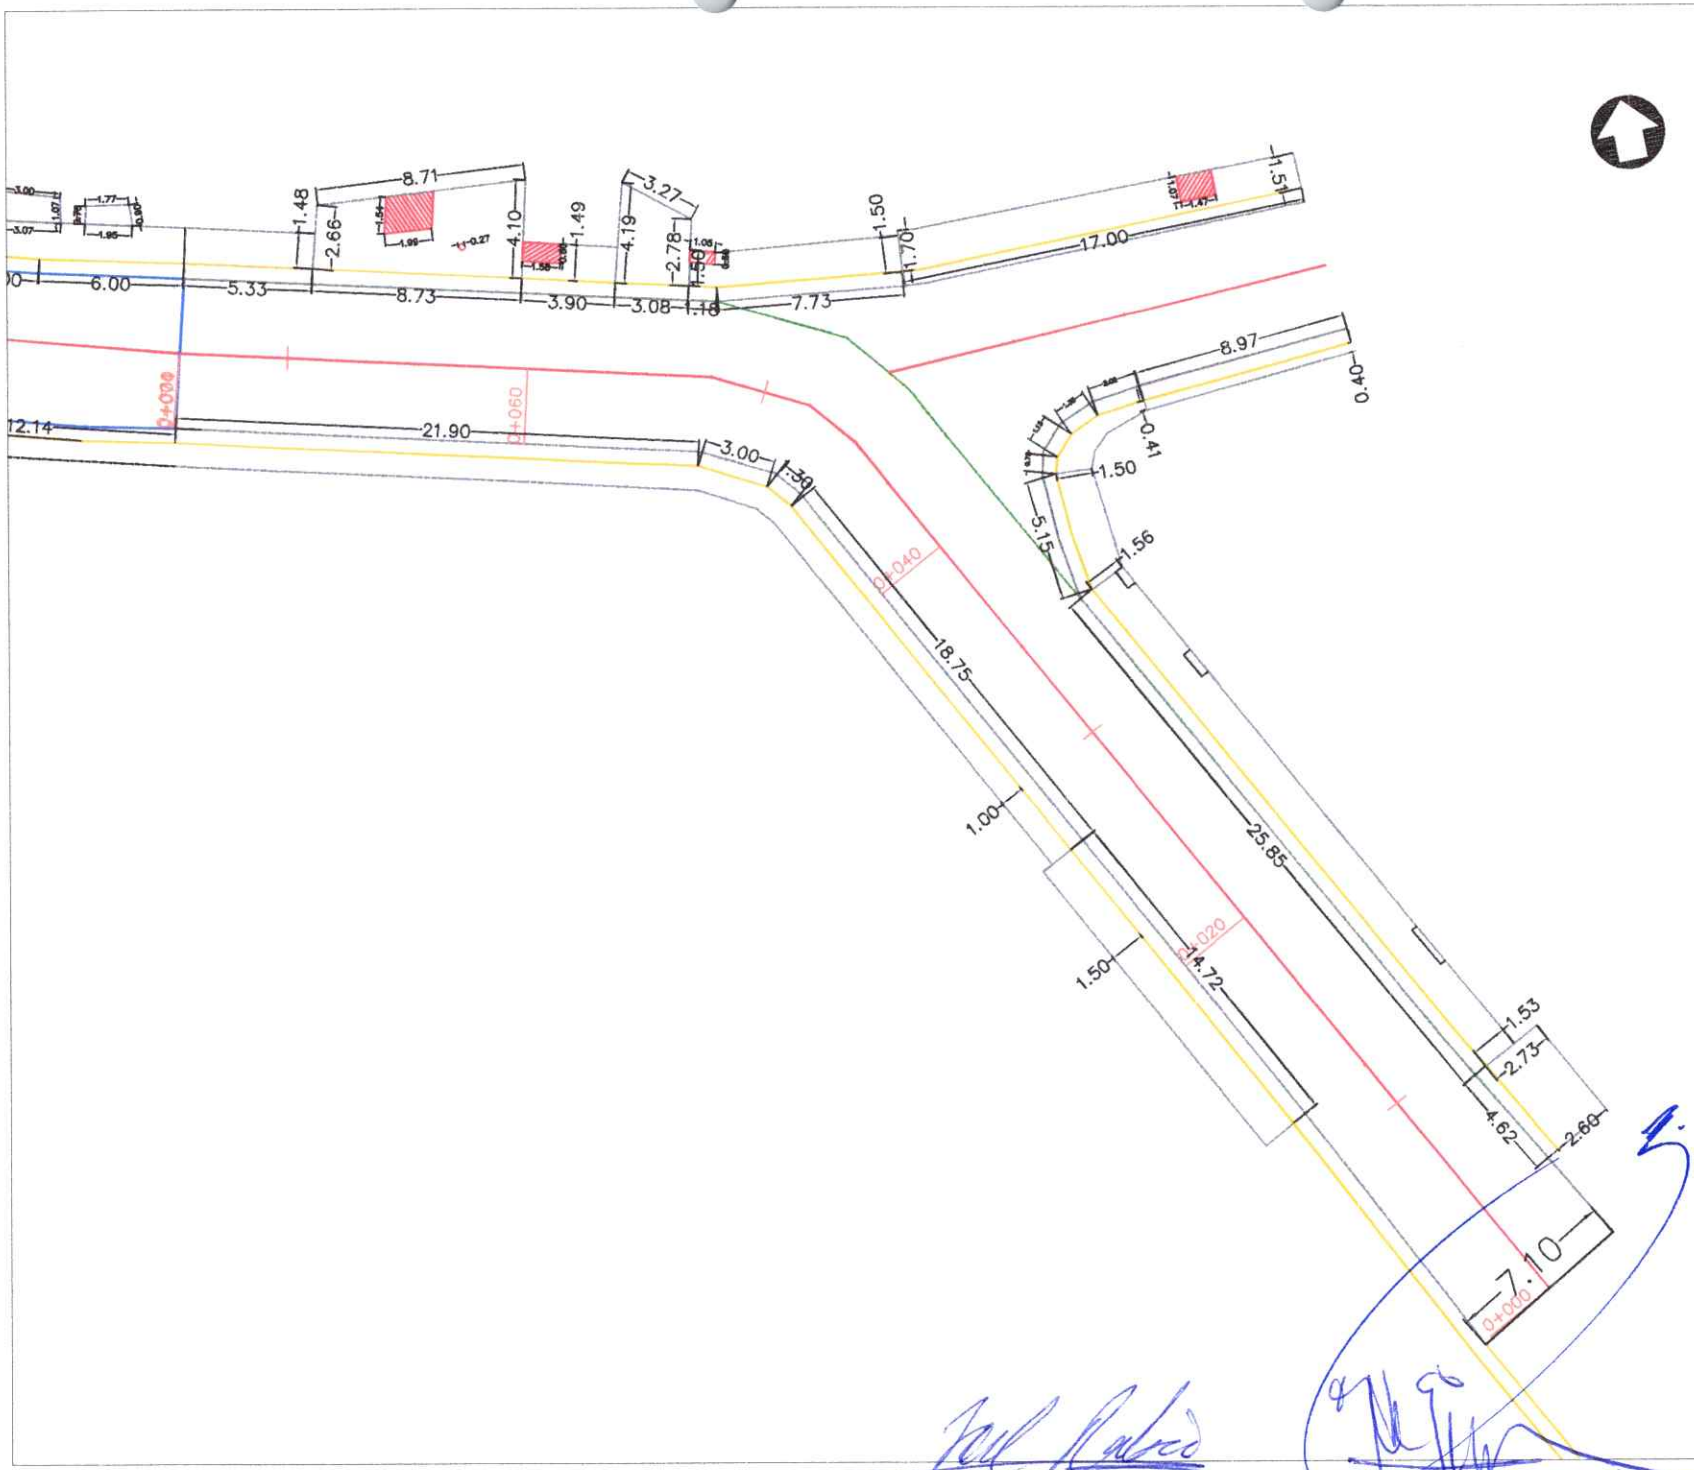

DAGBA INGENIERIA S.A. DE C.V.

LOCALIZACION


SIMBOLOGIA

- EJE DE PROYECTO
- CERCO
- AREA DE ASFALTO
- CONCRETO F'C 300KG/CM2
- CONCRETO F'C 200KG/CM2

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO ASFALTICO EN AVENIDA NUMERO NUEVE ENTRE PROLONGACION CALLE PEDRO FONSECA Y LIBRAMIENTO EN LA LOCALIDAD DE SINALOA DE LEYVA, MUNICIPIO DE SINALOA, ESTADO DE SINALOA.

CROQUIS DE ESTIMACION 3

BANQUETAS

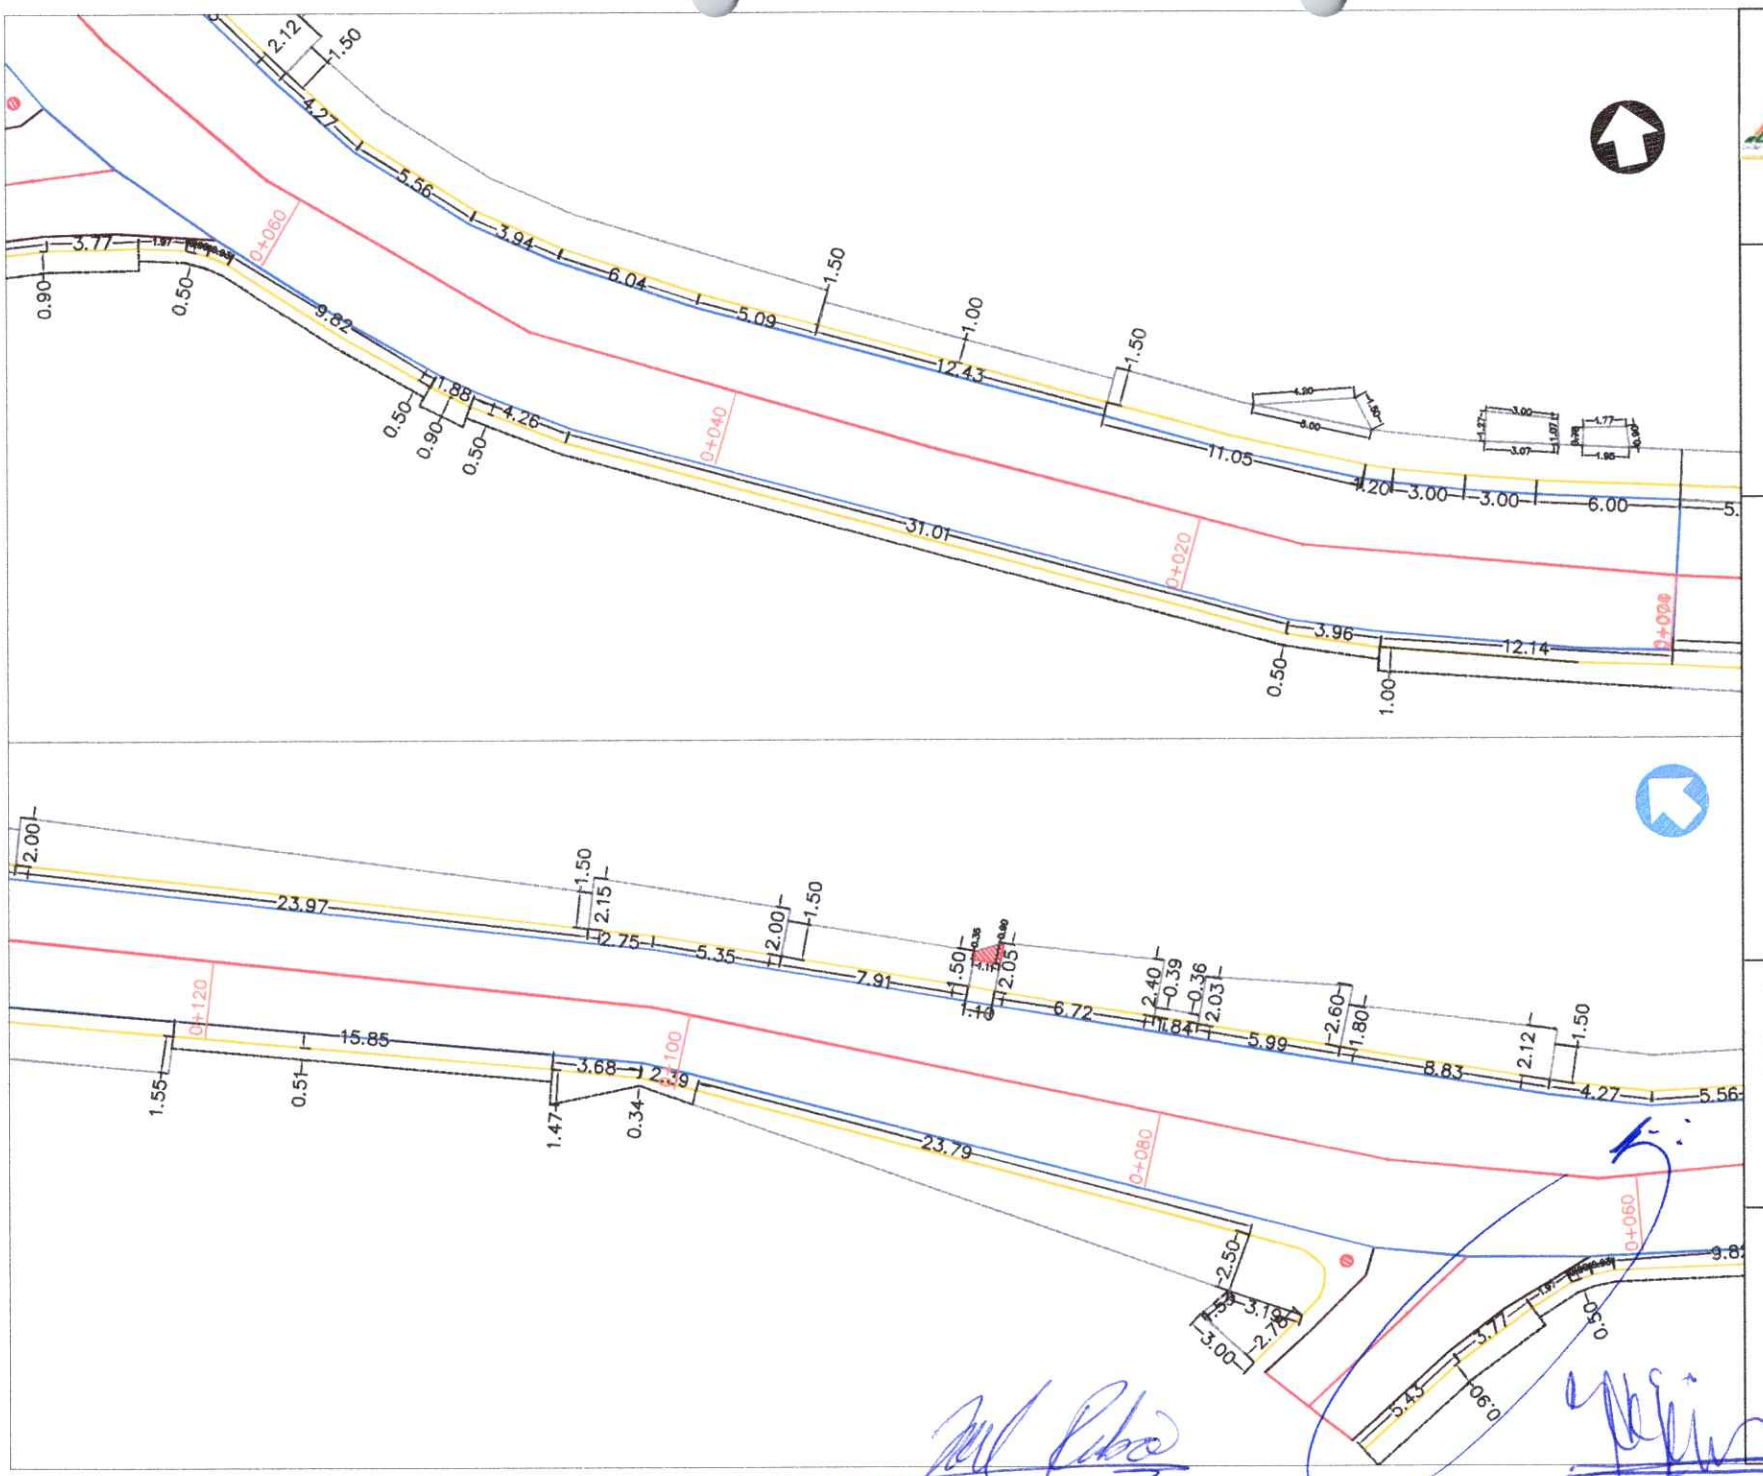

DAGBA CONSTRUCTORA S.A. DE C.V.

LOCALIZACION


SIMBOLOGIA


- EJE DE PROYECTO
- CERCO
- AREA DE ASFALTO
- CONCRETO F'C 300KG/CM2
- CONCRETO F'C 200KG/CM2

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO ASFALTICO EN AVENIDA NUMERO NUEVE ENTRE PROLONGACION CALLE PEDRO FONSECA Y LIBRAMIENTO EN LA LOCALIDAD DE SINALOA DE LEYVA, MUNICIPIO DE SINALOA, ESTADO DE SINALOA.

CROQUIS DE ESTIMACION 3

BANQUETAS

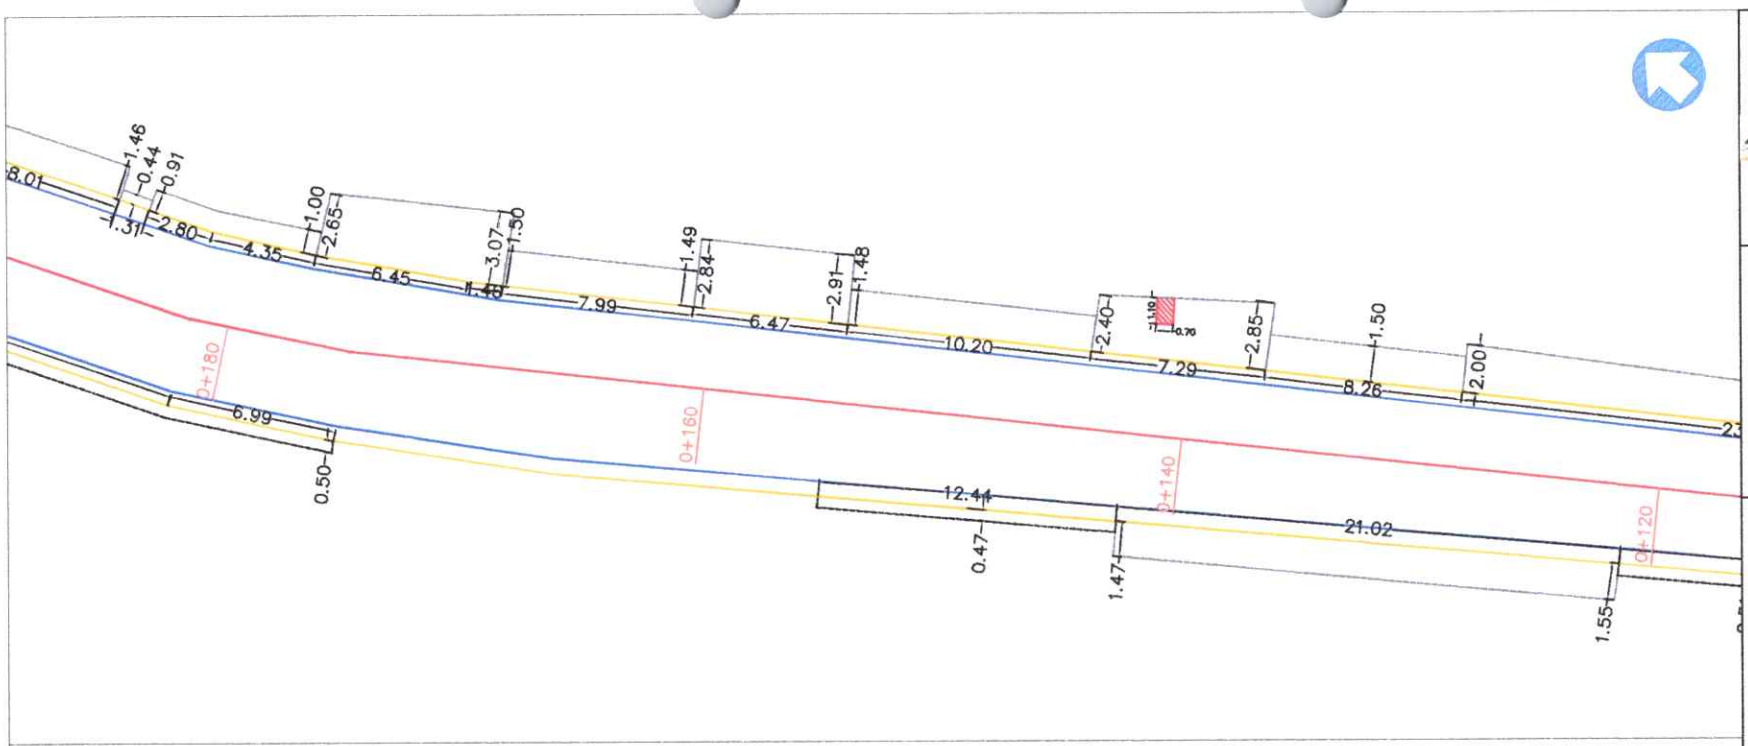

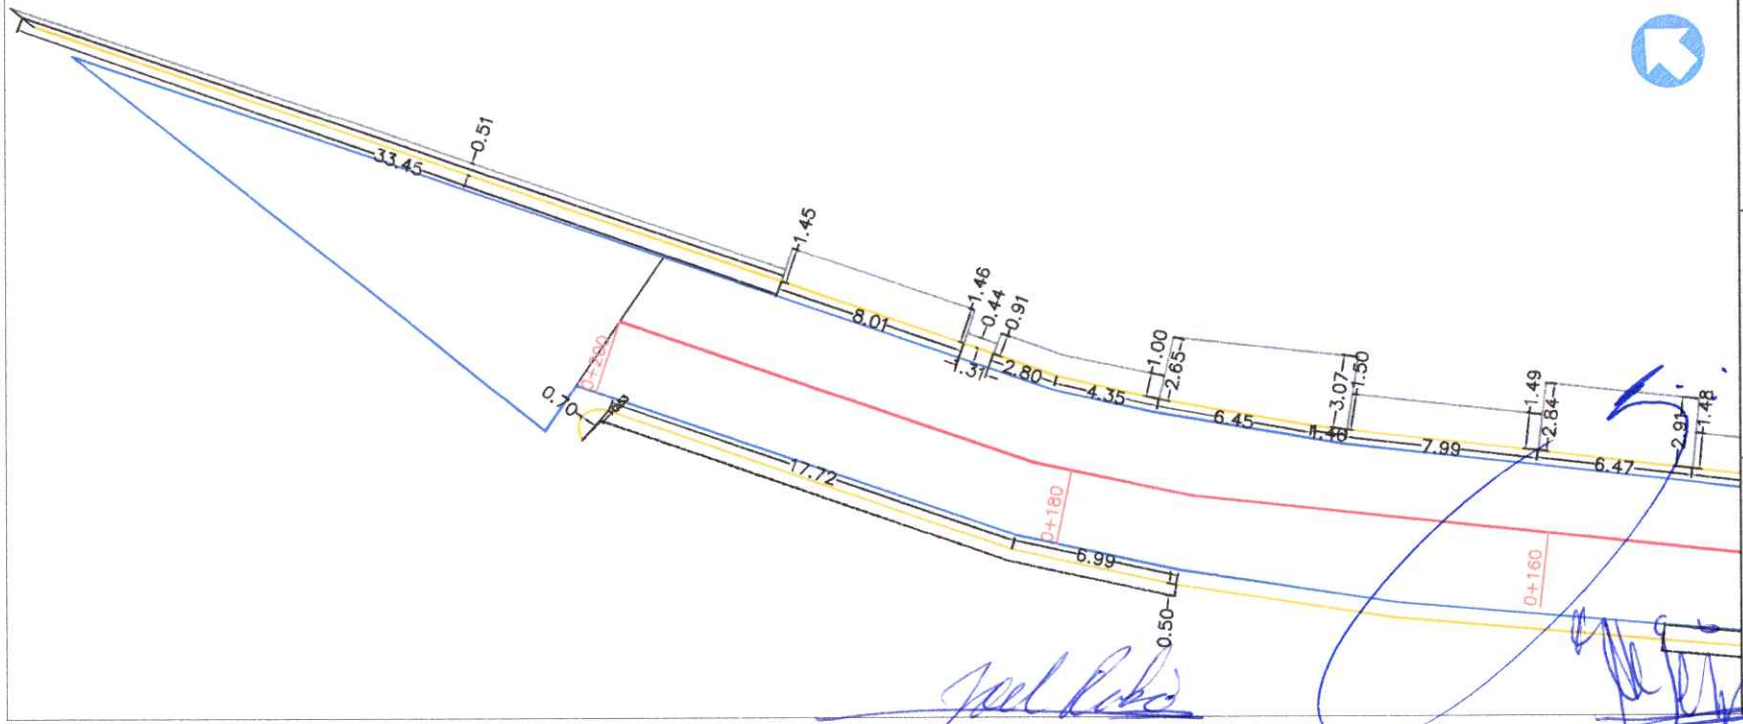

DAGBA CONSTRUCTORA S.A. DE C.V.

LOCALIZACION


SIMBOLOGIA

- EJE DE PROYECTO
- CERCO
- AREA DE ASFALTO
- CONCRETO F'C 300KG/CM2
- CONCRETO F'C 200KG/CM2

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO ASFALTICO EN AVENIDA NUMERO NUEVE ENTRE PROLONGACION CALLE PEDRO FONSECA Y LIBRAMIENTO EN LA LOCALIDAD DE SINALOA DE LEYVA, MUNICIPIO DE SINALOA, ESTADO DE SINALOA.

CROQUIS DE ESTIMACION 3

BANQUETAS

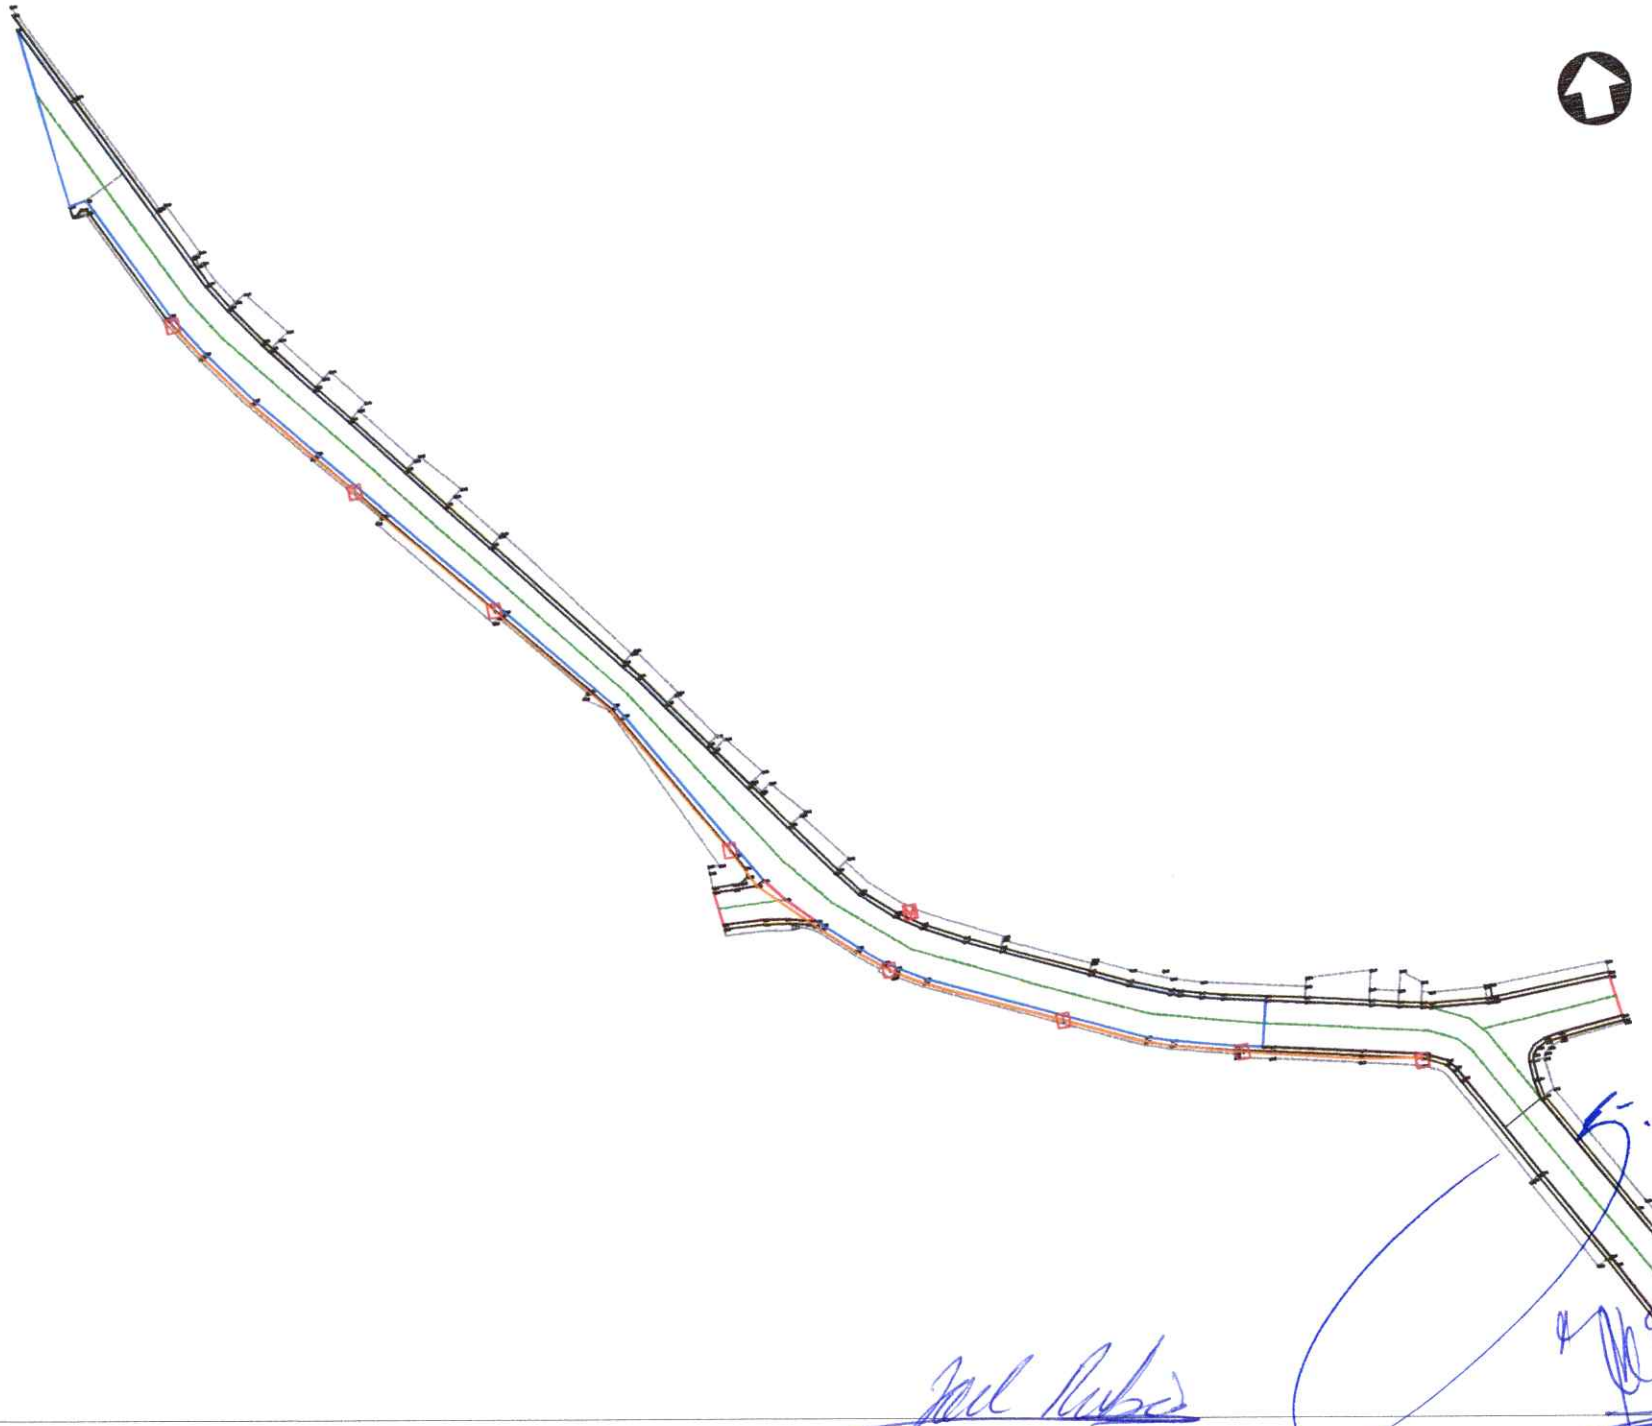

DAGBA CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.

LOCALIZACION

SIMBOLOGIA

EJE DE PROYECTO

CERCO

CABLE XLP 2+1

LUMINARIA

M MURETE

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO ASFALTICO EN AVENIDA NUMERO NUEVE ENTRE PROLONGACION CALLE PEDRO FONSECA Y LIBRAMIENTO EN LA LOCALIDAD DE SINALOA DE LEYVA, MUNICIPIO DE SINALOA, ESTADO DE SINALOA.

CROQUIS DE ESTIMACION 3

LUMINARIA
