MUNICIPIO DE SINALOA
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
ESTIMACION DE OBRA

OBRA:	**CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO ASFALTICO EN AVENIDA NUMERO NUEVE ENTRE PROLONGACION CALLE PEDRO FONSECA Y LIRAMIENTO EN LA LOCALIDAD DE SINALOA DE LEYVA, MUNICIPIO DE SINALOA, ESTADO DE SINALOA.**		
CONTRATO: FAIS-DOP-SIN-2025-012	**PERIODO CONTRATO:** 17 DE JUNIO AL 11 DE DICIEMBRE DEL 2025.		
IMPORTE CONTRATO: **$6,212,742.67**	CON I.V.A.	**IMPORTE ANTICIPO:** $2,174,459.93	
ESTIMACIÓN No.: ADICIONAL 1	**PERIODO:** 17 DE JUNIO AL 11 DE DICIEMBRE DEL 2025.	**FECHA:** 12 DE DICIEMBRE DEL 2025.	**HOJA:** 1 DE 1

DAGBA CONSTRUCTORA

DAGBA CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.
CALLE IGNACIO ZARAGOZA # 500-1, COL. CENTRO, GUASAVE, SIN. MÉXICO C.P. 81000
(687) 164-43-51

ESTADO DE CUENTA

ESTIMACION	PERIODO	IMPORTE DE ESTIMACION	DEDUCCION DEL 3.0%				AMORTIZACION DEL ANTICIPO 35%	TOTAL DE DEDUCCIONES	LIQUIDO A PAGAR
ESTIMACION 1 (UNO)	17 DE JUNIO AL 11 DE AGOSTO DEL 2025.	$ 1,023,833.46	$ 26,478.45				$ 358,341.71	$ 384,820.16	**$ 639,013.30**
ESTIMACION 2 (DOS)	12 DE AGOSTO AL 10 DE OCTUBRE DEL 2025.	$ 1,538,817.67	$ 39,797.01				$ 538,586.18	$ 578,383.19	**$ 960,434.48**
ESTIMACION 3 (FINIQUITO)	11 DE OCTUBRE AL 11 DE DICIEMBRE DEL 2025.	$ 3,491,977.94	$ 90,309.77				$ 1,222,192.28	$ 1,312,502.05	**$ 2,179,475.89**
ESTIMACIÓN No.: ADICIONAL 1	17 DE JUNIO AL 11 DE DICIEMBRE DEL 2025.	$ 158,113.60	$ 4,089.14				$ 55,339.76	$ 59,428.90	**$ 98,684.70**
TOTALES		**$ 6,212,742.67**	$ 160,674.37				$ 2,174,459.93	$ 2,335,134.30	**$ 3,877,608.37**
SALDO DEL CONTRATO:		$0.00	**SALDO POR AMORTIZAR DEL ANTICIPO**				$0.00		

CONFORME:

ARQ. OMAR ISIDRO DAGNINO MEZA
SUPERINTENDENTE DE OBRA

CONFORME:

ING. JOEL ERNESTO RUBIO ACOSTA
SUPERVISOR DE OBRAS PÚBLICAS

CONFORME:

JUAN MANUEL LOPEZ MENCHACA
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

MUNICIPIO DE SINALOA
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
ESTIMACION DE OBRA

OBRA:	**CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO ASFALTICO EN AVENIDA NUMERO NUEVE ENTRE PROLONGACION CALLE PEDRO FONSECA Y LIRAMIENTO EN LA LOCALIDAD DE SINALOA DE LEYVA, MUNICIPIO DE SINALOA, ESTADO DE SINALOA.**				**DAGBA** CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.
CONTRATO: FAIS-DOP-SIN-2025-012	**IMPORTE:**	$5,355,812.65 MAS I.V.A.	**PERIODO CONTRATO:**	17 DE JUNIO AL 11 DE DICIEMBRE DEL 2025.	DAGBA CONSTRUCTORA
ESTIMACIÓN No.: ADICIONAL 1	**PERIODO:**	17 DE JUNIO AL 11 DE DICIEMBRE DEL 2025.	**FECHA:**	12 DE DICIEMBRE DEL 2025.	**HOJA:** 1 DE 1

RESUMEN GENERAL DE ESTIMACIÓN

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO ASFALTICO EN AVENIDA NUMERO NUEVE ENTRE PROLONGACION CALLE PEDRO FONSECA Y LIRAMIENTO EN LA LOCALIDAD DE SINALOA DE LEYVA, MUNICIPIO DE SINALOA, ESTADO DE SINALOA.	**$**	**136,304.83**
SUB-TOTAL DE OBRA:	$	136,304.83
I.V.A. (16%):	$	21,808.77
TOTAL DE ESTIMACION:	**$**	**158,113.60**
DEDUCCIONES:		
AMORTIZACION DEL ANTICIPO 35%	$	55,339.76
DEDUCCION DEL 3.0%	$	4,089.14
Suma de deducciones	**$**	**59,428.90**
Neto a pagar de esta estimacion:	**$**	**98,684.70**

(Son: NOVENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS 70/100 M.N.)

CONFORME:

ARQ. OMAR ISIDRO DAGNINO MEZA
SUPERINTENDENTE DE OBRA

CONFORME:

ING. JOEL ERNESTO RUBIO ACOSTA
SUPERVISOR DE OBRAS PÚBLICAS

CONFORME:

JUAN MANUEL LOPEZ MENCHACA
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

MUNICIPIO DE SINALOA
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
ESTIMACION DE OBRA

OBRA:	**CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO ASFALTICO EN AVENIDA NUMERO NUEVE ENTRE PROLONGACION CALLE PEDRO FONSECA Y LIRAMIENTO EN LA LOCALIDAD DE SINALOA DE LEYVA, MUNICIPIO DE SINALOA, ESTADO DE SINALOA.**				**DAGBA** CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.
CONTRATO: FAIS-DOP-SIN-2025-012	**IMPORTE:**	$5,355,812.65 MAS I.V.A.	**PERIODO CONTRATO:**	17 DE JUNIO AL 11 DE DICIEMBRE DEL 2025.	
ESTIMACIÓN No.: ADICIONAL 1	**PERIODO EST:**	17 DE JUNIO AL 11 DE DICIEMBRE DEL 2025.	**FECHA:**	12 DE DICIEMBRE DEL 2025.	**HOJA:** 1 DE 1

RESUMEN DE ESTIMACIÓN

TERRACERIAS		
GUARNICION,BANQUETAS Y PAVIMENTOS	$	**79,921.41**
SEÑALIZACION	$	**12,861.16**
SISTEMA DE AGUA POTABLE		
TOMAS DOMICILIARIAS	$	**23,627.94**
SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO		
DESCARGAS DOMICILIARIAS	$	**19,894.32**

SUB-TOTAL DE OBRA:	$	136,304.83
I.V.A. (16%):	$	21,808.77
TOTAL DE ESTIMACION:	$	**158,113.60**

DEDUCCIONES:

AMORTIZACION DEL ANTICIPO 35%	$	55,339.76
DEDUCCION DEL 3.0%	$	4,089.14
Suma de deducciones	$	**59,428.90**

Neto a pagar de esta estimacion: $ 98,684.70

(Son: NOVENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS 70/100 M.N.)

CONFORME:

ARQ. OMAR ISIDRO BAGNINO MEZA
SUPERINTENDENTE DE OBRA

CONFORME:

ING. JOEL ERNESTO RUBIO ACOSTA
SUPERVISOR DE OBRAS PÚBLICAS

CONFORME:

JUAN MANUEL LOPEZ MENCHACA
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

MUNICIPIO DE SINALOA
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
ESTIMACION DE OBRA

OBRA:	**CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO ASFALTICO EN AVENIDA NUMERO NUEVE ENTRE PROLONGACION CALLE PEDRO FONSECA Y LIRAMIENTO EN LA LOCALIDAD DE SINALOA DE LEYVA, MUNICIPIO DE SINALOA, ESTADO DE SINALOA.**		
CONTRATO: FAIS-DOP-SIN-2025-012	**IMPORTE:** $ 5,355,812.65 MAS I.V.A.	**PERIODO CONTRATO:**	17 DE JUNIO AL 11 DE DICIEMBRE DEL 2025.
ESTIMACIÓN No.: ADICIONAL 1	**PERIODO EST:** 17 DE JUNIO AL 11 DE DICIEMBRE DEL 2025.	**FECHA:**	12 DE DICIEMBRE DEL 2025.

DAGBA CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	SEGUN PROYECTO	HASTA ESTA ESTIMACIÓN	HASTA LA ESTIMACIÓN ANTERIOR	EXCEDENTE	DE ESTA ESTIMACIÓN	P. U.	IMPORTE
2.-	**GUARNICION , BANQUETAS Y PAVIMENTOS**								
2.2	CONSTRUCCIÓN DE BANQUETA DE CONCRETO F'C=200 KG/CM2 DE 10CM DE ESPESOR REFORZADO CON MALLA ELECTROSOLDADA 66-1010 CON ACABADO ESCOBILLADO, INCLUYE: RELLENO COMPACTADO EN CAPAS NO MAYORES DE 20 CM CON MATERIAL INERTE (LIMO) DE BANCO,SUMINISTRO Y HABILITADO DE MALLA ELECTROSOLDADA 66-1010, CONCRETO PREMEZCLADO HECHO EN PLANTA CON ACARREO HASTA DE 45 KMS,VIBRADO DE INMERSION, HERRAMIENTA, PRUEBAS DE LABORATORIO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	608.25	674.15		48.89	46.976	$ 743.84	$ 34,942.628
2.3	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO DE 15 CM DE ESPESOR CONCRETO F'C=300 KG/CM2,INCLUYE: CIMBRADO Y DESCIMBRADO EN ESPESOR DE LOSA DE CONCRETO HIDRAULICO (POLIN DE 6" X 6 MTS CAL. 12), TENDIDO Y COMPACTACIÓN CON REGLA VIBRATORIA Y VIBRADO DE INMERSION, CONCRETO PREMEZCLADO HECHO EN PLANTA CON ACARREO HASTA DE 45 KMS,AVIONADO CON CHECK ROD Y BULL FLOAT ,ACABADO RAYADO CON PEINE METALICO DE ¾" DE SEPARACION, INDUCCIÓN DE AGRIETAMIENTO MEDIANTE CORTE CON CORTADORA Y DISCO PUNTA DIAMANTE, HERRAMIENTA, PRUEBAS DE LABORATORIO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	619.14	659.57		40.43	39.001	$ 1,089.72	$ 42,500.170
	TOTAL DE GUARNICION , BANQUETAS Y PAVIMENTOS:								**$ 77,442.798**
3.-	**SEÑALIZACION**								
3.2	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BOYA METALICA DE 20X20 CMS PARA TOPE VEHICULAR DE 40 CMS DE SECCION; INCLUYE: BOYA METALICA DE 20x20 CMS, JUEGO DE CUATRO CLAVOS DE SUJECIÓN, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	64.00	85.00		21.00	21.000	$ 256.54	$ 5,387.340
	TOTAL DE SEÑALIZACION:								**$ 5,387.340**
	SISTEMA DE AGUA PÓTABLE								
7.-	**TOMAS DOMICILIARIAS**								
7.1	EXCAVACION Y RELLENO COMPACTADO PARA LA INSTALACION DE MATERIALES EN TOMA DOMICILIARIA. INCLUYE: INCORPORACION DE HUMEDAD, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	ML	154.00	170.50		16.50	16.500	$ 192.55	$ 3,177.070
7.2	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA EXTRUPAK RD-9 EN TOMA DOMICILIARIA. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	ML	154.00	170.50		16.50	16.494	$ 59.75	$ 985.517
7.3	TOMA DOMICILIARIA, INCLUYE: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LLAVE DE BANQUETA 1/2", BOTA DE FoFo, TUBO GAL DE 1/2", 3 CODOS DE 90° DE 1/2" GALV, VÁLVULA LIMITADORA DE BRONCE DE 1/2", MEDIDOR DE 1/2", TEE DE 1/2" GALV, MANGUERA DE 4 MTS, LLAVE DE JARDÍN DE 1/2" EN BRONCE, ADAPTADOR YUCATAN DE 1/2", PLANTILLA Y RELLENO DE ZANJA PRODUCTO DE BANCO	PZA	28.00	31.00		3.00	3.000	$ 6,490.52	$ 19,471.560
	TOTAL DE TOMAS DOMICILIARIAS:								**$ 23,634.147**

CONFORME:

ARQ. OMAR ISIDRO DAGNINO MEZA
SUPERINTENDENTE DE OBRA

CONFORME:

ING. JOEL ERNESTO RUBIO ACOSTA
SUPERVISOR DE OBRAS PÚBLICAS

CONFORME:

JUAN MANUEL LOPEZ MENCHACA
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

MUNICIPIO DE SINALOA
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
ESTIMACION DE OBRA

OBRA:	**CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO ASFALTICO EN AVENIDA NUMERO NUEVE ENTRE PROLONGACION CALLE PEDRO FONSECA Y LIRAMIENTO EN LA LOCALIDAD DE SINALOA DE LEYVA, MUNICIPIO DE SINALOA, ESTADO DE SINALOA.**		
CONTRATO: FAIS-DOP-SIN-2025-012	**IMPORTE:** **$ 5,355,812.65** MAS I.V.A.	**PERIODO CONTRATO:**	17 DE JUNIO AL 11 DE DICIEMBRE DEL 2025.
ESTIMACIÓN No.: ADICIONAL 1	**PERIODO EST:** 17 DE JUNIO AL 11 DE DICIEMBRE DEL 2025.	**FECHA:**	12 DE DICIEMBRE DEL 2025.

DAGBA CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.
CALLE IGNACIO ZARAGOZA # 200-1, COL. CENTRO, GUASAVE, SIN. MEXICO C.P. 81000
DAGBA CONSTRUCTORA

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	SEGUN PROYECTO	HASTA ESTA ESTIMACIÓN	HASTA LA ESTIMACIÓN ANTERIOR	EXCEDENTE	DE ESTA ESTIMACIÓN	P. U.	IMPORTE
	SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO								
10.-	**DESCARGAS DOMICILIARIAS**								
10.1	CONSTRUCCION DE DESCARGA DOMICILIARIA CON TUBERIA DE 6" SERIE 20, INTERCONECTADA A TUBERIA DE 8" SERIE 20, INCLUYE: EXCAVACION, PLANTILLA, ACOSTILLADO Y VOLTEO.	**ML**	140.00	155.00		15.00	14.999	$ 372.46	$ 5,586.528
10.2	SUMINISTRO DE TUBERIA DE PVC DE 6" SERIE 20 PARA CONSTRUCCION DE DESCARGA DOMICILIARIA.	**ML**	140.00	155.00		15.00	14.998	$ 280.47	$ 4,206.489
10.3	SUMINISTRO E INSTALACION DE PIEZAS ESPECIALES PARA DESCARGA DOMICILIARIA DE 6" PARA SER INTERCONECTADAS A TUBERIA DE 8" SERIE 20: CODO DE PVC DE 45°X6" Y YEE DE 8"X6".	**LOTE**	28.00	31.00		3.00	3.000	$ 1,356.75	$ 4,070.250
10.4	SUMINISTRO DE MATERIALES Y CONSTRUCCION DE REGISTROS DE 0.60 X 0.40 MTS DE PROFUNDIDAD VARIABLE. A BASE DE TABIQUE ROJO RECOCIDO JUNTEADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA PROPORCION 1:3 CON BASE DE CONCRETO DE 0.10 MTS. DE ESPESOR ACABADO INTERIOR PULIDO CON CEMENTO- ARENA 1:3 Y MARCO Y CONTRAMARCO CON SOLERA DE 3" A 45° Y TAPA CON CONCRETO F´C= 200 KG/CM2 REFORZADA CON VARILLA DE 3/8" CORRUGADA @10 CM. INCLUYE EXCAVACIONES Y RELLENOS.	**LOTE**	28.00	31.00		3.00	3.000	$ 5,325.76	$ 15,977.280
	TOTAL DE DESCARGAS DOMICILIARIAS:								**$ 29,840.547**

SUB TOTAL	$ 136,304.83
IVA (16%)	$ 21,808.77
Total:	**$ 158,113.60**

CONFORME:

ARQ. OMAR ISIDRO DAGNINO MEZA
SUPERINTENDENTE DE OBRA

CONFORME:

ING. JOEL ERNESTO RUBIO ACOSTA
SUPERVISOR DE OBRAS PÚBLICAS

CONFORME:

JUAN MANUEL LOPEZ MENCHACA
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

MUNICIPIO DE SINALOA
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
ESTIMACION DE OBRA

OBRA: CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO ASFALTICO EN AVENIDA NUMERO NUEVE ENTRE PROLONGACION CALLE PEDRO FONSECA Y LIRAMIENTO EN LA LOCALIDAD DE SINALOA DE LEYVA, MUNICIPIO DE SINALOA, ESTADO DE SINALOA.

DAGBA CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.
CALLE IGNACIO ZARAGOZA # 200-1, COL. CENTRO, GUASAVE, SIN. MEXICO C.P. 81200
(646) 154-43-61

CONTRATO: FAIS-DOP-SIN-2025-012 | **IMPORTE:** $ 5,355,812.65 MAS I.V.A.

ESTIMACIÓN No.: ADICIONAL 1 | **PERIODO CONTRATO:** 17 DE JUNIO AL 11 DE DICIEMBRE DEL 2025.

FECHA 12 DE DICIEMBRE DEL 2025. | **CALCULÓ:** ARQ. OMAR ISIDRO DAGNINO MEZA

GENERADORES DE OBRA

CLAVE	DESCRIPCION	UNIDAD	TRAMO	EJE	LARGO	ANCHO	ALTO	PIEZA	AREA	RESULTADO PARCIAL	RESULTADO TOTAL	OBSERVACIONES
2.-	**GUARNICION , BANQUETAS Y PAVIMENTOS**											
2.2	CONSTRUCCIÓN DE BANQUETA DE CONCRETO F'C=200 KG/CM2 DE 10CM DE ESPESOR REFORZADO CON MALLA ELECTROSOLDADA 66-1010 CON ACABADO ESCOBILLADO, INCLUYE: RELLENO COMPACTADO EN CAPAS NO MAYORES DE 20 CM CON MATERIAL INERTE (LIMO) DE BANCO,SUMINISTRO Y HABILITADO DE MALLA ELECTROSOLDADA 66-1010, CONCRETO PREMEZCLADO HECHO EN PLANTA CON ACARREO HASTA DE 45 KMS,VIBRADO DE INMERSION, HERRAMIENTA, PRUEBAS DE LABORATORIO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	**AVENIDA NO. 9**									
		AREA DE CONCRETO	AREA DE CONCRETO									
			KM 0+000.00 AL 0+074.50									
			LADO IZQ		14.72	1.50				22.08		
					44.95	1.00				44.95		
			LADO DER									
					4.62	2.67	PROM.			12.34		
					25.85	1.55	PROM.			40.07		
					5.15	1.53	PROM.			7.88		
					5.25	0.95	PROM.			4.99		
					8.95	0.40				3.58		
			MENOS MACETEROS									
					1.84	0.24				-0.44		
					1.17	0.33				-0.39		
			ACERA SUPERIOR									
					17.00	1.61	PROM.			27.37		
			MENOS MACETEROS		1.45	1.05				-1.52		
					8.91	1.50				13.37		
			MENOS MACETEROS		1.00	0.50				-0.50		
					3.18	3.49	PROM.			11.10		
					3.90	1.50				5.85		
			MENOS MACETEROS		1.55	0.80				-1.24		
					8.72	3.38	PROM.			29.47		
			MENOS MACETEROS		2.00	1.54				-3.08		
					5.31	1.50				7.97		
		AREA DE ASFALTO	LADO DER									
			KM 0+000.00 AL 0+020.00		24.25	1.50				36.38		
			MAS ACCESO A COCHERA		1.86	0.83				1.54		
					3.04	1.18				3.59		
					b	h						
					1.50	4.60	PROM.			3.45		
			KM 0+020.00 AL 0+199.80		12.43	1.50				18.65		

CONFORME:

ARQ. OMAR ISIDRO DAGNINO MEZA
SUPERINTENDENTE DE OBRA

CONFORME:

ING. JOEL ERNESTO RUBIO ACOSTA
SUPERVISOR DE OBRAS PÚBLICAS

CONFORME:

JUAN MANUEL LOPEZ MENCHACA
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

MUNICIPIO DE SINALOA
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
ESTIMACION DE OBRA

OBRA: CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO ASFALTICO EN AVENIDA NUMERO NUEVE ENTRE PROLONGACION CALLE PEDRO FONSECA Y LIRAMIENTO EN LA LOCALIDAD DE SINALOA DE LEYVA, MUNICIPIO DE SINALOA, ESTADO DE SINALOA.

DAGBA CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.
CALLE IGNACIO ZARAGOZA # 200-1, COL. CENTRO, GUASAVE, SIN. MEXICO C.P. 81200
(646) 164-43-61

CONTRATO: FAIS-DOP-SIN-2025-012 | **IMPORTE:** $ 5,355,812.65 MAS I.V.A.

ESTIMACIÓN No.: ADICIONAL 1 | **PERIODO CONTRATO:** 17 DE JUNIO AL 11 DE DICIEMBRE DEL 2025.

FECHA 12 DE DICIEMBRE DEL 2025. | **CALCULÓ:** ARQ. OMAR ISIDRO DAGNINO MEZA

GENERADORES DE OBRA

CLAVE	DESCRIPCION	UNIDAD	TRAMO	EJE	LARGO	ANCHO	ALTO	PIEZA	AREA	RESULTADO PARCIAL	RESULTADO TOTAL	OBSERVACIONES
2.2	CONSTRUCCIÓN DE BANQUETA DE CONCRETO F'C=200 KG/CM2 DE 10CM DE ESPESOR REFORZADO CON MALLA ELECTROSOLDADA 66-1010 CON ACABADO ESCOBILLADO, INCLUYE: RELLENO COMPACTADO EN CAPAS NO MAYORES DE 20 CM CON MATERIAL INERTE (LIMO) DE BANCO,SUMINISTRO Y HABILITADO DE MALLA ELECTROSOLDADA 66-1010, CONCRETO PREMEZCLADO HECHO EN PLANTA CON ACARREO HASTA DE 45 KMS,VIBRADO DE INMERSION, HERRAMIENTA, PRUEBAS DE LABORATORIO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	AREA DE ASFALTO	KM 0+020.00 AL 0+199.80		23.33	1.50				35.00		
					8.80	1.97	PROM.			17.34		
					6.00	2.32	PROM.			13.92		
					1.85	0.38	PROM.			0.70		
					6.70	2.23	PROM.			14.94		
					1.10	1.78	PROM.			1.96		
			MENOS MACETEROS		1.10	0.62				-0.68		
					7.90	1.50				11.85		
					5.10	2.08	PROM.			10.61		
					24.00	1.50				36.00		
					8.25	1.50				12.38		
					7.30	2.63	PROM.			19.20		
			MENOS MACETEROS		1.10	0.70				-0.77		
					10.20	1.50				15.30		
					6.45	2.88	PROM.			18.58		
					8.00	1.50				12.00		
					7.90	2.87	PROM.			22.67		
					7.15	0.96	PROM.			6.86		
					1.30	0.45				0.59		
					8.00	1.45				11.60		
					33.45	0.50				16.73		
			LADO IZQ									
			KM 0+070.35 AL 0+155.00		3.10	2.17	PROM.			6.73		
					3.20	2.50	PROM.			8.00		
			MENOS MACETEROS		D		π					
					0.75		3.1416			-0.88		
					23.80	1.44	PROM.			34.27		
					3.68	0.93	PROM.			3.42		
					15.85	0.50				7.93		
					21.00	1.51				31.71		
					12.45	0.45				5.60		
					24.71	0.50				12.36		
					D		π					
					0.70		3.1416			0.77		
										TOTAL	674.15	

CONFORME:

ARQ. OMAR ISIDRO DAGNINO MEZA
SUPERINTENDENTE DE OBRA

CONFORME:

ING. JOEL ERNESTO RUBIO ACOSTA
SUPERVISOR DE OBRAS PÚBLICAS

CONFORME:

JUAN MANUEL LOPEZ MENCHACA
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

MUNICIPIO DE SINALOA
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
ESTIMACION DE OBRA

OBRA: CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO ASFALTICO EN AVENIDA NUMERO NUEVE ENTRE PROLONGACION CALLE PEDRO FONSECA Y LIRAMIENTO EN LA LOCALIDAD DE SINALOA DE LEYVA, MUNICIPIO DE SINALOA, ESTADO DE SINALOA.

DAGBA CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.
CALLE IGNACIO ZARAGOZA # 500-1, COL. CENTRO, GUASAVE, SIN. MEXICO C.P. 81000
(646) 154-43-51

CONTRATO: FAIS-DOP-SIN-2025-012 | **IMPORTE:** $ 5,355,812.65 MAS I.V.A.

ESTIMACIÓN No.: ADICIONAL 1 | **PERIODO CONTRATO:** 17 DE JUNIO AL 11 DE DICIEMBRE DEL 2025.

FECHA 12 DE DICIEMBRE DEL 2025. | **CALCULÓ:** ARQ. OMAR ISIDRO DAGNINO MEZA

GENERADORES DE OBRA

CLAVE	DESCRIPCION	UNIDAD	TRAMO	EJE	LARGO	ANCHO	ALTO	PIEZA	AREA	RESULTADO PARCIAL	RESULTADO TOTAL	OBSERVACIONES
2.3	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO DE 15 CM DE ESPESOR CONCRETO F'C=300 KG/CM2,INCLUYE: CIMBRADO Y DESCIMBRADO EN ESPESOR DE LOSA DE CONCRETO HIDRAULICO (POLIN DE 6" X 6 MTS CAL. 12), TENDIDO Y COMPACTACIÓN CON REGLA VIBRATORIA Y VIBRADO DE INMERSION, CONCRETO PREMEZCLADO HECHO EN PLANTA CON ACARREO HASTA DE 45 KMS,AVIONADO CON CHECK ROD Y BULL FLOAT ,ACABADO RAYADO CON PEINE METALICO DE ¾" DE SEPARACION, INDUCCIÓN DE AGRIETAMIENTO MEDIANTE CORTE CON CORTADORA Y DISCO PUNTA DIAMANTE, HERRAMIENTA, PRUEBAS DE LABORATORIO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	AVENIDA NO. 9									
			KM 0+000.00 AL 0+012.05		12.05	6.76				81.46		
			KM 0+012.05 AL 0+034.60		22.55	6.36				143.42		
			KM 0+034.60 AL 0+074.65		40.05	6.26				250.71		
			ENTRONQUE 1									
			KM 0+000.00 AL 0+018.75		8.75	5.81				50.84		
					3.55	6.49				23.04		
					1.22	7.76				4.73		
					7.19	14.24				51.19		
					2.73	4.34				5.92		
			ENTRONQUE 2									**s-a**
			KM 0+000.00 AL 0+009.10		**a**	**b**	**c**	**s**				5.45
					9.00	6.05	4.15	9.60		10.56		**s-b**
					2.09	5.39	**PROM.**			11.27		3.55
					5.66	4.67	**PROM.**			26.43		**s-c**
												4.15
										TOTAL	**659.57**	
3.-	**SEÑALIZACION**											
3.2	SUMINISTRO Y COLOCACIÒN DE BOYA METALICA DE 20X20 CMS PARA TOPE VEHICULAR DE 40 CMS DE SECCION; INCLUYE: BOYA METALICA DE 20x20 CMS, JUEGO DE CUATRO CLAVOS DE SUJECIÒN, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	AVENIDA NO. 9									
									85.00	85.00		
										TOTAL	**85.00**	
7.-	**TOMAS DOMICILIARIAS**											
7.1	EXCAVACION Y RELLENO COMPACTADO PARA LA INSTALACION DE MATERIALES EN TOMA DOMICILIARIA. INCLUYE: INCORPORACION DE HUMEDAD, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	ML	AVENIDA NO. 9									
					5.50			3.00		16.50		
										TOTAL	**16.50**	
7.2	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA EXTRUPAK RD-9 EN TOMA DOMICILIARIA. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	ML	AVENIDA NO. 9									
					5.50			3.00		16.50		
										TOTAL	**16.50**	

CONFORME:

ARQ. OMAR ISIDRO DAGNINO MEZA
SUPERINTENDENTE DE OBRA

CONFORME:

ING. JOEL ERNESTO RUBIO ACOSTA
SUPERVISOR DE OBRAS PÚBLICAS

CONFORME:

JUAN MANUEL LOPEZ MENCHACA
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

MUNICIPIO DE SINALOA
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
ESTIMACION DE OBRA

OBRA: CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO ASFALTICO EN AVENIDA NUMERO NUEVE ENTRE PROLONGACION CALLE PEDRO FONSECA Y LIRAMIENTO EN LA LOCALIDAD DE SINALOA DE LEYVA, MUNICIPIO DE SINALOA, ESTADO DE SINALOA.

DAGBA CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.
CALLE IGNACIO ZARAGOZA # 200-1, COL. CENTRO, GUASAVE, SIN. MEXICO C.P. 81000
(646) 164-43-51

CONTRATO: FAIS-DOP-SIN-2025-012 | **IMPORTE:** $ 5,355,812.65 MAS I.V.A.

ESTIMACIÓN No.: ADICIONAL 1 | **PERIODO CONTRATO:** 17 DE JUNIO AL 11 DE DICIEMBRE DEL 2025.

FECHA 12 DE DICIEMBRE DEL 2025. | **CALCULÓ:** ARQ. OMAR ISIDRO DAGNINO MEZA

GENERADORES DE OBRA

CLAVE	DESCRIPCION	UNIDAD	TRAMO	EJE	LARGO	ANCHO	ALTO	PIEZA	AREA	RESULTADO PARCIAL	RESULTADO TOTAL	OBSERVACIONES
7.3	TOMA DOMICILIARIA, INCLUYE: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LLAVE DE BANQUETA 1/2", BOTA DE FoFo, TUBO GAL DE 1/2", 3 CODOS DE 90° DE 1/2" GALV, VÁLVULA LIMITADORA DE BRONCE DE 1/2", MEDIDOR DE 1/2", TEE DE 1/2" GALV, MANGUERA DE 4 MTS, LLAVE DE JARDÍN DE 1/2" EN BRONCE, ADAPTADOR YUCATAN DE 1/2", PLANTILLA Y RELLENO DE ZANJA PRODUCTO DE BANCO	PZA	AVENIDA NO. 9					3.00		3.00		
										TOTAL	3.00	
10.-	DESCARGAS DOMICILIARIAS											
10.1	CONSTRUCCION DE DESCARGA DOMICILIARIA CON TUBERIA DE 6" SERIE 20, INTERCONECTADA A TUBERIA DE 8" SERIE 20, INCLUYE: EXCAVACION, PLANTILLA, ACOSTILLADO Y VOLTEO.	ML	AVENIDA NO. 9		5.00			3.00		15.00		
										TOTAL	15.00	
10.2	SUMINISTRO DE TUBERIA DE PVC DE 6" SERIE 20 PARA CONSTRUCCION DE DESCARGA DOMICILIARIA.	ML	AVENIDA NO. 9		5.00			3.00		15.00		
										TOTAL	15.00	
10.3	SUMINISTRO E INSTALACION DE PIEZAS ESPECIALES PARA DESCARGA DOMICILIARIA DE 6" PARA SER INTERCONECTADAS A TUBERIA DE 8" SERIE 20: CODO DE PVC DE 45°X6" Y YEE DE 8"X6".	LOTE	AVENIDA NO. 9					3.00		3.00		
										TOTAL	3.00	
10.4	SUMINISTRO DE MATERIALES Y CONSTRUCCION DE REGISTROS DE 0.60 X 0.40 MTS DE PROFUNDIDAD VARIABLE. A BASE DE TABIQUE ROJO RECOCIDO JUNTEADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA PROPORCION 1:3 CON BASE DE CONCRETO DE 0.10 MTS. DE ESPESOR ACABADO INTERIOR PULIDO CON CEMENTO- ARENA 1:3 Y MARCO Y CONTRAMARCO CON SOLERA DE 3" A 45° Y TAPA CON CONCRETO F´C= 200 KG/CM2 REFORZADA CON VARILLA DE 3/8" CORRUGADA @10 CM. INCLUYE EXCAVACIONES Y RELLENOS.	LOTE	AVENIDA NO. 9					3.00		3.00		
										TOTAL	3.00	

CONFORME:

ARQ. OMAR ISIDRO DAGNINO MEZA
SUPERINTENDENTE DE OBRA

CONFORME:

ING. JOEL ERNESTO RUBIO ACOSTA
SUPERVISOR DE OBRAS PÚBLICAS


CONFORME:


JUAN MANUEL LOPEZ MENCHACA
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS


MUNICIPIO DE SINALOA
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
ESTIMACION DE OBRA

OBRA:	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO ASFALTICO EN AVENIDA NUMERO NUEVE ENTRE PROLONGACION CALLE PEDRO FONSECA Y LIRAMIENTO EN LA LOCALIDAD DE SINALOA DE LEYVA, MUNICIPIO DE SINALOA, ESTADO DE SINALOA.	DAGBA CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.
CONTRATO: FAIS-DOP-SIN-2025-012	IMPORTE: $ 5,355,812.65 MAS IVA	
ESTIMACIÓN No.: ADICIONAL 1		
FECHA: 12 DE DICIEMBRE DEL 2025.	PERIODO: 17 DE JUNIO AL 11 DE DICIEMBRE DEL 2025.	

REPORTE FOTOGRAFICO

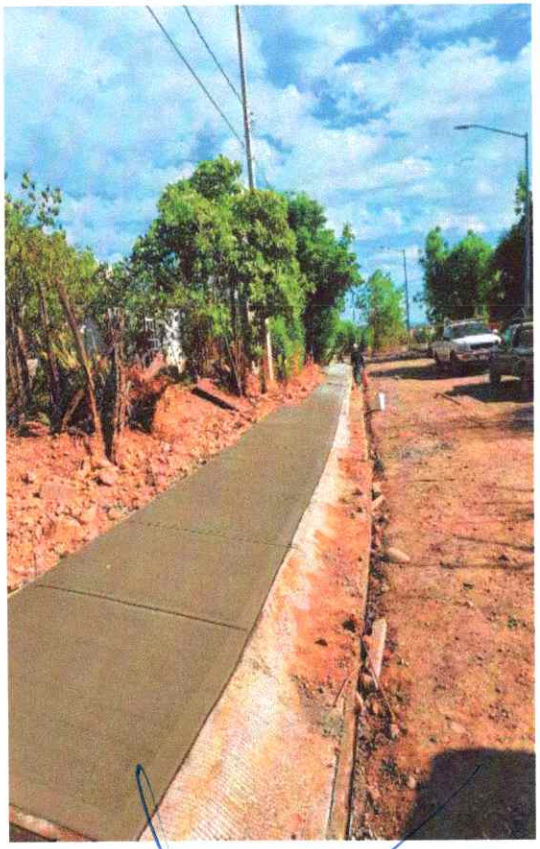

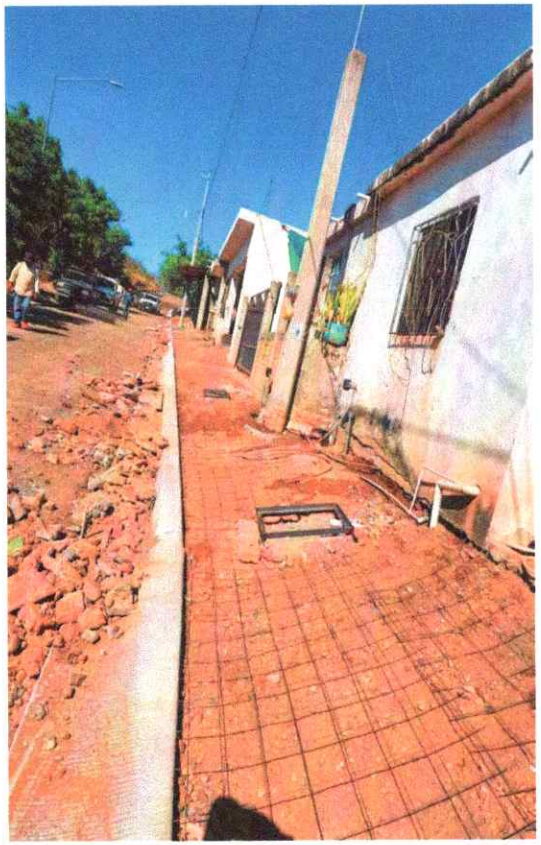

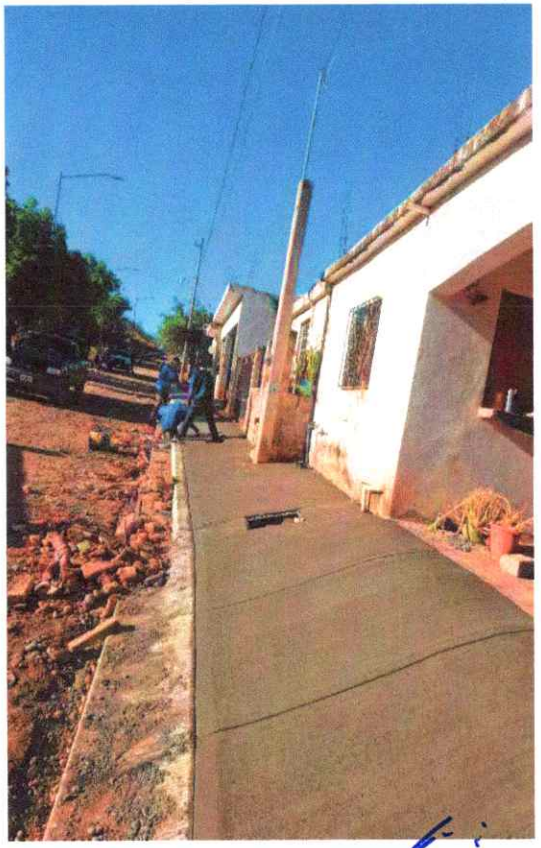

CONFORME:

ARQ. OMAR ISIDRO DAGNINO MEZA
SUPERINTENDENTE DE OBRA

CONFORME:

ING. JOEL ERNESTO RUBIO ACOSTA
SUPERVISOR DE OBRAS PÚBLICAS


CONFORME:


JUAN MANUEL LOPEZ MENCHACA
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS


MUNICIPIO DE SINALOA
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
ESTIMACION DE OBRA

OBRA:	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO ASFALTICO EN AVENIDA NUMERO NUEVE ENTRE PROLONGACION CALLE PEDRO FONSECA Y LIRAMIENTO EN LA LOCALIDAD DE SINALOA DE LEYVA, MUNICIPIO DE SINALOA, ESTADO DE SINALOA.	DAGBA CONSTRUCTORA **DAGBA** CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V. CALLE IGNACIO ZARAGOZA # 200-1, COL. CENTRO, GUASAVE, SIN. MEXICO C.P. 81000 (668) 154-43-51
CONTRATO: FAIS-DOP-SIN-2025-012	**IMPORTE:** $ 5,355,812.65 MAS IVA	
ESTIMACIÓN No.: ADICIONAL 1		
FECHA: 12 DE DICIEMBRE DEL 2025.	**PERIODO:** 17 DE JUNIO AL 11 DE DICIEMBRE DEL 2025.	

REPORTE FOTOGRAFICO

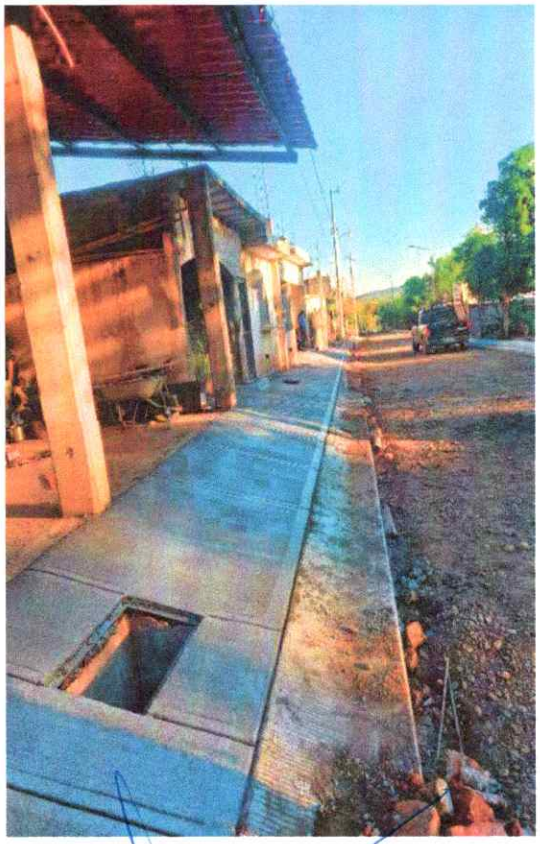

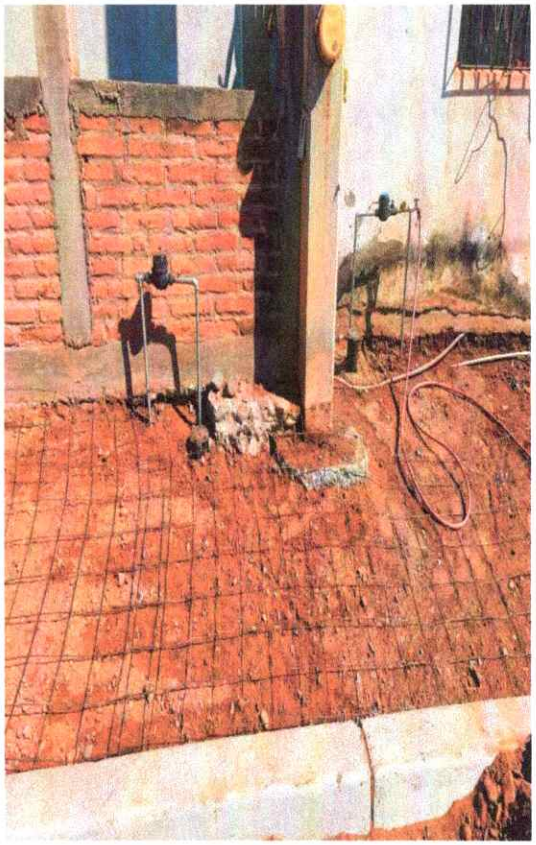

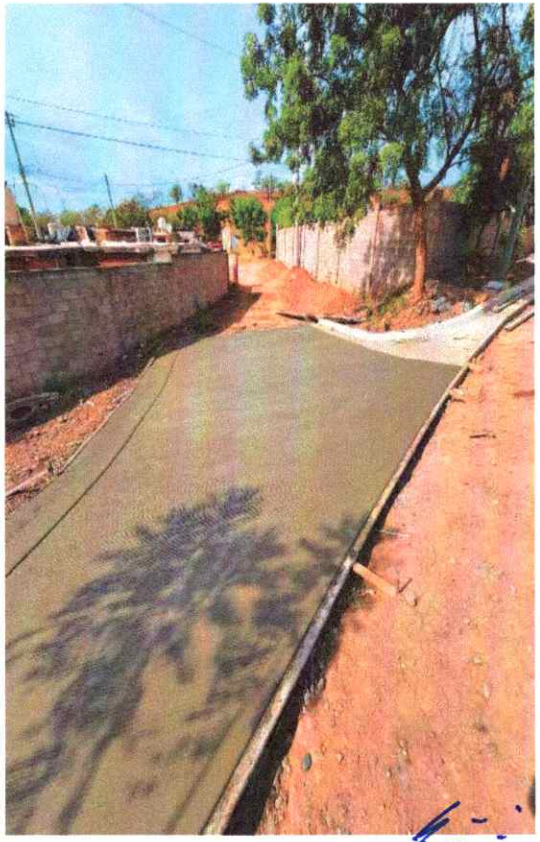

CONFORME:

ARQ. OMAR ISIDRO DAGNINO MEZA
SUPERINTENDENTE DE OBRA

CONFORME:

ING. JOEL ERNESTO RUBIO ACOSTA
SUPERVISOR DE OBRAS PÚBLICAS


CONFORME:


JUAN MANUEL LOPEZ MENCHACA
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS


MUNICIPIO DE SINALOA
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
ESTIMACION DE OBRA

OBRA:	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO ASFALTICO EN AVENIDA NUMERO NUEVE ENTRE PROLONGACION CALLE PEDRO FONSECA Y LIRAMIENTO EN LA LOCALIDAD DE SINALOA DE LEYVA, MUNICIPIO DE SINALOA, ESTADO DE SINALOA.	DAGBA CONSTRUCTORA — **DAGBA** CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V. CALLE IGNACIO ZARAGOZA # 200-1, COL. CENTRO, GUASAVE, SIN. MEXICO C.P. 81000 (668) 154-43-51
CONTRATO: FAIS-DOP-SIN-2025-012	IMPORTE: $ 5,355,812.65 MAS IVA	
ESTIMACIÓN No.: ADICIONAL 1		
FECHA: 12 DE DICIEMBRE DEL 2025.	PERIODO: 17 DE JUNIO AL 11 DE DICIEMBRE DEL 2025.	

REPORTE FOTOGRAFICO

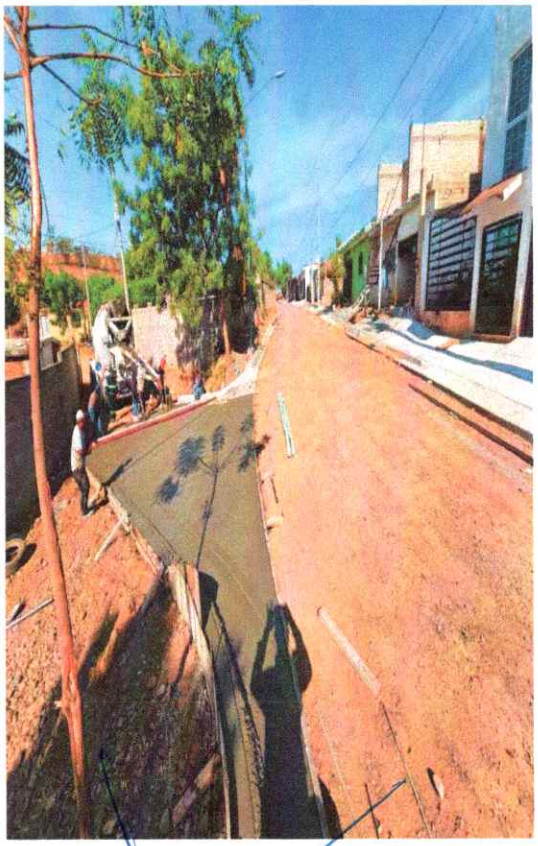

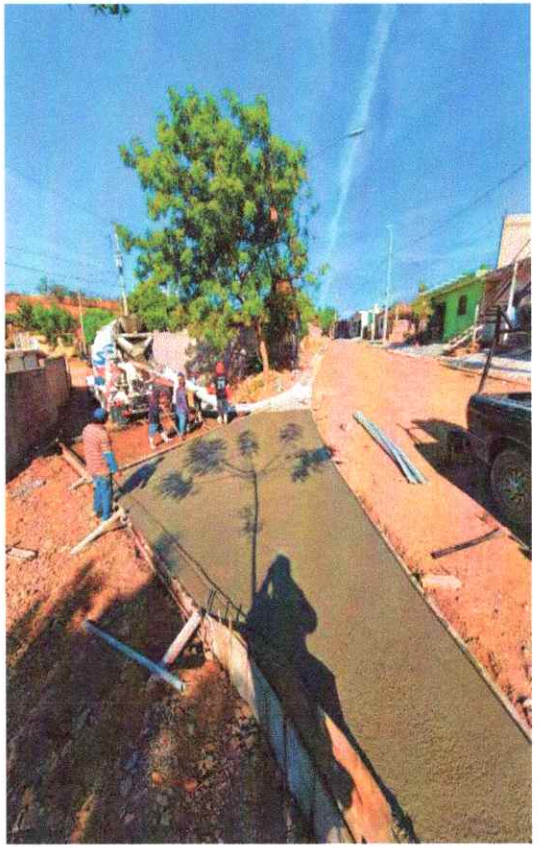

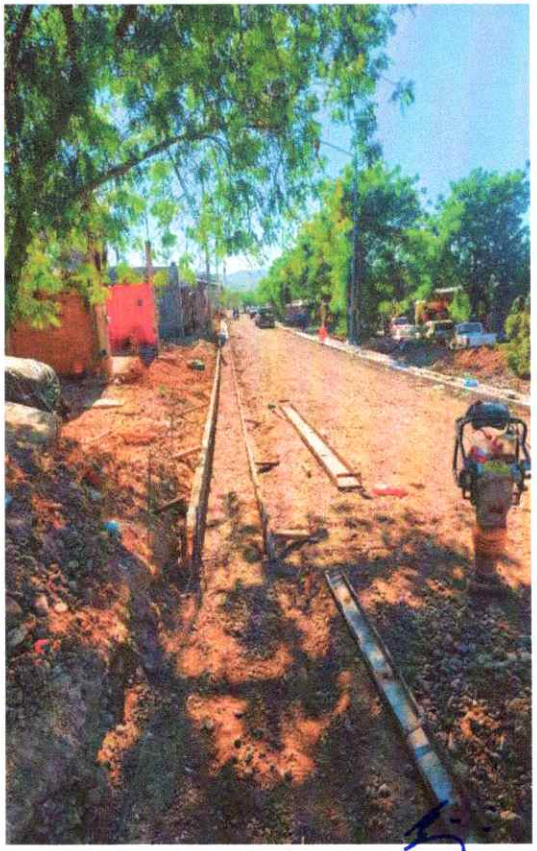

CONFORME:

ARQ. OMAR ISIDRO DAGNINO MEZA
SUPERINTENDENTE DE OBRA

CONFORME:

ING. JOEL ERNESTO RUBIO ACOSTA
SUPERVISOR DE OBRAS PÚBLICAS


CONFORME:


JUAN MANUEL LOPEZ MENCHACA
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS


MUNICIPIO DE SINALOA
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
ESTIMACION DE OBRA

OBRA:	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO ASFALTICO EN AVENIDA NUMERO NUEVE ENTRE PROLONGACION CALLE PEDRO FONSECA Y LIRAMIENTO EN LA LOCALIDAD DE SINALOA DE LEYVA, MUNICIPIO DE SINALOA, ESTADO DE SINALOA.	DAGBA CONSTRUCTORA **DAGBA** CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V. CALLE IGNACIO ZARAGOZA # 200-1, COL. CENTRO, GUASAVE, SIN. MEXICO C.P. 81000 (646) 154-43-51
CONTRATO: FAIS-DOP-SIN-2025-012	IMPORTE: $ 5,355,812.65 MAS IVA	
ESTIMACIÓN No.: ADICIONAL 1		
FECHA: 12 DE DICIEMBRE DEL 2025.	PERIODO: 17 DE JUNIO AL 11 DE DICIEMBRE DEL 2025.	

REPORTE FOTOGRAFICO

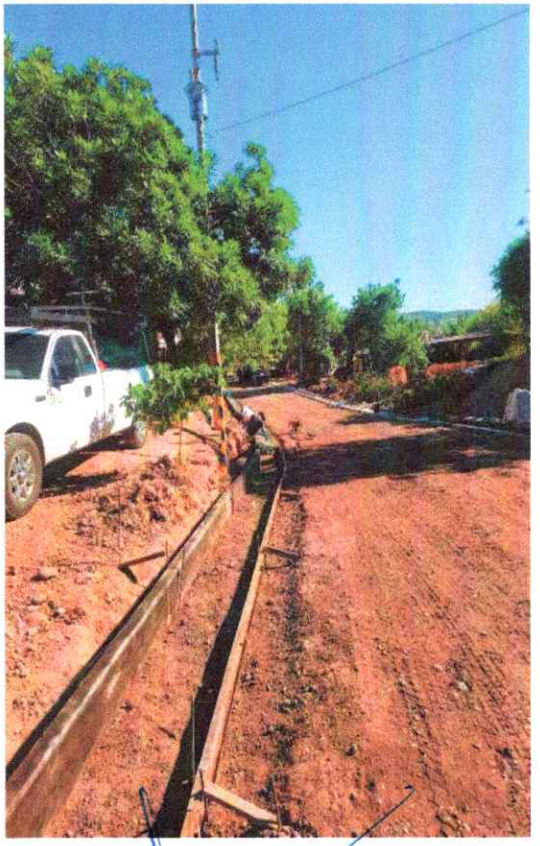

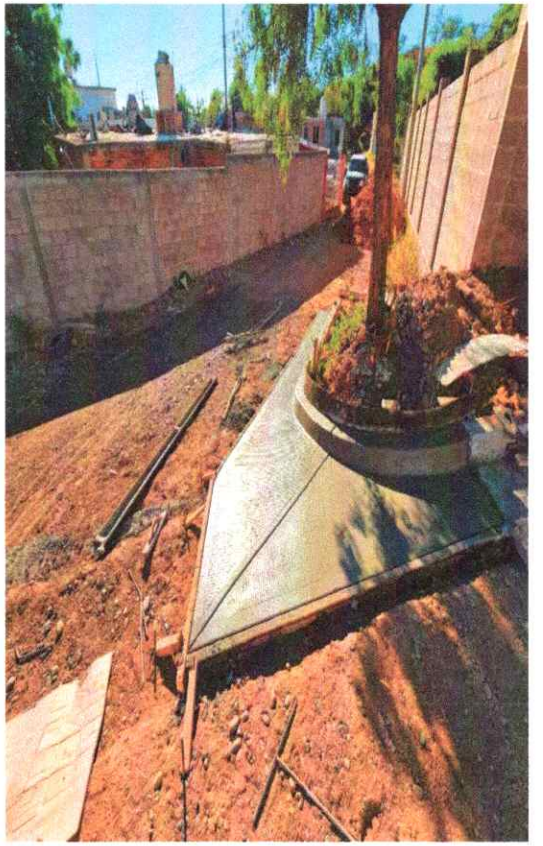

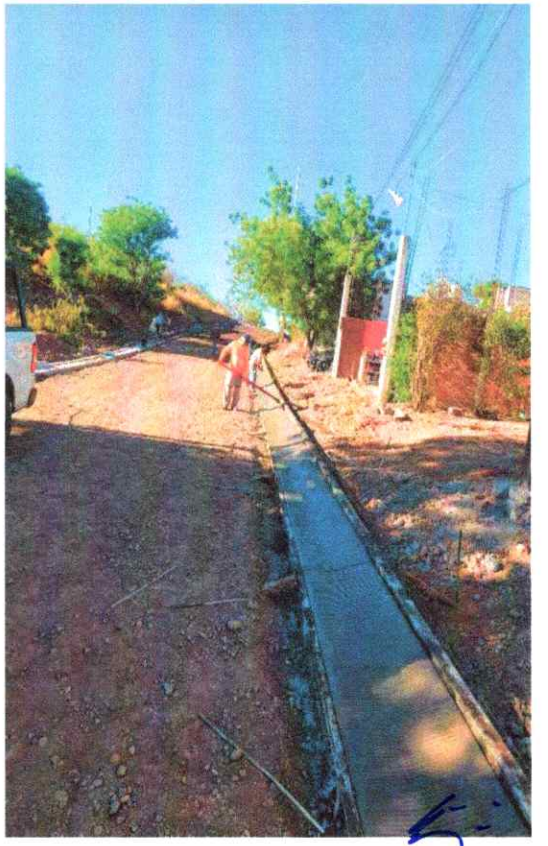

CONFORME:


ARQ. OMAR ISIDRO DAGNINO MEZA
SUPERINTENDENTE DE OBRA

CONFORME:

ING. JOEL ERNESTO RUBIO ACOSTA
SUPERVISOR DE OBRAS PÚBLICAS

CONFORME:

JUAN MANUEL LOPEZ MENCHACA
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

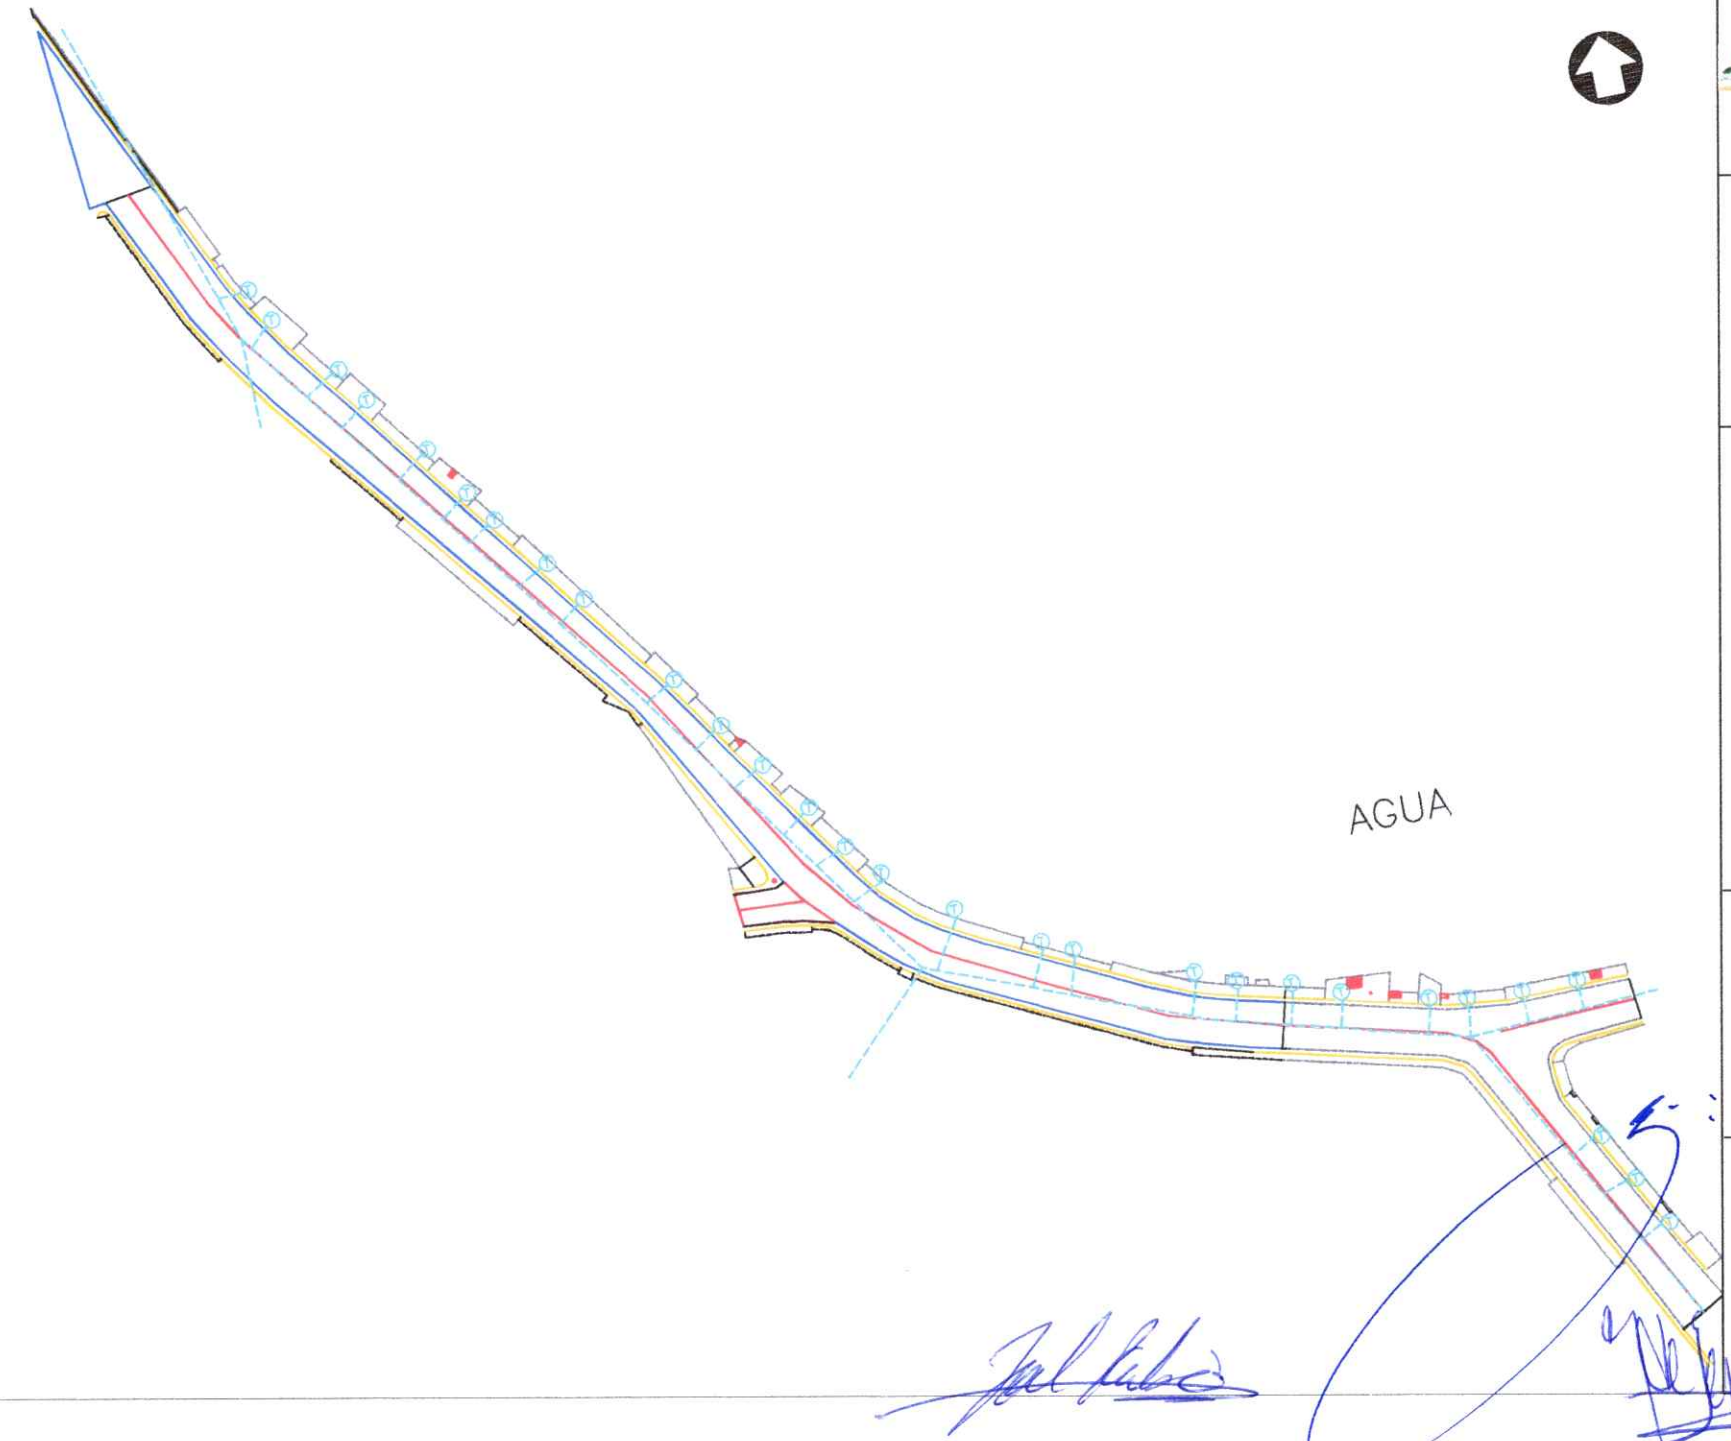

DAGBA CONSTRUCTORA S.A. DE C.V.

LOCALIZACION

SIMBOLOGIA

EJE DE PROYECTO

CERCO

TUBERIA PVA DE 3"

T TOMAS DOMICILIARIAS

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO ASFALTICO EN AVENIDA NUMERO NUEVE ENTRE PROLONGACION CALLE PEDRO FONSECA Y LIBRAMIENTO EN LA LOCALIDAD DE SINALOA DE LEYVA, MUNICIPIO DE SINALOA, ESTADO DE SINALOA.

CROQUIS DE ESTIMACION ADICIONAL 1

AGUA POTABLE



DAGBA CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.

LOCALIZACION

SIMBOLOGIA

EJE DE PROYECTO

CERCO

TUBERIA PVC DE 8"

R REGISTROS SANITARIOS


RENIVELACION DE POZO

CONSTRUCCION DE POZO

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO ASFALTICO EN AVENIDA NUMERO NUEVE ENTRE PROLONGACION CALLE PEDRO FONSECA Y LIBRAMIENTO EN LA LOCALIDAD DE SINALOA DE LEYVA, MUNICIPIO DE SINALOA, ESTADO DE SINALOA.

CROQUIS DE ESTIMACION ADICIONAL 1

DRENAJE SANITARIO

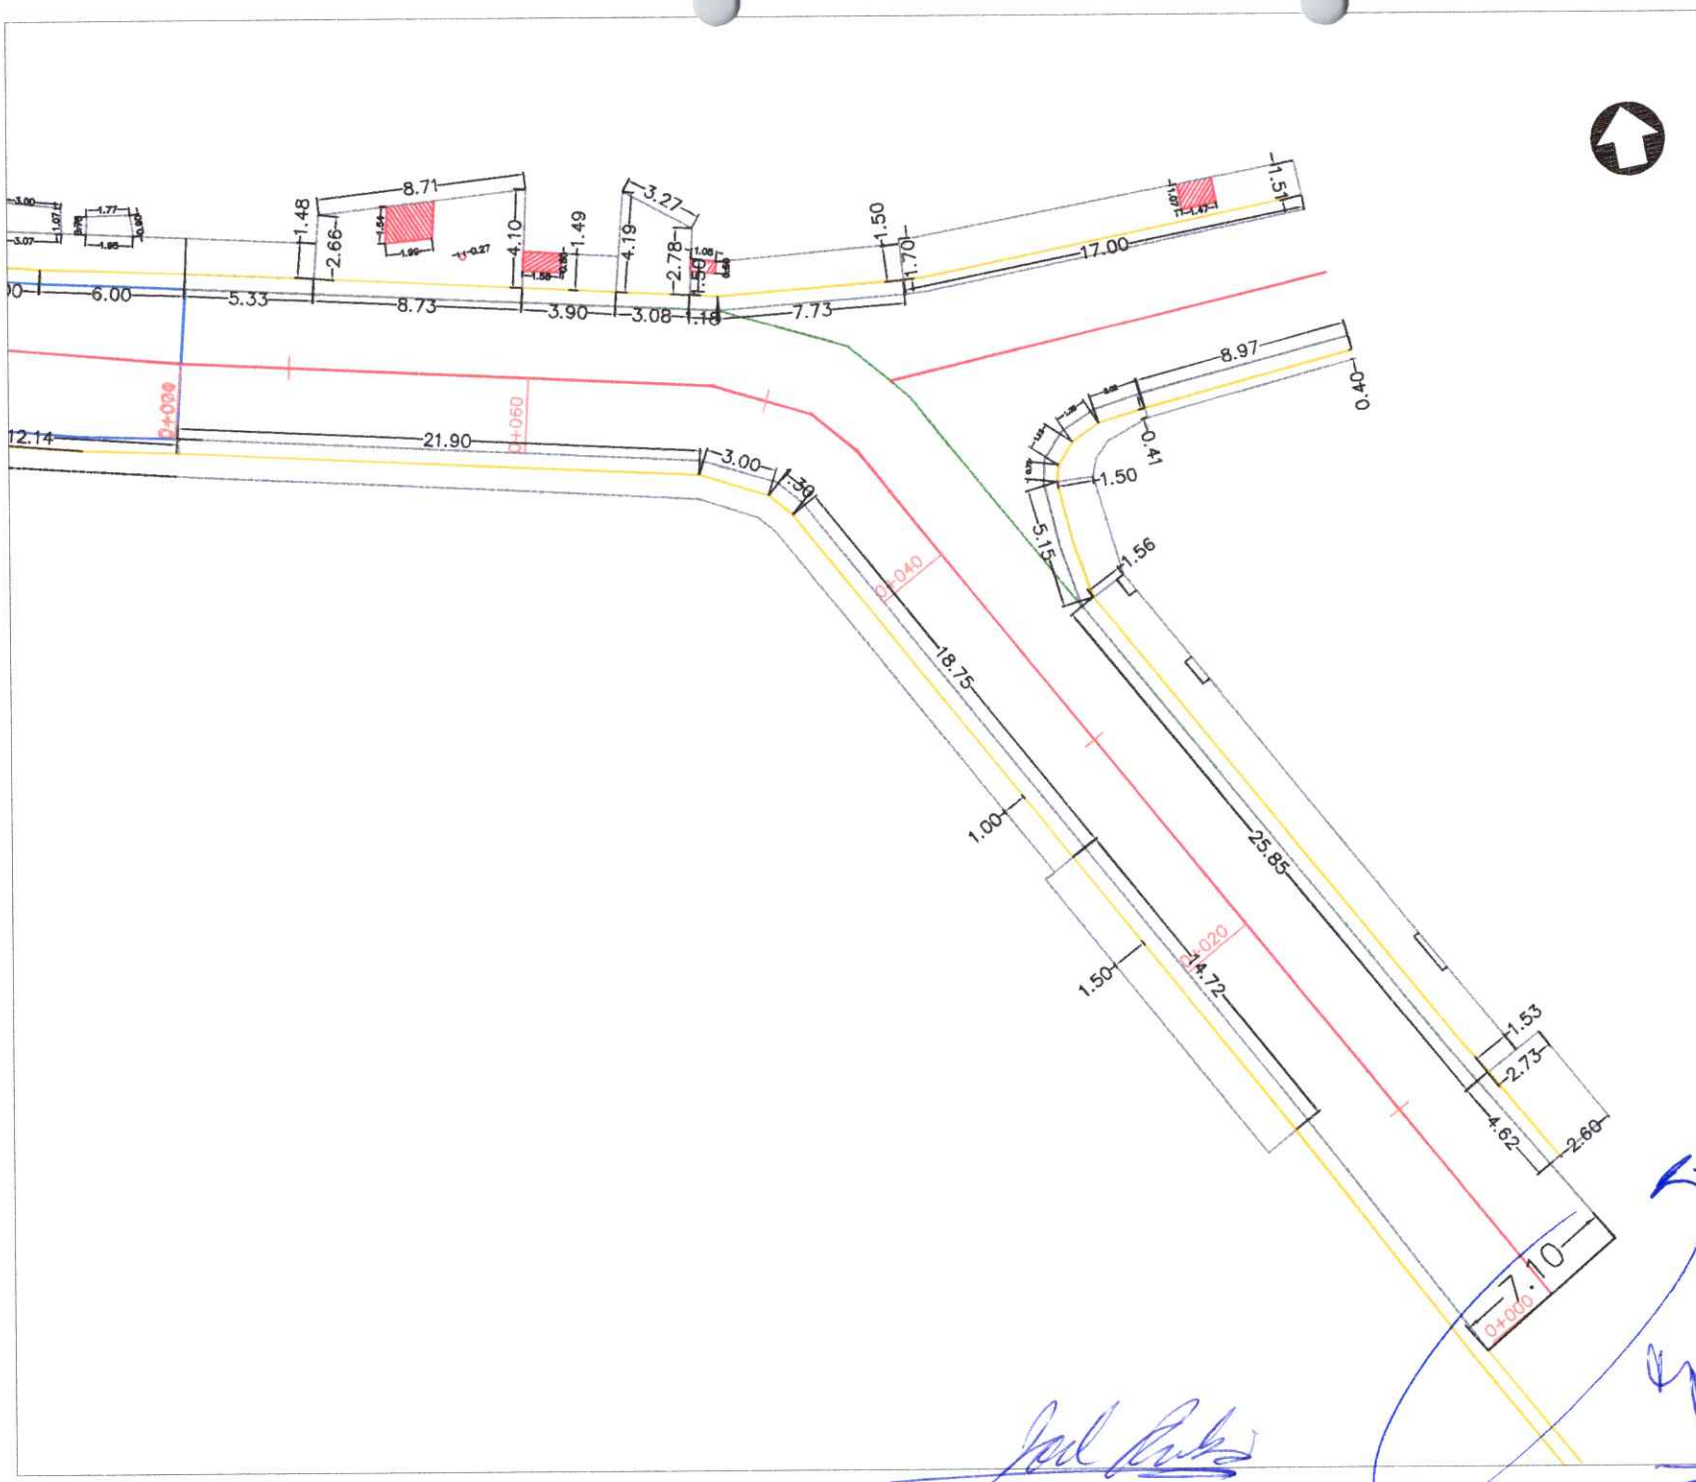


LOCALIZACION

SIMBOLOGIA

- EJE DE PROYECTO
- CERCO
- AREA DE ASFALTO
- CONCRETO F'C 300KG/CM2
- CONCRETO F'C 200KG/CM2

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO ASFALTICO EN AVENIDA NUMERO NUEVE ENTRE PROLONGACION CALLE PEDRO FONSECA Y LIBRAMIENTO EN LA LOCALIDAD DE SINALOA DE LEYVA, MUNICIPIO DE SINALOA, ESTADO DE SINALOA.

CROQUIS DE ESTIMACION ADICIONAL 1
BANQUETAS

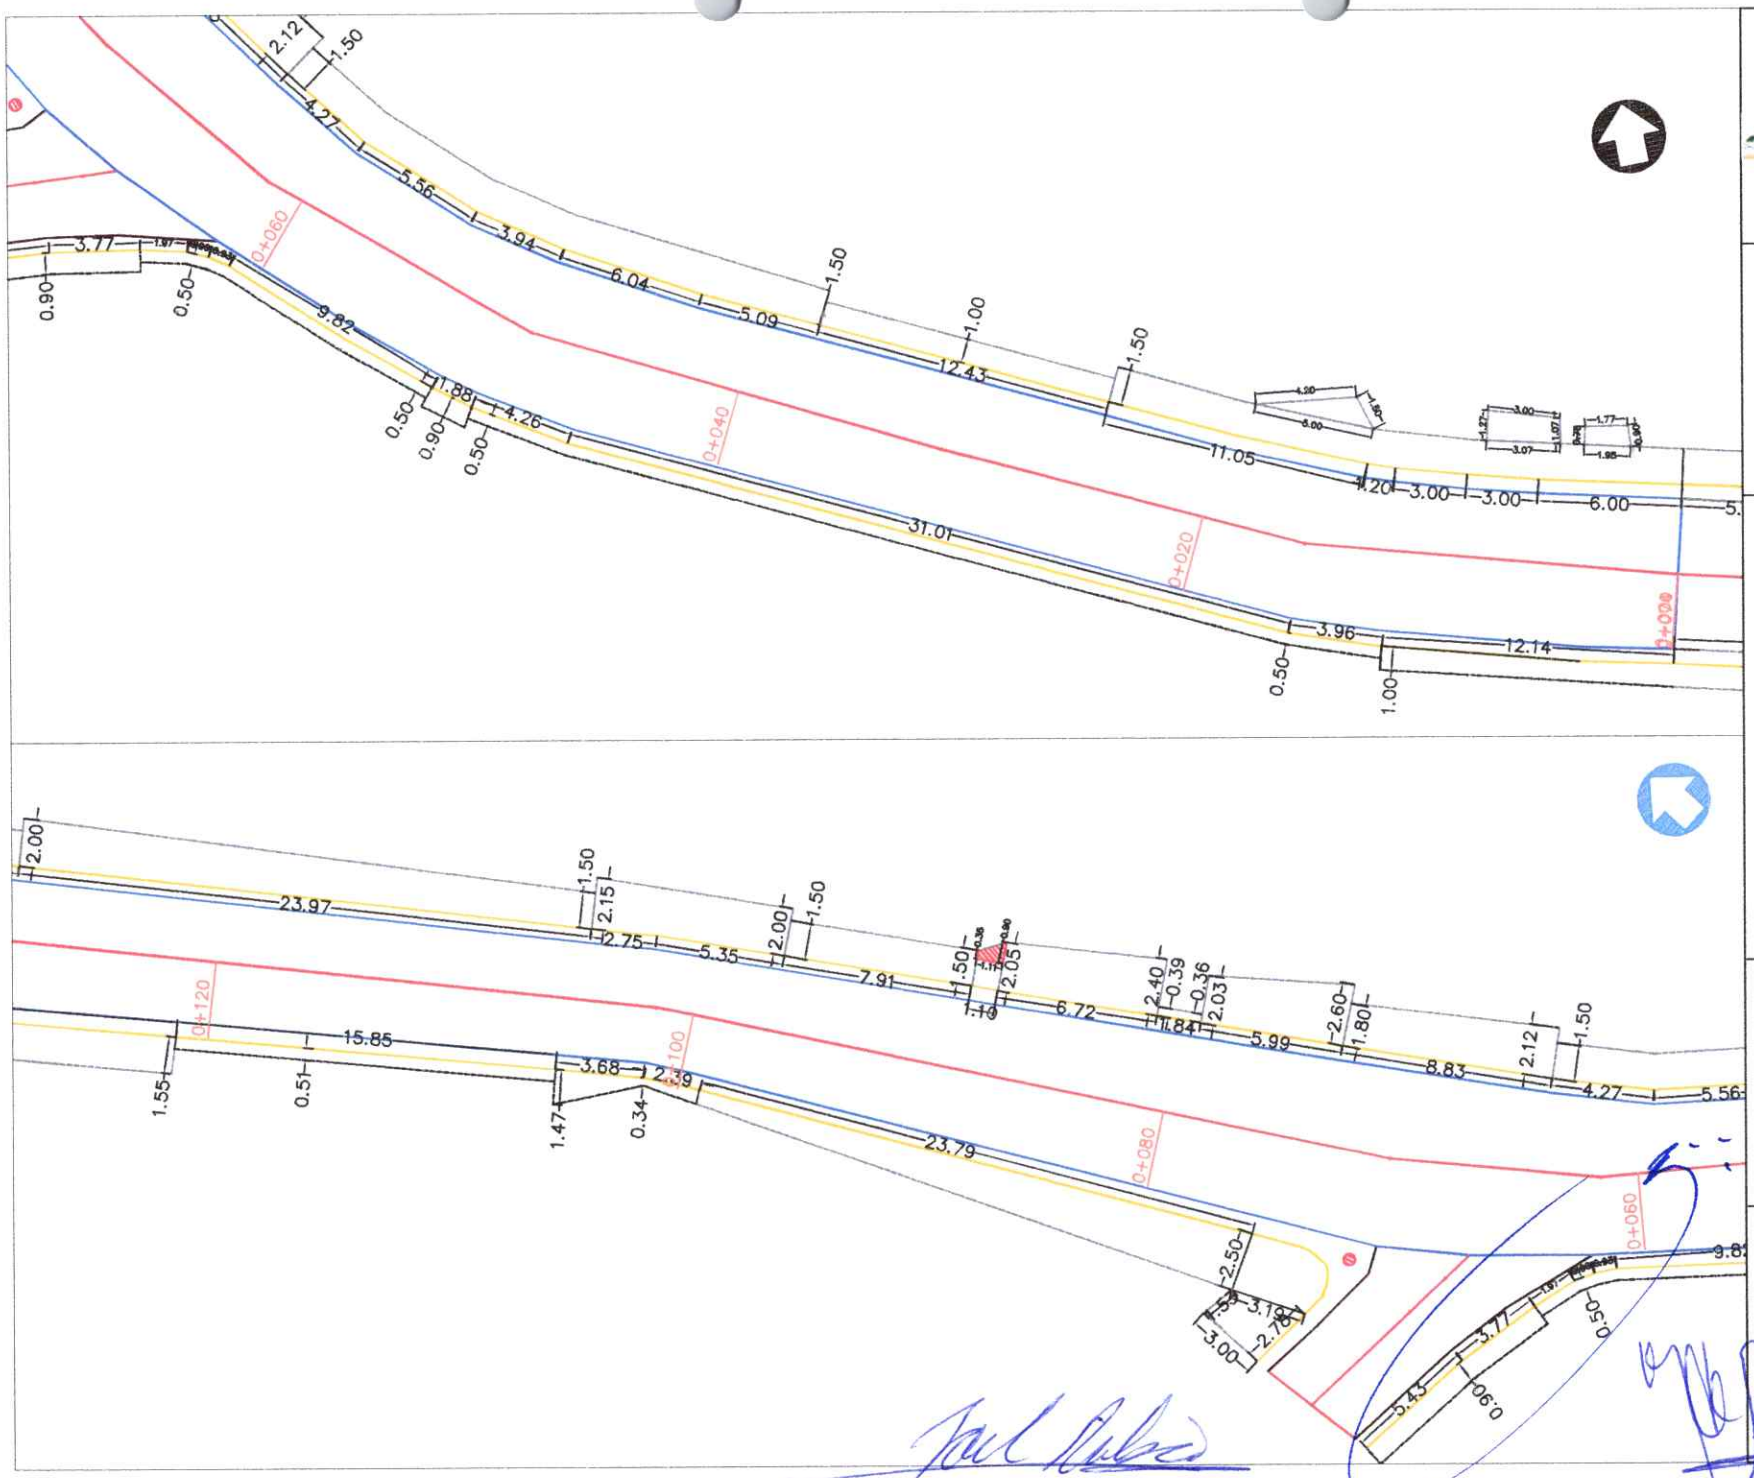

DAGBA CONSTRUCTORA S.A. DE C.V.


LOCALIZACION


SIMBOLOGIA

- EJE DE PROYECTO
- CERCO
- AREA DE ASFALTO
- CONCRETO F'C 300KG/CM2
- CONCRETO F'C 200KG/CM2

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO ASFALTICO EN AVENIDA NUMERO NUEVE ENTRE PROLONGACION CALLE PEDRO FONSECA Y LIBRAMIENTO EN LA LOCALIDAD DE SINALOA DE LEYVA, MUNICIPIO DE SINALOA, ESTADO DE SINALOA.

CROQUIS DE ESTIMACION ADICIONAL 1
BANQUETAS

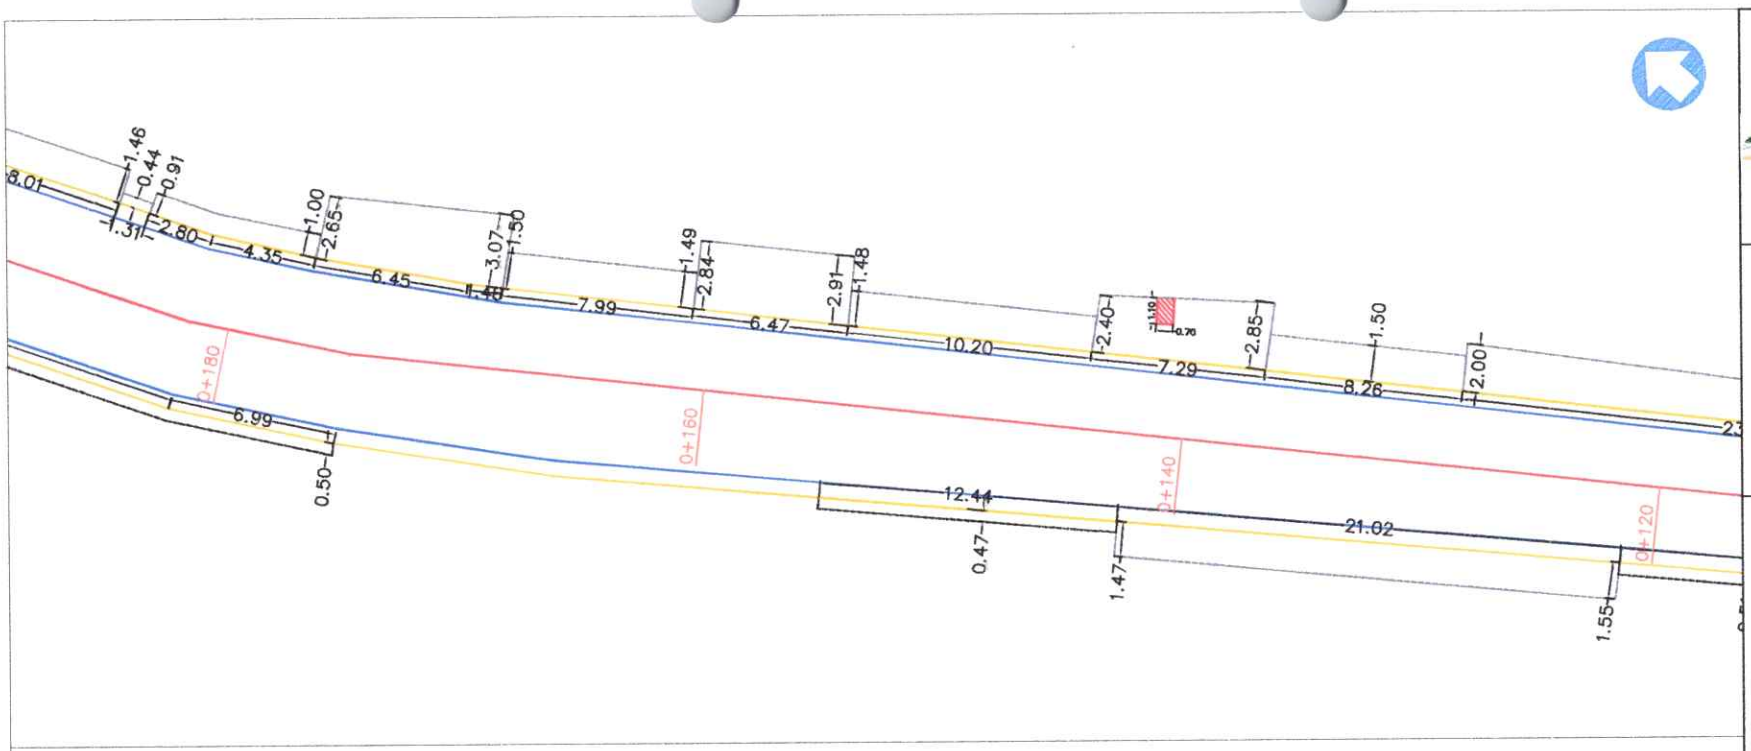

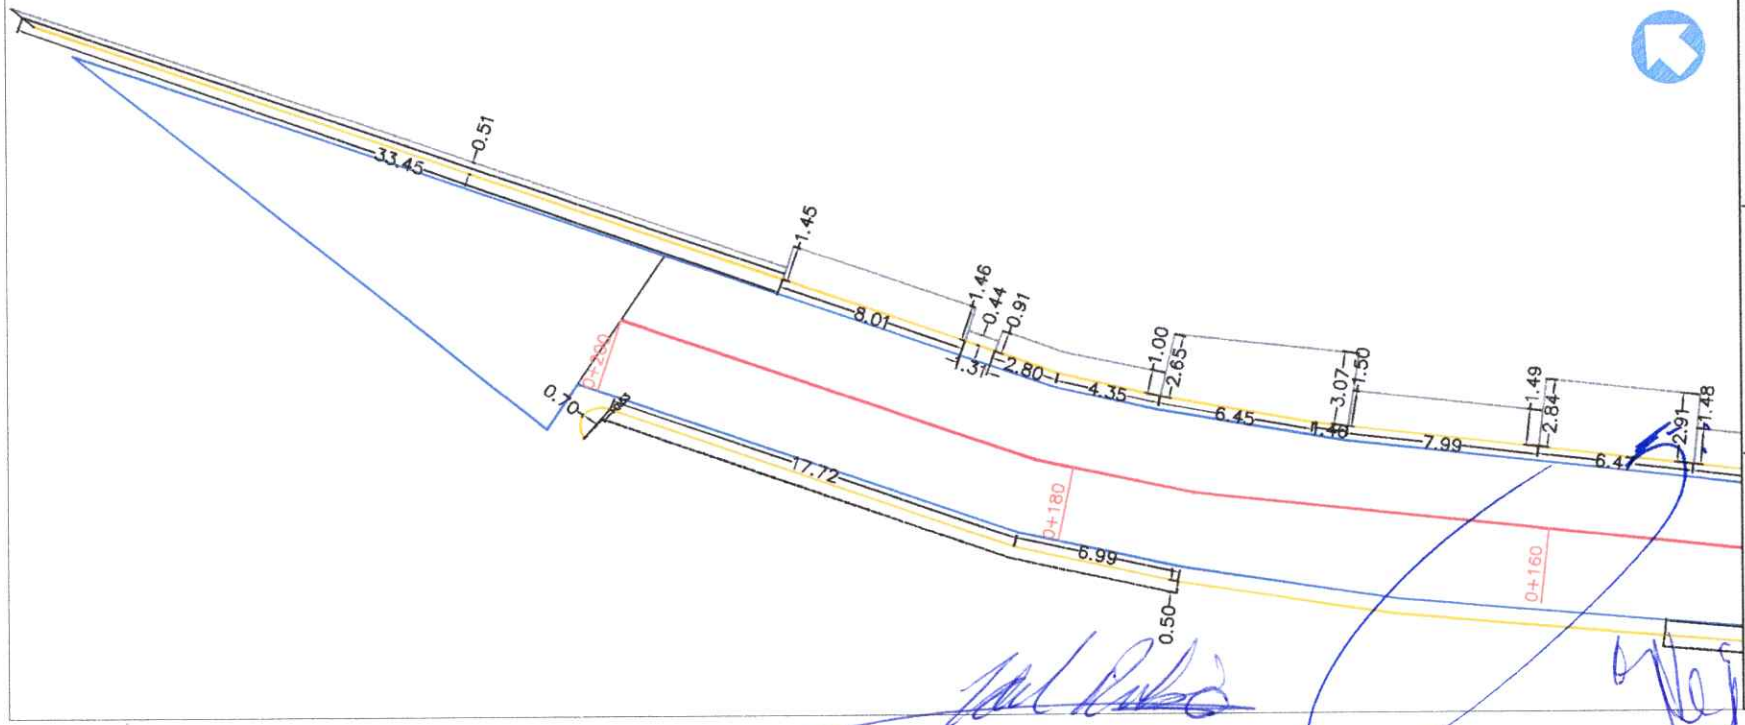

DAGBA CONSTRUCTORA S.A. DE C.V.

LOCALIZACION

SIMBOLOGIA

- EJE DE PROYECTO
- CERCO
- AREA DE ASFALTO
- CONCRETO F'C 300KG/CM2
- CONCRETO F'C 200KG/CM2

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO ASFALTICO EN AVENIDA NUMERO NUEVE ENTRE PROLONGACION CALLE PEDRO FONSECA Y LIBRAMIENTO EN LA LOCALIDAD DE SINALOA DE LEYVA, MUNICIPIO DE SINALOA, ESTADO DE SINALOA.

CROQUIS DE ESTIMACION ADICIONAL 1
BANQUETAS
